

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4 ze dne 18. 8. 2021  
k Rámcové dohodě č. II č. SZR – 461 – 159/Ř – 2018**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel**

**Česká republika – Správa základních registrů**

zastoupená: Ing. Michalem Peškem, ředitelem Správy základních registrů  
se sídlem: Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3  
IČ: 72054506  
Identifikátor datové schránky: jjqjqih

(dále též jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“ či „SZR“)

a

**2. Zhotovitel**

**První certifikační autorita, a.s.**

zastoupená: Ing. Petrem Budišem, Ph.D., MBA, předsedou představenstva a  
Ing. Romanem Kučerou, členem představenstva  
se sídlem: Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2178/6, PSČ 190 00  
IČ: 26439395  
DIČ: CZ26439395  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 7136  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 168457418/0300  
identifikátor datové schránky: a69fvfb

(dále též jen „**Zhotovitel**“ nebo „I.CA“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“ nebo „OZ“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

## **II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2021 dílčí smlouvu o dílo č. 4 k Rámcové dohodě č. II č. SZR – 461 – 159/Ř – 2018, která se týká:
  - 1.1. Pořízení dodatečného řešení „TSA\_izol“ pro nově budovanou izolovanou síť Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „NBÚ“) zahrnující dodávky HW, SW, maintenance, instalační, síťové a konfigurační práce a dodávku licencí.
  - 1.2. Pořízení dodatečného řešení „TSA\_izol“ pro nově budovanou izolovanou síť Policie České republiky (dále jen „PČR“) zahrnující dodávky HW, SW, maintenance, instalační, síťové a konfigurační práce a dodávku licencí. Vyjma maintenance (podpory výrobce) pro nově pořizovaný HW, je předmětem smlouvy také pořízení roční podpory výrobce pro HSM Thales nShield Connect 1500+, který je v současnosti v majetku PČR a je převáděn z této organizační složky státu do majetku SZR.
  - 1.3. Zahájení činností souvisejících s postupnou implementací opatření z plánu zvládnutí rizik. Konkrétně se jedná o realizaci opatření, která umožní nápravu zjištěných nedostatků z auditu přístupnosti (úprava a implementace zvukového doplnění systému CAPTCHA, umístění popisku grafického odkazu, převedení seznamu certifikátů do stylu H1 pro všechny aplikace, vylepšení nápovědy - přístupnost ikony, umístění bubliny v kódu pro všechny aplikace, zpřístupnění seznamů - výsledky vyhledávání - úprava tabulky).

## **III. PŘEDMĚT DODATKU**


2. Z důvodu technické nepřipravenosti na straně NBÚ a PČR, která neumožňuje provést veškeré nebytné činnosti pro instalaci řešení TSA\_izol na těchto bezpečnostních složkách, se obě smluvní strany dohodly na:
  - 2.1. změně Přílohy č. 3 - Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků,
  - 2.2. změně Přílohy č. 4 - Harmonogram.
3. Na základě výše uvedených změn se smluvní strany dále dohodly, že v případě prodloužení Zhotovitele se splněním bodu 3 Přílohy č. 4 – Harmonogram, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý den prodloužení.

## **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží Smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Objednatel:

Zhotovitel:

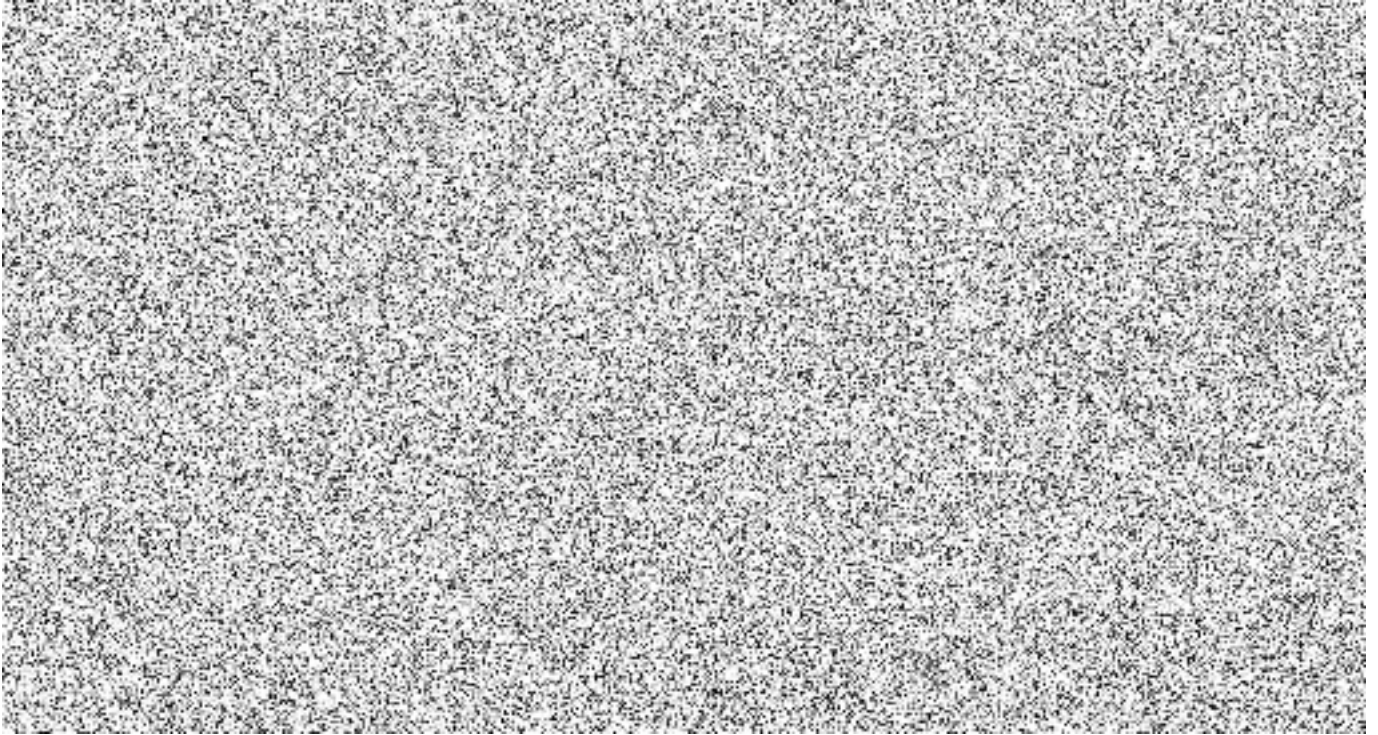

### Příloha č. 3 Smlouvy

#### Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků

Splněním milníku se rozumí podpis akceptačního protokolu pro příslušný milník s výrokem „splňuje“ oběma Smluvními stranami. K podpisu akceptačního protokolu pro příslušný milník nemůže dojít dříve, než Zhotovitel splní řádně bez jakýchkoliv vad akceptační kritéria sjednaná v této příloze Smlouvy pro příslušný milník.



Číslo milníku	Nejzazší termín pro předání	Název milníků	Výše platby	Akceptační kritéria
1	13.10.2021	Předání jednotlivých částí HW a SW	Splnění tohoto milníku zakládá právo dodavatele na fakturaci dle ceny bodu 1, tj. 6.067.500,80 Kč bez DPH, tj. 7.341.675,97 Kč s DPH.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instalace TSA_izol a redundantní sady TSA_izol v datovém centru NBÚ.</li> <li>2. Vygenerování testovacích certifikátů (generování klíčů a žádostí) na NBÚ.</li> <li>3. Provedení testů TimeStamp a Seal na NBÚ.</li> <li>4. Umístění nainstalované a nakonfigurované sady TSA_izol a redundantní sady TSA_izol v datovém centru PČR.</li> </ol>
2	30.11.2021	Realizace opatření z auditu přístupnosti.	Tento milník zakládá právo dodavatele na fakturaci dle ceny bodu 2, tj. 149.300,00 Kč bez DPH, tj. 180.653,00 Kč s DPH.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implementace změn odpovídající požadavkům auditu a zákonu č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.</li> <li>2. Provedení úspěšných akceptačních testů instalované funkcionality odpovídající výše uvedené legislativě pro informační systémy a webové stránky veřejné správy.</li> <li>3. Předání aktualizované dokumentace.</li> </ol>
3	31.3.2022	Kompletní otestování funkcionality TSA a TSA_HA.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provedení úspěšných akceptačních testů na reálně dodanou funkcionality TSA_izol řešení, vygenerování ostrých verzí certifikátů včetně potvrzení ze strany NBÚ o fungování služeb</li> </ol>

				<p>NCA v rozšířeném módu (s využitím redundance).</p> <p>2. Provedení úspěšných akceptačních testů na reálně dodanou funkcionalitu TSA_izol řešení, vygenerování ostrých verzí certifikátů včetně potvrzení ze strany PČR o fungování služeb NCA v rozšířeném módu (s využitím redundance a funkčnosti LoadBalanceru).</p> <p>3. Předání dokumentace skutečného provedení se zahrnutými změnami.</p>
--	--	--	--	--

## Příloha č. 4 Smlouvy

### Harmonogram

Zhotovitel poskytne plnění dle této Smlouvy v následujících termínech:

1. Do 13. 10. 2021 zajistí Zhotovitel:
  - dodávku veškerého HW a SW pro NBÚ a PČR,
  - 
  - vygenerování testovacích certifikátů (generování klíčů a žádostí) na NBÚ,
  - provedení testů TimeStamp a Seal na NBÚ,
  - 
2. Do 30.11.2021 zajistí Zhotovitel realizaci opatření z auditu přístupnosti.
3. Do 10 pracovních dnů od obdržení písemné informace ze strany SZR o technické připravenosti NBÚ a PČR zahájí práce nezbytné k:
  - provedení úspěšných akceptačních testů na reálně dodanou funkcionalitu TSA\_izol řešení, vygenerování ostrých verzí certifikátů včetně potvrzení ze strany NBÚ o fungování služeb NCA v rozšířeném módu (s využitím redundance).
  - provedení úspěšných akceptačních testů na reálně dodanou funkcionalitu TSA\_izol řešení, vygenerování ostrých verzí certifikátů včetně potvrzení ze strany PČR o fungování služeb NCA v rozšířeném módu (s využitím redundance a funkčnosti LoadBalanceru).
  - předání dokumentace skutečného provedení se zahrnutými změnami.

Nejzazší termín pro dokončení prací dle tohoto bodu je stanoven na 31. 3. 2022.
