

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDACTED]
středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000145

a

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.
se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
IČO: 253 17 628
DIČ: CZ253 17 628
bankovní spojení: [REDACTED]

[REDACTED]
zapsán dne 20.11.1996 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 2144

zastoupen Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy Ing. Pavel Borek, člen představenstva
ve věcech technických [REDACTED]
číslo smlouvy zhotovitele: ...

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele demolici stávajícího mostu ev. č. BM-560 lávky Táborského nábřeží přes Svatku v k. ú. Staré Brno a Štýřice, statuární město Brno, přičemž rozsah stavebních úprav je patrný ze situace. Před demolicí lávky bude v rámci stavby Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII. a VIII. provedeno odpojení a zaslepení potrubí horkovodu a plynovodu, kabel VN bude vyvěšen mimo dosah demolice, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně

přílohy s názvem „Lávka Táborského nábřeží přes Svatku most ev.č. BM-560 odstranění stavby II“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

- a) Demolice stavby „Lávka Táborského nábřeží přes Svatku most ev.č. BM-560 odstranění stavby II“

Demolici stavby se rozumí demolice stávajícího mostu ev.č. BM-560 lávky Táborského nábřeží přes Svatku v k. ú. Staré Brno a Štýřice, statutární město Brno.

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
 - dokumentace bouracích prací zpracovaná společností Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 717/20, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČO: 46974806,
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění demoličních prací bude zahájeno: ihned po předání staveniště.
- (3) Dokončení demoličních prací a vyklizení staveniště: do 60 dnů ode dne předání staveniště.
- (4) Předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů od dokončení demoličních prací.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno.
- (6) Dílo bude provedeno dle přiloženého harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termínů zahájení a ukončení provádění díla dle této smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- (7) Dřívější plnění je možné.
- (8) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4 899 464,76 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování

geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).

- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDACTED] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.

Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 45 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své

náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
- (7) Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen:
- i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
- (8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
- i. Povolení k uzavírkám.
 - ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.
 - iii. Stanovení dočasného dopravního značení,
 - iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
 - v. Užívání veřejného prostranství.
- (9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.

- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (4) Technickým dozorem investora je [REDAKCE]

IX. Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDAKCE]

X. Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Zhotovitel je povinen:
 - zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
 - zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použití mobilních signalizačních zařízení (semafory),
 - zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
 - spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - zajistit po celou dobu demoličních prací odpovídající technické vybavení
 - respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,

- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- **koordinovat postup stavby s hlavní stavbou Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII. a VIII.**

XI.

Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončených demoličních prací, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy jsou demoliční práce dokončeny tehdy, jsou-li bez vad, nebo vykazují-li ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání prostoru po demoličních pracích funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení demoličních prací je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelům vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
- (5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,
 - průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- (6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.

XII.

Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

- (4) Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- (5) Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

XIII.

Další ujednání

- (1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5) Zjistí-li zhotovitel při provádění demoličních prací skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde mají být demoliční práce provedeny, a tyto překážky znemožňují provedení demoličních prací způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání demoličních prací je zhotovitel oprávněn provádění demoličních prací v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

- (8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění demoličních prací zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- 2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
- 2.2 Ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předáním objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
- 2.3 Ve výši 1.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
- 2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li

- se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
- 2.5 Ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.
 - 2.7 Ve výši 20.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé takové porušení.
 - 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
 - 2.9 Ve výši 10.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
 - 2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
 - 2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
 - 2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
 - 2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
 - 2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
 - 2.15 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
 - 2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3)** Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1)** Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,

- e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmou.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII. Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.


Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Harmonogram

Za objednatele:


V Brně dne 11 -04- 2022



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Brně dne 22.3.2022



Ing. Pavel Borek /
člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20084-G2
Stavba: Demolice Most ev. č. BM-560, lávka Táborského náb oceněný

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 899 464,76**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 899 464,76	1 028 887,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **5 928 352,36**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 22.3.2022 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20084-G2

Stavba: Demolice Most ev. č. BM-560, lávka Táborského náb oceněný

Místo: Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 899 464,76	5 928 352,36
VRN	VRN	142 000,00	171 820,00
SO 01	Demolice	4 757 464,76	5 756 532,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice Most ev. č. BM-560, lávka Táborského náb oceněný

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

142 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 142 000,00

1	K	013244000	Dokumentace DIO pro realizaci stavby	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
3	K	072103002	DIO a přechodné dopravní značení	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Demolice Most ev. č. BM-560, lávka Táborského náb oceněný

Objekt:

SO 01 - Demolice

Místo:

Datum: 16. 2. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 757 464,76

D HSV Práce a dodávky HSV

3 795 645,63

D 1 Zemní práce 1 106 028,61

1	K	113106292	Rozebrání vozovky ze silničních dílců spáry zalité cementovou maltou strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	137,000	195,48	26 780,76	CS ÚRS 2022 01
	W		plocha pod jeřáby 32 m2 příjezd 105 m2					
	W		32*105		137,000			
	W		Součet		137,000			
2	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	98,560	195,95	19 312,83	CS ÚRS 2022 01
	W		32*3,08		98,560			
	W		Součet		98,560			
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch z kameniva drceného	m3	13,700	423,75	5 805,38	CS ÚRS 2022 01
	W		(32+105)*0,1		13,700			
	W		Součet		13,700			
4	K	131251202	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	58,451	612,74	35 815,27	CS ÚRS 2022 01
	W		OP1: 6,414 + 17,822 = 24,236; OP 2: 8,487 + 25,728 = 34,215					
	W		24,236+34,215		58,451			
	W		Součet		58,451			
5	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	81,000	5 060,00	409 860,00	CS ÚRS 2022 01
	W		9*9		81,000			
	W		Součet		81,000			
6	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	40,500	736,68	29 835,54	CS ÚRS 2022 01
	W		9*4,5		40,500			
	W		Součet		40,500			
7	K	151712111	Převázka ocelová zdvojená pro kotvení záporového pažení	m	11,000	3 795,00	41 745,00	CS ÚRS 2022 01
	W		7+2*2		11,000			
	W		Součet		11,000			
8	K	151712121	Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení	m	11,000	1 535,22	16 887,42	CS ÚRS 2022 01
9	M	13010984	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240	t	7,654	48 300,00	369 688,20	CS ÚRS 2022 01
	W		(81+11)*0,0832		7,654			
	W		Součet		7,654			
10	K	151721112	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 10 m s jeho následným odstraněním	m2	30,000	1 035,00	31 050,00	CS ÚRS 2022 01
	W		7,5*4		30,000			
	W		Součet		30,000			
11	M	60512135	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	4,200	8 050,00	33 810,00	
	W		30*0,14		4,200			
	W		Součet		4,200			
12	K	153111114	Příčné řezání ocelových zaberaných štětovic z terénu	kus	9,000	370,36	3 333,24	CS ÚRS 2022 01
	W		9		9,000			
	W		Součet		9,000			
13	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	66,703	106,02	7 071,85	CS ÚRS 2022 01
	W		58,451+9*3,14*0,2*0,2*7,3		66,703			
	W		Součet		66,703			
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	66,703	207,62	13 848,88	CS ÚRS 2022 01
	W		66,703		66,703			
	W		Součet		66,703			
15	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	66,703	15,51	1 034,56	CS ÚRS 2022 01
	W		1*66,703		66,703			
	W		Součet		66,703			
16	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	8,252	137,56	1 135,15	CS ÚRS 2022 01
	W		9*3,14*0,2*0,2*7,3		8,252			
	W		Součet		8,252			
17	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	155,506	379,50	59 014,53	CS ÚRS 2022 01
	W		zemina 66,703*1,8 + šterkodrt z podkladů pod panely 13,7*2,1					
	W		1,9*66,703+2,1*13,7		155,506			
	W		Součet		155,506			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	606 218,60				
18	K	226111411	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D přes 450 do 550 mm hl přes 5 m hornina I	m	65,700	3 680,00	241 776,00	CS ÚRS 2022 01
	W		9*7,3		65,700			
19	K	275121101	Hranice podpěrná dočasná ze ŽB silničních dílců pl do 3 m2 hl 2 m - zřízení	kus	72,000	822,24	59 201,28	CS ÚRS 2022 01
	W		"dle PD" 72		72,000			
20	K	275121102	Hranice podpěrná dočasná ze ŽB silničních dílců pl do 3 m2 hl 2 m - odstranění	kus	72,000	321,37	23 138,64	CS ÚRS 2022 01
21	M	59381000R	panel silniční 2,00x1,00x0,215 m	kus	72,000	3 653,55	263 055,60	
22	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	5,200	3 662,90	19 047,08	CS ÚRS 2022 01
	W		9*3,14*0,2*0,2*4,6		5,200			
	W		Součet		5,200			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce	17 284,37				
23	K	348401140	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v přes 2,0 do 4,0 m	m	62,200	124,41	7 738,30	CS ÚRS 2022 01
	W		2*31,1		62,200			
	W		Součet		62,200			
24	M	31324771	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2,15mm v 1250mm	m	125,000	69,23	8 653,75	CS ÚRS 2022 01
	W		125		125,000			
	W		Součet		125,000			
25	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	208,000	2,79	580,32	CS ÚRS 2022 01
	W		208		208,000			
	W		Součet		208,000			
26	M	15619201	drát poplastovaný kruhový vázací 2,0mm	m	200,000	1,56	312,00	CS ÚRS 2022 01
	W		200		200,000			
	W		Součet		200,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 066 114,05				
31	K	946231111	Montáž zavěšeného lešení pod bednění mostních říms s vyloženíem do 0,9 m	m	62,200	1 815,18	112 904,20	CS ÚRS 2022 01
	W		2*31,1		62,200			
	W		Součet		62,200			
32	K	946231121	Demontáž zavěšeného lešení podpěrného pod bednění mostní římsy	m	62,200	516,09	32 100,80	CS ÚRS 2022 01
	W		2*31,1		62,200			
	W		Součet		62,200			
33	M	94620240	poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních materiálů zatříděného kódem 17 06 04	t	1,958	2 875,00	5 629,25	CS ÚRS 2022 01
	W		0,15*4,4+2,2*0,59		1,958			
	W		Součet		1,958			
34	M	94621001	poplatek za uložení stavebního odpadu železobetonového zatříděného kódem 17 01 01 na recyklační skládku	t	251,794	300,00	75 538,20	CS ÚRS 2022 01
	W		2,5*(1,653+15,021+43,908)+2,6*38,592		251,794			
	W		Součet		251,794			
35	M	94621006	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 17 03 02 na recyklační skládku	t	6,505	632,50	4 114,41	CS ÚRS 2022 01
	W		32*3,08*0,03*2,2		6,505			
	W		Součet		6,505			
36	M	9462100R	Výzisk z materiálu uloženého do šrotu	t	-12,750	4 600,00	-58 650,00	
37	K	948411121	Zřízení podpěry dočasné kovové Pižmo výšky do 12 m	t	29,401	18 575,39	546 135,04	CS ÚRS 2022 01
	W		Roštový nosník R2 délky 4,0 m					
	W		12		12,000			
	W		465,0		465,000			
	W		5,580		5,580			
	W		Sloupek S3 výšky 1,0 m					
	W		8		8,000			
	W		84,8		84,800			
	W		0,678		0,678			
	W		Sloupek S5 výšky 0,4 m					
	W		8		8,000			
	W		52,5		52,500			
	W		0,420		0,420			
	W		Ztužidlo Z1 výšky 1,6 m					
	W		4		4,000			
	W		50,1		50,100			
	W		0,200		0,200			
	W		Ztužidlo Z3 výšky 0,8 m					
	W		4		4,000			
	W		35,3		35,300			
	W		0,141		0,141			
	W		Ztužidlo Z4 přímé					
	W		4		4,000			
	W		23,3		23,300			
	W		0,093		0,093			
	W		Ztužidlo Z5 příčné					
	W		2		2,000			
	W		18,5		18,500			
	W		0,037		0,037			
	W		Malé stykové deky, příložky, šrouby a matice (odhad)					
	W		0,200		0,200			
	W		Celkem 1 bárka					
	W		7,350		7,350			
	W		Celkem 4 bárky					
	W		29,401		29,401			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	948411221	Odstanění podpěry dočasné kovové Pížmo výšky do 12 m	t	29,401	11 143,67	327 635,04	CS ÚRS 2022 01
39	K	948411921	Měsíční nájemné podpěry dočasné kovové Pížmo výšky do 12 m	t	29,401	977,86	28 750,06	CS ÚRS 2022 01
40	K	949211112	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v přes 10 do 25 m	m2	93,300	40,65	3 792,65	CS ÚRS 2022 01
	W		2*1,5*31,1		93,300			
	W		Součet		93,300			
41	K	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	2 892,300	0,88	2 545,22	CS ÚRS 2022 01
	W		31*93,3		2 892,300			
	W		Součet		2 892,300			
42	K	949211812	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v přes 10 do 25 m	m2	93,300	29,14	2 718,76	CS ÚRS 2022 01
	W		93,3		93,300			
	W		Součet		93,300			
43	K	961051111	Bourání mostních základů z ŽB	m3	34,584	4 140,00	143 177,76	CS ÚRS 2022 01
	W		piloty pod OP1: 2*1,3*PI()*0,45*0,45					
	W		podesta OP1: 11,22; OP1: 12,608; podesta OP2: 14,382;					
	W		OP2: 17,267					
	W		odečet dutin: - 2*1,8- 4,313-1,654					
	W		75 % objemu opěr					
	W		1,653+0,75*43,908		34,584			
	W		Součet		34,584			
44	K	962051111	Bourání mostních zdí a pilířů z ŽB	m3	10,977	8 970,00	98 463,69	CS ÚRS 2022 01
	W		25 % objemu opěr					
	W		0,25*43,908		10,977			
	W		Součet		10,977			
45	K	963051111	Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB	m3	15,021	7 475,00	112 281,98	CS ÚRS 2022 01
	W		32*0,395+32*0,62*0,12		15,021			
	W		Součet		15,021			
46	K	966071823	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 2,0 do 4,0 m	m	62,200	87,08	5 416,38	CS ÚRS 2022 01
	W		2*31,1		62,200			
	W		Součet		62,200			
47	K	966075141	Odstanění kovového zábradlí vcelku	m	77,500	383,13	29 692,58	CS ÚRS 2022 01
	W		37,5+40		77,500			
	W		Součet		77,500			
48	K	966077111	Odstanění různých doplňkových ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kus	4,000	4 117,00	16 468,00	CS ÚRS 2022 01
	W		4		4,000			
	W		Součet		4,000			
49	K	977141125	Vrty pro kotvy do betonu průměru 25 mm hloubky 170 mm s vyplněním epoxidovým tmelem	kus	60,000	282,90	16 974,00	CS ÚRS 2022 01
	W		2*30		60,000			
	W		Součet		60,000			
50	K	977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kci s výztuží průměru přes 16 mm	m2	27,000	9 027,50	243 742,50	CS ÚRS 2022 01
	W		2,30		2,300			
	W		příčné řezání říms po 2m					
	W		7,68		7,680			
	W		podélné odřezání říms					
	W		5,76		5,760			
	W		podélné odřezání mostovka					
	W		1,05		1,050			
	W		příčné odřezání mostovky					
	W		7,68		7,680			
	W		podélné odřezání dobetonávek mezi nosníky					
	W		4,82		4,820			
	W		nosníky I-62 včetně dobetonávek mezi nimi					
	W		27,00		27,000			
	W		celková řezaná plocha podle postupu demolice PD					
51	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	38,592	4 658,25	179 771,18	CS ÚRS 2022 01
	W		32*1,206		38,592			
	W		Součet		38,592			
52	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	188,035	193,51	36 386,65	CS ÚRS 2022 01
	W		betony, 2,5*(1,653+43,908+15,021) + štěrkodrtě 2,1*15,3 + litý					
	W		asfalt 2,2*2,96 + asfaltové pásy 2,2*0,59					
	W		2,5*(1,653+43,908+15,021)+2,1*13,7+2,2*2,96+2,2*0,59		188,035			
	W		Součet		188,035			
53	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	1 880,350	9,53	17 919,74	CS ÚRS 2022 01
	W		10*188,035		1 880,350			
	W		Součet		1 880,350			
54	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	113,749	361,53	41 123,68	CS ÚRS 2022 01
	W		nosníky 2,6*38,592; zábradlí ocelové potrubí a opelochování					
	W		12,75; skelná vata izolace odvoz vybouraných nosníků,					
	W		ocelových prvků a skelné vaty0,66					
	W		2,6*38,592+12,75+0,66		113,749			
	W		Součet		113,749			
55	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 137,490	21,13	24 035,16	CS ÚRS 2022 01
	W		10*113,749		1 137,490			
	W		Součet		1 137,490			
56	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	188,035	41,46	7 795,93	CS ÚRS 2022 01
	W		188,035		188,035			
	W		Součet		188,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	113,749	48,15	5 477,01	CS ÚRS 2022 01
	W		113,749		113,749			
	W		Součet		113,749			
58	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	181,486	23,00	4 174,18	CS ÚRS 2022 01
D PSV Práce a dodávky PSV							14 958,50	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 080,60	
59	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	98,560	21,11	2 080,60	CS ÚRS 2022 01
	W		32*3,08		98,560			
	W		Součet		98,560			
D 713 Izolace tepelné							12 877,90	
60	K	713490821	Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu přes 500 mm	m	70,000	183,97	12 877,90	CS ÚRS 2022 01
	W		2*35		70,000			
	W		Součet		70,000			
D M Práce a dodávky M							60 375,15	
D 23-M Montáže potrubí							60 375,15	
61	K	230082087	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 159 mm tl 4,5 mm	kus	21,000	575,00	12 075,00	CS ÚRS 2022 01
	W		výpočet: 2*35*0,0429/0,05=20,545, zaokrouhlo					
	W		21		21,000			
	W		Součet		21,000			
62	K	230082100	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 219 mm tl 6,3 mm	kus	60,000	335,42	20 125,20	CS ÚRS 2022 01
	W		výpočet 2*35*0,0429/0,05 =60,6, zaokrouhlo					
	W		60		60,000			
	W		Součet		60,000			
63	K	230082122	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 324 mm tl 8,0 mm	kus	87,000	323,85	28 174,95	CS ÚRS 2022 01
	W		výpočet: 2*35*0,062/0,05 = 86,8, zaokrouhlo					
	W		87		87,000			
	W		Součet		87,000			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							886 485,48	
66	K	Jeřáb 70 t	Jeřáb nosnost 70 t - dle potřeb prací, konstrukcí a služeb dle PD vč. příjezdových cest a potřebných kčí.	soubor	1,000	274 040,32	274 040,32	
67	K	Jeřáb 200 t	Jeřáb nosnost 200 t - dle potřeb prací, konstrukcí a služeb dle PD vč. příjezdových cest a potřebných kčí.	soubor	1,000	612 445,16	612 445,16	

Lávka Tábořského nábreží přes Svatku most ev.č. BM-560 odstranění stavby II

Časový harmonogram

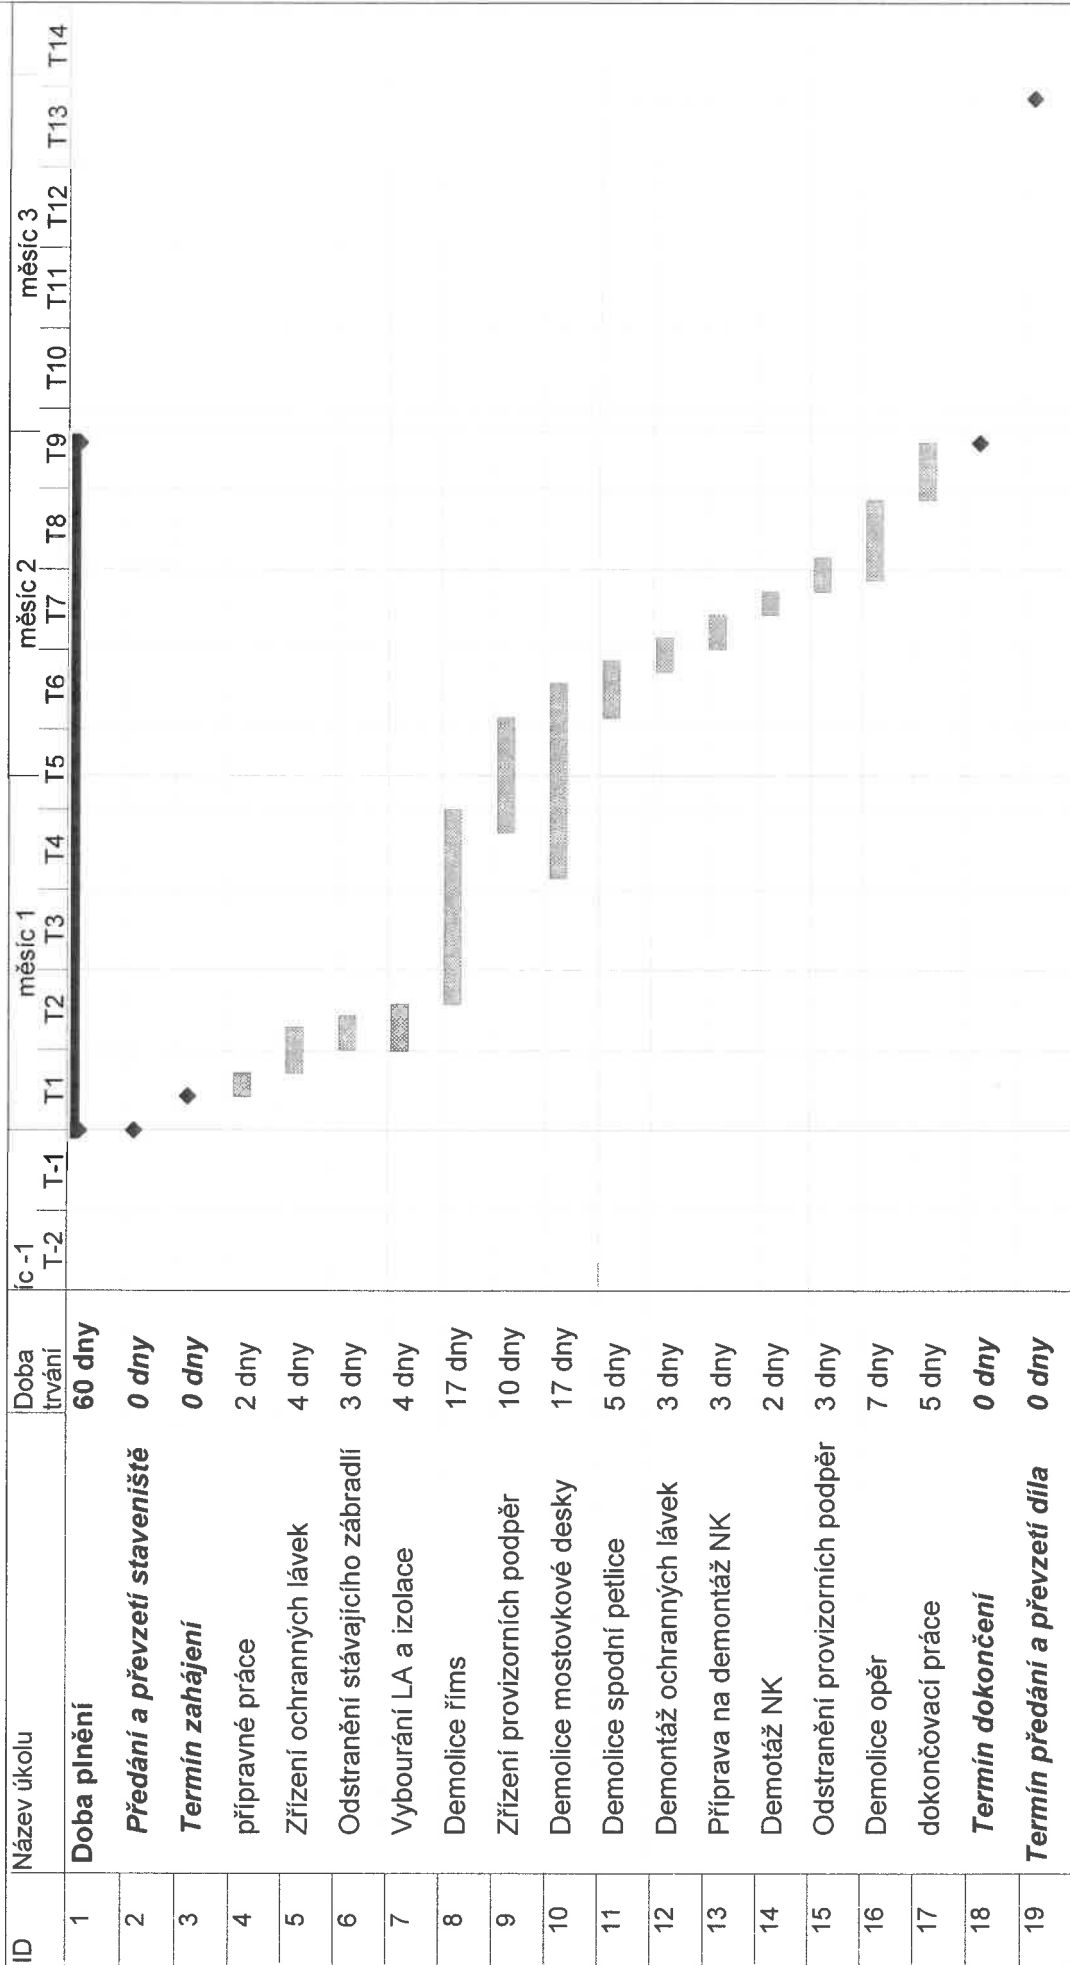

Úkol

Přerušení

Milník

Souhrnný

Datum: 21.03. 22



Finanční harmonogram

Lávka Táborského nábřeží přes Svratku most ev.č. BM-560
odstranění

měsíc	bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
měsíc 1	2 386 039	501 068	2 887 108
měsíc 2	2 410 537	506 213	2 916 749
měsíc 3	102 889	21 607	124 495
celkem	4 899 465	1 028 888	5 928 353

Cena celkem bez DPH

4 899 465 Kč


DPH 21%

1 028 888 Kč

Cena celkem vč. DPH

5 928 353 Kč

V Brně, dne 21. 03. 2022





Pověření

Brněnské komunikace a.s., IČ 607 33 098, se sídlem Brno - Štýřice, Rennská třída 787/1a, PSČ 639 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479, dále též jen „společnost“, zastoupená Ing. Luděkem Borovým, [redacted] generálním ředitelem na základě plné moci ze dne 3. 12. 2018

pověřuje

Ing. Aleše Kellera

technického ředitele společnosti, [redacted]

ve smyslu čl. 3.2.3.3. Organizačního řádu společnosti (OŘ-ŘD 001), aby zastupoval generálního ředitele v době jeho nepřítomnosti při jednání za společnost a aby zmocňoval v nutných případech k jednání za společnost zaměstnance společnosti podle platného Organizačního řádu společnosti a pracovního zařazení těchto zaměstnanců.

Pověřený je oprávněn jednat za společnost ve všech věcech ve smyslu ust. § 166 odst. 1 a § 430 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a samostatně ji zavazovat při jednotlivých právních jednáních a úkonech v rozsahu plné moci udělené generálnímu řediteli společnosti.

V Brně dne 3. 6. 2019

[redacted]
Ing. Luděk Borový
generální ředitel
Brněnské komunikace a.s.

[redacted]
Pověření přijímám.
Ing. Aleš Keller

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy pošty: Brno 8

Poř.č.: 60800-0217-0123

Vlastnoručně podepsal: Luděk Borový
Datum a místo narození: [REDACTED]

Brno 8, dne 05.06.2019
[REDACTED]

Podpis, úřední razítko

