



### DODATEK Č. 3

#### KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ LICENCE A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

uzavřené v souladu s ust. § 2586 a násl. a ust. § 2631 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

(dále jen „Dodatek č. 3“)

**Objednatel** (dále v textu jen „Objednatel“ nebo „Zadavatel“)

Název: **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Sídlo: **Kyjevská 44, 532 03 Pardubice**

Jednající: MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva,  
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA, člen představenstva

IČO: 27520536

DIČ: CZ27520536

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 2629

Bankovní spojení ČSOB, a.s., pobočka Pardubice, č. ú. 280123725/0300

Kontaktní osoba: xxxxx

Tel., mail: xxxxx, xxxxx

**Zhotovitel** (dále v textu jen „Zhotovitel“)

Název: **STAPRO s.r.o.**

Sídlo: **Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice**

Jednající: Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

IČO: 13583531

DIČ: CZ699004728

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148

Bankovní spojení: ČSOB Pojišťovna, č. ú. 271810793/0300

Kontaktní osoba: xxxxx

(Společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Dodatek č. 3 ke smlouvě, která vzešla ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na služby a dodávky č. VVZ Z2019-007575 s názvem „Jednotný klinický informační systém KIS NPK“ (dále v textu jen „Původní smlouva“).



## I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatkem č. 3 sjednaná změna závazku z Původní smlouvy **není** jeho tzv. **podstatnou změnou**, a je tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZZV.
2. Dodatkem č. 3 sjednaná změna spočívá v posunu nejzazšího termínu pro nasazení Díla do ostrého provozu. Smluvní strany byly nuceny přistoupit k posunutí termínu z důvodu opětovné eskalace epidemie onemocnění COVID-19 v průběhu nasazování Díla. Obzvláště Objednatele, provozovatele 5 nemocničních zařízení, epidemie postihla takovým způsobem, že nemohl řádně zajistit dostatečnou součinnost Zhotoviteli k provedení všech nezbytných činností k provedení Díla.
3. Eskalací epidemie došlo ke zvýšení počtu pacientů, pročež byl Objednatel nucen reprofilovat lůžkové stanice na stanice covidové. Reprofilace si vyžádala relokaci personálu Objednatele ke covidovým stanicím, personál byl nadměrně vytížen a nemohl poskytovat Zhotoviteli dostatečnou součinnost pro nasazení Díla. Grafické znázornění zvýšeného nárůstu pacientů a obsazenosti lůžek je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku č. 3. Schopnost Objednatele poskytovat součinnost Zhotoviteli byla dále omezena kvůli zvýšenému počtu karantén a izolací jeho personálu, a to jak nemocničního, tak technického. K zabránění další eskalace epidemie byly Smluvní strany současně donuceny k provedení části implementačních prací, například školení, distančním způsobem, některé implementační práce však nemohly být tímto způsobem nahrazeny. Prezenční školení personálu Objednatele přímo na pracovištích mohlo tudíž probíhat pouze za přísných hygienických podmínek, počet školených zaměstnanců byl významně omezen, a i délka těchto školení musela být zkrácena kvůli povinnému krytí úst respirátory. Všechny výše uvedené objektivní okolnosti tudíž zapříčinily nemožnost Smluvních stran nasadit Dílo do ostrého provozu.
4. Za v předchozích odstavcích popsané situace se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že, aniž by došlo k porušení imperativu ZZZV týkající se tzv. podstatné změny smlouvy, dochází k posunu termínu pro nasazení Díla do ostrého provozu.

## II. Obsah Dodatkem č. 3 měněných práv a povinností smluvních stran

1. Dodatkem č. 3 se smlouva mění a doplňuje následovně:

- a) **Čl. XX. smlouvy „Doba a místo plnění, způsob předání Díla“, odstavec 1**, se doplňuje následovně:

Etapa 3 – Realizace implementace, nasazení do ostrého provozu, převzetí Díla, počátek poskytování Servisních služeb	T + 22 měsíců
---	---------------

- b) **Čl. XX. smlouvy „Doba a místo plnění, způsob předání Díla“, odstavec 14**, se mění následovně:

„Nejzazší termín nasazení systému, resp. Díla do ostrého provozu dle tohoto článku odst. 1 Etapy 3 je **31. 8. 2022.**“



### III. Další ujednání

1. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je příloha č. 1 - Grafické znázornění epidemické situace.
2. Ustanovení Původní smlouvy ve znění dodatků neřešené Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán elektronickými podpisy.
4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem svého podpisu a účinnosti dnem vložení do registru smluv, které zajistí Objednatel.
5. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany připojují na důkaz své pravé a vážně míněné vůle své podpisy.

Příloha:

Příloha č. 1 - Grafické znázornění epidemické situace

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Pardubicích, dne 26. 4. 2022

V Pardubicích, dne 14. 4. 2022

.....

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

.....

Ing. Leoš Raibr  
jednatel společnosti

.....


MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., MBA  
člen představenstva



## Příloha č. 1 Grafické znázornění epidemické situace

Zdroj MZCR: <https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vyvoj-kapacit-luzkove-pece>

### Pardubický kraj: Denní přehled celkového počtu osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID-19 (aktivní případy)

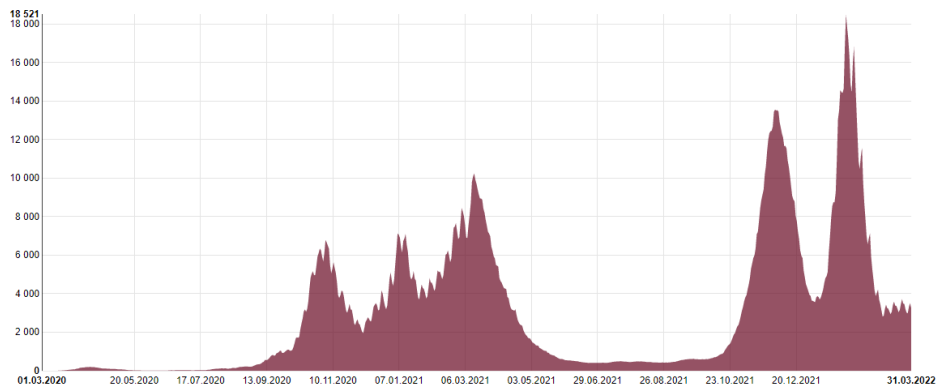


S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Zdravotnické zařízení


Kraj: Pardubický kraj (1)

1. 10. 2021 - 6. 4. 2022

#### Lůžka (standardní s kyslíkem)

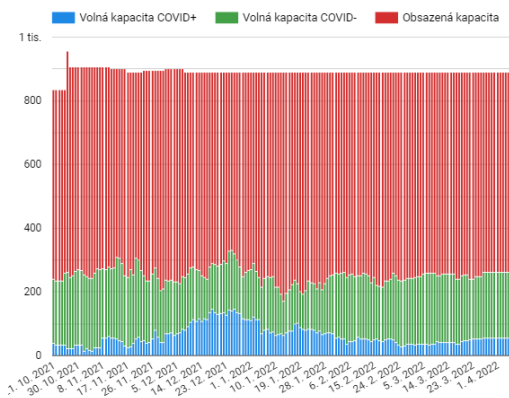

#### Lůžka (s možností HFNO)

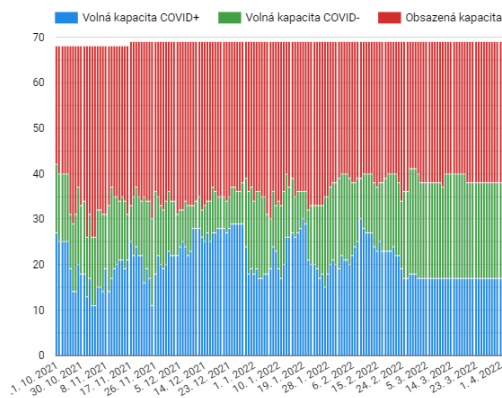

#### Lůžka (s možností UPV)

