



## Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. S21/077H

Smluvní strany:

(1) **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,

IČO: 68378271,

zastoupen: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

(dále jen „**Kupující**“); a

(2) **STREICHER, spol. s r.o. Plzeň,**

se sídlem: Plzeňská 565, Štěnovice, PSČ: 332 09,

IČO: 14706768,

zastoupen: Dr. Jiří Lopata, jednatel

(dále jen „**Prodávající**“).

(Kupující a Prodávající dále společně jen jako „**Strany**“ a každý samostatně též jako „**Strana**“.)

### 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Strany uzavřely dne 18. 5. 2021 Kupní smlouvu č. S21/077H (dále jen „**Smlouva**“). Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu Smlouvy o dodatečné práce a s tím související změna Kupní ceny uvedená v čl. 5.1 Smlouvy.

Předmětem tohoto dodatku je dále změna termínu dokončení 3. fáze předmětu Smlouvy (definovaná v čl. 2.1 písm. c) Smlouvy).

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „**Dodatek**“) je provedení činností a dodávek (dále jen „**Dodatečné práce**“) nad rozsah stanovený Smlouvou, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky s názvem „LBDS – Varianta 2021“.

1.3 V souladu s čl. 2.5 a čl. 13.4. Smlouvy se Strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy.

### 2. DODATEČNÉ PRÁCE

2.1 Dodatečné práce vznikly v důsledku okolností, které Kupující jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a jejich celková cena nepřesahuje 10 % ceny původního předmětu plnění.

2.2 Jedná se o níže uvedené Dodatečné práce, jejichž technické výkresy tvoří Přílohu č. 3 a Přílohu č. 4 tohoto Dodatku:



1) Dodělení řízení pro teleskop SHG 2 – Varianta A

**86.890,- Kč bez DPH**

2) Rozšíření řídicího systému Beckhoff

**388.900,- Kč bez DPH**

Dodatečné náklady sestávají ze dvou částí: A) rozšíření řízení (xxxxx Kč bez DPH);  
B) vícenáklady na výrobu (xxxxx Kč bez DPH).

Tyto vícenáklady obsahují: vzdálené připojení, komunikace TwinCAT ADS s Hilase a přípravu paralelní vizualizace IPC 16,6“.

3) Vícenáklady vzniklé u APM z důvodů dodatečných požadavků na provedení konstrukce

**46.910,- Kč bez DPH**

Optické stolky – Cena za jeden stolek xxxxx Kč bez DPH, celkem xxxxx Kč bez DPH.

Držáky justáže vlnovců – nové díly – obsahují celkem 16ks ocelových desek se spojovacím materiálem, konstrukční práce na řešení justážních sestav. Cena za 1 kus xxxxx Kč bez DPH, celkem xxxxx Kč bez DPH. (dle Přílohy č. 3 - *Výkresy: A21005-06\_M-01-31-01\_RO\_KONSTRUKCE LBDS\_PLECH CENTROVÁNÍ; A21005-06\_M-01-34-00\_RO\_KONSTRUKCE LBDS\_CENTROVÁNÍ II; A21005-06\_M-01-34-01\_RO\_KONSTRUKCE LBDS\_PLECH CENTROVÁNÍ II*)

Plastové držáky potrubí (poslední změna uchycení trubky) – 2 kusy tvarových – obráběných držáků z technického plastu, konstrukční práce. Cena za jeden kus xxxxx Kč bez DPH, celkem xxxxx Kč bez DPH. (dle Přílohy č. 3 - *Výkresy: A21005-06\_M-01-16-00\_RO\_KONSTRUKCE LBDS\_PODPĚRA S TŘMENEM 45; A21005-06\_M-01-16-01\_RO\_KONSTRUKCE LBDS\_DRŽÁK POM-C; A21005-06\_M-01-16-02\_RO\_KONSTRUKCE LBDS\_TŘMEN PR45-DLOUHÝ; A21005-06\_M-01-16-03\_RO\_KONSTRUKCE LBDS\_PODLOŽKA*)

4) Vícenáklady vzniklé během montáže:

**25.020,- Kč bez DPH**

Úprava poškozeného vrtání v Breadboardu 1ks vyvrtání + přešetření + mytí a balení (viz Příloha č. 1) – 1x xxxxx Kč bez DPH

Leštění těsnících ploch u 3ks kulatých komůrek + mytí a balení (viz Příloha č. 2) – 3x xxxxx Kč bez DPH

Leštění těsnících ploch u 1ks kompenzátoru DN 200 + mytí a balení - 1x xxxxx Kč bez DPH

Výroba provizorních nerezových záslepek, jako náhrady za skla průhledítek (materiál, soustružení, mytí a balení).

4xØ170x20                      xxxxx Kč/ks    celkem xxxxx Kč bez DPH



(dle Přílohy č. 4 - Výkresy: 93432-102 BOM; 93432-102; 93432-L2U2; 93432-L2U3; 93432-L2U10; 93432-T4LC)

6xØ76,2x12,7            xxxxx Kč/Ks    celkem xxxxx Kč bez DPH

(dle Přílohy č. 4 - Výkresy: 93432-104 BOM; 93432-104; 93432-L2U4; 93432-L2U8; 93432-T3LC)

1xØ100x10            xxxxx Kč/Ks    celkem xxxxx Kč bez

DPH (dle Přílohy č. 4 - Výkres: 92138\_VSF\_00\_000)

1xØ200x20            xxxxx Kč/Ks    celkem xxxxx Kč bez DPH

(dle Přílohy č. 4 - Výkres: 92138\_VSF\_00\_000)

### 3. ZMĚNA KUPNÍ CENY

- 3.1 V důsledku Dodatečných prací dochází k navýšení Kupní ceny, a to o částku ve výši **547.720,- Kč** bez DPH (slovy: pět set čtyřicet sedm tisíc sedm set dvacet korun českých).

### 4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

- 4.1 Kupující v souladu s čl. 2.5 Smlouvy písemně oznámil Prodávajícímu omezení provozních podmínek z důvodu probíhajícího experimentu v laboratořích Kupujícího a nutnosti přerušování instalace a demonstrace předmětu Smlouvy.
- 4.2 V souladu s čl. 2.5 Smlouvy se z důvodu probíhajícího experimentu v termínech od 25. 4. 2022 do 6. 5. 2022 a od 16. 5. 2022 do 20. 5. 2022 v laboratořích Kupujícího uvedených v čl. 3.2 Smlouvy, prodlužuje dílčí termín plnění o 3 týdny. Prodávající je tedy povinen 3. fázi plnění dle čl. 2.1 písm. c) Smlouvy nainstalovat a předat nejpozději do **30. 5. 2022**.

### 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

- 5.2 Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 - Obrázek

Příloha č. 2 - Obrázek

Příloha č. 3 - Vícenáklady vzniklé u APM z důvodů dodatečných požadavků na provedení konstrukce

Příloha č. 4 - Vícenáklady vzniklé během montáže

- 5.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



5.4 Tento dodatek je vyhotoven v jednom vyhotovení a je podepsán elektronickými podpisy obou smluvních stran.

**NA DŮKAZ ČEHOŽ** připojují Strany vlastnoruční podpisy:

**Kupující**

Podpis, datum: \_\_\_\_\_

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Funkce: ředitel

**Prodávající**

Podpis, datum: \_\_\_\_\_

Jméno: Dr. Jiří Lopata

Funkce: Jednatel



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MŠMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## **PŘÍLOHA 1**










EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MŠMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

## **PŘÍLOHA 2**



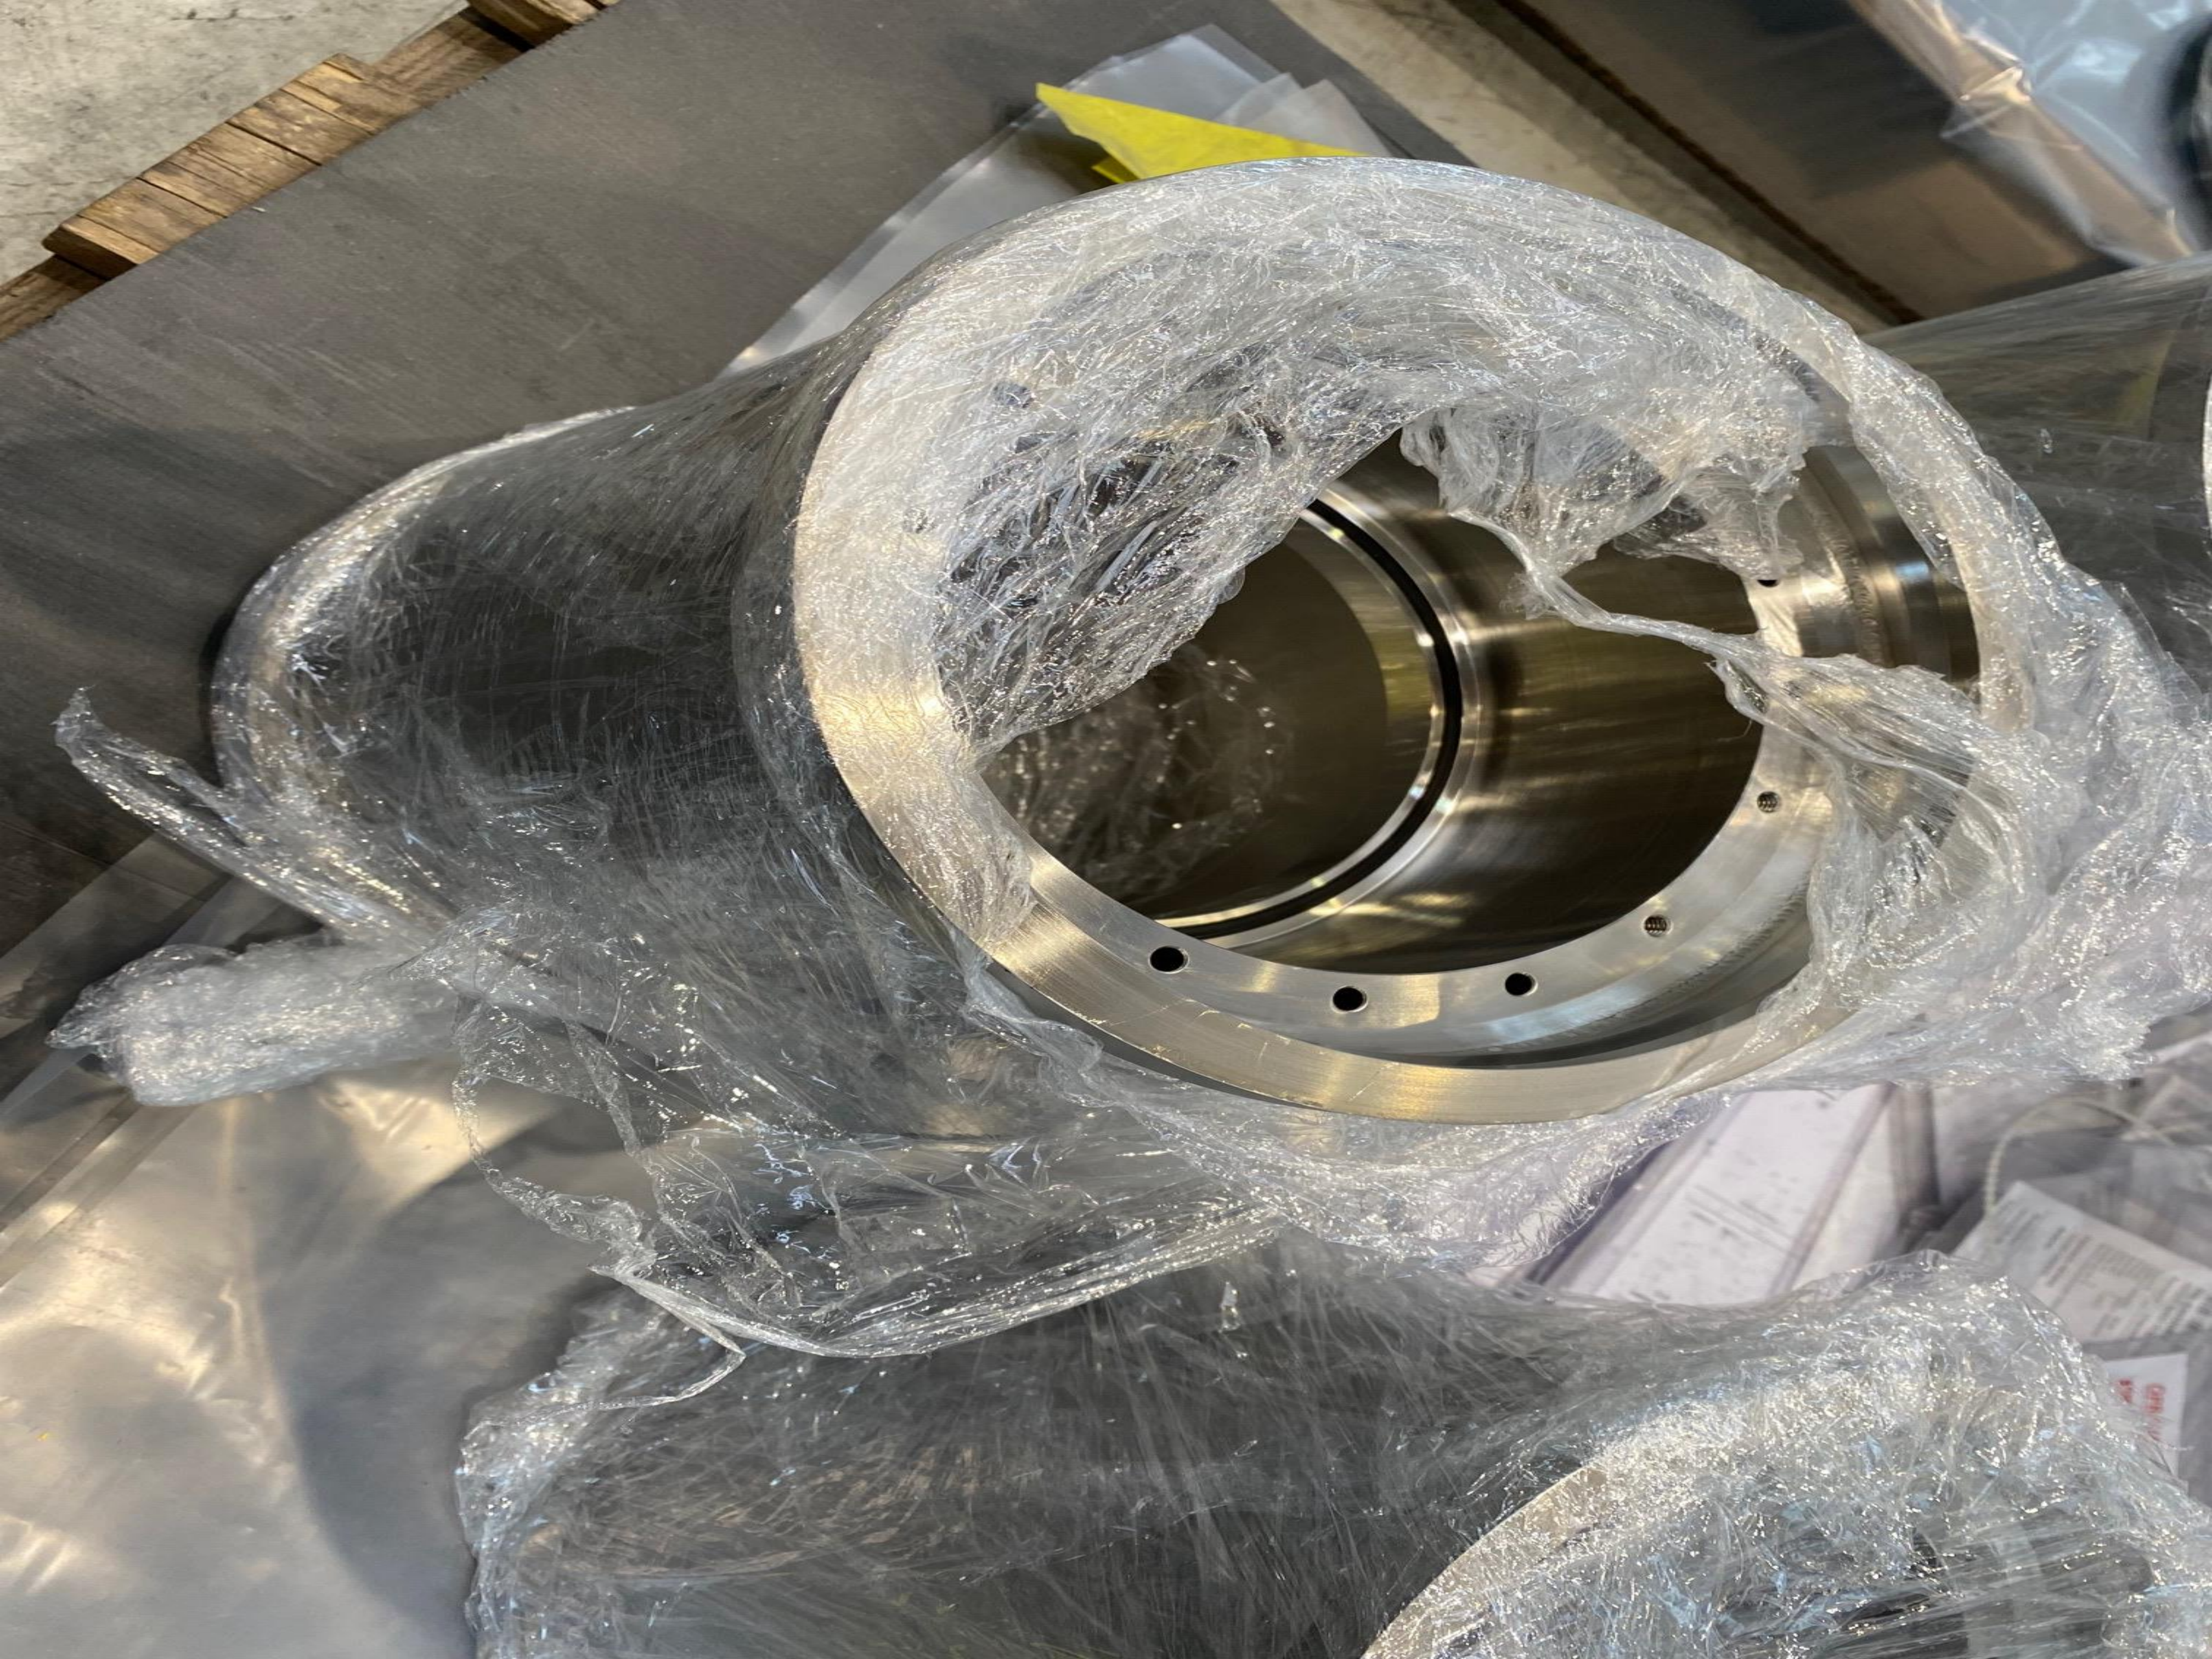





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



### **PŘÍLOHA 3**

#### **VÍCENÁKLADY VZNIKLÉ U APM Z DŮVODŮ DODATEČNÝCH POŽADAVKŮ NA PROVEDENÍ KONSTRUKCE**

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na: technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet. (§ 3, odst. 2, písm. b))





EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



## **PŘÍLOHA 4**

### **VÍCENÁKLADY VZNIKLÉ BĚHEM MONTÁŽE**

Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, se povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv nevztahuje na: technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet. (§ 3, odst. 2, písm. b))
