

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2021**

I. **Smluvní strany**

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

zastoupena: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

IČ: 27520536 DIČ: CZ27520536

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Pardubice, č.ú.: 280123725/0300

zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 2629

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

ANETE spol. s r. o.

se sídlem: Okružní 834/29a, Lesná, 638 00 Brno

zastoupena: Ing. Milošem Raušem, jednatelem

IČ: 46970126 DIČ: CZ46970126

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú.: 123-1354120207/0100

zápis v OR: Městský soud v Brně, oddíl C, vložka 7172

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

II. **Předmět dodatku**

Smluvní strany uzavírají tímto, a to po vzájemné dohodě, v souladu s čl. 7. smlouvy výše citované a z důvodů předpokládaných v čl. 7., odst. 12. smlouvy výše citované, tento dodatek č. 1, jehož předmětem je změna platně uzavřené a v současné době účinné smlouvy o dílo.

III. **Smluvní ujednání**

Účastníci se dohodli, že čl. 5., odst. 2. smlouvy výše citované se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně nejpozději do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Podrobný harmonogram realizace díla bude zpracován v Implementačním plánu projektu. Implementační plán projektu bude předložen Objednateli do 1 měsíce od zahájení plnění díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.“

IV. **Závěrečná ustanovení**

4.1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1. před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

4.3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních majících povahu originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

4.5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha č. 1 – Odůvodnění prodlení a příloha č. 2 – Grafické znázornění epidemické situace

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne 8. 4. 2022

V Brně dne 8. 4. 2022

.....
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA
předseda představenstva

.....
Ing. Miloš Rauš
jednatel

.....
Ing. Hynek Rais, MHA
místopředseda představenstva


Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Odůvodněné prodlení

1. Smluvní strany prohlašují, že Dodatkem č. 1 sjednaná změna závazku z Původní smlouvy **není** jeho tzv. **podstatnou změnou**, a je tudíž v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ.
2. Dodatkem č. 1 sjednaná změna spočívá v posunu nejzazšího termínu pro nasazení Díla do ostrého provozu. Smluvní strany byly nuceny přistoupit k posunutí termínu z důvodu opětovné eskalace epidemie onemocnění COVID-19 v průběhu nasazování Díla. Obzvláště Objednatele, provozovatele 5 nemocničních zařízení, epidemie postihla takovým způsobem, že nemohl řádně zajistit dostatečnou součinnost Zhotoviteli k provedení všech nezbytných činností k provedení Díla.
3. Eskalací epidemie došlo ke zvýšení počtu pacientů, pročež byl Objednatel nucen reprofilovat lůžkové stanice na stanice covidové. Reprofilace si vyžádala relokaci personálu Objednatele ke covidovým stanicím, personál byl nadměrně vytížen a nemohl poskytovat Zhotoviteli dostatečnou součinnost pro nasazení Díla a to v termínech 11.11.2021- 12.12.2021 a 10.2.2022-11.3.2022. Grafické znázornění zvýšeného nárůstu pacientů a obsazenosti lůžek je uvedeno v Příloze č. 2. Schopnost Objednatele poskytovat součinnost Zhotoviteli byla dále omezena kvůli zvýšenému počtu karantén a izolací jeho personálu, a to jak nemocničního, tak technického. K zabránění další eskalace epidemie byly Smluvní strany současně donuceny k provedení části implementačních prací distančním způsobem. Některé implementační práce však nemohly být tímto způsobem nahrazeny. Všechny výše uvedené objektivní okolnosti tudíž zapříčinily nemožnost Smluvních stran nasadit Dílo do ostrého provozu.

Příloha č. 2 Dodatku č.1 - Grafické znázornění epidemické situace

Zdroj MZCR: <https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vyvoj-kapacit-luzkove-pece>


Pardubický kraj: Denní přehled celkového počtu osob s aktuálně probíhajícím onemocněním COVID-19 (aktivní případy)

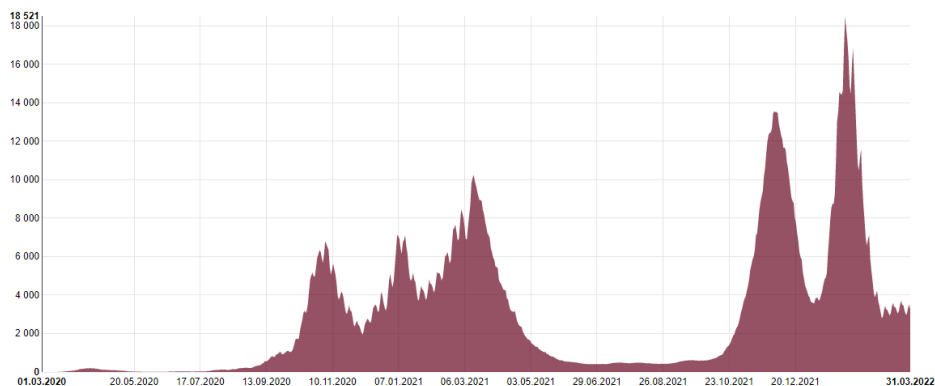


S ohledem na fakt, že vykazování vyléčených osob a úmrtí má určité zpoždění oproti reálnému stavu z důvodu validace a uzavírání případů krajských hygienických stanic, se mohou denní záznamy zpětně výrazně měnit právě z důvodu průběžného doplňování. Nedoporučujeme proto uvádět aktuální počty aktivních případů na základě počtů vyléčených osob a úmrtí za poslední dny. V souladu s rozhodnutím sekce hlavní hygieničky Ministerstva zdravotnictví ČR je tento graf publikován se zpožděním 1 týden z důvodů doplnění a validace dat.

Zdravotnické zařízení - Kraj: Pardubický kraj (1) - 1. 10. 2021 - 6. 4. 2022

Lůžka (standardní s kyslíkem)

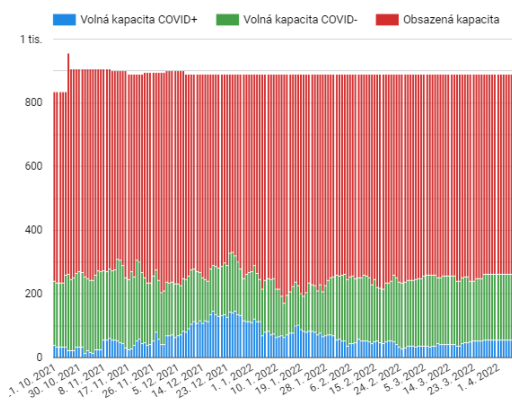

Lůžka (s možností HFNO)

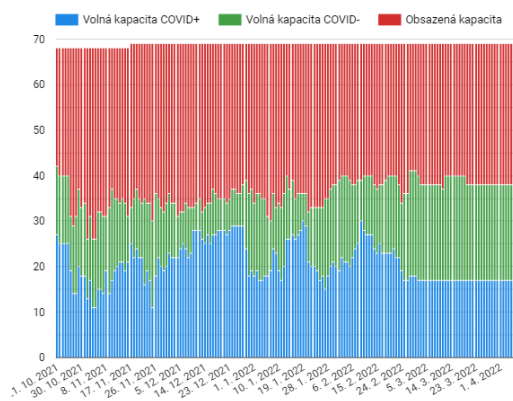

Lůžka (s možností UPV)

