

Smlouva o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-740/2022**

ISPROFOND: **551 352 0014**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Mgr. Viliamem Perknovským**, jednatelem a
Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3,
Strašnice

číslo smlouvy Zhotovitele: **S23-059-0027**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Objednatel si přeje, aby Dílo „**Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily**“ bylo provedeno
Zhotovitelem, přijal Zhotovitelovu Nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a odstranění
všech jeho vad, a proto se



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo (ve znění případných dodatků) a jako její součást musí být čteny a vykládány, a to dle pořadí závaznosti uvedeného ve Smluvních podmínkách.
 - 1.1 Dopis o přijetí nabídky datovaný **12.10.2022**
 - 1.2 Dopis nabídky datovaný **08.08.2022**
 - 1.3 Smluvní podmínky [Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem (FIDIC 1999) - Obecné podmínky; Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace č.j.: MD/20033/2021/520]
 - 1.4 Technická specifikace (VTP/R-F-14/22, ZTP ze dne 20. 05. 2022 a další dle Podčlánku 1.1.1.5 Smluvních podmínek)
 - 1.5 Výkresy
 - 1.6 Formuláře:
 - 1.6.1 Soupis prací,
 - 1.7 Ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy (<https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>)
 - 1.7.1 Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení – schváleno Ministerstvem dopravy dne 10.11.2020
 - 1.7.2 Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle Smluvních podmínek FIDIC (1.vydání leden 2018) schváleno Ministerstvem dopravy dne 20.2.2018
 - 1.7.3 Metodika pro správu změn díla (variací) u stavebních zakázek financovaných z rozpočtu SFDI podle smluvních podmínek FIDIC (Červené knihy) ve vztahu k úpravě zadávání veřejných zakázek – 1. vydání, leden 2018
2. Specifikace související dokumentace je uvedena v Technické specifikaci, a to zejména ve Zvláštních technických podmínkách.
3. Za platby, které má Objednatel uhradit Zhotoviteli tak, jak je níže uvedeno, se Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo, včetně vypracování veškeré příslušné dokumentace související s Dílem a odstraní na něm všechny vady v souladu s ustanovením Smlouvy.
4. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení a dokončení Díla a odstranění jeho vad Smluvní cenu v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
5. Objednatel používá informační systém pro řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XDC, <https://xdc.szdc.cz/>):
 - 5.1 Faktura,
 - 5.2 soupis zjišťovacích protokolů,
 - 5.3 zjišťovací protokoly.
6. Rekapitulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo.
7. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

Objednatel vymezil ve Smluvních podmínkách požadavky sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací tak, aby jejich aplikací nebyly porušeny zásady zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

V rámci plnění Díla jde o dále uvedené požadavky:

- rovnocenné platební podmínky v rámci dodavatelského řetězce,
- jednání vedená primárně distančním způsobem,
- studentské exkurze,
- recyklace kameniva vyzískávaného z kolejového lože,

8. V případě Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby, které je posledním Potvrzením průběžné platby nebo Potvrzením závěrečné platby před převzetí Díla, Sekce nebo jiné části Díla Objednatelům ve smyslu Pod-článku 10.1 [*Převzetí díla a sekce*] a Pod-článku 10.2 [*Převzetí části díla*] Smluvních podmínek je Správce stavby povinen vydat Potvrzení průběžné platby nebo Potvrzení závěrečné platby nejpozději v den převzetí Díla, Sekce nebo části Díla Objednatelům.
9. Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajícího se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle § 92 odst. 1 zákona o DPH.
10. Strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit DPH z peněžního plnění přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
11. V případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou její ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky, vyjádřený Zadávací dokumentací.
12. NEOBSAZENO
13. Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění dokumentů dle odst. 1 této Smlouvy o dílo a příloh dle odst. 23 této Smlouvy o dílo týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.
14. Pokud by se kterékoliv ustanovení Smlouvy ukázalo být zdánlivým, neplatným nebo jinak nevymahatelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy o dílo, pak tato skutečnost nepůsobí zdánlivostí, neplatností ani nevymahatelností ostatních ustanovení Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení Právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Strany takové zdánlivé, neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradit platným a vymahatelným ustanovením, které bude svým obsahem nejbližší účelu zdánlivého, neplatného či nevymahatelného ustanovení.
15. Objednatel si vyhrazuje:
 - 15.1 požadavek, že níže uvedené významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky:
SO 01-10-01 ŽST Semily, železniční svršek
 - 15.2 požadavek, že významné činnosti při plnění veřejné zakázky dle předchozího bodu 15.1 musí být plněny takovým subjektem na straně Zhotovitele, který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, konkrétně poskytnutí a dokončení odpovídajících nejvýznamnějších stavebních prací, a to jeho vlastními prostředky; pokud by plnění měl poskytovat jiný subjekt na straně Zhotovitele, než který před uzavřením Smlouvy prokázal odpovídající požadavky na technickou kvalifikaci, pak pouze pokud prokáže, že rovněž splňuje předmětnou kvalifikaci v potřebném rozsahu a Objednatel tuto skutečnost potvrdí písemným souhlasem; Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nabídkové ceny uvedené v Dopise Nabídky za každý případ porušení vyhrazeného požadavku.

- 15.3 v souladu s § 100 odst.1 ZZVZ provedení činností v souvislosti s publicitou Stavby spolufinancované Evropskou unií podle platných pravidel pro „Nástroje pro oživení a odolnost“ (Recovery and Resilience Facility) Specifikace činností a podmínky pro jejich provedení jsou uvedeny v Technické specifikaci – Zvláštní technické podmínky. V případě, že tato veřejná zakázka nebude spolufinancovaná z prostředků Evropské unie, zajištění publicity Stavby nebude Zhotovitelem provedeno. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění.
- 15.4 změnu zhotovitele v souladu s § 100, odst. 2 ZZVZ v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinností Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Pokynů pro dodavatele. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 15.5 právo valorizovat částky způsobilé k platbě Zhotoviteli, a to v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek. Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že valorizace může nabývat hodnot kladných i záporných,
- 15.6 změna závazku v souladu s § 100 odst.1 ZZVZ ve věci měření množství každé původní měřitelné položky s jednotkovou cenou ve výkazu výměr dle čl.12 Smluvních podmínek.
16. Součástí dodávky na zhotovení Díla nejsou prvky mobiliáře, které jsou součástí SO 01-79-01 Drobná architektura, mobiliář dle technické specifikace v Soupisu prací jednotlivých položek.
17. Závazky ze Smlouvy je možné měnit pouze písemnou dohodou Stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo, podepsanou za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
18. Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením Závěrečného vyúčtování (po vyřešení případných sporů):
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).
- Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.
- Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č.11 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).
19. Podpisem této Smlouvy o dílo Zhotovitel současně jako zpracovatel uzavírá s Objednatелеm jako správcem smlouvu o zpracování osobních údajů ve znění uvedeném v příloze č. 5 této Smlouvy o dílo.

20. Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností).

21. Mezinárodní sankce

21.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (dále jen „**Sankční seznamy**“),

21.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 21 také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

21.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 21, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

21.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s Nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014.

21.5 Zhotovitel se dále ve smyslu článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nepřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.

21.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 21.1 této Smlouvy jako nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 21.3 nebo některou z povinností dle odstavců 21.4 nebo 21.5 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé

jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty, s výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 21.3 této Smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300.000 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 21.3, smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

22. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- | | |
|---------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Příloha k nabídce (<i>pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek</i>) |
| Příloha č. 7 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele - NEOBSAZENO |
| Příloha č. 8 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 9 | Žádost o poskytnutí zálohové platby |
| Příloha č. 10 | NEOBSAZENO |
| Příloha č. 11 | Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky |

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dílo oběma Stranami a účinnou se stává dnem uveřejnění v registru smluv.

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích



04.11.2022 07:38
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.10.26
10:04:58 +02'00'

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Datum: 2022.10.26
09:08:13 +02'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel společnosti
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Aspe

3.1.3

Rekapitulace úrovní členění stavby**Stavba :** Zm10_5513520014 - Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily SW**Varianta :** ZŘ -

Odbytová cena [Kč]: 173 227 989,95

Objekty	Popis	OC
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení	
	PS 01-01-11 Staniční zabezpečovací zařízení	
	PS 01-01-51 ŽST Stará Paka, úprava DOZZ	
D.2	Železniční sdělovací zařízení	
	PS 01-02-11 ŽST Semily, Místní kabelizace	
	PS 01-02-21 ŽST Semily, Rozhlasové zařízení	
	PS 01-02-71 ŽST Semily, informační systém	
	PS 01-02-91 ŽST Semily, kamerový systém	
D.3	Silnoproudá technologie včetně DŘT	
	PS 01-03-11 ŽST Semily, DŘT	
	PS 01-03-12 ŽST Semily, DDTS ŽDC	
	PS 01-04-05 Náhradní zdroj elektrické energie - NZEE	
E.1.1.1	Železniční svršek	
	SO 01-10-01 ŽST Semily, železniční svršek	
E.1.1.2	Železniční spodek	
	SO 01-11-01 ŽST Semily, železniční spodek	
E.1.2	Nástupiště	
	SO 01-12-01 ŽST Semily, nástupiště a zpevněné plochy	
E.1.3	Železniční přejezdy	
	SO 01-13-01 ŽST Semily, úprava úrovněového přejezdu v km 102,017	
E.1.4	Mosty, propustky a zdi	
	SO 01-20-01 Podchod pro pěši v km 102,106	
	SO 01-23-01 Opěrná zeď podél nástupiště	
	SO 01-23-02 Opěrná zeď se schodištěm	
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty	
	SO 01-30-01 Anténní stožár	
	SO 01-92-01 Kácení a náhradní výsadba	
E.1.6	Potrubní vedení	
	SO 01-31-01 ŽST Semily, dešťová kanalizace	
	SO 01-31-03 Rekonstrukce jednotné kanalizace	
	SO 01-33-01 Přeložka plynovodu	
E.1.8	Pozemní komunikace	
	SO 01-50-02 ŽST Semily, úpravy stávající manipulační plochy	
E.1.9	Kabelovody, kolektory	
	SO 01-60-01 ŽST Semily, kabelovod	
E.2	Pozemní stavební objekty	
	SO 01-72-01 ŽST Semily, Objekt pro náhradní zdroj	
	SO 01-74-01 ŽST Semily, zastřešení nástupišť	
	SO 01-77-01 ŽST Semily, orientační systém	
	SO 01-78-01 ŽST Semily, demolice stávajícího skladiště	
	SO 01-79-01 Drobná architektura, mobiliář	
E.3.4	Ohřev výměn	
	SO 01-84-01 ŽST Semily, EOv	
E.3.6	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	
	SO-01-86-01,0 ŽST Semily, Rozvody VN, NN, osvětlení a DO odpojovačů	
SO90-90	ODPADY	
	SO 90-90 LIKVIDACE ODPADŮ včetně dopravy	
VŠEOB	Všeobecný objekt	
	SO 98-98 Všeobecný objekt	

PŘÍLOHA Č. 2

Oprávněné osoby, odborný personál Zhotovitele

(Pod-článek 6.9 Smluvních podmínek)

Oprávněné osoby Zhotovitele, včetně ředitele stavby dle čl. 5, odst. (1) bod g. směrnice SŽ SM 105 Změny během výstavby

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací na mosty a inženýrské konstrukce)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Osoba odpovědná za bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████@██████████.██████████
Telefon	██████████-██████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci zabezpečovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za realizační dokumentaci sdělovacího zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

PŘÍLOHA Č. 3

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
██████████ ██████████ ██████████ ██████████	████████████████████ ██████████ ████████████████████	██████
██████████ ██████████ ██████████████████ ██████████	████████████████████	██████
████████████████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	██████████████████	██████
██████████████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████	████████████████████ ██████████ ████████████████████ ██████████	██████


PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací


"Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily"

Harmonogram výstavby

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	"Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily"	455 dny?	03.10. 22	31.12. 23	
2					
3	Zahájení prací	0 dny	03.10. 22	03.10. 22	
4	Ukončení prací	0 dny	08.10. 23	08.10. 23	
5					
6	Výluky	248 dny	05.12. 22	09.08. 23	
7	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 1 vŽST Semily.	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	35SS
8	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 vúseku od návěstidla S1 po námezník výhybky č. 3 vŽST Semily.	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	35SS
9	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 vúseku od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 vŽST Semily.	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	35SS
10	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 3 vŽST Semily.	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	35SS
11	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 5 vŽST Semily.	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	35SS
12	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 4 vŽST Semily.	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	35SS
13	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 4 vúseku od návěstidla S4 po námezník výhybky č. 4.	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	35SS
14	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 4 vúseku od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 5.	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	35SS
15	Vyloučí se kolejově část staropackého záhlaví vúseku od vjezdového návěstidla L po hrot jazyka výhybky č. 1 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
16	Vyloučí se kolejově část staropackého zhlaví vúseku od hrotu jazyka výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 3 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
17	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 vúseku od námezniku výhybky č. 3 po návěstidlo S1 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
18	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 1 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
19	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 1 vúseku od návěstidla L1 po námezník výhybky č. 6 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
20	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 3 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
21	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 5 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
22	Vyloučí se kolejově část staropackého zhlaví vúseku od hrotu jazyka výhybky č. 3 po námezník výhybky č. 4 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
23	Vyloučí se část staniční koleje č. 2 vúseku od námezniku výhybky č. 4 do km 102,285 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
24	Vyloučí se kolejově staniční koleje č. 4 vŽST Semily.	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	36SS
25	Vyloučí se kolejově část staropackého zhlaví vúseku od námezniku výhybky č. 1 po námezník výhybky č. 2 vŽST Semily.	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	37SS
26	Vyloučí se kolejově část staropackého zhlaví vúseku od hrotu jazyka výhybky č. 2 po námezník výhybky č. 2 vŽST Semily.	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	37SS
27	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 4 vúseku od námezniku výhybky č. 2 po návěstidlo S4 vŽST Semily.	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	37SS
28	Vyloučí se kolejově staniční kolej č. 2 vŽST Semily.	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	37SS
29	Vyloučí se kolejově část staniční koleje č. 4 vúseku od návěstidla L4 po námezník výhybky č. 4 vŽST Semily.	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	37SS
30	Vyloučí se část železnobrodského zhlaví vúseku od námezniku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 5 vŽST Semily.	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	37SS
31	Vyloučí se část železnobrodského zhlaví vúseku od námezniku výhybky č. 4 po hrot jazyka výhybky č. 4	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	37SS
32					
33	Stavební postupy	393 dny?	03.10. 22	30.10. 23	
34	Přípravné práce	30 dny	03.10. 22	01.11. 22	
35	Stavební postup č. 1	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	
36	Stavební postup č. 2a	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	35
37	Stavební postup č. 2b	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	36
38	Stavební postup č. 3	60 dny	10.08. 23	08.10. 23	37
39	Dokončovací práce	20 dny	09.10. 23	28.10. 23	38
40					
41	Stavební práce po stavebních postupech	391 dny	03.10. 22	28.10. 23	
42	Přípravné práce	30 dny	03.10. 22	01.11. 22	
43	Zařízení staveniště, návoz mechanizace a materiálu	30 dny	03.10. 22	01.11. 22	34SS
44	Demontáž kolejí č. 3,5	5 dny	03.10. 22	07.10. 22	43SS
45	Demolice objektu	30 dny	03.10. 22	01.11. 22	43SS
46	Demolice podchodu	25 dny	08.10. 22	01.11. 22	44
47	Přeložka plynu - příprava dokladů	30 dny	03.10. 22	01.11. 22	43SS
48	Provizorní nástupiště P1 vč. Přístupu k VB	16 dny	17.10. 22	01.11. 22	43SS+14 dny
49	Pažení pro podchod mezi kolejí 1 a 2	16 dny	17.10. 22	01.11. 22	43SS+14 dny
50					
51	Stavební postup č. 1	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	
52	Zahájení výluky	0 dny	05.12. 22	05.12. 22	35SS
53	Demolice objektu	10 dny	05.12. 22	14.12. 22	52SS

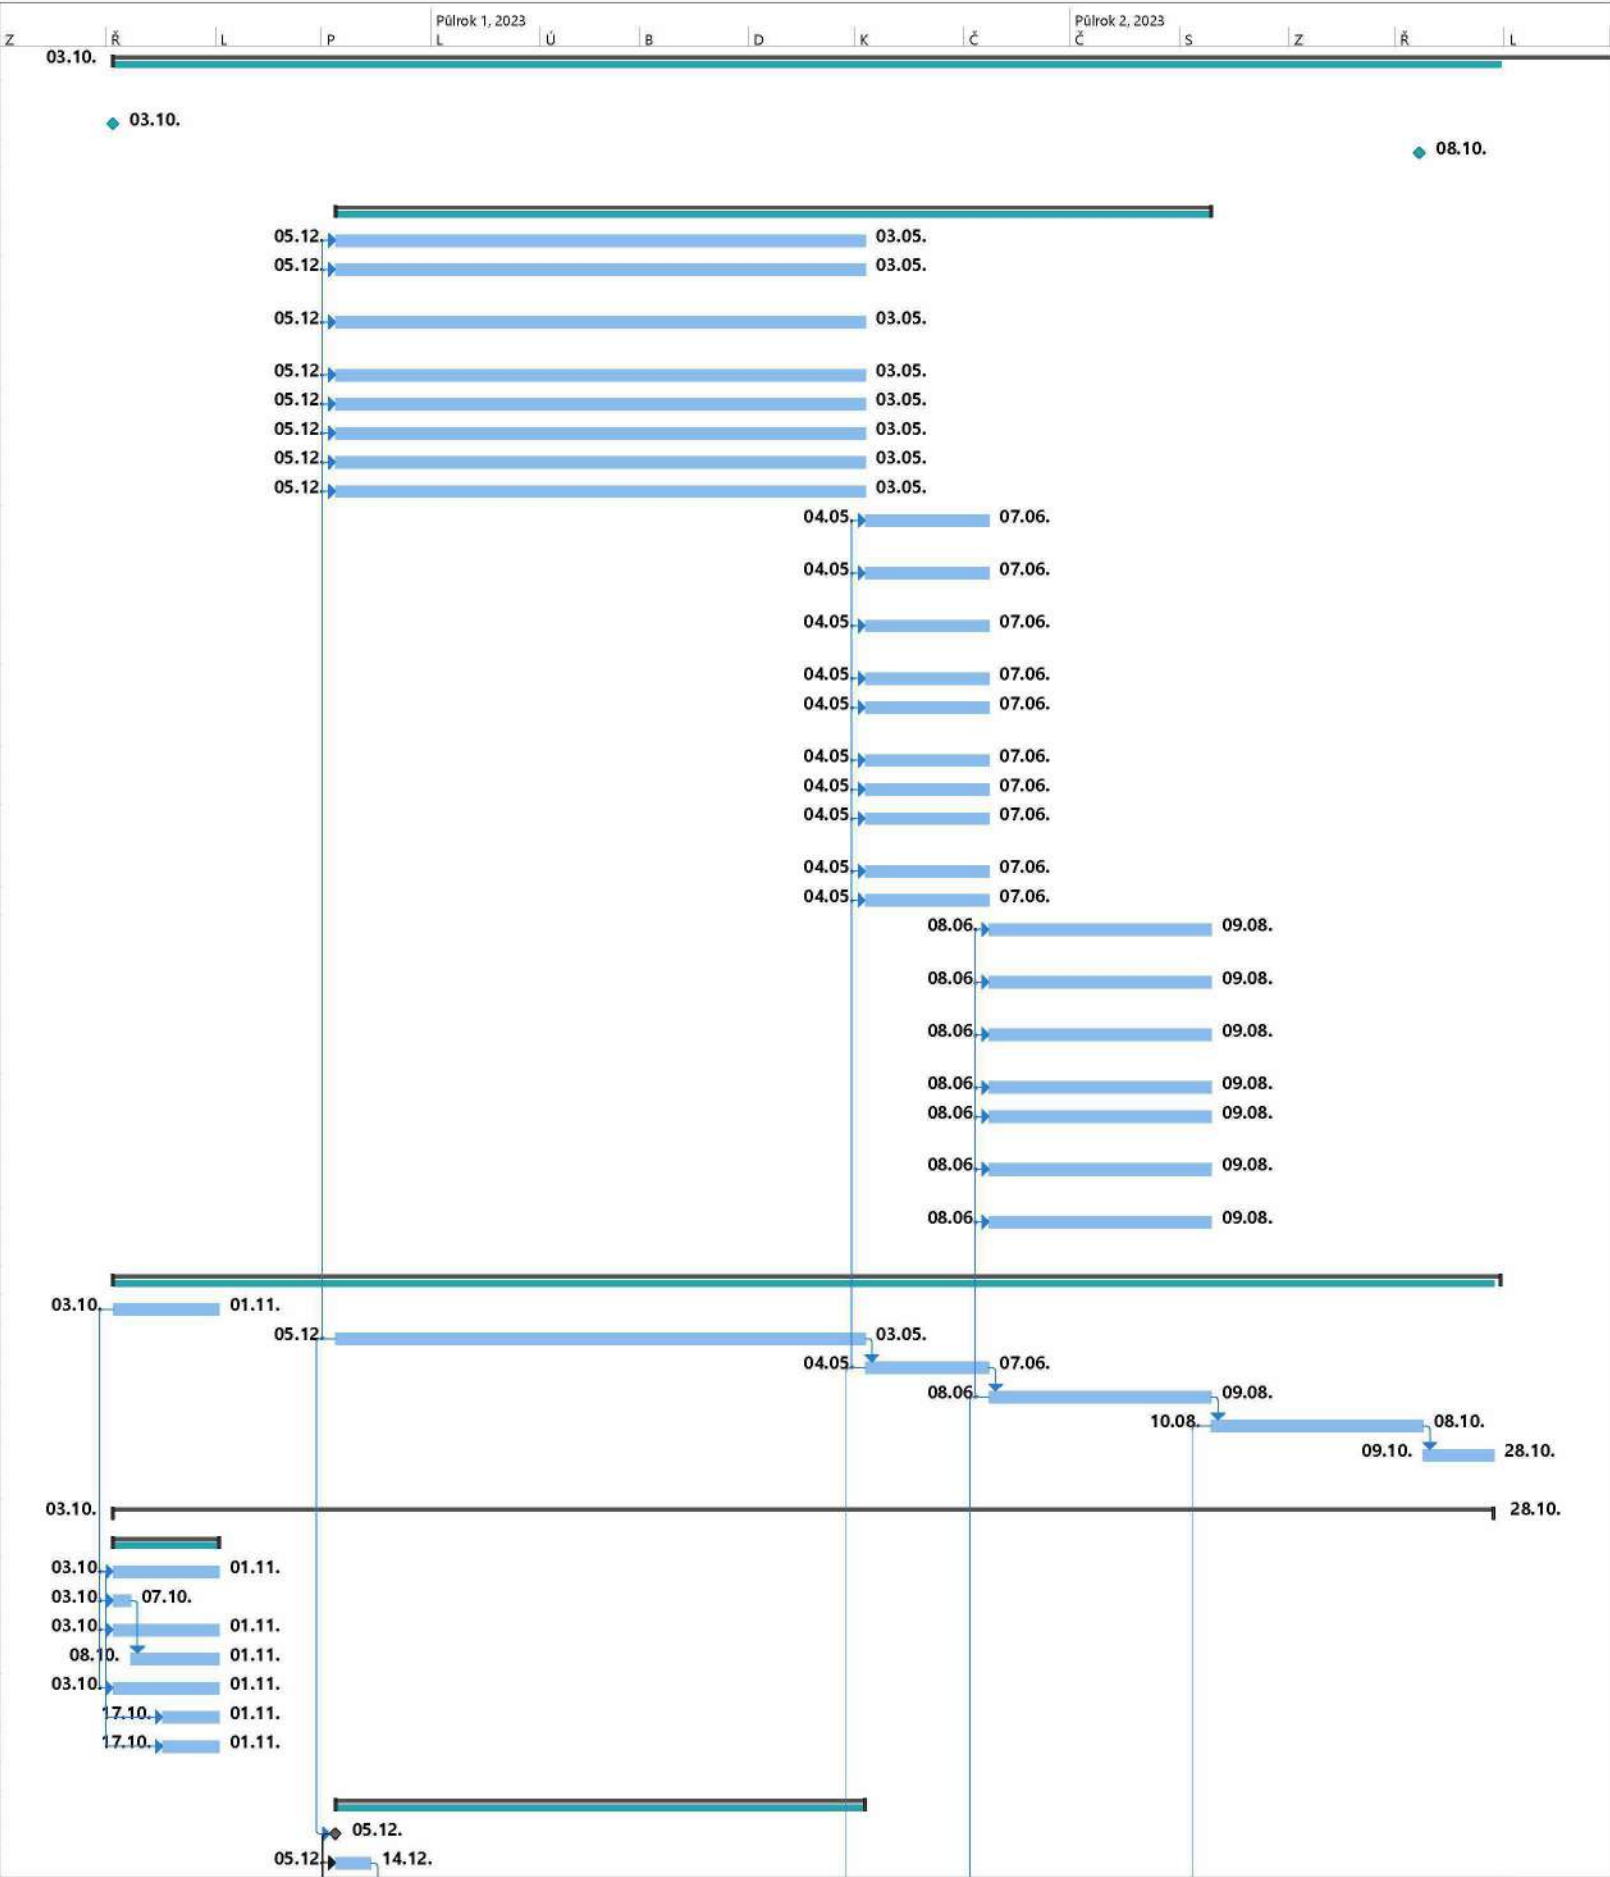

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
54	Plyn - provizorní stav	21 dny	05.12. 22	25.12. 22	52SS
55	Manipulační plocha, zřízení ZS2	30 dny	15.12. 22	13.01. 23	53
56	Demontáž koleje č. 1, 4 vč.odtěžení spodku	10 dny	05.12. 22	14.12. 22	52SS
57	Podchod 1.část	149 dny	06.12. 22	03.05. 23	52SS+1 den
58	Nástupiště č.1	50 dny	15.03. 23	03.05. 23	57FF
59	Kabelovod 1.část	50 dny	29.01. 23	19.03. 23	58SF+5 dny
60	Opěrná stěna za kolejí č. 4	110 dny	15.12. 22	03.04. 23	56
61	Demolice N2	5 dny	08.02. 23	12.02. 23	56FS+11 týdn
62	Odvodnění	51 dny	13.02. 23	04.04. 23	61
63	Spodek koleje č. 1 a 3	14 dny	05.04. 23	18.04. 23	62
64	Svršek koleje č. 1 a 3 (bez V3)	15 dny	19.04. 23	03.05. 23	63
65	Zabezpečovací a sdělovací zařízení	150 dny	05.12. 22	03.05. 23	52SS
66	Konec výluky	0 dny	03.05. 23	03.05. 23	57FF
67					
68	Stavební postup č. 2a	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	
69	Zahájení výluky	0 dny	04.05. 23	04.05. 23	36SS
70	Plyn - přeložka	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	69SS
71	Demontáž přejezdu	5 dny	04.05. 23	08.05. 23	69SS
72	Demontáž výhybek V1 a V2	5 dny	04.05. 23	08.05. 23	69SS
73	Oprava V1 a montáž na nové V3	15 dny	09.05. 23	23.05. 23	72
74	Zaráředlo u P1	1 den	04.05. 23	04.05. 23	69SS
75	Demontáž koleje č. 2 vč.odtěžení spodku	2 dny	04.05. 23	05.05. 23	69SS
76	Podchod 2.část	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	69SS
77	Přechod kabelovodu a odvodnění přes koleje č.2 a 4	14 dny	06.05. 23	19.05. 23	75
78	Opěrná stěna za kolejí č. 4	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	69SS
79	Přejezd P3083	20 dny	09.05. 23	28.05. 23	71
80	Dokončení svršeku koleje č. 1 a 3 vč. V3, přejezdu	5 dny	29.05. 23	02.06. 23	79
81	Zkoušení ZabZař	5 dny	03.06. 23	07.06. 23	80
82	Zabezpečovací a sdělovací zařízení	35 dny	04.05. 23	07.06. 23	69SS
83	Konec výluky	0 dny	07.06. 23	07.06. 23	82FF
84					
85	Stavební postup č. 2b	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	
86	Zahájení výluky	0 dny	08.06. 23	08.06. 23	37SS
87	Podchod 2.část	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	86SS
88	Demolice P1	5 dny	08.06. 23	12.06. 23	86SS
89	Nástupiště č.2	28 dny	08.06. 23	05.07. 23	86SS
90	Kabelovod 2.část	14 dny	13.07. 23	26.07. 23	89FS+7 dny
91	Odvodnění	12 dny	06.07. 23	17.07. 23	89
92	Spodek koleje č. 2, 4	14 dny	18.07. 23	31.07. 23	91
93	Svršek koleje č. 2 a 4	9 dny	01.08. 23	09.08. 23	92
94	Zabezpečovací a sdělovací zařízení	63 dny	08.06. 23	09.08. 23	86SS
95	Konec výluky	0 dny	09.08. 23	09.08. 23	94FF
96					
97	Stavební postup č. 3	60 dny	10.08. 23	08.10. 23	
98	Zahájení výluky	0 dny	10.08. 23	10.08. 23	38SS
99	Demontáž vyhybek V4 a V5	5 dny	10.08. 23	14.08. 23	98SS
100	Propojení podchodu + Dokončení	40 dny	10.08. 23	18.09. 23	98SS
101	Spodek pod V2 a V4	5 dny	19.09. 23	23.09. 23	100
102	Svršek V2 a V4	5 dny	24.09. 23	28.09. 23	101
103	Zkoušení ZabZař celá žst.	10 dny	29.09. 23	08.10. 23	102
104	Konec výluky	0 dny	08.10. 23	08.10. 23	103FF
105					
106	Dokončovací práce	20 dny	09.10. 23	28.10. 23	
107	Dokončení všech PS a SO	10 dny	09.10. 23	18.10. 23	104
108	Odstranění zařízení staveniště	10 dny	19.10. 23	28.10. 23	107
109	Úklid a úpravy ploch po zařízení staveniště	10 dny	19.10. 23	28.10. 23	107
110					
111					
112					
113					
114					
115					

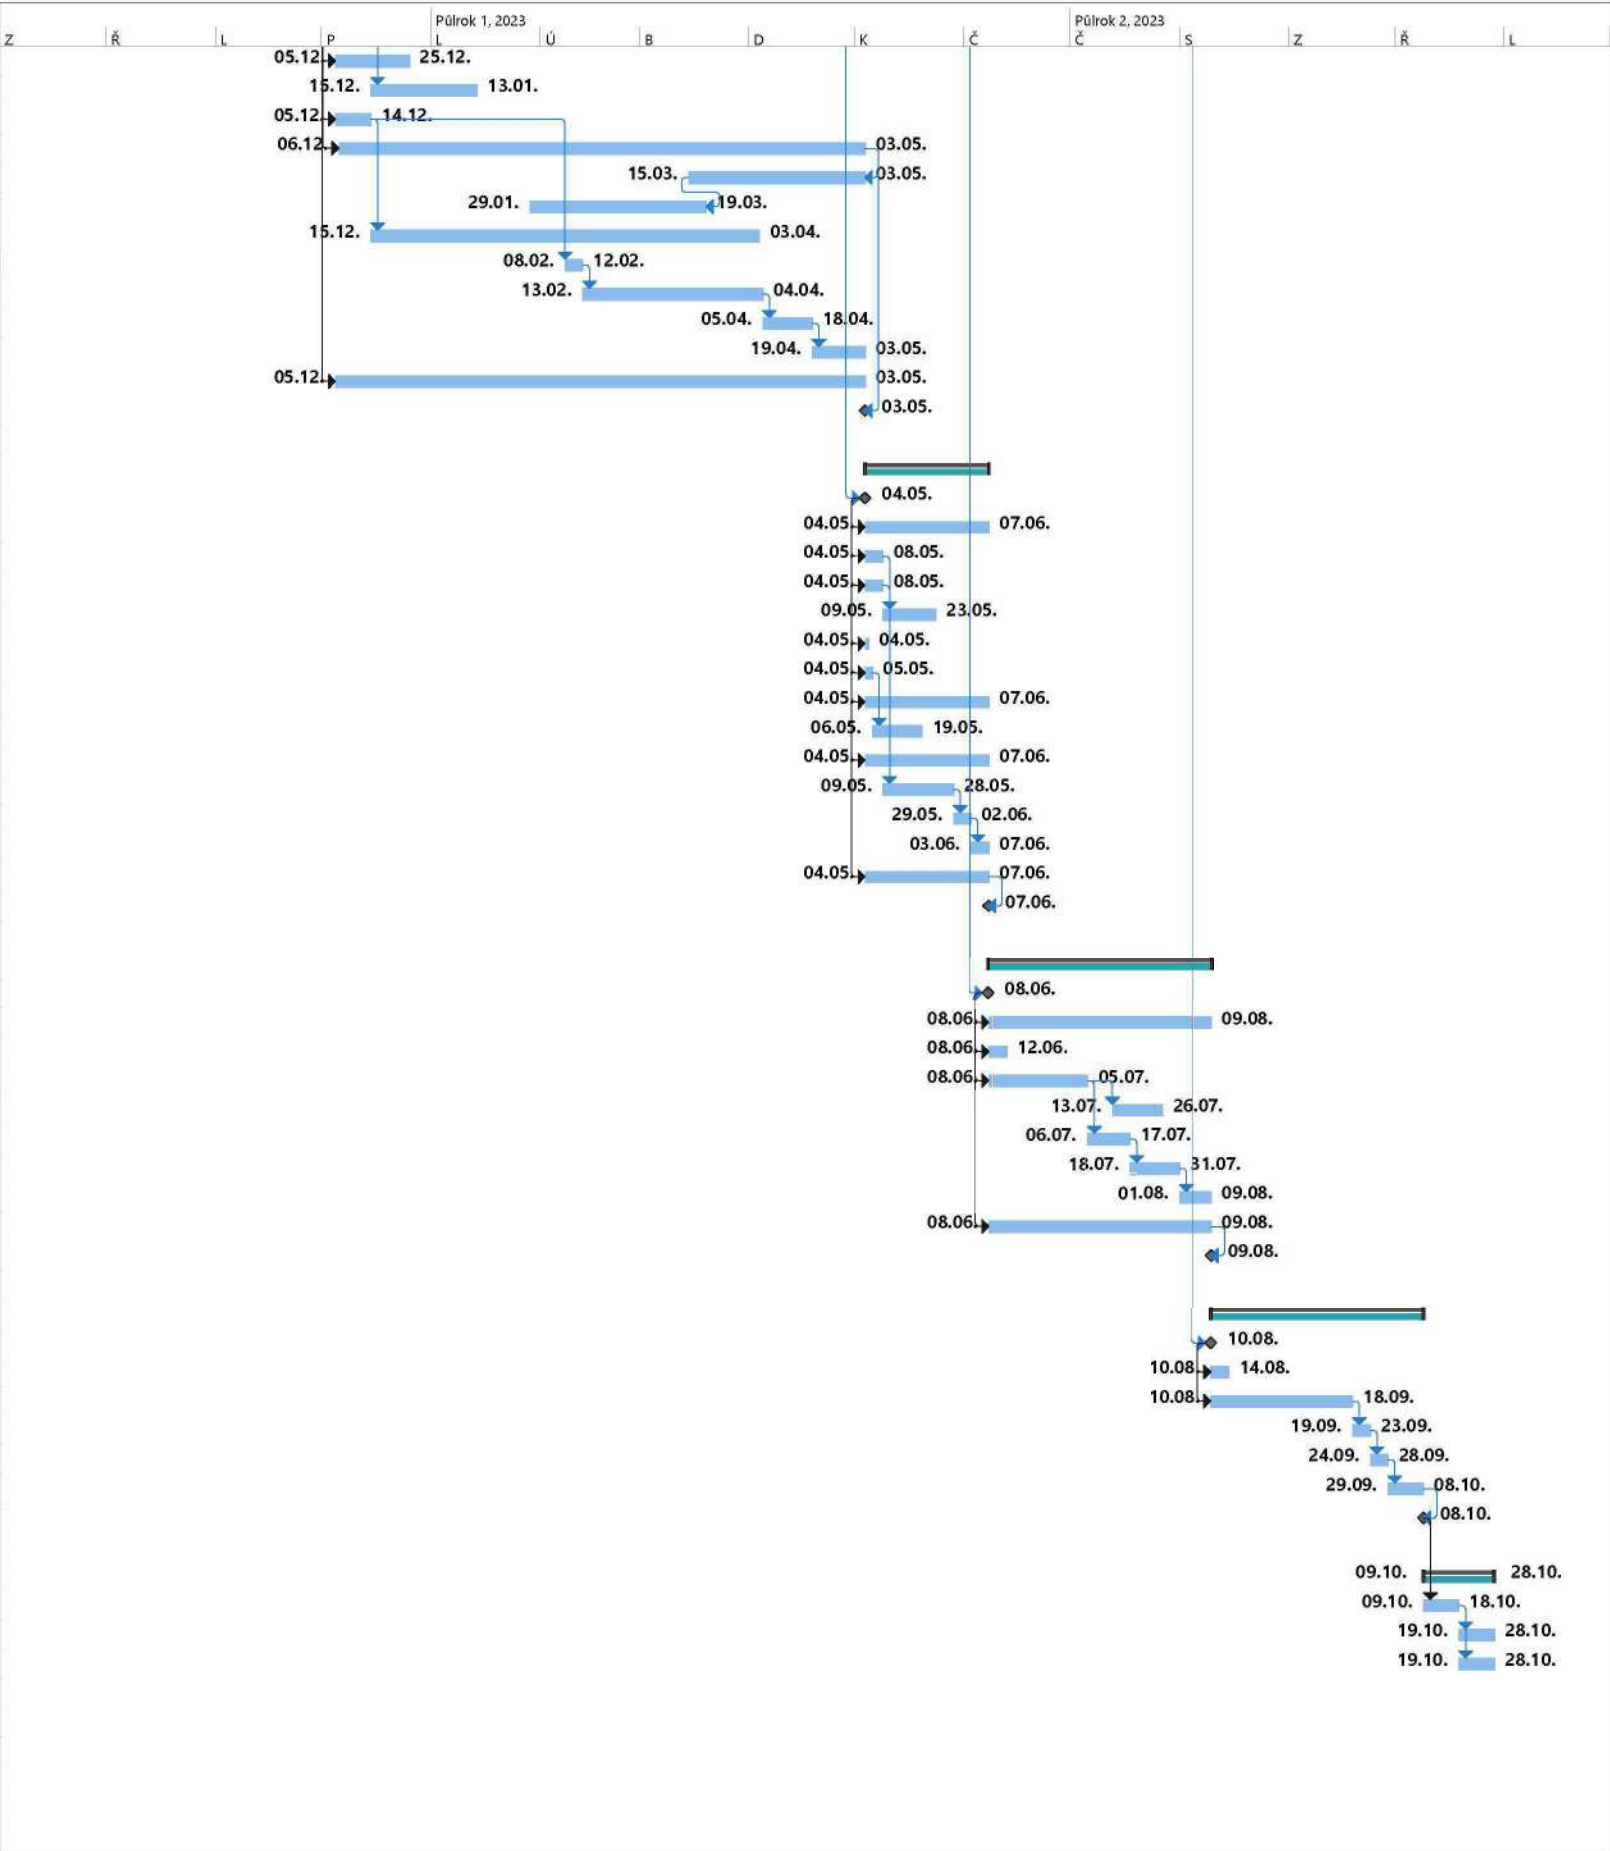

PŘÍLOHA Č. 5

Smlouva o zpracování osobních údajů

1. Předmět smlouvy o zpracování osobních údajů

- 1.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran za účelem zajištění uzavření smluv uvedených ve Všeobecných technických podmínkách, a to za splnění podmínek dále uvedených.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat předmětné osobní údaje výhradně za uvedeným účelem a na základě doložených pokynů a podmínek Objednatele a v souladu s nimi, jak vyplývají z této Smlouvy o zpracování osobních údajů a z této Smlouvy o dílo.

2. Rozsah zpracovávaných údajů

- 2.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v čl.4 Všeobecných technických podmínek na zhotovení stavby.
- 2.2 Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny ve výše uvedeném bodě 2.1, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.

3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Správci.
- 3.2 Zhotovitel bude neprodleně informovat Objednatele, pokud jsou podle jeho názoru některé pokyny Objednatele v rozporu s platnou právní úpravou.
- 3.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou o zpracování osobních údajů, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 3.4 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl. 32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 3.5 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 3.6 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

- 3.7 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovávaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 3.8 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě během běžné pracovní doby Zhotovitele provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy o zpracování osobních údajů, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy o dílo, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.
- 3.9 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy o zpracování osobních údajů je Zhotovitel povinen vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání je v souladu s platnou právní úpravou nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.

4. Odpovědnost Zhotovitele a smluvní pokuta

- 4.1 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „zpracovatele“ ve smyslu GDPR. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený Smlouvou o zpracování osobních údajů nebo doloženými pokyny Objednatele vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen škodu uhradit.
- 4.2 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení. Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zaslané Objednatelem na základě tohoto ustanovení.
- 4.3 Zaplacením smluvní pokuty, jak je popsána v odstavci výše, není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu újmy způsobené porušením ustanovení této Smlouvy o zpracování osobních údajů.

PŘÍLOHA Č. 6

Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)

PŘÍLOHA Č. 7

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

a

Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo

NEOBSAZENO

PŘÍLOHA Č. 9

Žádost o poskytnutí zálohové platby

V souladu s ustanovením pod-článku 14.2 Smluvních podmínek ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby žádáme o poskytnutí zálohové platby na finanční plnění výši: [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] Kč.

Záloha bude využita na pokrytí nákladů stavebních prací a dodávek materiálů v souladu s výše uvedenou Smlouvou o dílo v období: MM/RR – MM/RR [VLOŽÍ ZHOTOVITEL] včetně.

Součástí této žádosti je:

- aktuální Správcem stavby písemně potvrzený finanční harmonogram stavby (smluvní hodnota prací předpokládaných k realizaci pro příslušný kalendářní rok dle podrobného Harmonogramu Pod-článek 8.3 Smluvních podmínek), do kterého je v souladu s výše uvedenými údaji promítnuto plánované využití zálohové faktury na krytí nákladů Díla, zajišťující vypořádání zálohové faktury v předepsaném období, které musí korespondovat s věcným plněním Díla.
- zálohová faktura č. [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

V dne

.....
Zhotovitel

PŘÍLOHA Č. 11

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací
č.j. [●]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč:	

Zhotovitel díla (název dle SOD)	
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):	

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek)	Hodnota poddodávky v % ze smluvní ceny díla a konkrétní částka v Kč

Rozsah prací: (dle předmětu díla / předmětu plnění VZ)	
Charakter prací (oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)	
Délka traťového úseku* (v km)	
Dílo probíhalo na trati* jednokolejné / vícekolejné	
Dílo probíhalo na trati* elektrifikované / neelektrifikované	
Dílo probíhalo na trati* širé (mezistaniční úsek)/ ve stanici	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním mostním objektu (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku mostního objektů/mostních objektů, případně jinou specifikaci)	
Stavební práce zahrnovaly práce na trakčním vedení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek)	
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč a délku traťového úseku)	
Stavební práce zahrnovaly práce na silnoproudých zařízeních (ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč)	
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelové stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu)	
Stavební práce zahrnovaly práce na pozemní stavbě (ANO/NE, v případě ANO uvést typ objektu – budova osobního nádraží, technologická budova apod.)	

Stavební práce zahrnovaly práce na stavbě s památkovou ochranou (ANO/NE, v případě ANO uvést druh objektu a hodnotu Kč)	
SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou (ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti):	
Popis vyhrazeného plnění dle SOD (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO):	
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč (bez DPH)
Správce/vedoucí společník (v případě, kdy se jedná o společnost – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Další společník (v případě, kdy se jedná o společnost na základě společenské smlouvy – dříve sdružení):		
Celkem v Kč	xxx	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
-------------------------------	---

Kontaktní osoba:	

Jméno a příjmení vystavitele (viz poznámka 1)	
Funkce:	
Podpis vystavitele	
Datum vystavení osvědčení	

** Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantní.*

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3138198

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1f566688-01a6-4a91-b1e1-a486cf308e3a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana BROŽKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2022 13:21:05



e67a197e-81e8-472f-bd38-1b70554e06e6
