




Nabídka společnosti InQool a.s.

FRS
— FRS.GOV.CZ

Oficiální webový portál pro cizince, kteří žijí
nebo chtějí žít v Česku.

Projekt: Informační portál pro cizince



MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

Objednatel: **Ministerstvo vnitra České republiky**

Krycí list nabídky

Objednatel: Ministerstvo vnitra České republiky

Odbor azylové a migrační politiky

Sídlo: P. O. Box 21/OAM, 170 34 Praha 7

Kontaktní osoba:

Email kontaktní osoby:



Dodavatel:

InQool a.s.

Sídlo:

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, Česká republika

IČO:

29222389

DIČ:

CZ29222389


Kontaktní osoba:


Kontaktní adresa:


Telefon kontaktní osoby:


Email kontaktní osoby:




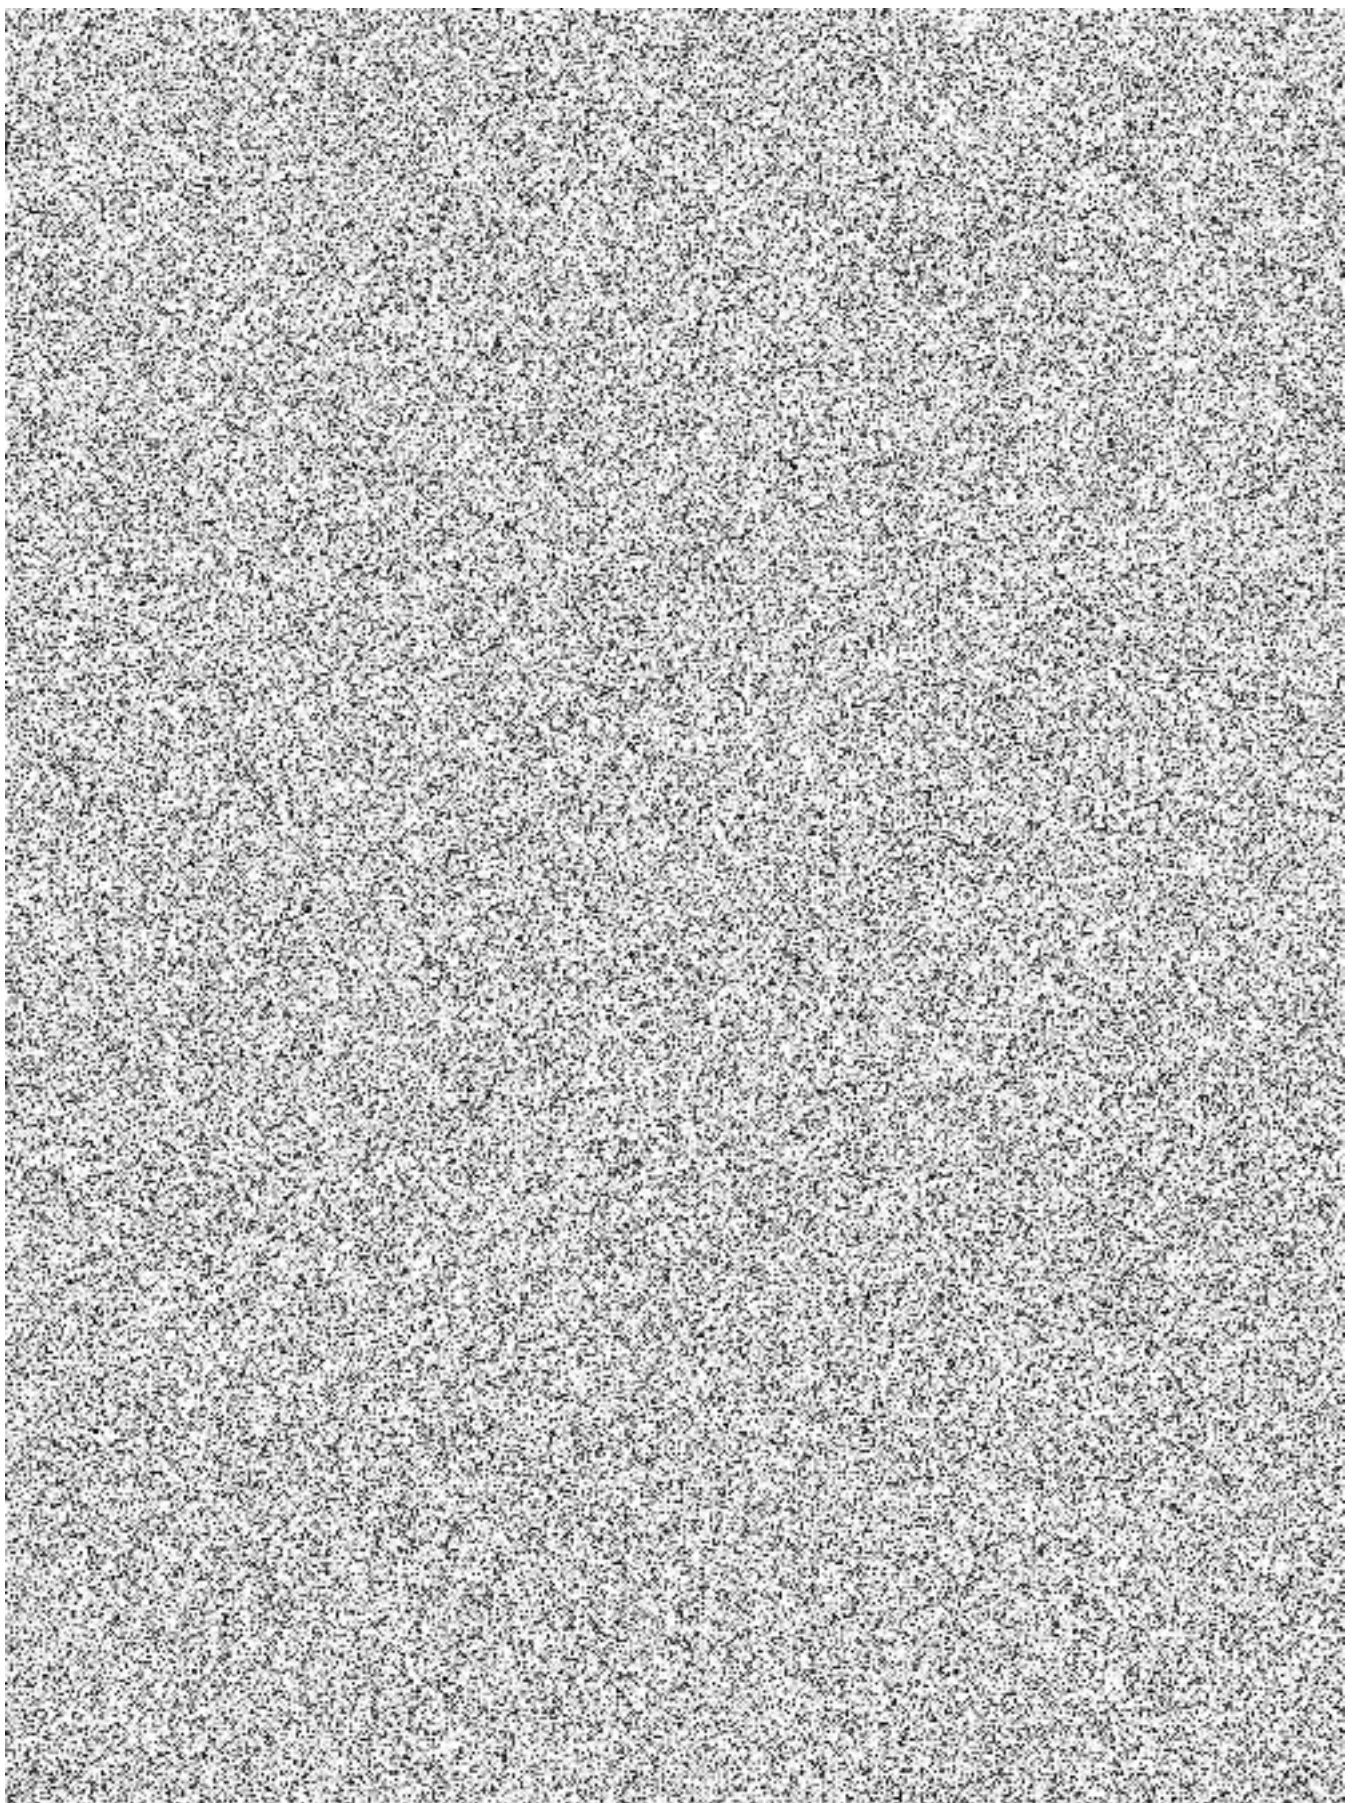


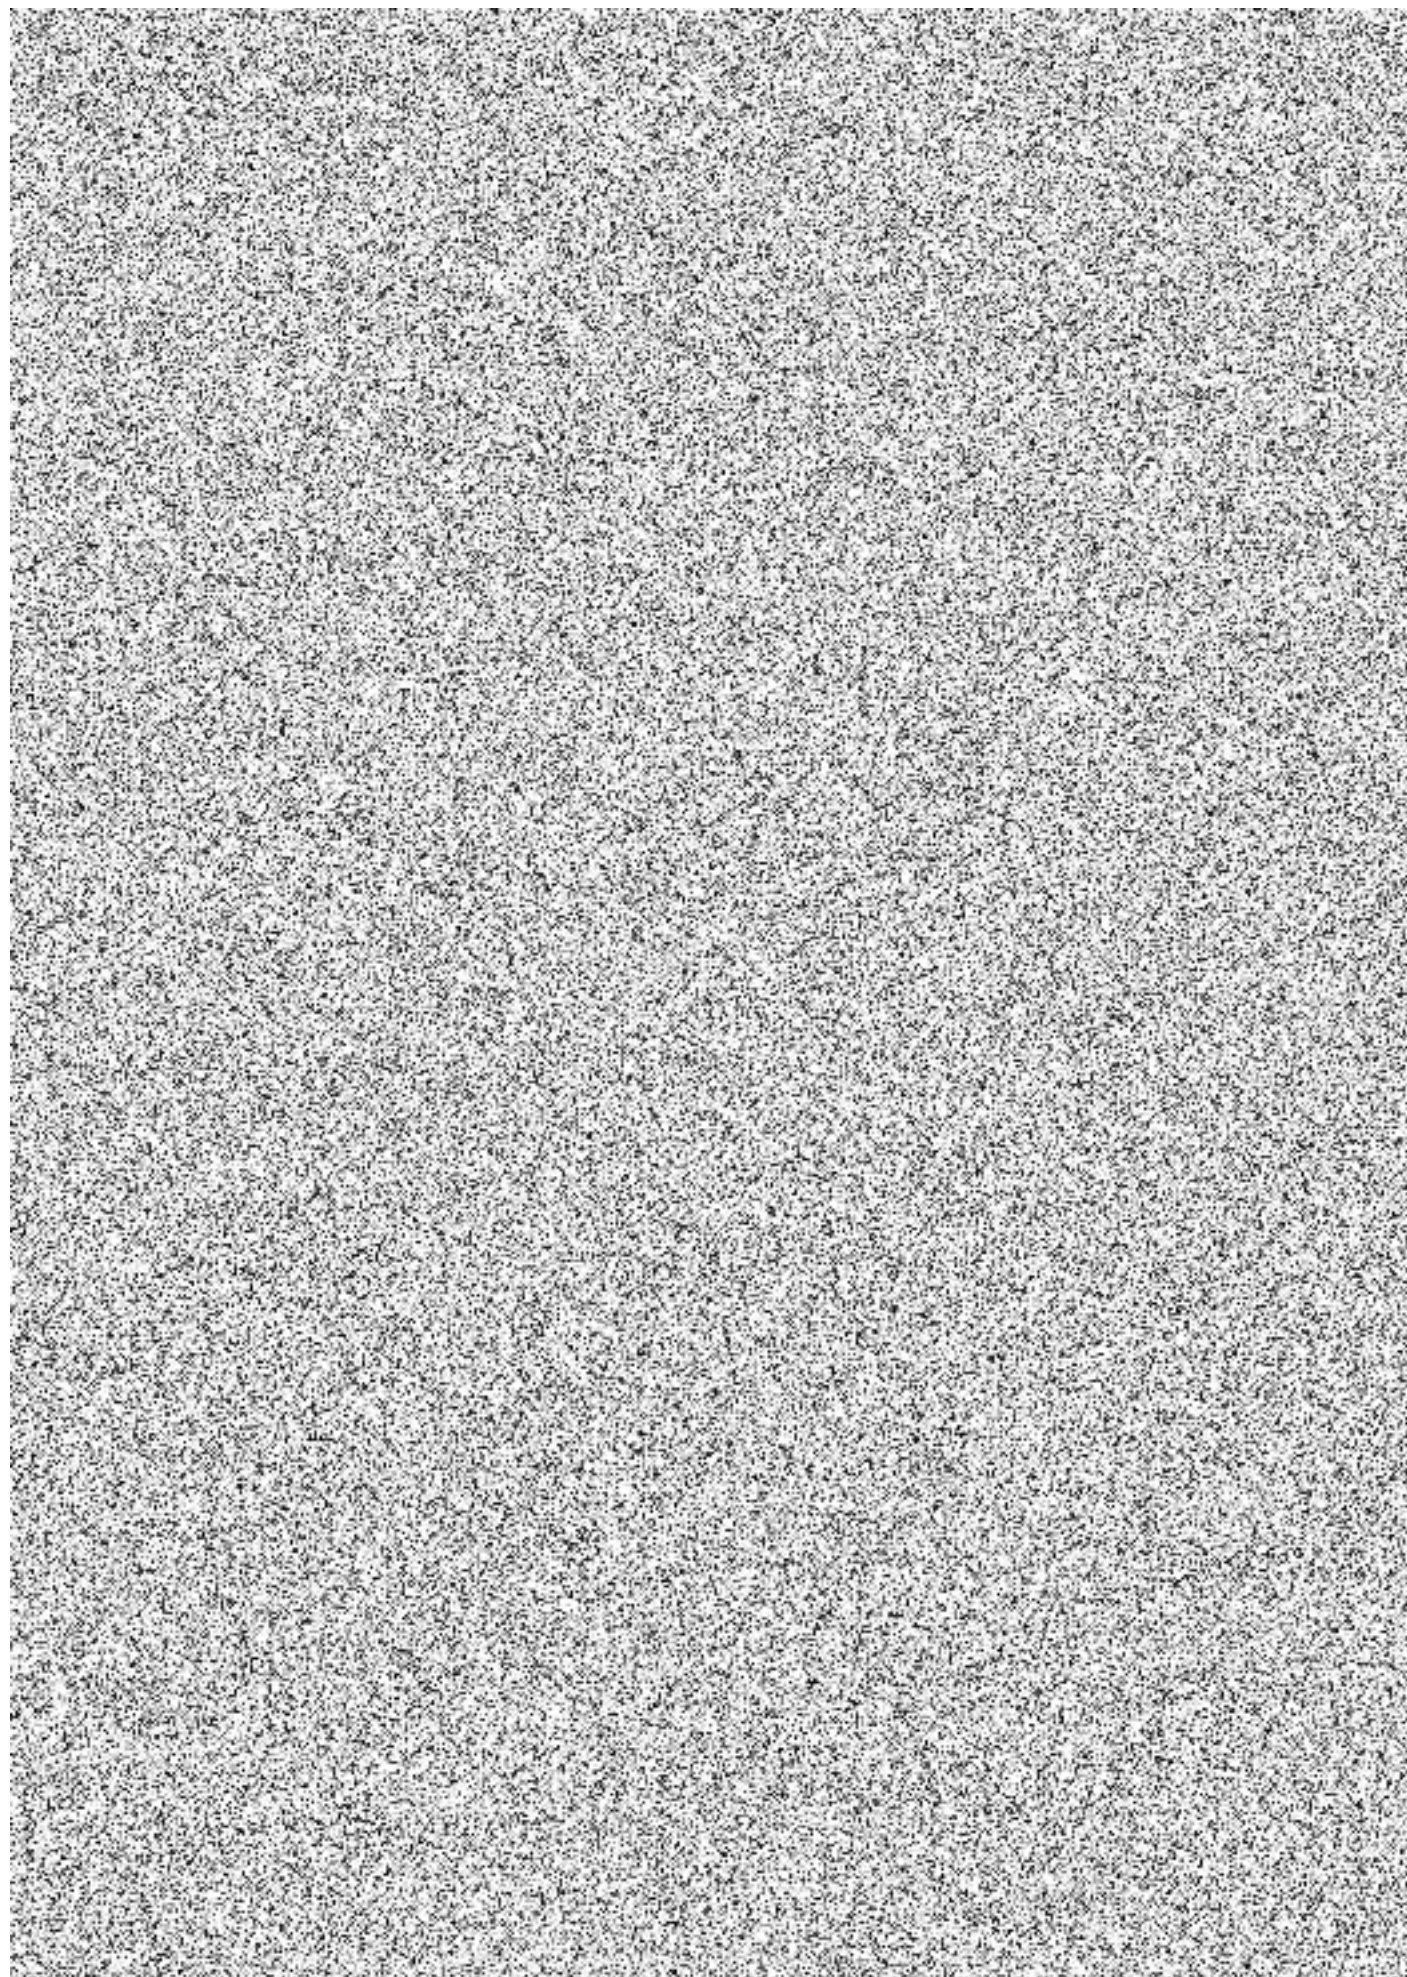


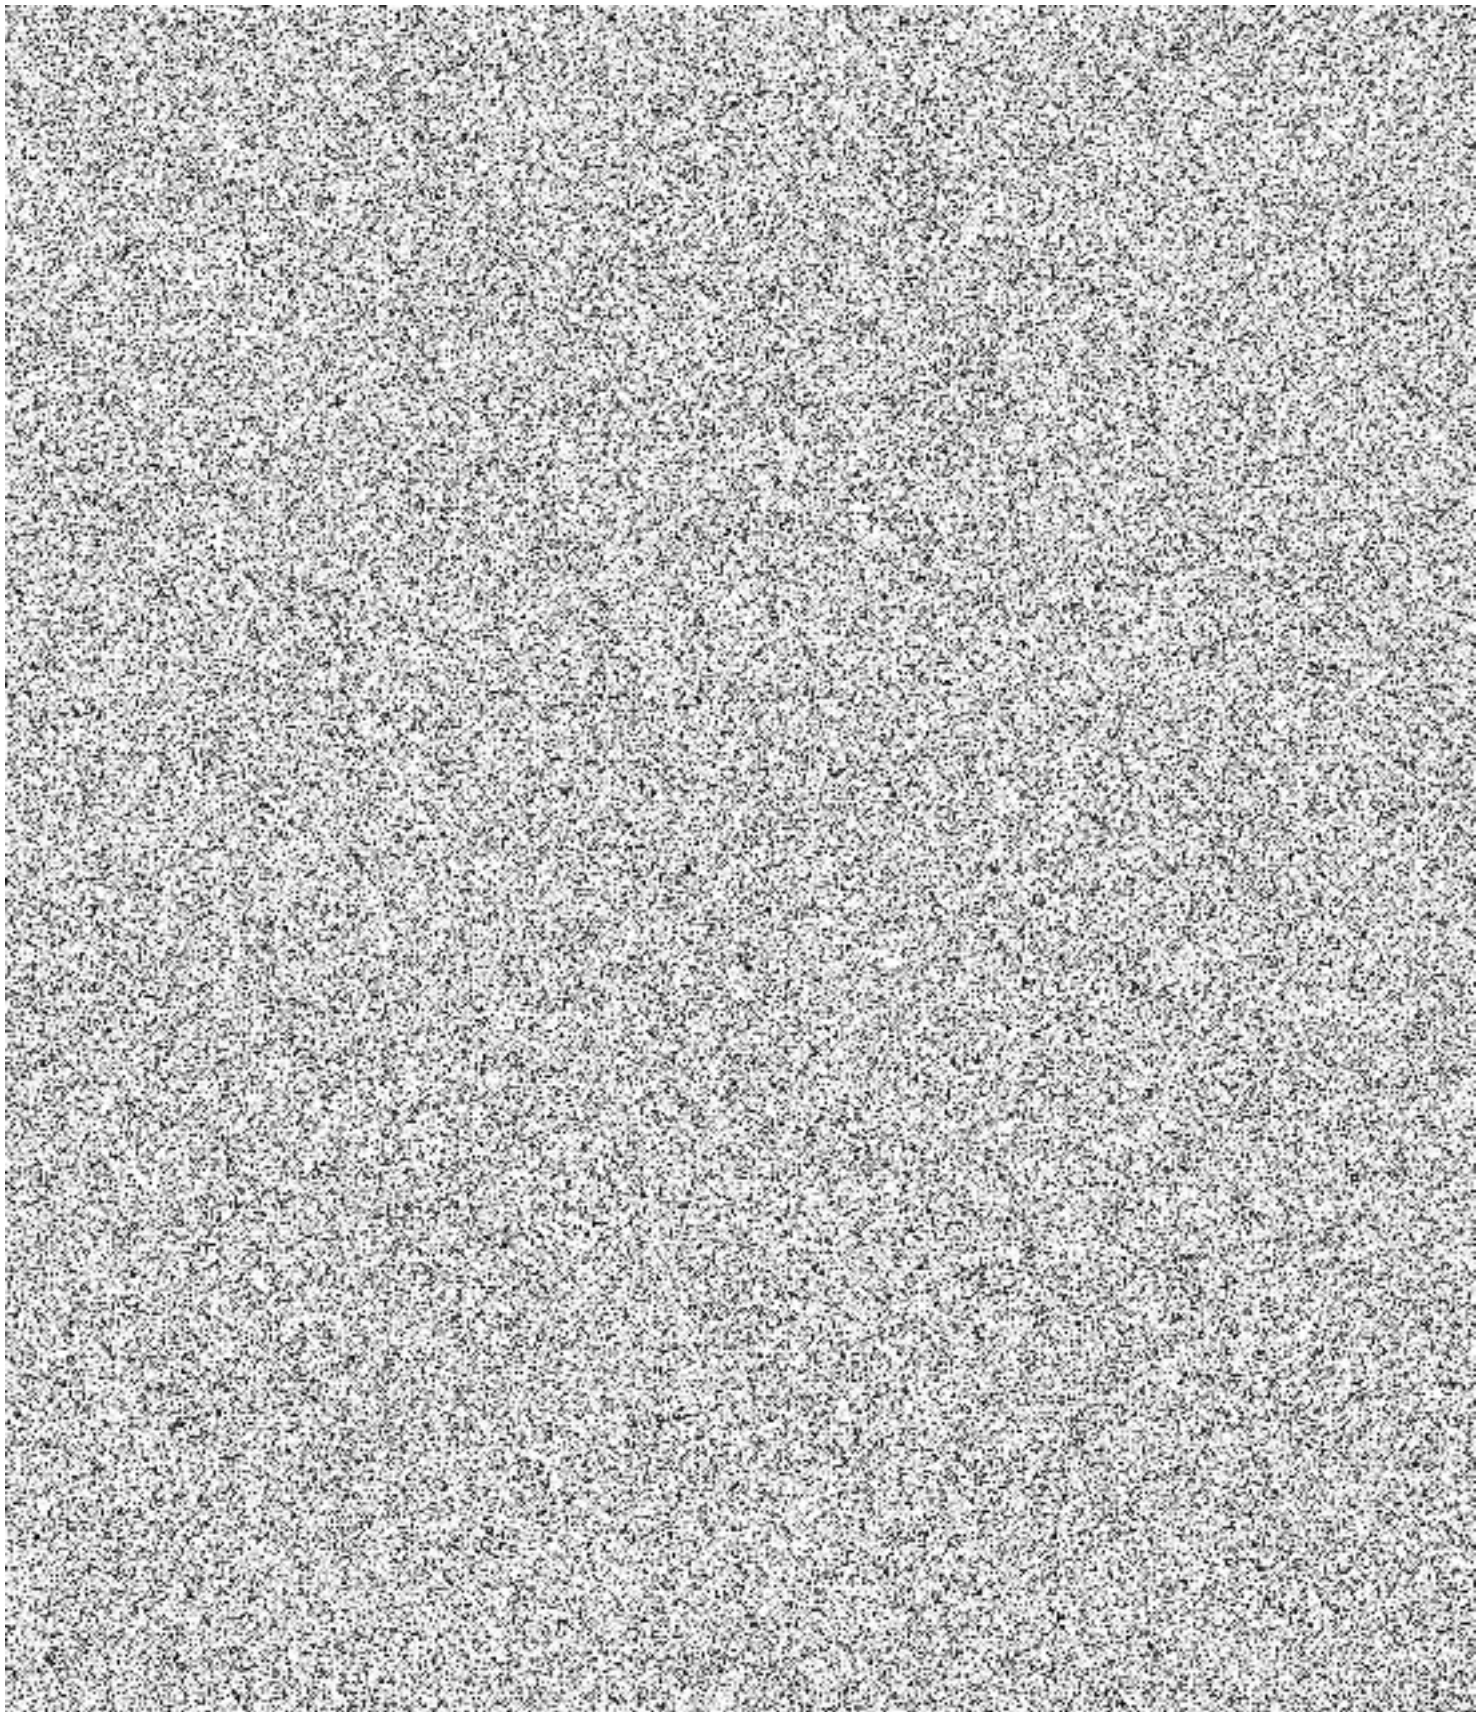


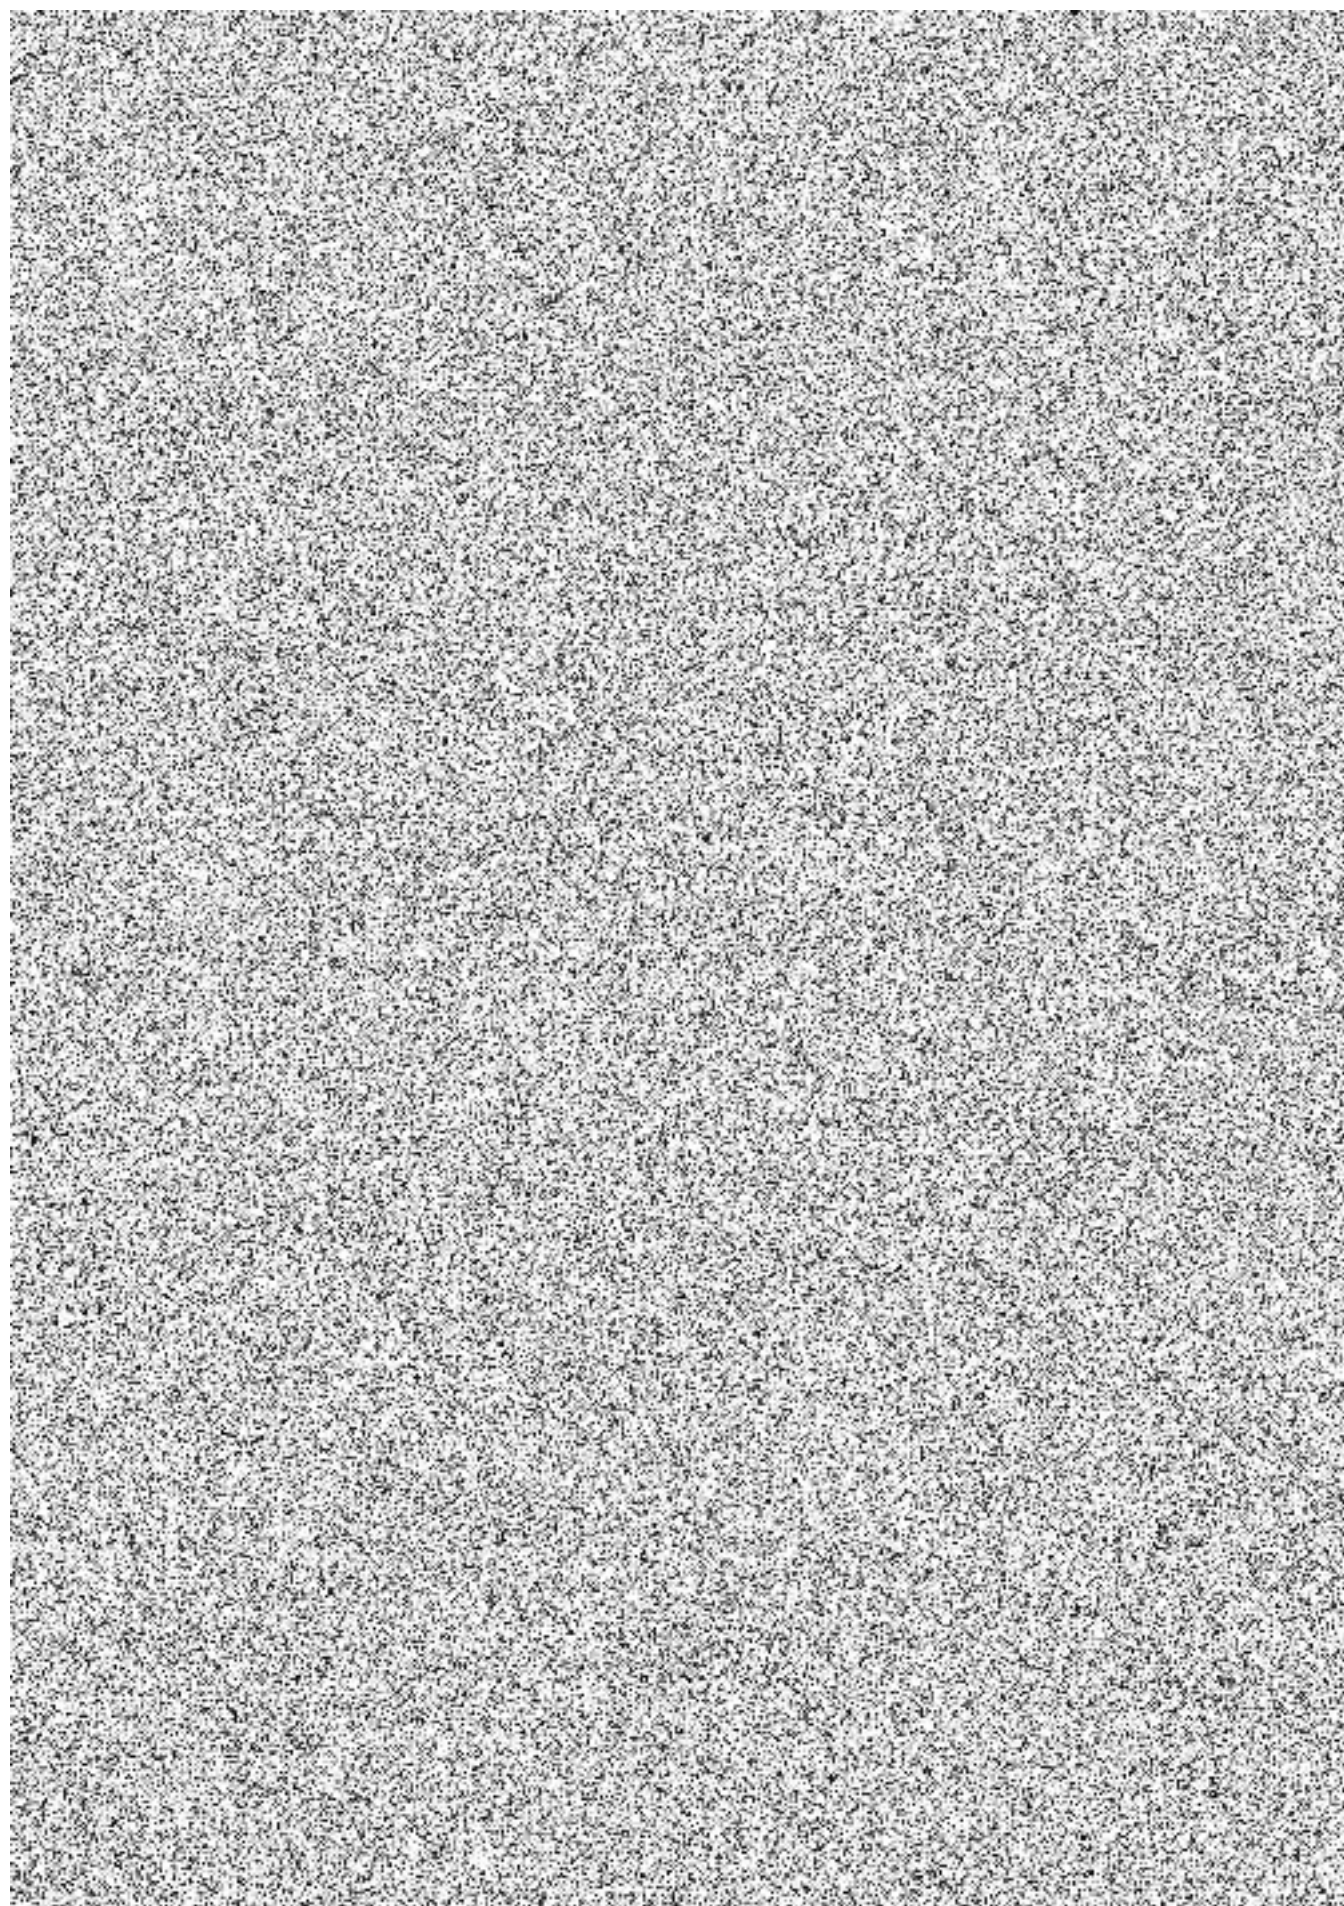


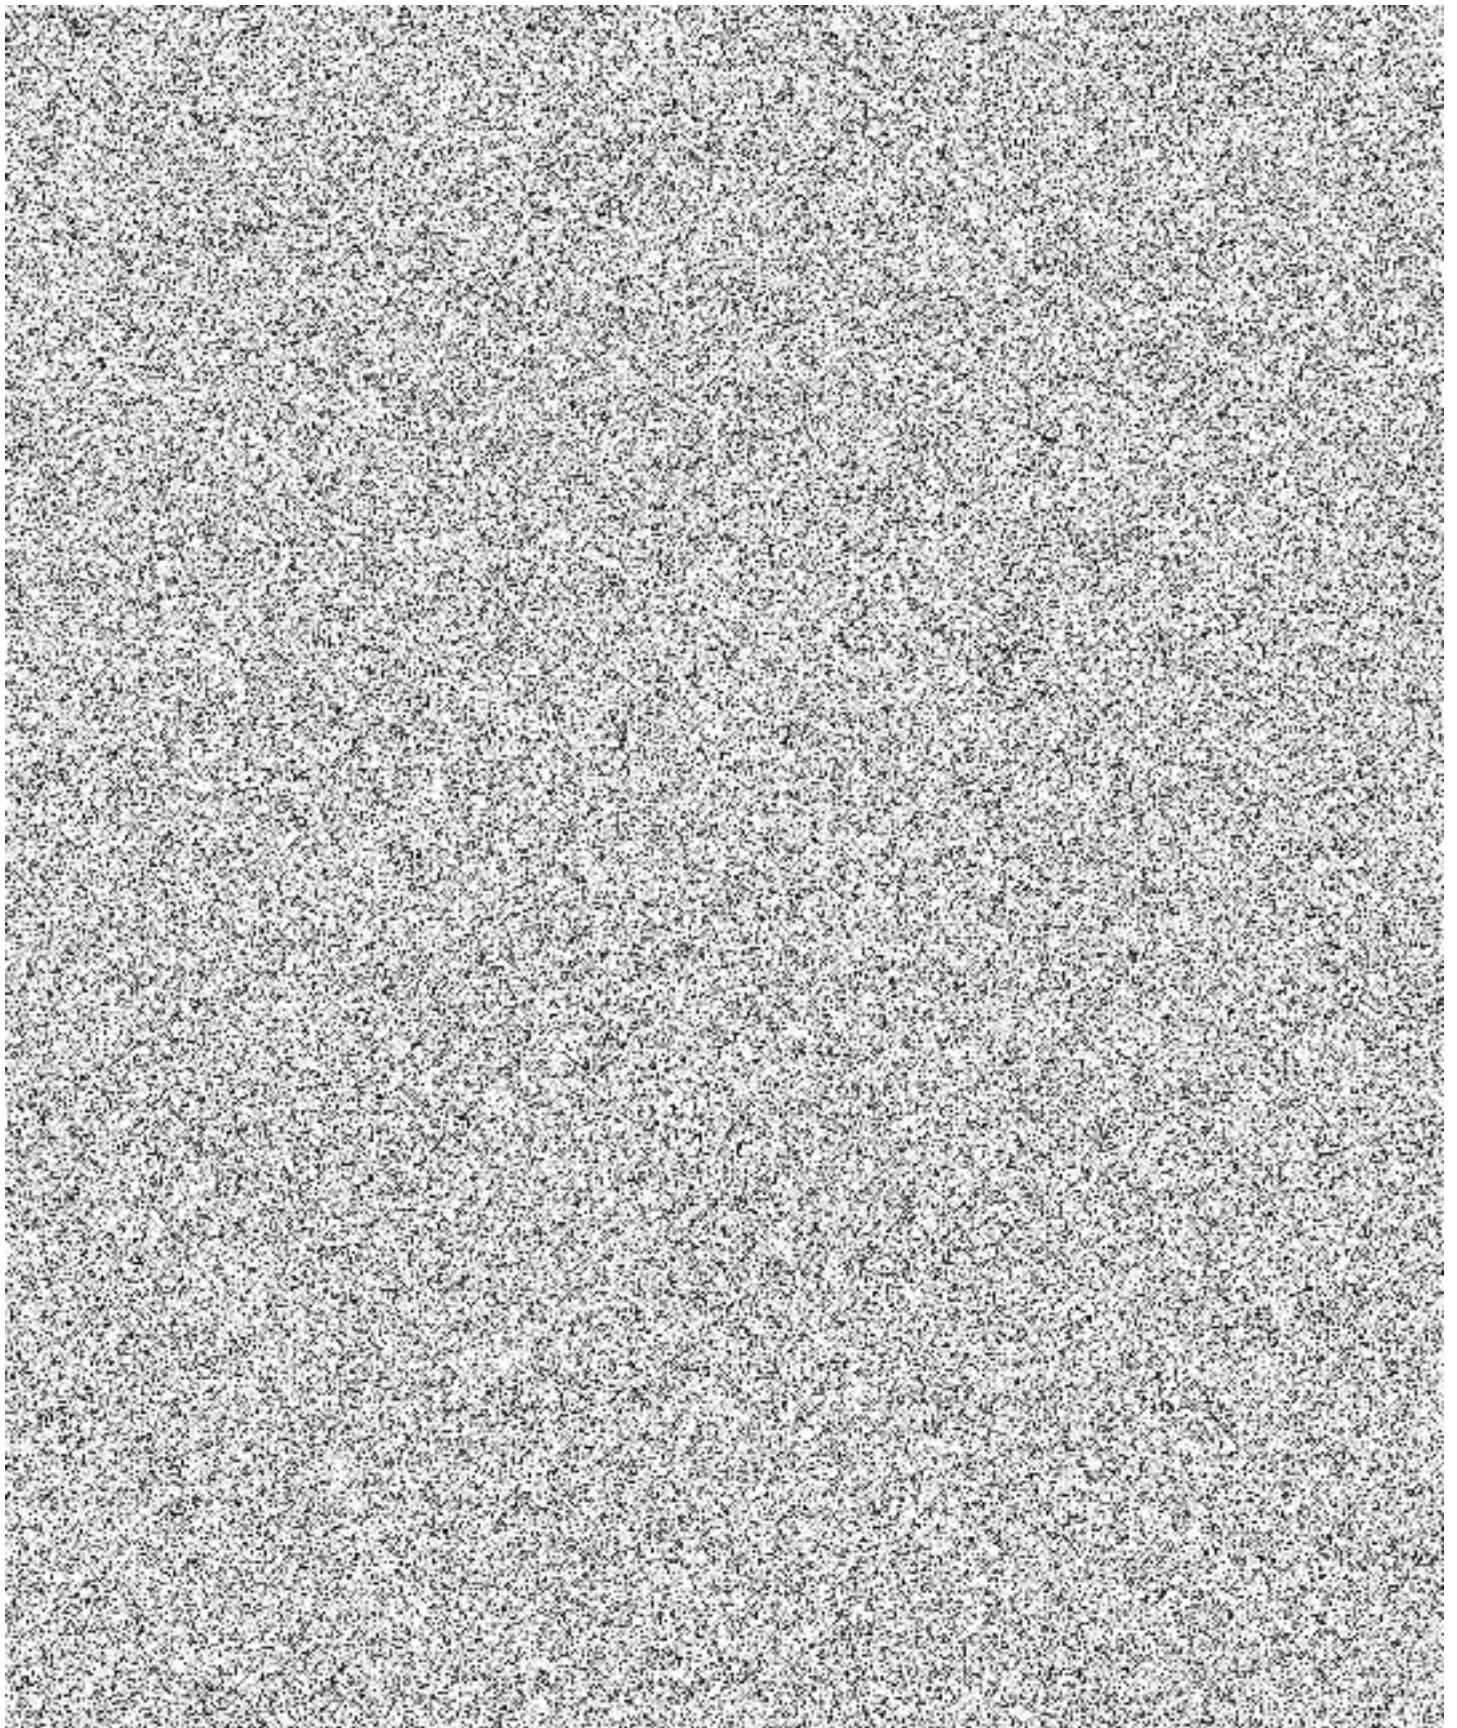


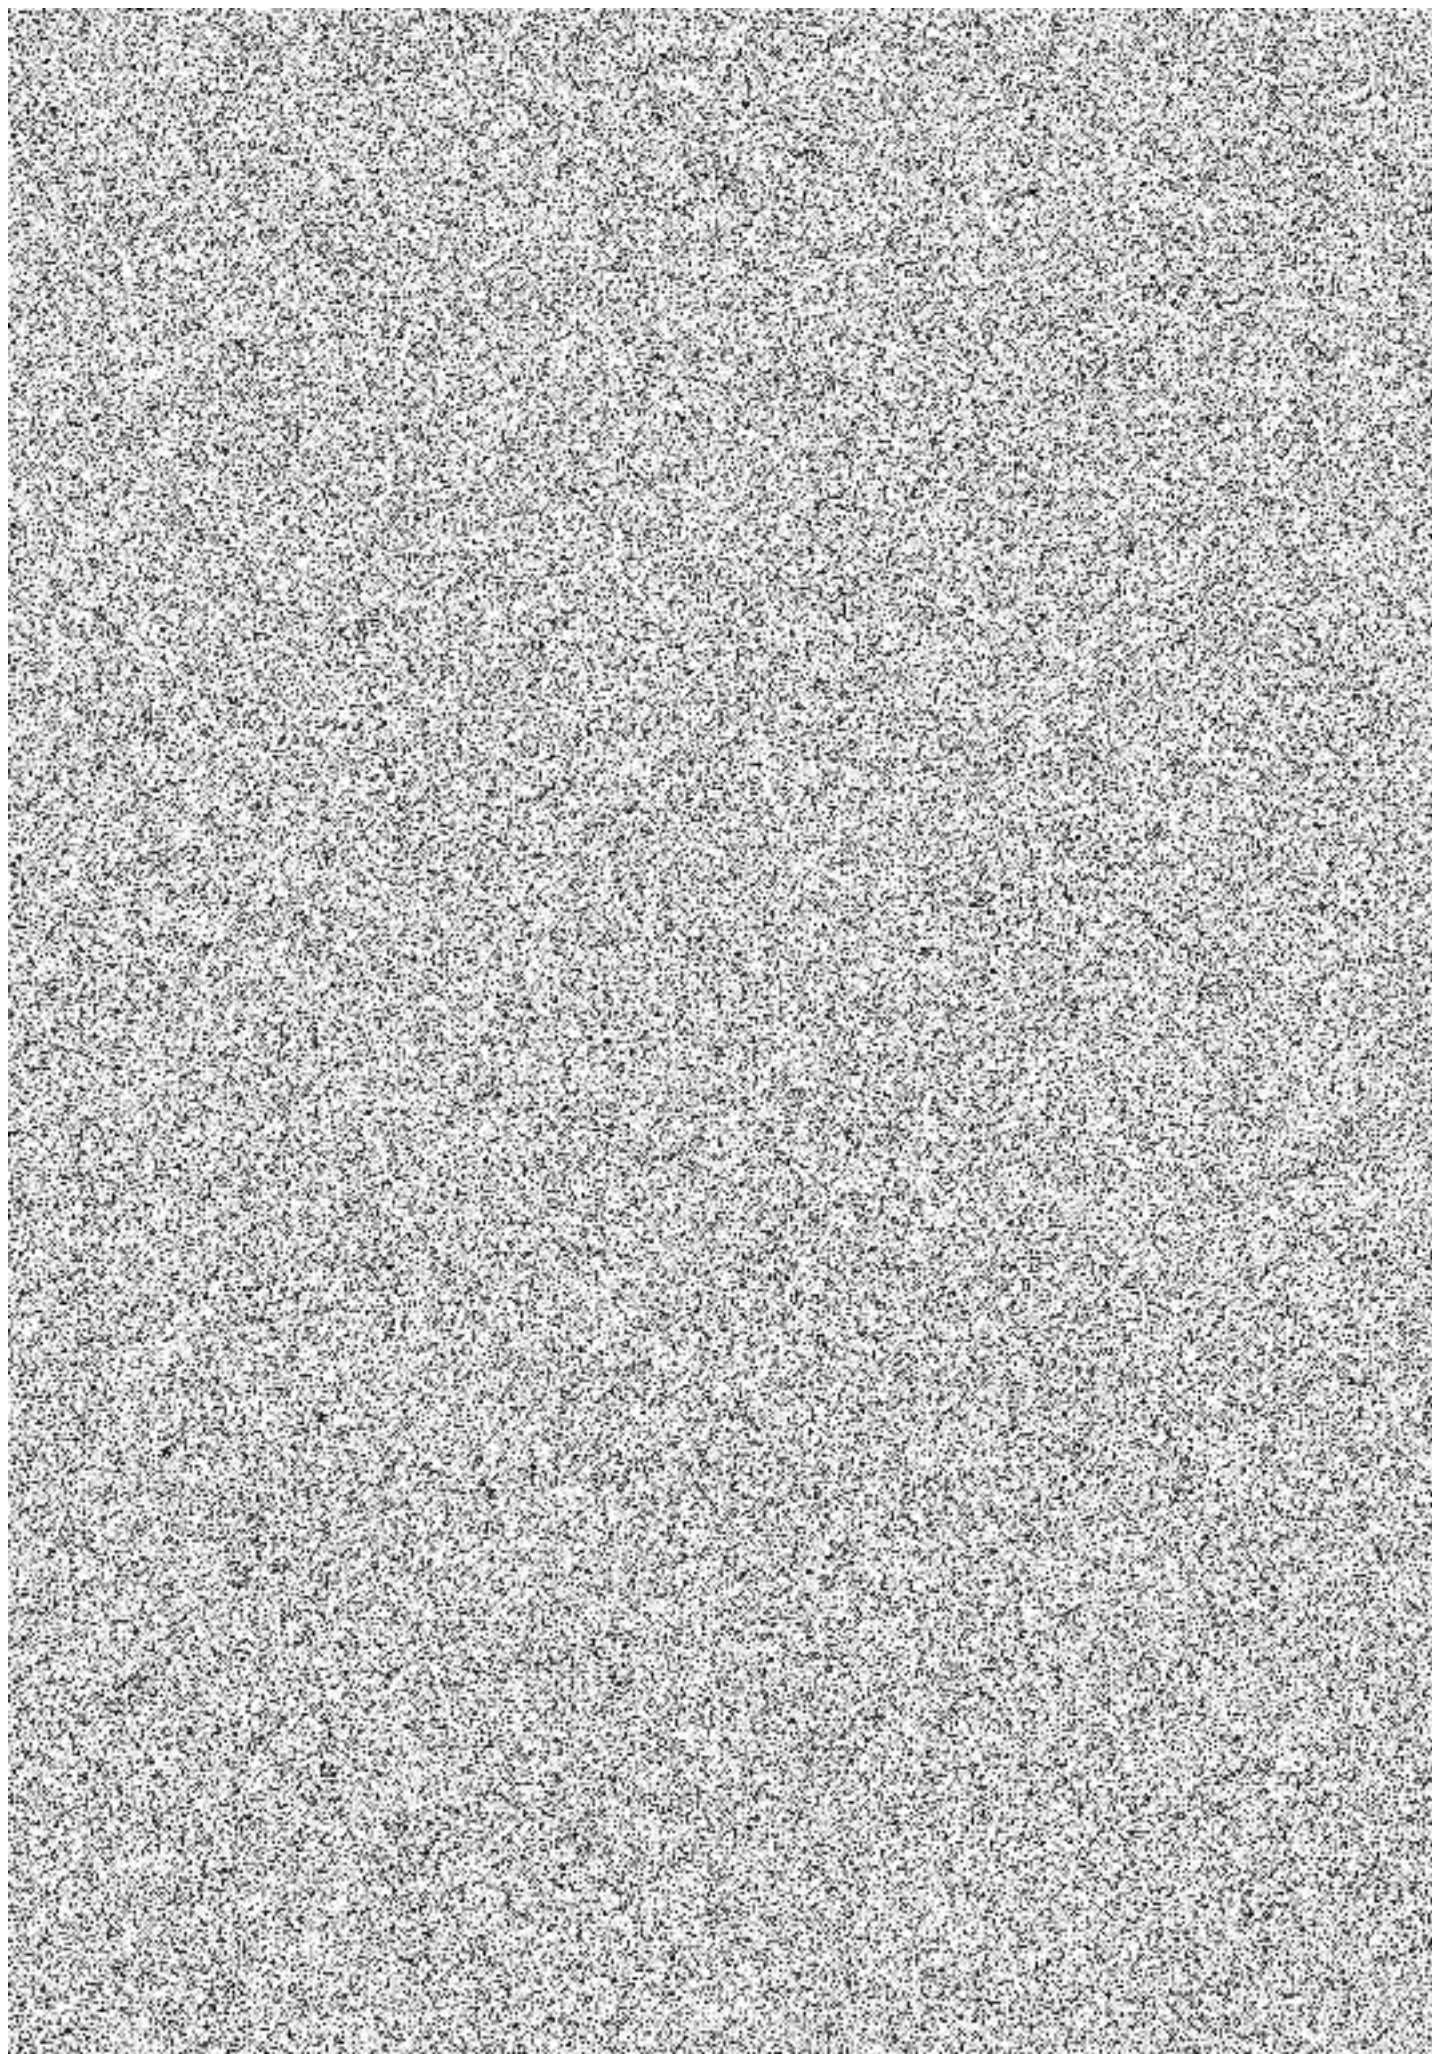

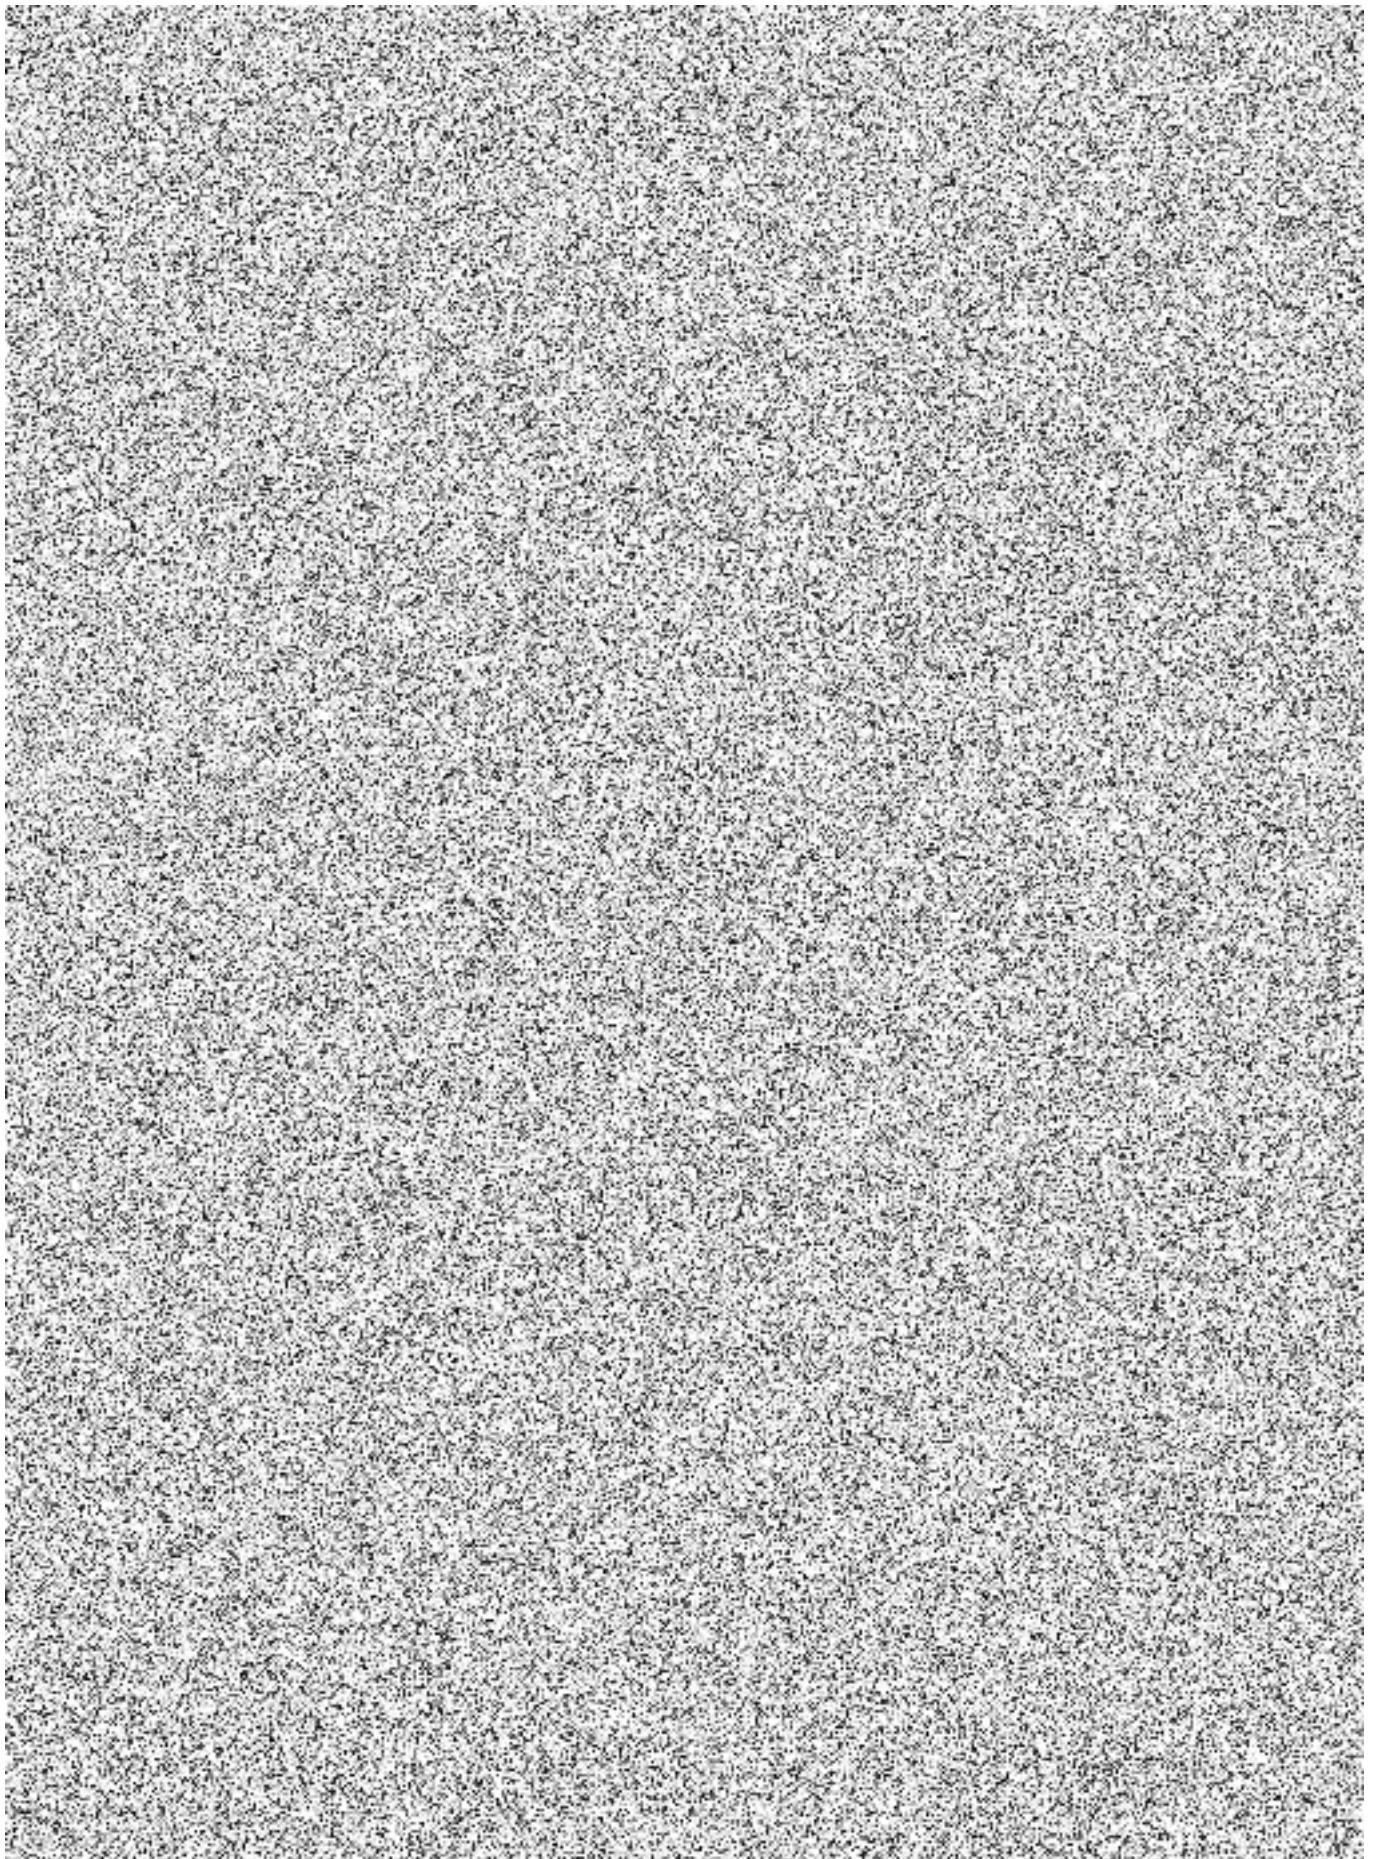

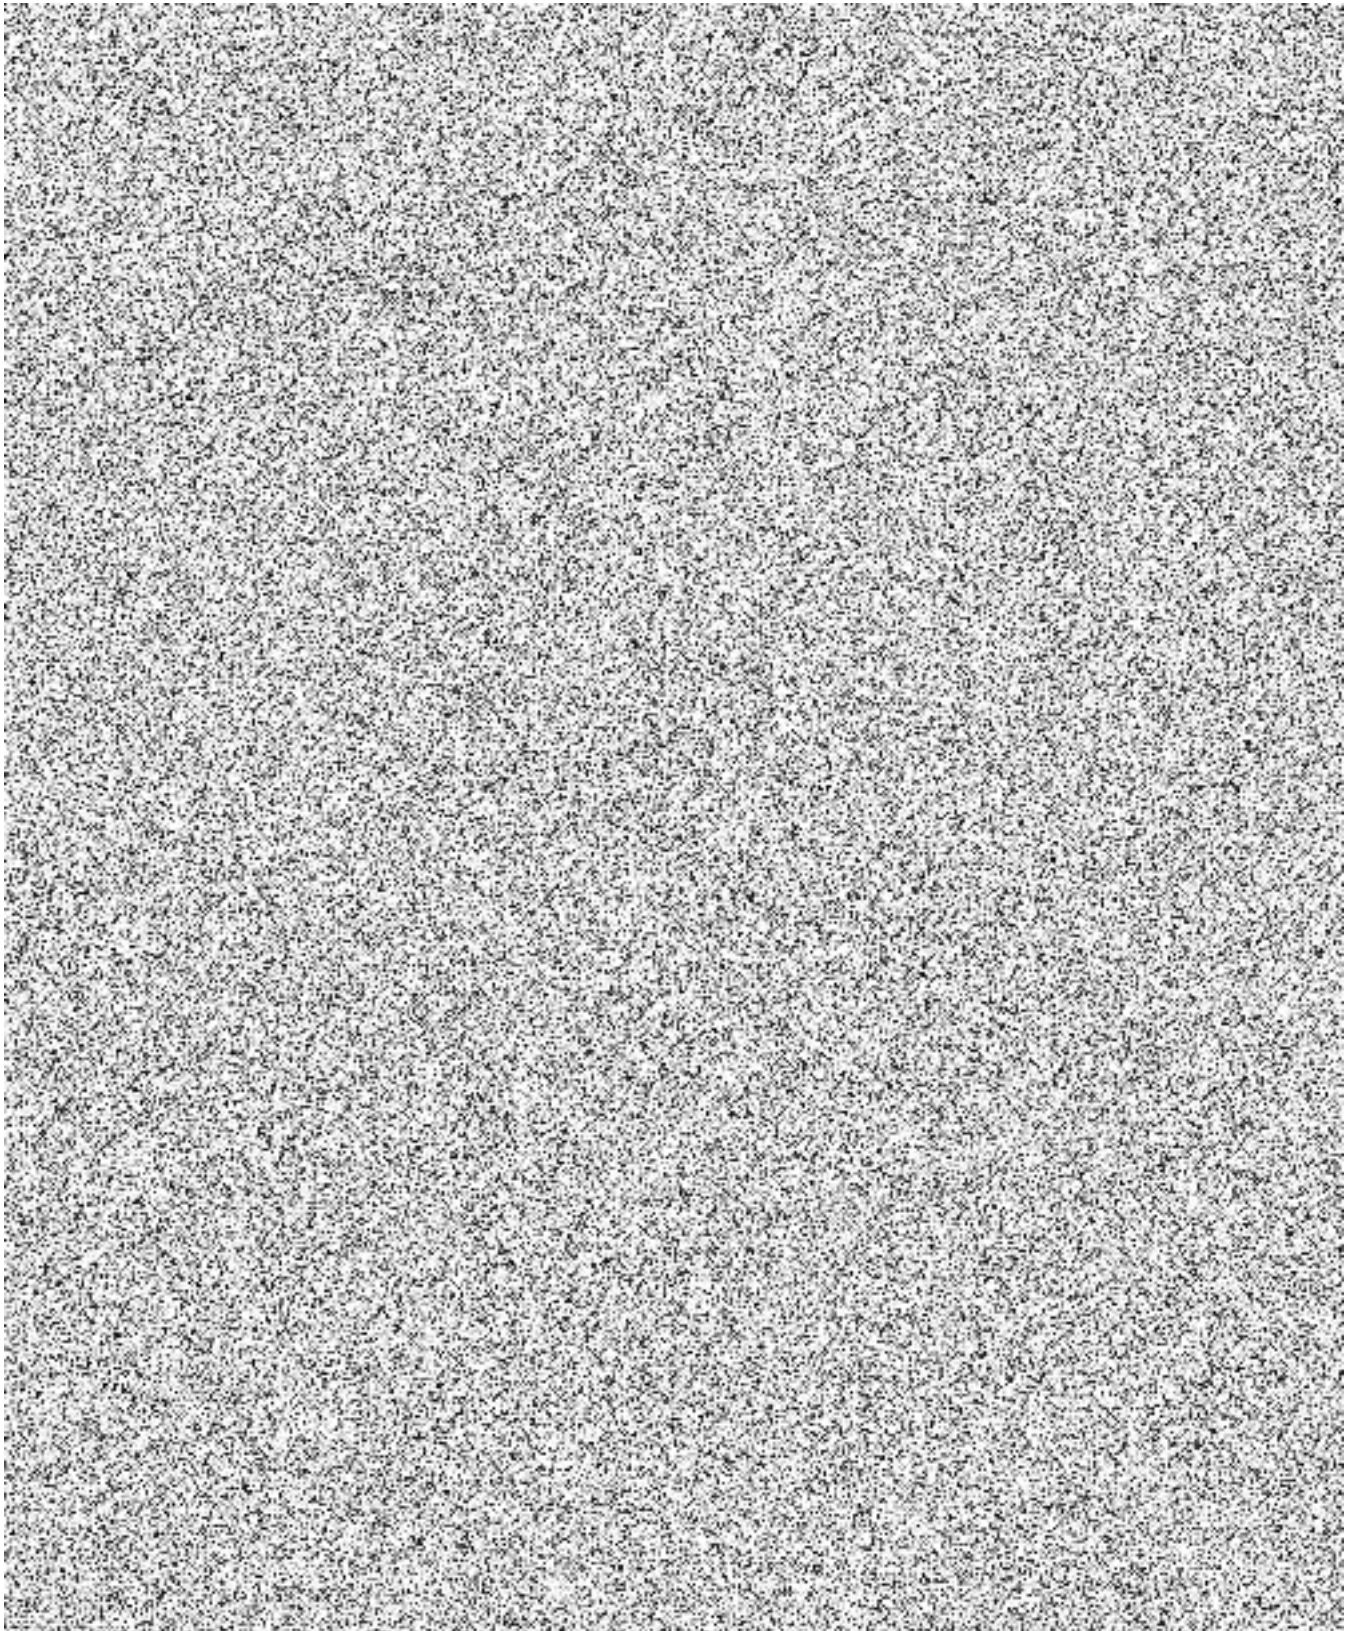

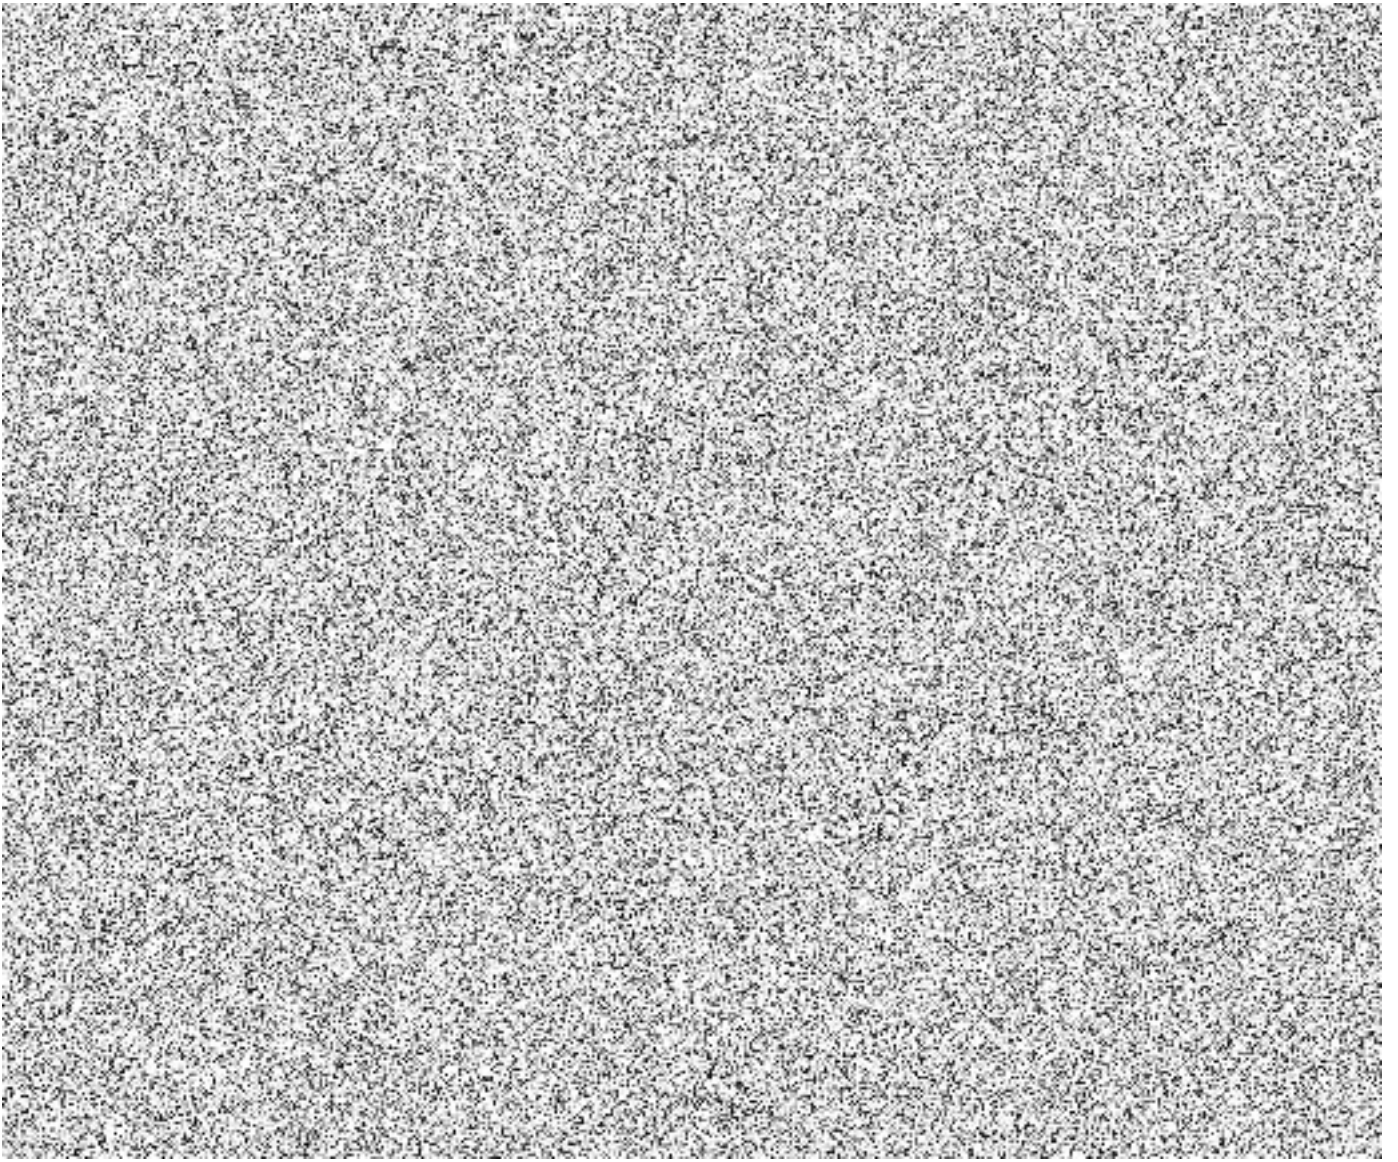

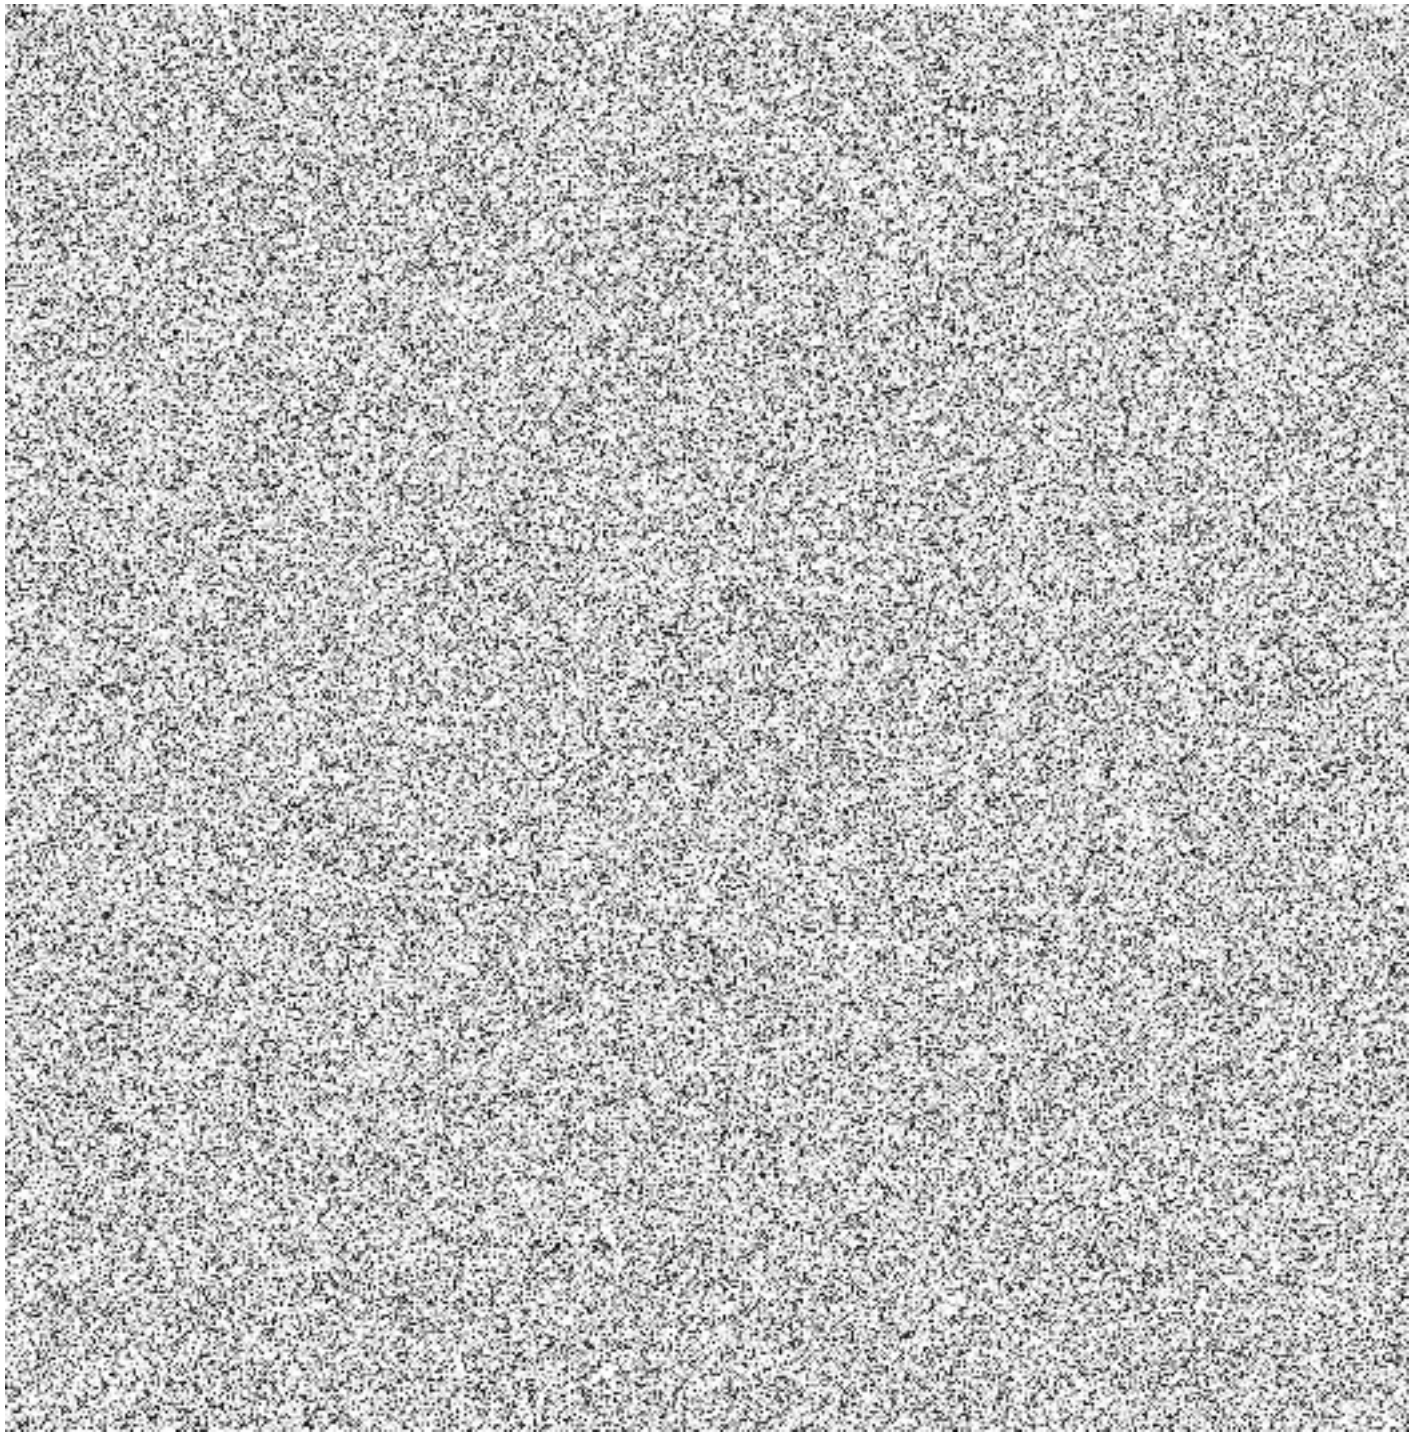

Ekonomická analýza navrhovaných řešení

K standardním funkcionalitě IP budou implementovány následující funkcionality a procesy. Při jednotlivých položkách je uvedena pracnost v MD a také předpokládaný termín pro testování a zpětnou vazbu ze strany Objednatele.

ID požadavku	Název a popis	Pracnost (MD)	Termín pro test
1	Podpora pro "zkrácenou verzi" registrace.	3	10.1.2023
2	Úprava rozcestníku pro vyplnění dalších údajů o cizinci po ověření e-mailu.	1	10.1.2023
3	Formuláře pro registraci Dočasné ochrany (DO) ve dvou variantách.	23	30. 12. 2022
4	Vytvoření nové sekce v DO v profilu cizince.	5	10. 1. 2023
5	Propojení ověření identity v rámci DO s profilem cizince v IP.	8	20. 1. 2023
6	Podpora pro registraci občanů ČR (nové zařazení)	1	20. 1. 2023
7	Nové notifikace (5 událostí)	4	20. 1. 2023
8	Zpracování číselníku škol a validace věku u děti s upozorněním.	3	20. 1. 2023
9	Nová evidence "DO registrace" s přehledem rozpracovaných i dokončených registrací DO.	14	20. 1. 2023
10	Nové agendy rezervací DO včetně úpravy procesu rezervace s výběrem pracoviště na úrovni kraje.	4	20. 1. 2023
11	Nové validace na možnost zrušení termínu, maximální počet termínů pro DO, nutnost poznámky při nevyužitém termínu.	5	20. 1. 2023
12	Zápis informace o registraci DO do CIS a zpracování čísla jednacího.	4	31.1.2023
13	Nová evidence "DO CIS (č.j)" s referencí na registraci DO (vyplněné formuláře).	5	31.1.2023
14	Export statistik dle požadavků Objednatele (seznam cizinců plnících školní docházku).	3	15.2.2023

15	Integrace ověření humanitární adresy vůči HUMPO a s tím spojené notifikace a interní příznak v žádosti.	4	15.2.2023
16	Generování QR kódu a vytvoření veřejného rozhraní pro ověření prodloužení DO.	6	31.1.2023
17	Vytvoření funkcionalit na straně veřejnosti (cizince) bude v CZ variantě s UA alternativou textu.	0	31.1.2023
18	Provedení implementace tak, aby bylo možné spravovat textace polí formuláře a nápověd Objednatelem.	2	20.1.2023
19	Hromadné změny rezervaci - přesun lokality hromadně, změna termínu hromadně (bez validace volných termínů).	4	15.2.2023
20	Rezerva pro další požadavky Objednatele v průběhu testování (při nevyužití nebude účtováno).	10	15.2.2023
	Celkem	109 MD	

Celkovou pracnost dodavatel odhaduje na 109 MD.

V odhadech jsou zahrnuty konzultační a analytické práce a také zapracování změny do Dokumentace.

Dodavatel vytvořil uvedený seznam na základě dodatečné konzultace s Objednatelem nad rámec popisu v poptávce. Pokud není funkcionalita v seznamu zmíněná, tak dodavatel ji nezahrnuje do plnění (příkladem je dotazníkové šetření).

Předpokládaný harmonogram dodání

Termíny zpřístupnění jednotlivých funkcionalit jsou viditelné v přehledová tabulce v sekci Návrh řešení. Níže dodavatel definuje rámcový harmonogram dodání.

Verze k testování a zpětné vazbě k formuláři: 23.12.2022.

Nasazení testovacího procesu registrace a vyplnění formuláře: 10.1.2023.

Kompletní proces se simulovanou funkcionalitou ověření v CIS: 13.1.2023.

Zpracování připomínek a připojení produkční verze CIS: 20.1.2023.

Finální ověření a publikace produkční verze: 31.1.2023.

Dokončení méně prioritních oblastí a akceptace: 15.2.2023

Dodavatel upozorňuje, že potřebuje nevyhnutnou aktivní součinnost Objednatele při testování a poskytnutí rozhraní třetích stran pro naplnění potřebné funkcionality.

Dodavatel potřebuje minimálně 15 dnů od poskytnutí rozhraní třetích stran pro jejich implementaci. V případě nedodání je termín zpřístupnění funkcionality posunut.

Jednotlivé funkcionality bude dodavatel k testování zpřístupňovat co nejdříve s ohledem na potřebu urychlené realizace ze strany Objednatele.

Analýza rizik nově plánovaných rozvojových aktivit

Primární aktiva a základní popis systému IP zůstávají bez změny. Dodavatel neidentifikoval nové hrozby a zranitelnosti, které by nebyly pokryty ve stávající analýze rizik a nastavení systému.

Nad rámec analýzy rizik dle *ISMS 03.01.02.P01 Metodika identifikace a hodnocení aktiv a rizik* si dodavatel dovoluje Objednatele upozornit na následující provozní dopady:

- nadstandardní zátěž systému v důsledku zavedení nové agendy DO,
- publikace služeb v krátkém čase bez postupného uživatelského ověřování může vést ke náporu na kontaktní centrum OAMP,
- riziko posunu spuštění DO v případě neposkytnutí aktivní součinnosti třetích stran (integrace).

Specifikace předpokládaných dopadů na uživatele IP

Dodavatel neidentifikoval žádné zásadní dopady týkající se uživatelů IP.

Přítomnost nové agendy, která je relevantní pouze pro část uživatelů může ovlivnit navigaci a orientaci uživatelů z veřejnosti, kteří hledají standardní (již existující) služby systému.

Interní uživatele (pracovníky OAMP) bude nutné zaškolit a metodicky pokrýt použití nových funkcionalit v oblasti DO.

Výstupy služby, návrh akceptačních kritérií

Ověření jednotlivých funkcionalit v rámci UAT testování.
Vyřešení relevantních připomínek v helpdesk.

Platnost nabídky

Platnost nabídky je do 31.12.2022.

Nabídku vypracoval 
