

**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. objednatele: 16PT-000490/16**  
**č. dodavatele/zhotovitele: D4/17/2017**

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4**

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED] generálním ředitelem

osoba oprávněna jednat ve věci této zakázky: [REDACTED] ředitel Správy Ostrava  
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

**„Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“**

Doručovací adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Správce

**Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8**

IČ 000 14 915

DIČ CZ 000 14 915

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

zastoupena [REDACTED], členem představenstva

[REDACTED] členem představenstva

a

Společník

**SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**

IČ 480 35 599

DIČ CZ 480 35 599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

zastoupena [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu na základě plné moci

a

Společník

**COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9**

IČ 261 77 005

DIČ CZ 26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 65562

zastoupená [REDACTED], ředitelem Divize silničního stavitelství, na základě plné moci

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby Dílo **D48 Rybí - MÚK Rychaltice, ISPROFIN 327 126 7021** bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní

částku ve výši 2 069 023 420,15 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena / Přijátá smluvní částka v Kč bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena / Přijátá smluvní částka v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
<b>D48 Rybí - MÚK Rychaltice</b>	2 069 023 420,15	434 494 918,23	2 503 518 338,38

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel** takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D48 Rybí - MÚK Rychaltice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631154 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)<sup>1</sup>
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)<sup>2</sup>
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
  - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 26. 10. 2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

<sup>1</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a čtyři obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

17. 05. 2017

Datum: \_\_\_\_\_

Datum: 11. 4. 2017

PODEPSÁN

Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: ředitel Správy Ostrava  
za objednatele na základě delegace pravomocí  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: člen představenstva  
za dodavatele/zhotovitele  
**Metrostav a.s.**

PODEPSÁN


Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: člen představenstva  
za dodavatele/zhotovitele  
**Metrostav a.s.**

PODEPSÁN

Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: vedoucí odštěpného závodu  
na základě plné moci  
za dodavatele/zhotovitele  
**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

PODEPSÁN

Jméno: \_\_\_\_\_  
Funkce: ředitel Divize silničního  
stavitelství na základě plné moci  
za dodavatele/zhotovitele  
**COLAS CZ, a.s.**



V Ostravě dne: 17. 03. 2017

Číslo zakázky: 16PT-000490

Vyřizuje: [REDACTED]

„Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Metrostav a.s., divize 4  
Koželužská 2450/4  
180 00 PRAHA 8

### Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

#### „ D48 Rybí - MÚK Rychaltice“

zadávací řízení zahájeno dne 11. července 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 631154, ISPROFIN: 327 126 7021 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 4 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 3, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100 bodů, podaná sdružením uchazečů

#### „Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Správce:

**Metrostav a.s.**, sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, právní forma: akciová společnost, IČO: 00014915

Společník:

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**, sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 48035599

Společník:

**COLAS CZ, a.s.**, sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, právní forma: akciová společnost, IČO: 26177005

Celková nabídková cena uchazeče: 2 069 023 420,15 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, která v hodnocení dosáhla 94,91 bodů, podaná sdružením uchazečů

**Společnost pro D48 Rybí – Rychaltice“**

Správce:

**OHL ŽS, a.s.**, sídlo: Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, právní forma: akciová společnost, IČO: 46342796

Společník:

**Budpol Construction s.r.o.**, sídlo: Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 04694694

Celková nabídková cena uchazeče: 2 192 990 438,41 (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, která v hodnocení dosáhla 93,38 bodů, podaná sdružením uchazečů

**Společnost D48 STRABAG – EUROVIA“**

Správce:

**STRABAG a.s.**, se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, právní forma: akciová společnost, IČO: 60838744

Společník:

**EUROVIA CS, a.s.**, se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město, právní forma: akciová společnost, IČO: 45274924

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, Nové Město

Celková nabídková cena uchazeče: 2 233 413 258,07 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, která v hodnocení dosáhla 81,08 bodů, podaná sdružením uchazečů

**SPOLEČNOST D48 RYBÍ – MÚK RYCHALTICE – HOCHTIEF – BETON TECHNIK – M – SILNICE“**

Vedoucí společník:

**HOCHTIEF CZ a.s.**, se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, právní forma: akciová společnost, IČO: 46678468

Druhý společník:

**BT Beton Technik GmbH**, se sídlem: Hannoversche Str. 23, 315 47 Rehburg – Loccum, Německo, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČO: 233403420023148

Třetí společník:

**M – SILNICE a.s.**, sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice, právní forma: akciová společnost, IČO: 42196868

Celková nabídková cena uchazeče: 2 296 714 122,86 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem „Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Bychalčice“ jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

**Poučení:**

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Ostravě dne 17. 03. 2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

.....  
[redacted]  
ředitel Správy Ostrava  
na základě delegace pravomocí

## DOPIS NABÍDKY

„Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

**NÁZEV STAVBY:** D48 Rybí - MÚK Rychaltice

**PRO:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

**Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:**

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
D48 Rybí - MÚK Rychaltice	2 069 023 420,15	434 494 918,23	2 503 518 338,38

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

**Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:**

<u>Dílčí hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Hodnota</u>
Nabídková cena v Kč bez DPH	90 %	2 069 023 420,15 Kč bez DPH
Délka záruční doby v měsících	10 %	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

3

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – Výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Harmonogram a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)]
  - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
  - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis \_\_\_\_\_

obchodní náměstek divize 4, Metrostav a.s.

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení Metrostav a.s., za Společnost na základě plné moci

Adresa Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Datum 22.11.2016

4



## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Objekt: METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“  
 D48 Rybí - MÚK Rychaltice

Tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.

Číslo Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Adresa a adresa Objednatel	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Adresa a adresa Instalovatele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Adresa a adresa Správce stavby	1.1.2.4 , 1.3	██████████, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Doba pro dokončení Doba	1.1.3.3	48 měsíců
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	43 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelům dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k nabídce níže, (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a (iiii) CB krytu (nestmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Jednotlivé objekty cizích správců (viz část (f) Výkresy; Průvodní zpráva - kap. 7 Stručný technický popis stavby). Dokončená komunikace včetně všech objektů pro jeden směr.
Dílo	1.1.5.8	D48 Rybí - MÚK Rychaltice
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 6.500.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> 1.200.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 250.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce</i> 12.500.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 1.250.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> 2.500.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 250.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
	4.29	Věcný milník: Finanční plnění minimálně 40% z Přijaté smluvní částky za práce provedené dle platného harmonogramu do 24 měsíců od zahájení prací
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem Sekce/části Díla SO 451 SO 452 SO 453 SO 454 SO 456 SO 456.1 SO 461

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		SO 463 SO 464 SO 465 SO 467 SO 462 SO 468 SO 469  je Zadavatelem určená společnost:: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN).
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	10 % Přijaté smluvní částky
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH


Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

V Praze dne 31.10.2016

████████████████████  
Obchodní náměstek divize 4  
Metrostav a.s.  
(za Společnost na základě plné moci)

### D48 Rybí - MÚK Rychaltice

- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace
- (g) Výkresy

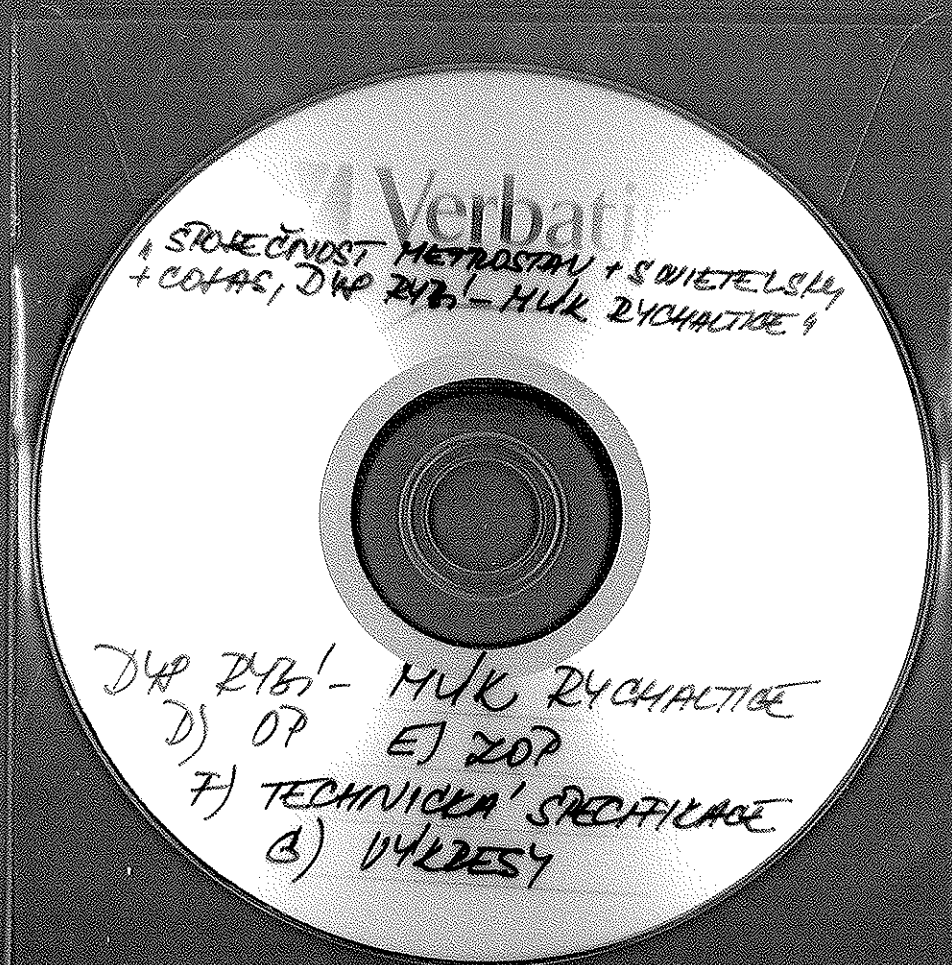

## Soupis objektů

Návrh: 5/15 048 - R48 Rybí – MÚK Rychaltice, VD-ZDS/AD

Varianta: VD-ZDS -

	Odbytová cena [Kč]	2 069 023 420,15
Popis		OC
Vedlejší a ostatní náklady		5 239 423,66
DEMOLICE PROTIHLUKOVÝCH STĚN		1 210 945,42
DEMOLICE OPĚRNÉ STĚNY U LONKY PŘÍBOR		53 982,03
DEMOLICE ZÁRUBNÍ ZDI A PHS VLEVO V K.Ú. RYCHALTICE		1 188 018,09
PŘÍPRAVA ÚZEMÍ		9 976 891,78
SILNICE R48 V KM 21,898 AŽ 27,4		292 382 719,14
ÚPRAVA MELIORACE KÚ KLOKOČOV U PŘÍBORA - VPRAVO		547 951,66
Silnice R48 v km 28,902 - 34,875		315 095 678,36
MÚK Příbor - východ, větve MÚK		16 400 768,56
MÚK Příbor - východ, okružní křižovatka		15 107 938,24
ÚPRAVA MELIORACE KÚ RYBÍ - VPRAVO		353 547,20
SOUBĚŽNÁ SIL. III. TR. - PROPOJENÍ SIL.II/482 A SIL.III/46433		18 890 670,53
ÚPRAVA MELIORACE KÚ KLOKOČOV U PŘÍBORA - VLEVO		353 494,74
Souběžná silnice III. třídy - Propojení silnice III/4825 a silnice III/4806		28 861 205,93
Souběžná silnice III. tř. - propojení sil. III/4806 a sil. II/486		25 344 867,89
SOUBĚŽNÁ SIL.III. TR. - PROPOJENÍ SIL.III/4822 A SIL.III/04823		25 194 578,22
Připojení MK na souběžnou silnici v Klokočově		5 101 696,05
Dopravní značení		27 163 606,32
PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ		7 482 108,76
OPRAVA SILNICE III/46433 V LIBHOŠTI		8 990 362,75
Oprava MK v Příboře		1 400 841,10
ÚPRAVA MELIORACE KÚ LIBHOŠŤ - VPRAVO		505 857,88
PŘELOŽKA SOUBĚŽNÉ POLNÍ CESTY (KM 23.0-25.4 VPRAVO)		13 042 711,54
MOST NA SILNICI R48 PŘES POLNÍ CESTU A VODOTEČ V KM 22.032		272 250 919,78
MOST NA SILNICI R48 PŘES POLNÍ CESTU (MK) V KM 22.764		25 079 089,42
MOST NA SILNICI R48 PŘES VODOTEČ V KM 23.374		6 028 326,31

194

## Soupis objektů

Stavba: 5/15 048 - R48 Rybí – MÚK Rychaltice, VD-ZDS/AD

Varianta: VD-ZDS -

Popis	Odbytová cena [Kč]	OC
MOST NA POLNÍ CESTĚ PŘES VODOTEČ V KM 0.363	5 067 791,48	
MOST NA SILNICI R48 PŘES POLNÍ CESTU V KM 23.478	34 771 669,61	
MOST NA SILNICI R48 PŘES POLNÍ CESTU A VODOTEČ V KM 24.595	68 397 814,19	
MOST NA SILNICI R48 PŘES SILNICI III/4822 A SEDLNICI V KM 2	109 534 105,84	
MOST NA SILNICI R48 PŘES VODOTEČ V KM 26.463	4 125 997,21	
Podchod pro pěší pod silnicí R48 v km 29,172	4 024 555,50	
Most na sil. R48 přes silnici II/58 v km 29,563	41 041 029,98	
Most na sil. R48 - přes trať ČD v km 29,676	47 287 329,49	
MOST NA SILNICI R48 PŘES PŘES ŘEKU LUBINU V KM 29.998	105 613 028,26	
MOST NA SILNICI R48 PŘES MÍSTNÍ KOMUNIKACI V KM 30.192	32 175 852,04	
Most na souběžné silnici III. třídy přes silnici R48 v km 30,777	29 368 123,55	
Most na sil. R48 - ekomost v km 33,900	23 059 192,67	
Most na silnici III. tř. přes potok Klenos v km 0,370	9 993 038,68	
Most na silnici R48 přes potok Klenos v km 30,955	6 078 382,35	
MOST NA SILNICI R48 PŘES VODOTEČ V KM 31.833	1 568 776,98	
MOST NA SILNICI III. TR. PŘES VODOTEČ	937 355,50	
MOST NA SIL. R48 - PŘES SILNICI III/4806	35 756 587,38	
Most na silnici R48 přes vodoteč v km 33,800	4 821 579,30	
Most na souběžné silnici přes vodoteč v km 1,170	3 909 738,89	
MOST NA SOUBĚŽNÉ SILNICI III. TŘÍDY PŘES SEDLNICI	3 317 535,34	
ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 22,244-22,590 VLEVO	8 260 317,79	
ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 22,875-23,140 VPRAVO	6 823 803,51	
ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 22,460-22,590 VPRAVO	2 559 832,34	
ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 23,790-23,950 VPRAVO	2 419 109,78	
ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 25,370-26,630 VPRAVO	6 140 043,66	
ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 24,090-24,390 VPRAVO	4 551 156,72	
ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 26,980-27,170 VPRAVO	2 882 076,07	
OPĚRNÁ ZEĎ V KM 29,500-29,550 VPRAVO	1 254 270,10	

1095



## Soupis objektů

Stavba: 5/15 048 - R48 Rybí – MÚK Rychaltice, VD-ZDS/AD

Varianta: VD-ZDS -

Odbytová cena [Kč] 2 069 023 420,15

Popis	OC
OPĚRNÁ ZEĎ V KM 29.835-29.950 VLEVO	9 513 949,73
OPĚRNÁ ZEĎ U LONKY PŘÍBOR V KM 30,05-30,20 A 30,23-30,32 VL	33 714 135,41
ZÁRUBNÍ ZEĎ V KM 34.020-34.710 VPRAVO	18 497 912,13
ZÁRUBNÍ ZEĎ V.KM 34.230-34.650 VLEVO	13 548 258,12
Zárubní zeď - rampa D MÚK Příbor - východ	10 568 113,90
PHS v km 22,08 - 22,26 vlevo	1 349 660,73
PHS v km 22,59 - 23,15 vlevo	8 231 126,40
PHS v km 23,15 - 23,91 vlevo	12 588 828,36
PHS v km 23,91 - 24,11 vlevo	2 791 233,03
PHS v km 24,38 - 25,40 vlevo	19 770 822,03
PHS v km 25,60 - 26,18 vlevo	8 441 292,36
PHS v km 29,075 - 29,53 vpravo	10 035 501,46
PHS v km 29,75 - 30,17 vpravo	4 650 229,51
PHS v km 29,95 - 30,77 vlevo	10 423 188,14
PHS v km 32,44 - 32,80 vpravo	4 577 724,82
PHS v km 34,63 - 34,80 vpravo	2 642 959,88
PHS v km 34,63 - 34,81 vlevo	2 631 228,44
ODVODNĚNÍ SILNICE R48 V KM 21,900 až 27,400	48 611 775,96
ODVODNĚNÍ SILNICE R48 V KM 28,900 až 34,875	38 608 230,30
ÚPRAVA KANALIZACE ČSPH LIBHOŠŤ	17 573,37
PŘELOŽKA VODOVODU V KM 30,200	400 694,29
ÚPRAVA POTOKA V LIBHOŠTI	39 401,49
VENKOVNÍ VEDENÍ 22KV, VN 239, KM 23,340 - ÚPRAVA TRASY	278 112,07
VENKOVNÍ VEDENÍ 22 KV, VN 74, KM 29,270 - ÚPRAVA TRASY	297 247,45
KABELOVÉ VEDENÍ 22KV, VN 48, PŘÍBOR-LUBINA, KM 30,0320-PŘELOŽKA	112 672,20
VENKOVNÍ VEDENÍ 22 KV, VN 48, KM 30,900 - PŘELOŽKA	883 273,02
VENKOVNÍ VEDENÍ 22 KV, VN 05, KM 31,000 AŽ 31,440 - PŘELOŽKA	990 554,17
Kabelové vedení ČD 6kV žkm 11,8-ochrana trasy v km 29,650	74 822,44

196

## Soupis objektů

Stavba: 5/15 048 - R48 Rybí – MÚK Rychaltice, VD-ZDS/AD

Varianta: VD-ZDS -

Odbytová cena [Kč]

2 069 023 420,15

Objekt	Popis	OC
0401	Venkovní a kabelové vedení NN - rekonstrukce stáv. příp.	94 594,50
0405	kabelové vedení NN, Příbor, km 29,590 přeložka	127 437,04
0406	Kabelové vedení NN, Příbor, B. Němcové, km 30,200 přeložka	127 643,95
0407	Venkovní vedení NN, Příbor, samota, km 30,900 demontáž	177 957,19
0408	Venkovní vedení NN, Rychaltice, km 34,7 - úprava trasy	551 097,20
0409	Osvětlení podchodu Příbor, I. Olbrachta, km 29,170 úprava	99 199,22
0410	Osvětlení podchodu Příbor, B. Němcové, km 30,200 přeložka	83 293,91
0411	Osvětlení autobus. zastávek, km 32,500 přeložka	209 441,90
0412	VO, Rychaltice, km 34,620 - přeložka	64 773,98
0413	Ochrana kabelů DOK a DK(ČT a ČEZ net),km 21,980	326 930,38
0414	Ochrana trasy DK (ČT) km 22,500	575 463,63
0415	Přeložka kabelů DOK a DK (ČT a ČEZnet)km 23,04-24,5	3 325 632,75
0416	Přeložka DK Ostrava - Příbor (ČT) km 29,550	235 431,41
046.1	Úprava trasy DOK (ČT a ČEZnet) km 32,900	145 123,03
046	Úprava trasy DOK (ČT a ČEZnet),km 32.900	266 245,31
046.1	Úprava trasy OK Přerov-F.Místek km0,067a0,433 sil.IIIř.C115	302 855,47
046.2	Úprava trasy OK Přerov-F.Místek km0,013 a polní cesty C 171	224 278,21
046.1	Přeložka trasy OK Přerov-F.Místek,km 23,240-24,480 R48	2 250 729,29
046	Úprava trasy OK Přerov-F.Místek km0,513 sil.IIIř.Borovec-Př	382 389,54
0461	Nadzemní telefonní vedení Libhošť, km 22,150 přeložka	239 346,09
0462	Telefonní kab.vedení Libhošť(Benzina) km 23,510 přeložka	248 104,01
0463	Telefonní kab.vedení Libhošť(samota) km 27,0 - 27,3 přeložka	265 710,85
0464	Telefonní kab.vedení Příbor,Masarykova,km 29,190 ochrana trasy	109 743,24
0465	Telefonní kab.vedení Příbor,Ostravská, km 29,590 ochrana trasy	121 463,42
0467	Telefonní kab.vedení Příbor,B.Němcové km 30,200 přeložka	228 141,36
0468	Telefonní kab.vedení Rychaltice, přípojka č.p.50 demontáž	15 930,26
0469	Telefonní kab.vedení Rychaltice, MK km 34,720 ochrana	117 063,50
0471	Ochrana kabelové trasy DOK TRANGASU v km.0,250 souběžné sil	64 231,42
0491	SYSTÉM SOS - kabelové vedení	7 911 743,12

## Soupis objektů

Stavba: 5/15 048 - R48 Rybí – MÚK Rychaltice, VD-ZDS/AD  
 Varianta: VD-ZDS -

Odbytová cena [Kč]

2 069 023 420,15

Objekt	Popis	OC
0001	Systém SOS – hlásky	6 860 262,62
0002	Systém SOS – meteostanice	5 321 771,58
0003	SYSTÉM SOS - kabelové šachty a prostupy	1 348 301,54
0004	SYSTÉM SOS - trubky pro optické kabely	2 672 160,39
0005	SYSTÉM SOS - automatické sčítače dopravy	2 389 861,52
0006	SYSTÉM SOS - optický kabel	1 211 601,34
0007	Systém SOS – dispečinky	1 482 130,06
0008	Ochrana VVTL plynovodu DN 500 ev.č.631 107	496 683,02
0009	Ochrana VTL plynovodu DN 500	161 651,62
0010	Přeložka VTL plynovodu DN 300 č. 632 039	166 543,37
0011	Přeložka VTL plynovodu DN 300 č. 632 039	4 849 964,80
0012	Přeložka VTL přípojka k RS DN 100 ev.č. 632 074	2 946 391,85
0013	Přeložka VTL plynovodu DN 300 ev.č. 633 016	3 761 498,72
0014	Prodloužení chráničky DN 400 VTL plynovodu DN 200 č.822 668	103 438,87
0015	Přeložka STL plynovodu PE 63 Rychaltice	129 463,13
0016	OPLOCENÍ	9 817 847,12
0017	OPLOCENÍ	192 014,27
0018	Vegetační úpravy R48 v km 21,898 - 27,400	1 774 802,15
0019	Vegetační úpravy R48 v km 28,902 - 34,875	2 281 299,71
0020	Vegetační úpravy podél sil. III.tř. (C 115, C 116, C 118)	919 818,45
0021	Vegetační úpravy podél sil. III.tř. (C 117)	398 392,32
0022	Vegetační úpravy podél polní cesty (C 171)	202 706,67
0023	Vegetační úpravy podél MK (C 123)	67 537,17
0024	Rekultivace stávajících komunikací	7 296 465,90

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.2**  
**ZÁVAZEK INTEGRITY**

Městská část Praha 8, Na Pankráci 56, Praha 4

Kotoluzská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915

Podle ustanovení § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že jsme se v souvislosti s ochranou hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavíráme žádnou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D48 Rybí - MÚK Rychaltice“, ev. č. 631154 (dále „Veřejná zakázka“).

Prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, ani žádný jiný člen s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem a s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (dále „zakázané praktiky“) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku. Prohlašujeme, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik jakékoli osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Při úspěšném zadávacím řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti této „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, která bude mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k dodržení tohoto závazku.

Prohlašujeme, že během my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během nepřímých předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, včetně nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Prohlašujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

**plakárství (Corrupt practice)** znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepřípustné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky

124

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 21.10.2016

---

člen představenstva  
Metrostav a.s.

---

člen představenstva  
Metrostav a.s.

125

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.2**  
**ZÁVAZEK INTEGRITY**

**Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**

**Společnost: SWIETELSKY stavební s.r.o.,**

**sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,**

**IČ: 480 35 599,**

**zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,**

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D48 Rybí - MÚK Rychaltice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631154 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Ble

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Brně, dne 19.10.2016

vedoucí o.z. Dopravní stavby Morava  
SWIETELSKY stavební s.r.o.  
(na základě plné moci)

127

## DÍL 1, ČÁST 4 FORMULÁŘ 4.4.2 ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „D48 Rybí - MÚK Rychaltice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631154 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky



nebo realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

**Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonekvenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnícké osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 18.10.2016

COLAS CZ, a.s.

obchodní ředitel, na základě plné moci

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.5**  
**ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU**

„Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Název veřejné zakázky: **D48 Rybí - MÚK Rychaltice**

Společnost Metrostav a.s.,  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,  
IČ: 00014915,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D48 Rybí - MÚK Rychaltice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631154 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

<b>Materiál</b>	<b>Množství</b>	<b>Jednotková cena</b>
Asfaltové směsi frézované a vybourané	125 900 t	117 Kč/t
Kamenné obrubníky	1000 m	399 Kč/bm
Ostatní ocel (svodidla, zábradlí)	930 t	za cenu šrotu
Mímolesní zeleň, z toho	7 337 ks	
- dřevo měkké		250 Kč/m <sup>3</sup> (plnometr)
- dřevo tvrdé		550 Kč/ m <sup>3</sup> (plnometr)
Štěpkový materiál	Skutečně zjištěné množství v průběhu realizace stavby	230 Kč/ m <sup>3</sup>

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené v tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Praze dne 31.10.2016

\_\_\_\_\_  
[REDACTED]  
Obchodní náměstek divize 4  
Metrostav a.s.  
(za Společnost na základě plné moci)

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.6**  
**HARMONOGRAM A ROZDĚLENÍ PRACÍ**

„Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Společnost Metrostav a.s.,  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,  
IČ: 00014915,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D48 Rybí - MÚK Rychaltice, e<sup>2</sup> dle Věstníku veřejných zakázek 631154 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: viz. příloha,
2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.
3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky:
  - **Pokládka cementobetonového krytu v rozsahu dle dílu 5 Zadávací dokumentace – Výkresy.**

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídka specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Přeložky SEK	Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 Žižkov	0,23 %	Viz. příloha
CELKEM %			

Nhoda uvedených subdodavatelů se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny.

V Praze dne 31.10.2016

\_\_\_\_\_  
Obchodní náměstek divize 4  
Metrostav a.s.  
(za Společnost na základě plné moci)

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.

## D48 Rybí – Rychaltice – postup prací

Stavba je rozdělena na dva samostatné úseky:

- úsek R 48 v km 21,900 – 27,455 (C 103)
- úsek R 48 v km 28,902 – 34,875 (C 104)

V prostoru stávající „MÚK Příbor – západ“, tj. v km 27.455 – 28.902 byla komunikace realizována v rámci stavby Příbor - obchvat.

Oba úseky je možno stavět samostatně a není rozhodující z hlediska postupu výstavby, který se musí stavět dříve. Lze je stavět i současně, ale s ohledem na délku stavby je doporučeno budování postupně.

Obecně pro oba úseky platí:

- stavba bude prováděna za ponechání provozu na stávající silnici
- doprava bude vedena v 1 jízdním pruhu pro každý směr
- doprava bude vedena v polovině, která se nerozšiřuje
- po provedení rozšíření vozovky A středního dělicího pruhu se doprava převede na tuto novou polovinu a dobuduje se polovina druhá.

V jednotlivých úsecích jsou navrženy vždy 3 fáze:

- fáze přeložky inženýrských sítí K uvolnění území pro stavbu A provedení nových souběžných komunikací
- fáze rozšíření silničního tělesa 1. poloviny komunikace
- fáze oprava a případné rozšíření 2. poloviny komunikace

Stávající MÚK budou postupně uzavírány a rekultivovány. MÚK Příbor – východ bude přebudována v 2. a 3. fázi. S ohledem na to, že se vozovka rozšiřuje postupně vlevo a vpravo je nutné provizorním dopravním značením převést dopravu na opačnou polovinu.

Jde o tyto staničení:

- 21,800 – 21,900
- 22,500 – 22,650
- 27,300 – 27,400
- 28,800 – 28,900
- 31,400 – 31,500
- 34,800 – 34,900

Mosty budou realizovány samostatně pro každý směr jízdy a vždy spolu s výstavbou silnice. Rovněž kanalizace bude budována v koordinaci se silnicí.

Během stavby budou silnice III. třídy a obslužné komunikace využívány stavbou pouze pro příjezd na staveniště. Bude proveden pasport silnic před stavbou a po stavbě se provede oprava používaných komunikací.

Staveniště je přístupné ze stávajících silnic I/48, II/462, II/486, III/46433, III/4822, III/46432, III/04825, III/4806 a III/4863.


Dále budou využity místní komunikace v Příboře a to v části podchodu do Prchalova, u Lubiny a u areálu Skarab (dříve Lonka) Příbor. V Libhošti pak polní cesta podél silnice I/48 a polní cesty za Příborem až do Rychaltic.

K omezení veřejné hromadné dopravy nedojde, pouze je nutné přemístění zastávky ze zrušené větve MÚK Hájev na souběžnou silnici. Během výstavby bude zastávka provizorní.

Ornice pro ohumusování svahů zemního tělesa a terénní úpravy bude získána ze skryvek ornice ze ZPF v katastrálním území Libhošť.

117

# Schéma zařízení staveniště

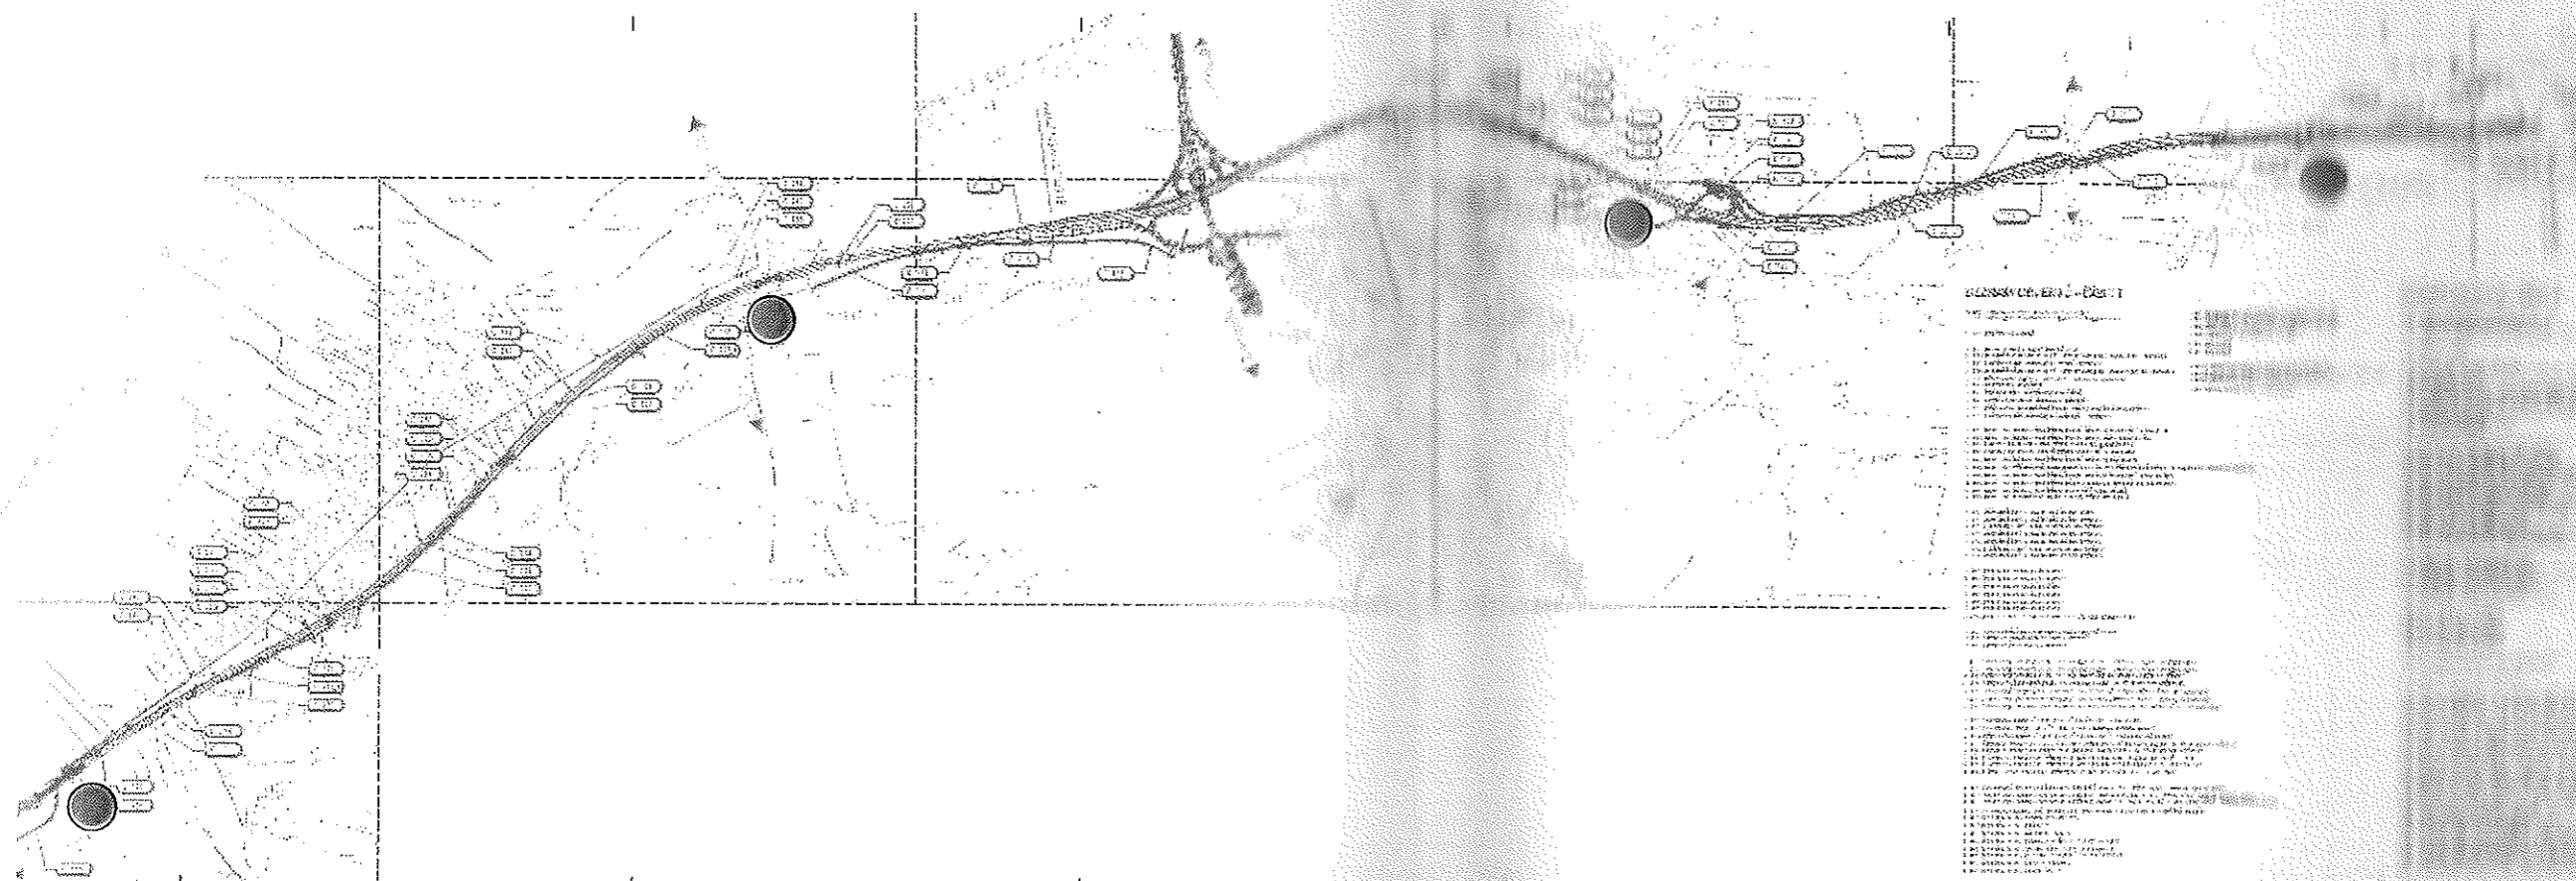

## LEGENDA

- 1. Stavenišťové zařízení
- 2. Stavenišťové zařízení
- 3. Stavenišťové zařízení
- 4. Stavenišťové zařízení
- 5. Stavenišťové zařízení
- 6. Stavenišťové zařízení
- 7. Stavenišťové zařízení
- 8. Stavenišťové zařízení
- 9. Stavenišťové zařízení
- 10. Stavenišťové zařízení
- 11. Stavenišťové zařízení
- 12. Stavenišťové zařízení
- 13. Stavenišťové zařízení
- 14. Stavenišťové zařízení
- 15. Stavenišťové zařízení
- 16. Stavenišťové zařízení
- 17. Stavenišťové zařízení
- 18. Stavenišťové zařízení
- 19. Stavenišťové zařízení
- 20. Stavenišťové zařízení
- 21. Stavenišťové zařízení
- 22. Stavenišťové zařízení
- 23. Stavenišťové zařízení
- 24. Stavenišťové zařízení
- 25. Stavenišťové zařízení
- 26. Stavenišťové zařízení
- 27. Stavenišťové zařízení
- 28. Stavenišťové zařízení
- 29. Stavenišťové zařízení
- 30. Stavenišťové zařízení
- 31. Stavenišťové zařízení
- 32. Stavenišťové zařízení
- 33. Stavenišťové zařízení
- 34. Stavenišťové zařízení
- 35. Stavenišťové zařízení
- 36. Stavenišťové zařízení
- 37. Stavenišťové zařízení
- 38. Stavenišťové zařízení
- 39. Stavenišťové zařízení
- 40. Stavenišťové zařízení
- 41. Stavenišťové zařízení
- 42. Stavenišťové zařízení
- 43. Stavenišťové zařízení
- 44. Stavenišťové zařízení
- 45. Stavenišťové zařízení
- 46. Stavenišťové zařízení
- 47. Stavenišťové zařízení
- 48. Stavenišťové zařízení
- 49. Stavenišťové zařízení
- 50. Stavenišťové zařízení

● Zařízení staveniště





RDS - Rychlost		Postup výstavby: (měs)		
Zaměření výstavby, technologických činností		Rok:		
Zaměření předávání RDS, TP a VTD		Měsíc:		
	Délka výstavby	Zahájení	Ukončení	
<b>0 170</b>	<b>SOUBĚŽNÁ SILNICE, PŘIPOJENÍ SILNICE III/4822 A SILNICE III/04823</b>	274 dní	01.03.2017	30.11.2017
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Stavební práce	274 dní	01.03.2017	30.11.2017
<b>0 170.1</b>	<b>Průjezd MK na souběžnou silnici v Klokočově</b>	274 dní	01.03.2017	30.11.2017
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Stavební práce	243 dní	01.04.2017	30.11.2017
<b>0 171</b>	<b>Dopravní značení</b>	1186 dní	01.09.2017	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	29 dní	01.09.2017	30.09.2017
	Předání technologického předpisu	29 dní	01.09.2017	30.09.2017
	Stavební práce	1186 dní	01.09.2017	30.11.2020
<b>0 172</b>	<b>PROVIZORNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</b>	1460 dní	01.03.2017	28.02.2021
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Stavební práce	1460 dní	01.03.2017	28.02.2021
<b>0 171</b>	<b>OPRAVA SILNICE III/46433 V LIBHOŠTI</b>	121 dní	01.03.2017	30.06.2017
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Stavební práce	121 dní	01.03.2017	30.06.2017
	Oprava MK v Příboře	60 dní	01.08.2020	30.09.2020
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.08.2020	31.08.2020
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.08.2020	31.08.2020
	Stavební práce	60 dní	01.08.2020	30.09.2020
<b>0 171</b>	<b>PŘELOŽKA SOUBĚŽNÉ POLNÍ CESTY (KM 23.0-25.4 VPRAVO)</b>	274 dní	01.03.2017	30.11.2017
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	274 dní	01.03.2017	30.11.2017
<b>0 171.1</b>	<b>OPRAVA MELIORACE KÚ LIBHOŠŤ - VPRAVO</b>	121 dní	01.03.2017	30.06.2017
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	121 dní	01.03.2017	30.06.2017
<b>Objekty řady 200</b>		1370 dní	01.03.2017	30.11.2020
<b>C 201</b>	<b>MOST NA SILNICI R48 PŘES POLNÍ CESTU A VODOTEČ V KM 22.03</b>	1156 dní	01.10.2017	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	122 dní	01.10.2017	31.01.2018
	Předání technologického předpisu	89 dní	01.12.2017	28.02.2018
	Předání výrobně-technické dokumentace		01.01.2018	31.03.2018
	Stavební práce	1005 dní	01.03.2018	30.11.2020
<b>C 232</b>	<b>MOST NA SILNICI R48 PŘES POLNÍ CESTU (MK) V KM 22.764</b>	974 dní	01.04.2018	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	90 dní	01.04.2018	30.06.2018
	Předání technologického předpisu	91 dní	01.05.2018	31.07.2018
	Předání výrobně-technické dokumentace		01.06.2018	31.08.2018
	Stavební práce	852 dní	01.08.2018	30.11.2020
<b>C 233.1</b>	<b>MOST NA SILNICI R48 PŘES VODOTEČ V KM 23.374</b>	943 dní	01.03.2017	30.09.2019
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Předání výrobně-technické dokumentace		01.04.2017	30.04.2017
	Stavební práce	912 dní	01.04.2017	30.09.2019
<b>C 233.2</b>	<b>MOST NA POLNÍ CESTĚ PŘES VODOTEČ V KM 0.363</b>	943 dní	01.03.2017	30.09.2019
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Předání výrobně-technické dokumentace		01.04.2017	30.04.2017
	Stavební práce	912 dní	01.04.2017	30.09.2019
<b>C 234</b>	<b>MOST NA SILNICI R48 PŘES POLNÍ CESTU V KM 23.478</b>	1156 dní	01.10.2017	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	122 dní	01.10.2017	31.01.2018
	Předání technologického předpisu	89 dní	01.12.2017	28.02.2018
	Předání výrobně-technické dokumentace		01.01.2018	31.03.2018
	Stavební práce	1005 dní	01.03.2018	30.11.2020
<b>C 236</b>	<b>MOST NA SILNICI R48 PŘES POLNÍ CESTU A VODOTEČ V KM 24.591</b>	1156 dní	01.10.2017	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	122 dní	01.10.2017	31.01.2018
	Předání technologického předpisu	89 dní	01.12.2017	28.02.2018
	Předání výrobně-technické dokumentace		01.01.2018	31.03.2018
	Stavební práce	1005 dní	01.03.2018	30.11.2020
<b>C 238</b>	<b>MOST NA SILNICI R48 PŘES SILNICI III/4822 A SEDLNICI V KM 2</b>	1156 dní	01.10.2017	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	122 dní	01.10.2017	31.01.2018
	Předání technologického předpisu	89 dní	01.12.2017	28.02.2018
	Předání výrobně-technické dokumentace		01.01.2018	31.03.2018







D40 Rybí - Rychaltice			Postup výstavby: (měs)	
Harmonogram výstavby, technologických činností			Rok:	
Harmonogram předávání RDS, TP a VTD			Měsíc:	
Objekt	Popis	Délka výstavby	Zahájení	Ukončení
	Stavební práce	91 dní	01.03.2019	31.05.2019
0 202	PHS v km 22,59 - 23,15 vlevo	182 dní	01.06.2020	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.06.2020	31.07.2020
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.06.2020	31.07.2020
	Stavební práce	152 dní	01.07.2020	30.11.2020
0 203	PHS v km 23,15 - 23,91 vlevo	182 dní	01.04.2020	30.09.2020
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.04.2020	31.05.2020
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.04.2020	31.05.2020
	Stavební práce	152 dní	01.05.2020	30.09.2020
0 204	PHS v km 23,91 - 24,11 vlevo	182 dní	01.06.2020	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.06.2020	31.07.2020
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.06.2020	31.07.2020
	Stavební práce	152 dní	01.07.2020	30.11.2020
0 205	PHS v km 24,38 - 25,40 vlevo	274 dní	01.03.2020	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.03.2020	30.04.2020
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.03.2020	30.04.2020
	Stavební práce	243 dní	01.04.2020	30.11.2020
0 206	PHS v km 25,60 - 26,18 vlevo	152 dní	01.03.2020	31.07.2020
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.03.2020	30.04.2020
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.03.2020	30.04.2020
	Stavební práce	121 dní	01.04.2020	31.07.2020
C 288	PHS v km 29,075 - 29,53 vpravo	183 dní	01.05.2020	31.10.2020
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.05.2020	30.06.2020
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.05.2020	30.06.2020
	Stavební práce	152 dní	01.06.2020	31.10.2020
C 289	PHS v km 29,75 - 30,17 vpravo	183 dní	01.05.2020	31.10.2020
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.05.2020	30.06.2020
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.05.2020	30.06.2020
	Stavební práce	152 dní	01.06.2020	31.10.2020
C 290	PHS v km 29,95 - 30,77 vlevo	180 dní	01.01.2019	30.06.2019
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.01.2019	31.01.2019
	Předání technologického předpisu	58 dní	01.01.2019	28.02.2019
	Stavební práce	121 dní	01.03.2019	30.06.2019
C 291	PHS v km 32,44 - 32,80 vpravo	180 dní	01.01.2019	30.06.2019
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.01.2019	31.01.2019
	Předání technologického předpisu	58 dní	01.01.2019	28.02.2019
	Stavební práce	121 dní	01.03.2019	30.06.2019
C 292	PHS v km 34,63 - 34,80 vpravo	180 dní	01.01.2019	30.06.2019
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.01.2019	31.01.2019
	Předání technologického předpisu	58 dní	01.01.2019	28.02.2019
	Stavební práce	121 dní	01.03.2019	30.06.2019
0 293	PHS v km 34,63 - 34,81 vlevo	182 dní	01.06.2020	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	60 dní	01.06.2020	31.07.2020
	Předání technologického předpisu	60 dní	01.06.2020	31.07.2020
	Stavební práce	152 dní	01.07.2020	30.11.2020
<b>Objekty řady 300</b>		1370 dní	01.03.2017	30.11.2020
C 301	ODVODNĚNÍ SILNICE R48 V KM 21,900 až 27,400	1095 dní	01.12.2017	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	61 dní	01.12.2017	31.01.2018
	Předání technologického předpisu	58 dní	01.01.2018	28.02.2018
	Stavební práce	1005 dní	01.03.2018	30.11.2020
C 302	ODVODNĚNÍ SILNICE R48 V KM 28,900 až 34,875	1095 dní	01.12.2017	30.11.2020
	RDS - koncept, čístopis	61 dní	01.12.2017	31.01.2018
	Předání technologického předpisu	58 dní	01.01.2018	28.02.2018
	Stavební práce	1005 dní	01.03.2018	30.11.2020
C 310	ÚPRAVA KANALIZACE ČSPH LIBHOŠŤ	88 dní	01.02.2018	30.04.2018
	RDS - koncept, čístopis	27 dní	01.02.2018	28.02.2018
	Předání technologického předpisu	27 dní	01.02.2018	28.02.2018
	Stavební práce	60 dní	01.03.2018	30.04.2018
C 350	PŘELOŽKA VODOVODU V KM 30,200	88 dní	01.02.2018	30.04.2018
	RDS - koncept, čístopis	27 dní	01.02.2018	28.02.2018
	Předání technologického předpisu	27 dní	01.02.2018	28.02.2018
	Stavební práce	60 dní	01.03.2018	30.04.2018
C 361	ÚPRAVA POTOKA V LIBHOŠTI	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čístopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017



D48 Rybí - Rychaltice		Postup výstavby (měs)		
Harmonogram výstavby, technologických činností		Rok		
Harmonogram předávání RDS, TP a VTD		Měsíc:		
Objekt	Popis	Délka výstavby	Zahájení	Ukončení
<b>Objekty řady 400</b>		1309 dní	01.03.2017	30.09.2020
0412	VENKOVNÍ VEDENÍ 22KV, VN 239, KM 23,340 - ÚPRAVA TRASY	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
0414	VENKOVNÍ VEDENÍ 22 KV, VN 74, KM 29,270 - ÚPRAVA TRASY	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Stavební práce	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
0415	KABELOVÉ VEDENÍ 22KV, VN 48, PŘÍBOR-LUBINA, KM 30,0320-PŘELOŽKA	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Stavební práce	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
0416	VENKOVNÍ VEDENÍ 22 KV, VN 48, KM 30,900 - PŘELOŽKA	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
0417	VENKOVNÍ VEDENÍ 22 KV, VN 05, KM 31,000 AŽ 31,440 - PŘELOŽKA	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
0418	Kabelové vedení ČD 6kV žkm 11,8-ochrana trasy v km 29,650	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Stavební práce	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
0433.1	Venkvní a kabelové vedení NN - rekonstrukce stáv. příp.	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
0435	kabelové vedení NN, Příbor, km 29,590 přeložka	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Stavební práce	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
0436	Kabelové vedení NN, Příbor, B. Němcové, km 30,200 přeložka	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017
	Stavební práce	60 dní	01.10.2017	30.11.2017
0437	Venkvní vedení NN, Příbor, samota, km 30,900 demontáž	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
3	Venkvní vedení NN, Rychaltice, km 34,7 - úprava trasy	60 dní	01.03.2018	30.04.2018
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2018	31.03.2018
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2018	31.03.2018
	Stavební práce	60 dní	01.03.2018	30.04.2018
441	Osvětlení podchodu Příbor, I. Olbrachta, km 29,170 úprava	60 dní	01.10.2019	30.11.2019
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2019	31.10.2019
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2019	31.10.2019
	Stavební práce	60 dní	01.10.2019	30.11.2019
442	Osvětlení podchodu Příbor, B. Němcové, km 30,200 přeložka	60 dní	01.03.2020	30.04.2020
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2020	31.03.2020
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2020	31.03.2020
	Stavební práce	60 dní	01.03.2020	30.04.2020
	Osvětlení autobus. zastávek, km 32,500 přeložka	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	VO, Rychaltice, km 34,620 - přeložka	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Ochrana kabelů DOK a DK(ČT a ČEZ net), km 21,980	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	Ochrana trasy DK (ČT) km 22,500	60 dní	01.03.2017	30.04.2017
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017





D48 Rybí - Rychaltice		Postup výstavby: (měs)			1	2	3	4	5
Harmonogram výstavby, technologických činností		Rok:							
Harmonogram předávání RDS, TP a VTD		Měsíc:							
Objekt	Popis	Délka výstavby	Zahájení	Ukončení	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
C 453	Přeložka kabelů DOK a DK (ČT a ČEZnet)km 23,04-24,5	91 dní	01.03.2017	31.05.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	91 dní	01.03.2017	31.05.2017					
C 454	Přeložka DK Ostrava - Příbor (ČT) km 29,550	60 dní	01.10.2017	30.11.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.10.2017	30.11.2017					
C 456	Úprava trasy DOK (ČT a ČEZnet),km 32.900	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
C 456.1	Úprava trasy DOK (ČT a ČEZnet) km 32,900	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
C 458	Úprava trasy OK Přerov-F.Místek km0,513 sil.IIItr.Borovec-Př	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
C 458.1	Úprava trasy OK Přerov-F.Místek km0,067a0,433 sil.IIItr.C115	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
C 458.2	Úprava trasy OK Přerov-F.Místek km0,013 a polní cesty C 171	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
C 458.3	Přeložka trasy OK Přerov-F.Místek,km 23,240-24,480 R48	91 dní	01.03.2017	31.05.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	91 dní	01.03.2017	31.05.2017					
C 461	Nadzemní telefonní vedení Libhošť, km 22,150 přeložka	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
C 462	Telefonní kab.vedení Libhošť(Benzina) km 23,510 přeložka	60 dní	01.03.2018	30.04.2018					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2018	31.03.2018					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2018	31.03.2018					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2018	30.04.2018					
C 463	Telefonní kab.vedení Libhošť(samota) km 27,0 - 27,3 přeložka	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
C 464	Telefonní kab.vedení Příbor,Masarykova,km 29,190 ochrana trasy	60 dní	01.03.2018	30.04.2018					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2018	31.03.2018					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2018	31.03.2018					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2018	30.04.2018					
C 465	Telefonní kab.vedení Příbor,Ostravská, km 29,590 ochrana trasy	60 dní	01.10.2017	30.11.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.10.2017	30.11.2017					
C 467	Telefonní kab.vedení Příbor,B.Němcové km 30,200 přeložka	60 dní	01.10.2017	30.11.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.10.2017	30.11.2017					
C 468	Telefonní kab.vedení Rychaltice, přípojka č.p.50 demontáž	61 dní	01.07.2019	31.08.2019					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.07.2019	31.07.2019					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.07.2019	31.07.2019					
	Stavební práce	61 dní	01.07.2019	31.08.2019					
C 469	Telefonní kab.vedení Rychaltice, MK km 34,720 ochrana	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
C 471	Ochrana kabelové trasy DOK TRANGASU v km.0,250 souběžné sil	60 dní	01.03.2017	30.04.2017					
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017					

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
2018											2019											2020											2021					
Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	

16/5

D48 Rybí - Rychaltice				Postup výstavby: (měs)		1	2	3	4	5	6
Harmonogram výstavby, technologických činností				Rok:		2017					
Harmonogram předávání RDS, TP a VTD				Měsíc:		Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen
Objekt	Popis	Délka výstavby	Zahájení	Ukončení							
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017							
C 491	SYSTÉM SOS - kabelové vedení	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
	RDS - koncept, čistopis	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Předání technologického předpisu	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Stavební práce	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
C 492	Systém SOS – hlásky	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
	RDS - koncept, čistopis	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Předání technologického předpisu	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Stavební práce	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
C 493	Systém SOS – meteostanice	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
	RDS - koncept, čistopis	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Předání technologického předpisu	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Stavební práce	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
C 494	SYSTÉM SOS - kabelové šachty a prostupy	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
	RDS - koncept, čistopis	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Předání technologického předpisu	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Stavební práce	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
C 495	SYSTÉM SOS - trubky pro optické kabely	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
	RDS - koncept, čistopis	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Předání technologického předpisu	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Stavební práce	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
C 496	SYSTÉM SOS - automatické sčítače dopravy	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
	RDS - koncept, čistopis	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Předání technologického předpisu	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Stavební práce	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
C 497	SYSTÉM SOS - optický kabel	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
	RDS - koncept, čistopis	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Předání technologického předpisu	29 dní	01.09.2018	30.09.2018							
	Stavební práce	760 dní	01.09.2018	30.09.2020							
C 498	Systém SOS – dispečinky	91 dní	01.07.2020	30.09.2020							
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.07.2020	31.07.2020							
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.07.2020	31.07.2020							
	Stavební práce	91 dní	01.07.2020	30.09.2020							
<b>Objekty řady 500</b>		425 dní	01.03.2017	30.04.2018							
C 501	Ochrana VVTL plynovodu DN 500 ev.č.631 107	60 dní	01.03.2017	30.04.2017							
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017							
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017							
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017							
C 502	Ochrana VTL plynovodu DN 500	60 dní	01.03.2017	30.04.2017							
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017							
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017							
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017							
C 503	Přeložka VTL plynovodu DN 300 č. 632 039	60 dní	01.10.2017	30.11.2017							
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017							
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017							
	Stavební práce	60 dní	01.10.2017	30.11.2017							
C 503.1	Přeložka VTL plynovodu DN 300 č. 632 039	60 dní	01.03.2017	30.04.2017							
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017							
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017							
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017							
C 504	Přeložka VTL přípojka k RS DN 100 ev.č. 632 074	60 dní	01.03.2018	30.04.2018							
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2018	31.03.2018							
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2018	31.03.2018							
	Stavební práce	60 dní	01.03.2018	30.04.2018							
C 505	Přeložka VTL plynovodu DN 300 ev.č. 633 016	211 dní	01.10.2017	30.04.2018							
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.10.2017	31.10.2017							
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.10.2017	31.10.2017							
	Stavební práce	211 dní	01.10.2017	30.04.2018							
C 506	Prodloužení chráničky DN 400 VTL plynovodu DN 200 č.822 668	60 dní	01.03.2018	30.04.2018							
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2018	31.03.2018							
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2018	31.03.2018							
	Stavební práce	60 dní	01.03.2018	30.04.2018							
C 512	Přeložka STL plynovodu PE 63 Rychaltice	60 dní	01.03.2017	30.04.2017							
	RDS - koncept, čistopis	30 dní	01.03.2017	31.03.2017							
	Předání technologického předpisu	30 dní	01.03.2017	31.03.2017							
	Stavební práce	60 dní	01.03.2017	30.04.2017							





**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.7**  
**SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS**

„Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Společnost Metrostav a.s.,  
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,  
IČ: 00014915,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **D48 Rybí - MÚK Rychaltice**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631154 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
Metrostav a.s.	00014915	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Praze dne 31.10.2016

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
Obchodní náměstek divize 4  
Metrostav a.s.  
(za Společnost na základě plné moci)

1108

## Systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby

Realizační dokumentace stavby (RDS) je z pozice zhotovitele kontrolována ještě před odevzdáním konceptu RDS. Projektant realizační dokumentace stavby předá pro tyto účely zhotoviteli paré dokumentace, do které jsou případné nedostatky vyznačeny, případně popsány. Paré dokumentace pro kontrolu zhotovitelem, předá projektant RDS odpovědné osobě zhotovitele (která má patřičnou odbornou způsobilost ke kontrole RDS) pět pracovních dní před termínem vydání čistopisu, z toho tři dny je na provedení kontroly zhotovitelem a dva dny na zapracování připomínek projektantem RDS. Dokumentace je následně předána zpět projektantovi s průvodním dopisem. Projektant následně nedostatky upraví a vydá koncept RDS, který je již připomínkován pouze objednatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Zhotovitel kontroluje zda-li je dokumentace v souladu se smluvními podmínkami (ČSN, TKP, ZTKP, a další smluvní dokumenty), zda-li je technické řešení technologicky proveditelné a jestli obsahuje veškeré formální náležitosti dle souhrnu smluvních dohod.

Kontrolu RDS provádí technické oddělení zhotovitele osobami s požadovanými autorizacemi. Nezávislou kontrolu RDS budou provádět tyto osoby v zaměstnaneckém poměru zhotovitele:

- ██████████ – autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby
- ██████████ autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce
- ██████████ – autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

V Praze dne 31.10.2016

---

██████████  
obchodní náměstek divize 4  
Metrostav a.s.  
(za Společnost na základě plné moci)

**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.8**  
**ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB**  
**PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ**

Obchodní firma vedoucího účastníka: Metrostav a.s.,

Sídlo vedoucího účastníka: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 00014915 DIČ CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku: vedené Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758

Telefon / Fax 266 018 430 / 266 018 401

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):  
netýká se

Sídlo zastoupení vedoucího účastníka v České republice: [bude doplněno]

Telefon / Fax [bude doplněno] / [bude doplněno]

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku

- i) Metrostav a.s. - správce
- ii) SWIETELSKY stavební s.r.o. - společník
- iii) COLAS CZ, a.s. - společník

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:

„Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“  
Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník sdružení bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení bude odpovědností vedoucího účastníka sdružení („Smlouva“).

- i) Datum uzavření: 19.10.2016
- ii) Místo: Praha, Brno
- iii) Příloha – Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky (v %) s uvedením druhu prací, které budou provedeny každým z nich

- i) Metrostav a.s. 60% - mosty, zemní práce, CB kryt, konstrukční vrstvy vozovky
- ii) SWIETELSKY stavební s.r.o. 20% - konstrukční vrstvy vozovky, mosty
- iii) COLAS CZ, a.s. 20% - mosty, zemní práce, konstrukční vrstvy vozovky

V Praze dne 02.11.2016

\_\_\_\_\_  
vedoucí útvaru předvýrobní přípravy divize 4  
Metrostav a.s.  
(za Společnost na základě plné moci)

170



**DÍL 1, ČÁST 4**  
**FORMULÁŘ 4.4.11**  
**PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A**  
**PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ**

„Společnost METROSTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Společnost Metrostav a.s.,

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,

IČ: 00014915,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D48 Rybí - MÚK Rychaltice“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631154 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

*prohlašuje, že*

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Netýká se	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů

187

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Netýká se	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 31.10.2016

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
Obchodní náměstek divize 4  
Metrostav a.s.  
(za Společnost na základě plné moci)

ASP

ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Netýká se	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
2.	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitém vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitém vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne 31.10.2016

\_\_\_\_\_  
[redacted]  
Obchodní náměstek divize 4  
Metrostav a.s.  
(za Společnost na základě plné moci)

ASP

**DÍL I, ČÁST 4  
FORMULÁŘ 4.4.12  
SEZNAM SUBDODAVATELŮ**

„Společnost METRONTAV + SWIETELSKY + COLAS, D48 Rybí – MÚK Rychaltice“

Společnost Metroslav a.s.,

se sídlem: Kuzelská 2450/4, 180 00 Praha 8,

IČ: 00014915,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce D48 Rybí - MÚK Rychaltice, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 631154 (dále jen „dodavatel“),

přijímá s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

NETÝKÁ SE

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelům uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]	[bude doplněno]

**alternativa A**

Zadavatel se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

**alternativa B**


Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele;

1309

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]
[bude doplněno]	[bude doplněno]

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Praze dne 31.10.2016

\_\_\_\_\_  
  
Obchodní náměstek divize 4  
Metrostav a.s.  
(za Společnost na základě plné moci)
