

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2023-03

Poskytovatel služby	CATTA Consulting s.r.o.
Správce IS	SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů
Číslo RFC SZR	1153
Název RFC SZR	NPO - Cloudia - Součinnost při migraci NIA testu do SDI v DC2
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	121958
Katalogový list	SZR05
Typ odstavky	Není relevantní

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk, tiket 121958.

2. Zadání požadované změny

Úkolem je součinnost provozovatele služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů SZR (dále jen „provozovatel podpory IS SZR“) při přesunutí/vytvoření NIA test v prostředí SDI v DC2.


3. Popis zajištění realizace změny


Požadované činnosti uvedené v plánu NAKIT, s.p. budou realizovány administrátory dle příslušných oblastí (sítě, virtualizace, zálohování). Související administrativa a koordinace bude zastřešena projektovým manažerem a architektem poskytovatele služeb.


4. Odhad pracnosti

Nacenení pracnosti vychází z předaných podkladů a diskutovaného:

- Soubor: NIA-TEST-03-02-2023-Nový sizing.xlsx
- Soubor: HMG_Migrace_NIA_TEST_020223.mpp - činnosti jdoucí za provozovatelem podpory IS SZR
- z emailu [redacted] s předmětem emailu: NIA-TEST Aktuální sizing, kde byl uveden požadavek na replikace a SSD disky
- z upřesnění [redacted] na schůzce dne 15.2.2023




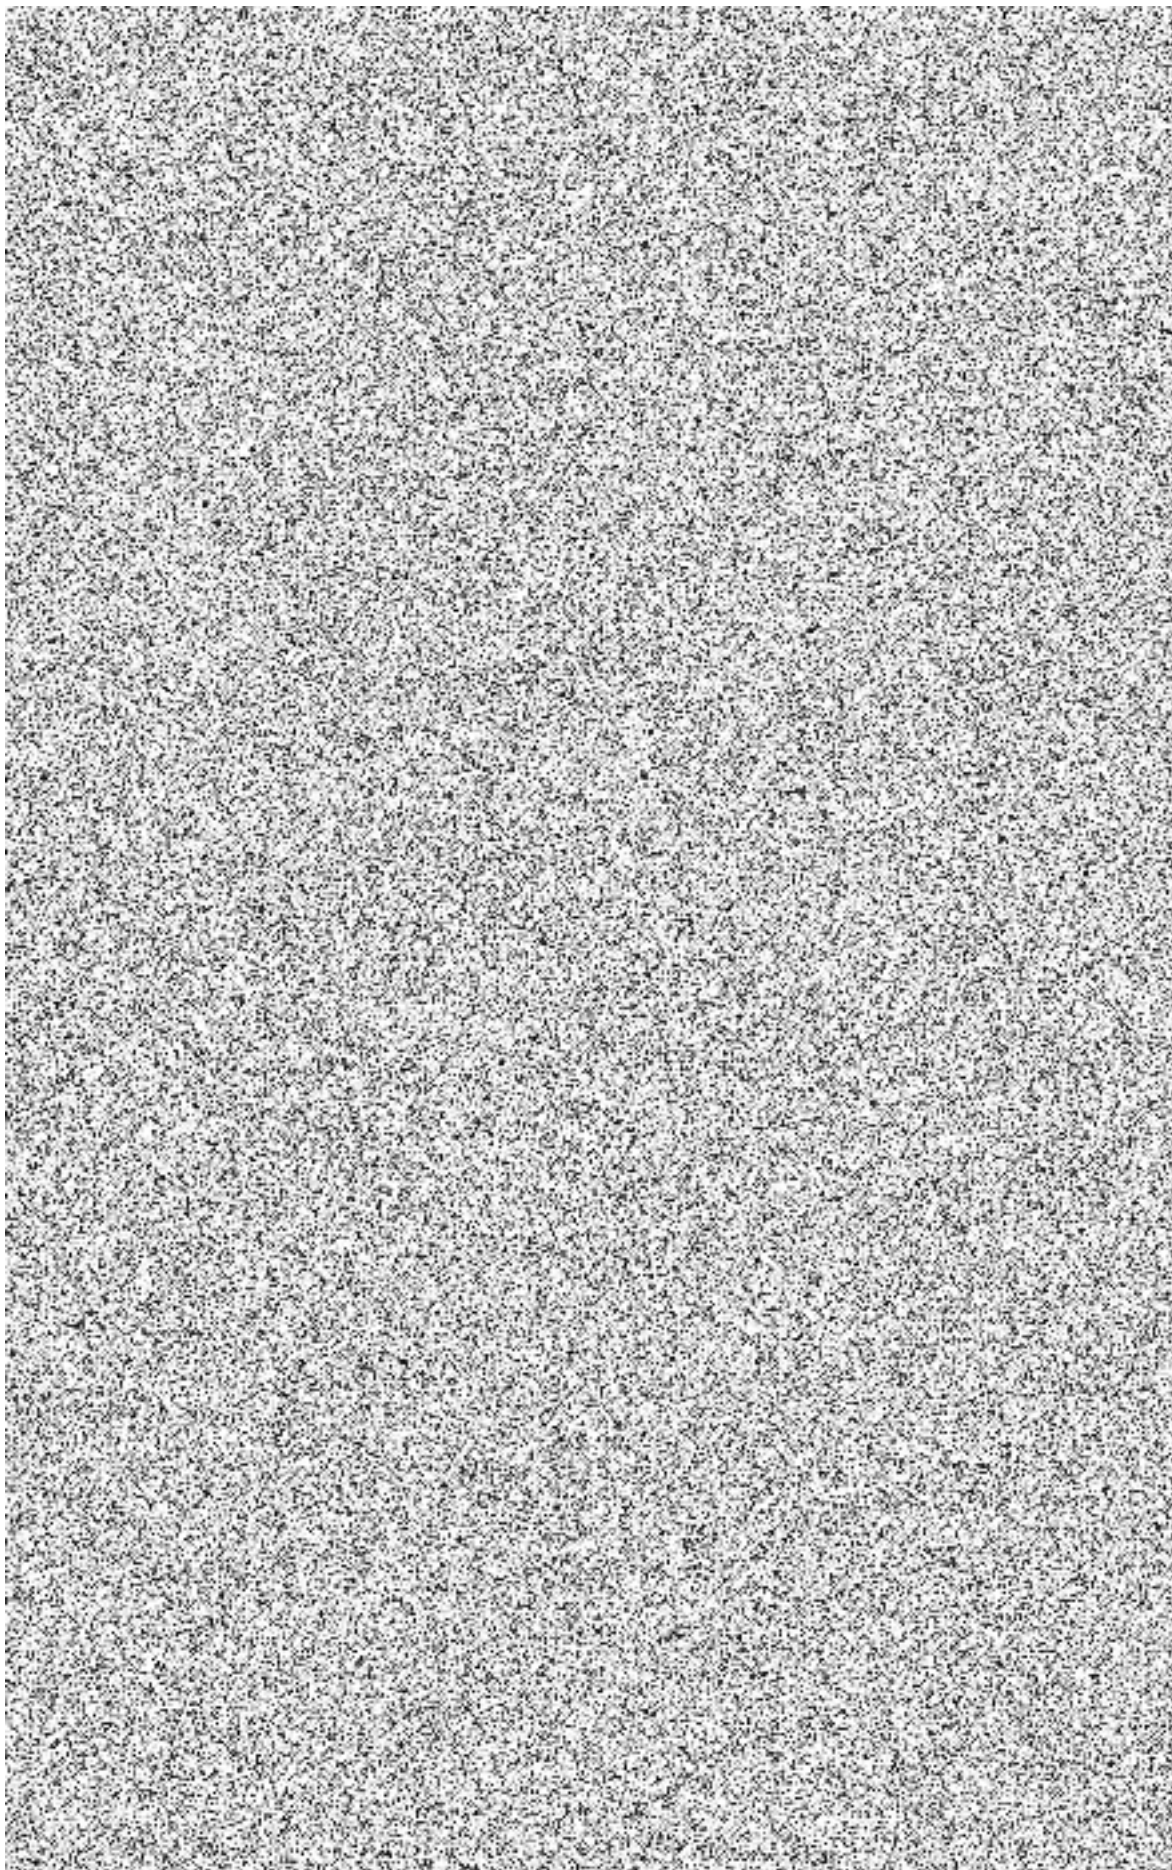

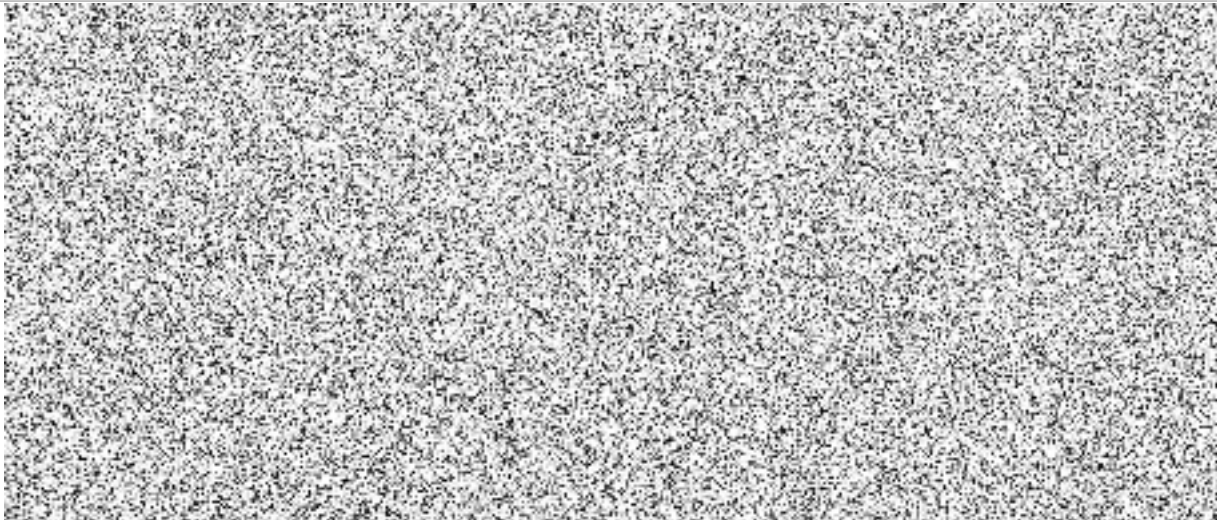

Celková cena za práce činí 175 600 Kč bez DPH, tj. 212 476 Kč včetně DPH.

Podrobný rozpad ceny:



5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Harmonogram vychází z návrhu NIA (soubor HMG_Migrace_NIA_TEST_020223.mpp) a následné aktualizace posunu o 14 dnů, tj. kick-off 1.3.2023.

Činnosti jdoucí na Poskytovatele služby jsou naplánovány v níže uvedených termínech.

Start	Finish
Mon 19.12.22	Tue 23.05.23
Mon 19.12.22	Tue 23.05.23
Wed 01.03.23	Wed 01.03.23
Tue 31.01.23	Tue 23.05.23
Wed 15.02.23	Fri 24.03.23
Wed 08.03.23	Thu 16.03.23
Fri 17.03.23	Tue 21.03.23
Wed 22.03.23	Fri 24.03.23
Wed 22.03.23	Fri 24.03.23
Wed 26.04.23	Fri 05.05.23
Thu 04.05.23	Fri 05.05.23
Thu 04.05.23	Fri 05.05.23
Sun 30.04.23	Tue 09.05.23
Mon 08.05.23	Tue 09.05.23

Pokud dojde k posunům v plánu, předpokládá se, že doba trvání (duration) zůstává i v novém plánu stejná. Aby Poskyvatel mohl zajistit potřebné činnosti v novém termínu, je nezbytné si tento termín vzájemně potvrdit.

6. Návrh testovacího scénáře

Testování bude provádět NAKIT. Pro provozovatele podpory IS SZR není relevantní.

7. Výstupy změnového požadavku

Tenant má připravené prostředí dle zadání potvrzeného zadavatelem.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Tenant má připravené prostředí dle zadání potvrzeného zadavatelem.

9. Požadavky na součinnosti

- Součinnost NAKIT: včasné předání kompletních dílčích zadání (viz ř.10 harmonogramu “Vytvoření podkladů pro dodavatele SZR provozovatele podpory IS SZR a CMS”)
- Součinnost NAKIT: předání zadání ve strukturovaném formuláři – týká se požadavku na propojení sítí mezi starým a novým TEST prostředím (vytvoření firewall pravidel), požadavku na vytvoření VM
- Součinnost NAKIT: troubleshooting
- Součinnost SZR: koordinace RFC zástupci SZR a včasné informování a domluva s Poskytovatelem o případných změnách
- Součinnost SZR: změna rozsahu nad rámec, který je uveden v tomto PnČ, bude projednána s Poskytovatelem jako nový změnový požadavek
- Součinnost SZR: zadání nových GOVek
- Součinnost Gordic: týká se JUMP serverů

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Převod aplikace na nové prostředí.

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Bez dopadu.

