

POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2023-08

Poskytovatel služby	CATTA Consulting s.r.o.
Správce IS	SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Objednatel	ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Smlouva	SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů
Číslo RFC SZR	1197
Název RFC SZR	NPO – Cloudia - Součinnost při náhradě firewallů
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	128586
Katalogový list	SZR05 - Objednávka
Typ odstavky	Pokud bude požadována odstavka, bude zadáno jako Požadavek Dodavatele nových Firewall

1. Identifikace vzniku požadavku

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk.

2. Zadání požadované změny

Úkolem je poskytnutí součinnosti Dodavateli nových firewallů (dále jen Dodavatel) při implementaci firewallového řešení do stávající infrastruktury výpočetního prostředí Cloudia.

3. Popis zajištění realizace změny

Na základě společných konzultací s dobou trvání 5 týdnů zpracuje Dodavatel Technicko-implentační projekt. Během těchto konzultací dojde k vyjasnění zapojení nového zařízení a finálního firewallového řešení (FW). Od Dodavatele se očekává instalace nového zařízení dle vzájemně odsouhlaseného řešení a Pilotní nastavení v součinnosti s poskytovatelem služeb. Poskytovatel služeb následně zajistí, aby nastavení nového zařízení bylo funkční i pro další tenanty v prostředí SDI - tato část není předmětem tohoto PnČ.

4. Odhad pracnosti

Pracnost poskytovatele služeb je rozdělena do 2 hlavních oblastí


1) Součinnost při přípravě Technicko-implentačního projektu, přípravné práce

- Poskytování vstupů (podklady k akt. stavu, fyzické propojení, komunikace, aj.)
- Objasňování podkladů
- Technické konzultace
- Pravidelná jednání
- Revize dokumentu
- Součinnost na přípravných pracích (dočasné připojení, příprava testovacího tenanta, VM, adresy, prostupy aj.)

2) Součinnost při implementaci-Pilotní nastavení (kanceláře, pilotní tenant)


- Součinnost při instalaci

- b. Součinnosti při implementaci vč. testování
 - i. Výstavba nového prostředí, konfigurace BGP pro vzdálené lokality
 - ii. Propoj Office a CheckPoint
- c. Technické konzultace, pravidelné schůzky
- d. Troubleshooting
- e. Účast na školení/převzetí Pilotního nastavení
- f. Revize finální dokumentace předané dodavatelem

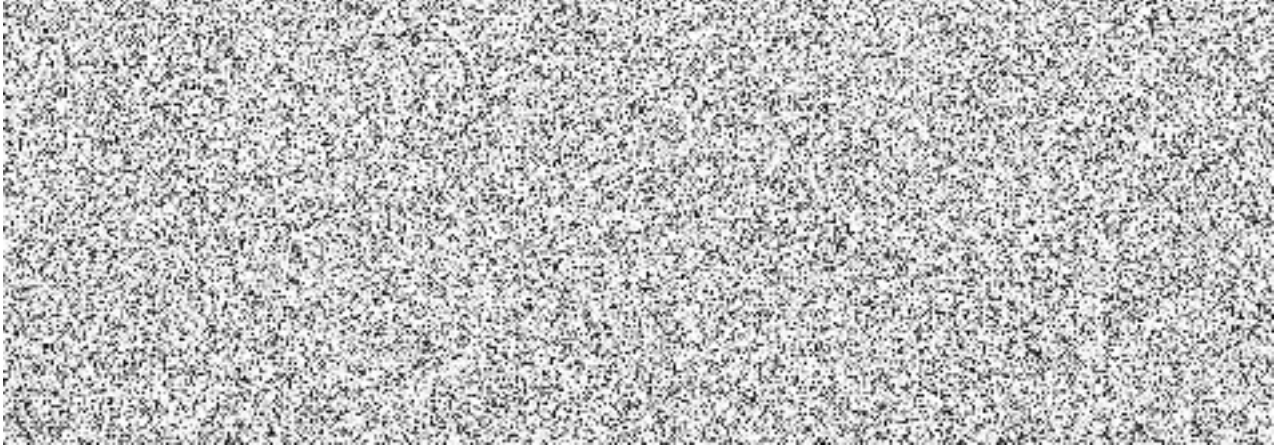

Celková cena za práce činí 235 400 Kč bez DPH, tj. 284 834 Kč včetně DPH.

Podrobný rozpad ceny:



Poskytovatel služby (dále jen „Catta“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ č. 2023-08 je spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen „NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem „Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR“ (dále jen „projekt“) s registračním číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_19/0000019. Catta v této souvislosti bere na vědomí, že je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ č. 2023-08, včetně všech účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že o datu jejího schválení bude Catta ze strany SZR informován po skončení projektu.

Faktura za plnění dle tohoto PnČ č. 2023-08 bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, viz identifikace výše.

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku

Činnost	Trvání
Zahájení prací na Technicko-implemenčním projektu	T0
Podpis smlouvy SZR a Dodavatele	T0S
1) Součinnost při přípravě Technicko-implemenčního projektu, přípravné práce	T1 = T0 + 5 týdnů
2) Součinnost při implementaci-Pilotní nastavení (kanceláře, pilotní tenant)	T2 = T0S+ 5 měsíců

Délka trvání zaznamenaná v harmonogramu je závislá na poskytnutí součinností uvedených v části 9 toho PnČ. Předpokládané dokončení je do konce 8/2023, případně 9/2023 s ohledem na omezení v době dovolených. Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12.2023.

6. Návrh testovacího scénáře

Návrh testovacích scénářů vzejde z Dodavatelem zpracovaného Technicko-implemenčního projektu.

U sítí proběhne ověření funkčnosti propojů, u Pilotního tenanta bude ověřena funkčnost s aplikačním správcem.

7. Výstupy změnového požadavku

Funkční zapojení nových firewallů.

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Potvrzení funkčnosti aplikačním správcem Pilotního tenanta – ověření odpovídající komunikace i po zapojení nových firewallů.

9. Požadavky na součinnosti

Součinnost Dodavatele:

- Včasné zpracování Technicko-implemenčního projektu v domluveném rozsahu
- Dodržení termínů a postupu prací dle plánu projektu

Součinnost SZR – níže uvedené by mělo být poptáno/zadáno Dodavatelem:

- Domluva termínu odstávek a jejich schválení
- Zajištění součinnosti aplikačního správce Pilotního tenanta (technické konzultace, testování)
- Zajištění součinnosti 3. subjektů (Nakit, Simac), pokud bude Dodavatelem požadováno

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Úprava Přílohy č.5 Smlouvy: rozšíření rozsahu-navýšení o 10 nových zařízení.

10.1 Náklady na podporu provozu IS

Služby definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

Zlepšení redundance, odlehčení výkonu F5.

