

**POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2023-09**

Poskytovatel služby	CATTA Consulting s.r.o.
Správce IS	SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Objednatel	Digitální a informační agentura, Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3
Smlouva	SZR-3004-21/Ř-2022–Smlouva o poskytování služeb podpory provozu interní infrastruktury a interních systémů
Číslo RFC SZR	<b>1198</b>
Název RFC SZR	Cloudia - Síť DIA nových lokalit [REDACTED]
Kategorie RFC	Konfigurace
Číslo tiketu (Service Desk)	130345
Katalogový list	<b>SZR 05 - Objednávka</b>
Typ odstavky	Není relevantní

**1. Identifikace vzniku požadavku**


**2. Zadání požadované změny**

Úkolem je poskytnutí součinnosti při budování nových sítí lokalit [REDACTED] a [REDACTED] a jejich propojení do [REDACTED].

**3. Popis zajištění realizace změny**

Realizace lokality [REDACTED] viz připojený soubor [REDACTED] činností pracnosti.xlsx)

**Východiska realizace lokality [REDACTED]**

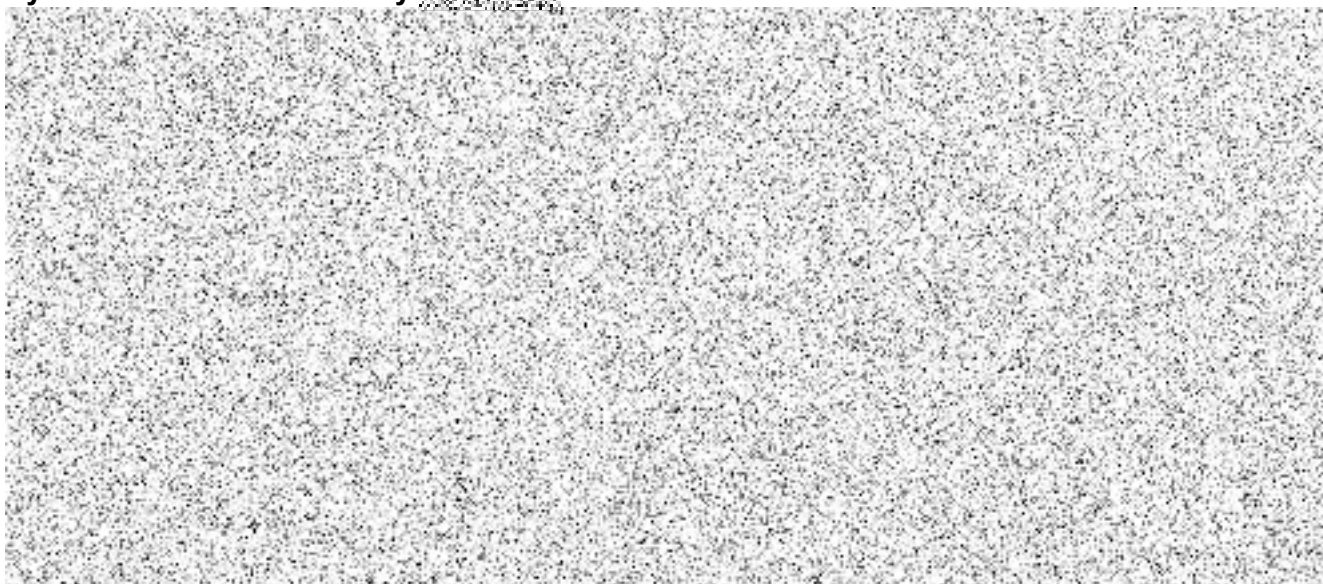

- Prerekvizity síťové komunikace:








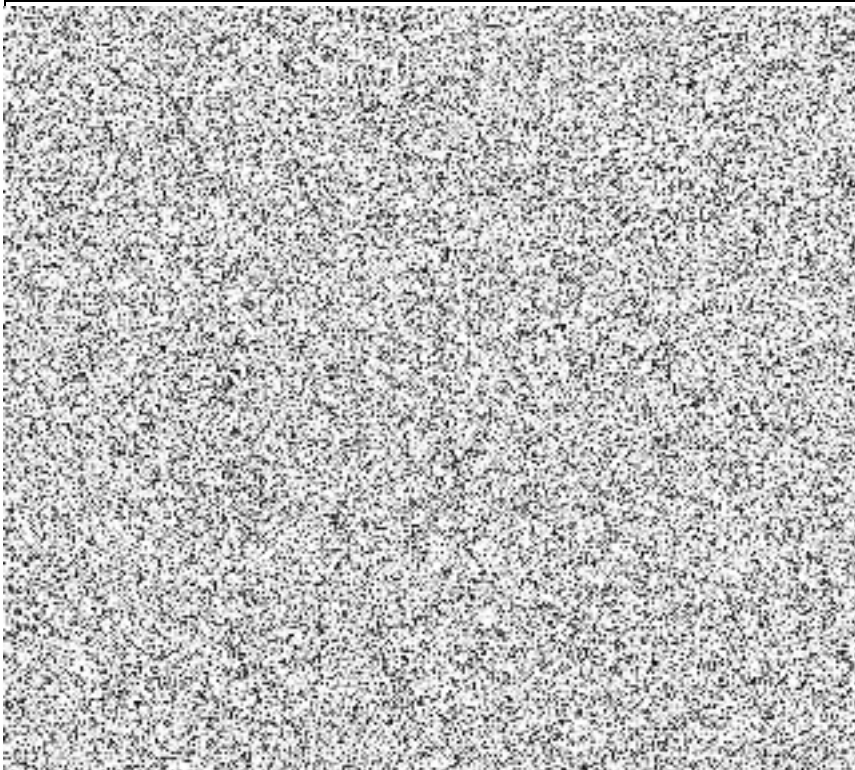
Schéma , obdobné pro lokalitu 




Nová lokalita na   
Východiska:

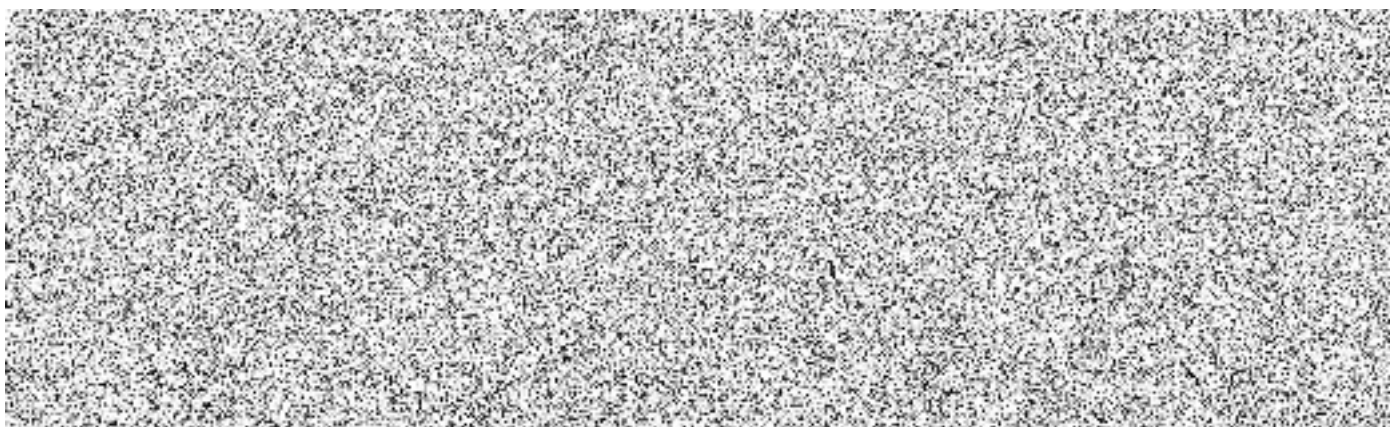

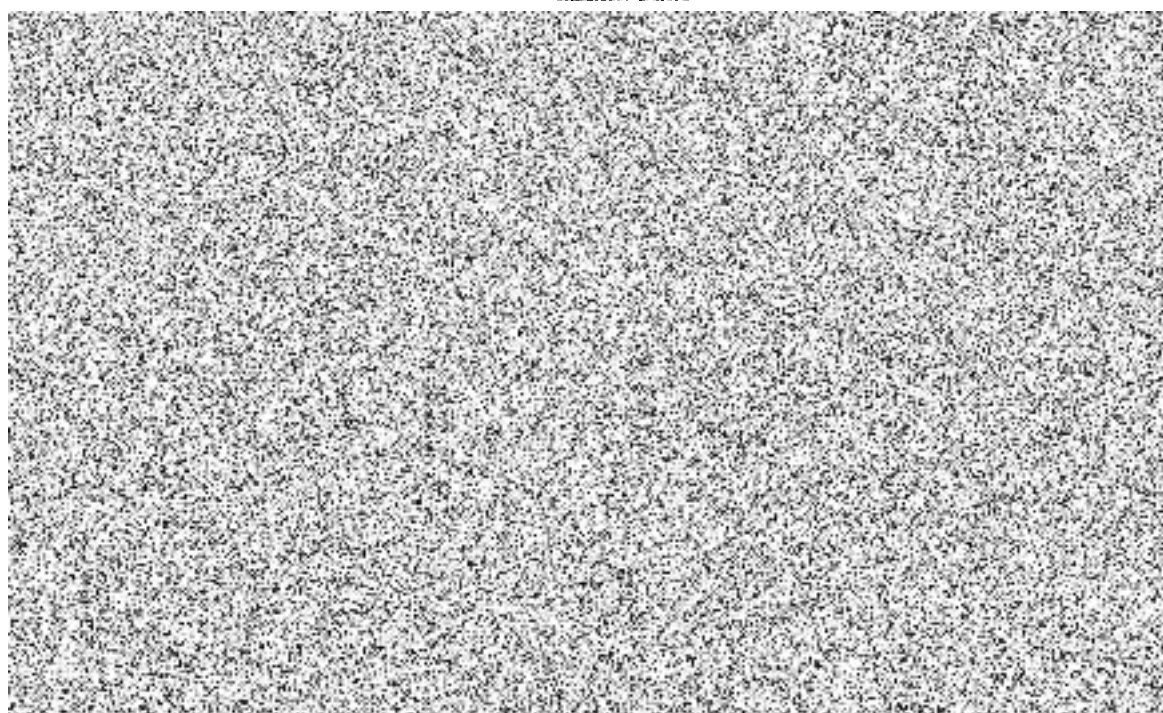1. Činnosti – Lokalita	Pracnost MD
Přehled činností s detailním rozpadem pracnosti viz příložený xls	18

2. Činnosti – Lokalita	Pracnost MD
	1
	1
	4
	2
	2
	2
	1
	2
	<b>CELKEM</b>

3. Činnosti – nová lokalita	Pracnost MD
	3

**Souhrnný přehled**

Činnost	Pracnost MD
-	18
-	15
-	3
<b>Celkem</b>	<b>36</b>


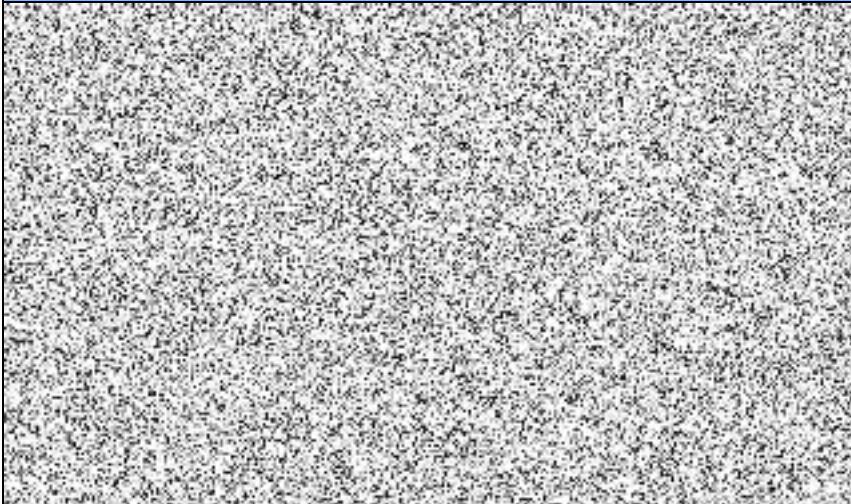
#### 4. Odhad pracnosti



**Celková cena za práce činí 313 900 Kč bez DPH, tj. 379 819 Kč včetně DPH.**

Podrobný rozpad ceny:

Role	Počet dnů (pracnost MD)	Sazba (Kč za MD bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
Administrátor	25,5	7 800	198 900
Architekt	5,0	12 000	60 000
Projektový manažer	5,5	10 000	55 000
<b>Celkem</b>	<b>36,0</b>		<b>313 900</b>

#### 5. Návrh harmonogramu změnového požadavku


Činnosti lokality 	Délka trvání (t=týden)
	T0
	T1=T0+0,5t
	T2=T+0,5t
	T3=T2+4t
	T4=T3+1t
	průběžně
	T5=T4+1t
	T6=T0+7t

U činností nové lokality  se předpokládá, že budou realizovány paralelně s lokalitou .

Dodávka bude realizována během 7 týdnů od zahájení za předpokladu poskytnutí požadované součinnosti. Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele do 31.12.2023.

## 6. Návrh testovacího scénáře

Testování proběhne za účasti zástupce/uživatele DIA s potřebnými přístupy do testovaných aplikací.



## 7. Výstupy změnového požadavku

Funkční komunikace na síťové vrstvě v nových lokalitách [REDACTED].

Síť je prostupná, uživatelé mají přístup do [REDACTED] prostřednictvím kterého mohou spravovat aplikace.


## 8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci

Funkční komunikace na síťové vrstvě v nových lokalitách [REDACTED].

Síť je prostupná, uživatelé mají přístup do [REDACTED] prostřednictvím kterého mohou spravovat aplikace.

## 9. Požadavky na součinnosti

### - Součinnost DIA



- Součinnost Simac – zajistí DIA
- Součinnost NAKIT/CMS – zajistí DIA
- Součinnost NAKIT/ITS – zajistí DIA

## 10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční prostředky na podporu provozu daného IS

Realizace tohoto PnČ představuje rozšíření Přílohy č. 5 výše uvedené smlouvy o další prvky.

Služby definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS.

## 11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace

- Dopady na bezpečnost IS – žádné.
- Dopady do bezpečnostní dokumentace – žádné.

## 12. Přílohy

### 1) Přehled činností a pracností na lokalitě

Soubor: činností pracností.xlsx



činností přehled  
činností pracností.xls

### 2) Adresní plán

Soubor: Adresni\_plán\_DIA\_v03\_1.xlsx



Adresni\_plán\_DIA\_v0  
3\_1.xlsx

	Schválil (dodavatel)	Schválil (zákazník)
Jméno	[Redacted]	
Datum		
Podpis		
