



MVCRX07DAFGM
prvotní identifikátor

Č. j. MV- 33952-66/OSR-2022

**DODATEK Č. 11 KE SMLOUVĚ O DODÁVCE A IMPLEMENTACI
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU e-SBÍRKA a e-LEGISLATIVA
A O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále „Dodatek“)**

(ev. č. Objednatele: MV-100298-248/VZ-2017)

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo vnitra
se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
bankovní spojení: účet č. 19 – 3605881/0710 vedený u České národní banky
zastoupen: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického
rozvoje a koordinace veřejné správy

(dále jen „Objednatel“)

a

Dodavatel: Asseco Central Europe, a.s.
se sídlem: Budějovická 778/3a, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu 1657960/0300
zastoupená: Ing. David Šindelář
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp.zn. 8525

(dále jen „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále společně „Strany“ nebo kterýkoli z nich „Strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A. Dne 10. 10. 2018 uzavřely Strany Smlouvu o dodávce a implementaci informačního systému e-Sbírka a e-Legislativa a o poskytování služeb, č.j.: MV-100298-248/VZ-2017 (dále jen „**Smlouva**“), a to na základě zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky zadávané Objednatelem pod názvem „*Implementátor technického řešení projektu v rámci realizace projektu „Projekt e-Sbírka a e-Legislativa (Projekt elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronické tvorby právních předpisů)*“ (dále jen „**Projekt eSeL**“).
- B. Ke dni uzavření tohoto Dodatku byly mezi Stranami uzavřeny následující dodatky ke Smlouvě:
- a) Dodatek č. 1 ze dne 15. 1. 2019 (č.j.: MV-8048-1/LG-2019),
 - b) Dodatek č. 2 ze dne 5. 2. 2019 (č.j.: MV-8048-3/LG-2019),
 - c) Dodatek č. 3 ze dne 20. 3. 2020 (č.j.: MV-8048-33/LG-2019),
 - d) Dodatek č. 4 ze dne 26. 6. 2020 (č.j.: MV-8048-43/LG-2019),
 - e) Dodatek č. 5 ze dne 28. 8. 2020 (č.j.: MV-8048-46/LG-2019),
 - f) Dodatek č. 6 ze dne 28. 12. 2020 (č.j.: MV-8048-65/LG-2019),
 - g) Dodatek č. 7 ze dne 14. 1. 2022 (č.j.: MV-8048-89/OSR-2019),
 - h) Dodatek č. 8 ze dne 29. 3. 2022 (č.j.: MV- 33952-7/OSR-2022),
 - i) Dodatek č. 9 ze dne 12. 8. 2022 (č.j. MV- 33952-22/OSR-2022), a
 - j) Dodatek č. 10 ze dne 14. 3.2023 (č.j. MV- 33952-54/OSR-2022).
- C. Každá ze Stran prohlašuje, že v období od uzavření Dodatku č. 10 činila kroky tak, aby byly naplněny povinnosti této Strany stanovené v Dodatku č. 10. O těchto krocích se Strany průběžně vzájemně informovaly.
- D. Objednatel dopisem ze dne 30. května 2023 informoval Dodavatele o stavu ověřování akceptačního testování a požádal o jeho prodloužení.
- E. Strany činí nesporným, že v období od uzavření Dodatku č. 10 v průběhu realizace Projektu eSeL průběžně docházelo a ke dni podpisu tohoto Dodatku stále dochází k okolnostem stojících mimo vůli Stran, které Strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a které ve svém souhrnu objektivně brání realizaci některých částí plnění předmětu Smlouvy v časových harmonogramech předvídaných Smlouvou (dále jen „**Okolnosti**“).

- F. Strany činí nesporným, že Okolnostmi dle předchozího bodu E tohoto článku Dodatku jsou zejména tyto skutečnosti:
- a) Z důvodu enormní pracnosti akceptačního testování dodaných funkčních celků milníků „Implementace e-Legislativa RC3c“ a „Implementace e-Legislativa RC4“ dodaných ke dni 19. 5. 2023, resp. 9. 6. 2023, a z důvodu souběhu akceptačního testování uvedených dvou milníků a nefunkčních testů v rámci souběžně běžícího Pilotu 1. fáze se ukázalo jako zcela nezbytné posunout termín akceptace uvedených milníků na 30. 6. 2023 tak, aby byl Objednateli poskytnut odpovídající časový prostor pro komplexní ověření všech předávaných plnění.
 - b) Přestože Strany při podpisu Dodatku č. 10 vyhodnotily dle informací dostupných k danému okamžiku rozsah, předpokládanou časovou náročnost a další požadavky na napojení systému na bezpečnostní dohled dohledového centra e-Governmentu (dále jen „DCeGov“), které jsou podmínkou pro dokončení integrace a implementace systému e-Sbírka a e-Legislativa a pro spuštění e-Sbírky a e-Legislative pro uživatele přistupující z Internetu, po uzavření Dodatku č. 10 byly identifikovány další integrační a implementační práce.
 - c) Práce uvedené v bodě b) nebyly smluvním stranám známy před při uzavření Dodatku č. 10.
 - d) Provozba souboru požadavků Oprávnění, jejichž vnitřní logika a nastavení je významně, zejména v oblasti auditů propojena s pracemi uvedenými v bodě b) a obecně s integračními a implementačními pracemi mezi systémem e-Sbírka a e-Legislativa a DCeGov nezbytně vyžaduje vazbu souboru Oprávnění na nový akceptační milník.
 - e) Rozšířená a modifikovaná bezpečnostní konfigurace vyžaduje samostatné pilotní ověření v okamžiku, kdy dosavadní součásti Díla úspěšně projdou Pilotem 1. fáze a Pilotem 2. fáze dle Smlouvy. Toto dodatečné pilotní ověření si klade za cíl ověřit plnou funkčnost implementovaných a integrovaných prací dle Studie, v plném souladu se souborem oprávnění, zejména v oblasti auditů již v prostředí s vysokým Service-Level-Agreement (SLA).
 - f) Komplexní charakter systému e-Sbírka a e-Legislativa současně vyžaduje, aby pilotní ověření jeho dokončených částí probíhalo, v mezích daných pravidly kybernetické bezpečnosti, v co nejširším rozsahu, a to i před dokončením implementace napojení na bezpečnostní dohled i dokončením akceptačního milníku Oprávnění.

- g) Jako nezbytné se jeví zajištění podpor úrovně L3 a L4 pro Pilot 2. fáze ve stejné konfiguraci jako pro Pilot 1. fáze, což vyplývá ze zkušeností z Pilotu 1. fáze, tedy kromě technologické podpory je nezbytné zajištění i podpory aplikační.
- G. Strany konstatují, že skutečnosti popsané výše v písmenech C až F s dopadem na realizaci Díla je třeba zohlednit tak, jak je stanoveno dále v tomto Dodatku.
- H. Dodavatel v této souvislosti prohlašuje, že, pokud Strany budou plnit povinnosti stanovené Smlouvou, jejími Dodatky a obecně závaznými právními předpisy, je připraven a schopen Projekt eSeL dokončit v rozsahu a termínech stanovených Smlouvou ve znění tohoto Dodatku.
- I. Objednatel prohlašuje, že je připraven Dodavateli poskytnout pro dokončení Projektu eSeL dostatečnou součinnost.
- J. Strany považují shora popsané změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Strany se dohodly, že předmětem tohoto Dodatku je:

- 2.1.1. Rozdělení akceptačního milníku Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov na více fází, jejich přizpůsobení ostatním fázím a rozšíření služeb v rozsahu Přílohy č. 2, bodů 2 a 3 tohoto Dodatku;
- 2.1.2. rozšíření Díla o provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období;
- 2.1.3. rozšíření Díla o poskytování služby „Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ v období do 30. 11. 2023;
- 2.1.4. rozšíření poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2, aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 po dobu provozu Pilot 3. fáze systému e-Sbírka a e-Legislativa tedy od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023; dále rozšíření aplikační podpory úrovně L3 a L4 po dobu provozu Pilot 2. fáze systému e-Sbírka a e-Legislativa, tedy od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023;
- 2.1.5. úprava plnění spadajícího do akceptačních milníků e-Legislativa RC3c – vícepráce, Integrace 2 – vícepráce, Implementace e-Legislativa RC3c, Implementace e-Legislativa RC4 a Integrace 2 tak, že Oprávnění, jak jsou

- definována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, nově tvoří samostatný akceptační a fakturační milník;
- 2.1.6. úprava plnění spadajícího do akceptačního milníku Pilot tak, že Pilot bude realizován za podmínek stanovených Smlouvou a v Příloze č. 4 Dodatku č. 10 tak, že 1. fáze Pilotu bude probíhat v období od 15. 3. 2023 až 15. 6. 2023 a 2. fáze Pilotu bude probíhat v období od 1. 7. 2023 až 30. 9. 2023 a 3. fáze Pilotu bude probíhat v období od 1. 10. 2023 až 30. 11. 2023. 3. fáze Pilotu bude probíhat podle standardů a SLA (včetně všech souvisejících práv a povinností) stanovených Smlouvou pro provoz systému v době po KAP, tak aby byla otestována plná funkcionalita systému před spuštěním do ostrého provozu.
 - 2.1.7. úprava akceptačních a fakturačních milníků Dokumentace, Integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností a Kompletní akceptace díla (KAP);
 - 2.1.8. úprava a doplnění relevantních částí Smlouvy, včetně akceptačních a fakturačních milníků, v návaznosti na výše popsané skutečnosti.
- 2.2. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 2.2.1. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.1 tohoto Dodatku se akceptační milník Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov rozděluje na více fází podle Přílohy č. 2 tohoto Dodatku. Dodavatel se zavazuje realizovat s tím spojené vícepráce, a to v rozsahu a za podmínek vymezených v tomto Dodatku, v jeho Příloze č. 2 a za obecných podmínek vymezených Smlouvou a jejími Dodatky.
 - 2.2.2. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.2 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje provést pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, postupnou digitalizaci dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných v období od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období, a to v termínech, za podmínek a postupy stanovenými Smlouvou ve znění jejích dodatků pro postupnou digitalizaci.
 - 2.2.3. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.3 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje poskytovat pro Objednatele, v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě ve znění jejích dodatků včetně tohoto Dodatku, službu „Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí“ v období do 30. 11. 2023.


- 2.2.4. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.4 tohoto Dodatku se Dodavatel zavazuje poskytovat Objednateli služby Poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2, aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 po dobu provozu Pilot 3. fáze systému e-Sbírka a e-Legislativa tedy od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023. A aplikační podpory úrovně L3 a L4 po dobu provozu Pilot 2. fáze systému e-Sbírka a e-Legislativa, tedy od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023; Plnění bude poskytováno v rámci plnění předmětu Smlouvy a za podmínek stanovených ve Smlouvě (aplikovány budou zejména, nikoliv však výlučně, body 3.4.5 a 3.4.6 Smlouvy v míře nezbytné pro zajištění dostupnosti Pilotního provozu v rámci poskytované aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4), v tomto Dodatku a jeho přílohách, jakož i v dalších dodatcích Smlouvy. Úrovně podpory a rozsah aplikace čl. 2.2.5 a čl. 2.7 Dodatku č. 9 pro Pilot 1. a 2. fáze jsou stanoveny v Přílohách č. 5, č. 7, č. 8 a č. 9 Dodatku č. 10. 3. fáze Pilotu bude probíhat podle standardů a SLA (včetně všech souvisejících práv a povinností) stanovených Smlouvou pro provoz systému v době po KAP.
- 2.2.5. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.5 toho Dodatku se z akceptačních milníků e-Legislativa RC3c – vícepráce, Integrace 2 – vícepráce, Implementace e-Legislativa RC3c, Implementace e-Legislativa RC4 a Integrace 2 vydělují Oprávnění, jak jsou definována v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, tak, že tvoří samostatný akceptační a fakturační milník. Při jejich akceptaci a fakturaci se postupuje podle podmínek stanovených ve Smlouvě, v tomto Dodatku a v dalších dodatcích Smlouvy.
- 2.2.6. V návaznosti na ustanovení čl. 2.1.6 toho Dodatku se dodavatel zavazuje realizovat Pilot tak, že bude realizován za podmínek stanovených Smlouvou a v Příloze č. 4 Dodatku č. 10, avšak v následujících termínech – Pilot 1. fáze v období od 15. 3. 2023 až 15. 6. 2023, Pilot 2. fáze bude probíhat v období od 1. 7. 2023 až 30. 9. 2023 a Pilot 3. fáze bude probíhat v období od 1. 10. 2023 až 30. 11. 2023. 3. fáze Pilotu bude probíhat podle standardů a SLA (včetně všech souvisejících práv a povinností) stanovených Smlouvou pro provoz systému v době po KAP.
- 2.2.7. Smluvní strany se dohodly, že případné výhrady Objednatele k plnění poskytovanému Dodavatelem na základě Smlouvy v rámci budoucích akceptačních milníků Implementace e-Legislativa RC3c, Integrace 2 a Oprávnění, Dokumentace, Implementace e-Legislativa RC5 (dále jen „**Akceptační milníky s výhradou**“), budou řešeny následujícím způsobem:
- 2.2.7.1. všechny výhrady Objednatele identifikované v rámci předávaného plnění Dodavatele ke kterémukoli Akceptačnímu


milníku s výhradou dle této Smlouvy nebo jeho části, bez ohledu na to, zda budou – v případě jejich oprávněnosti – ze strany Objednatele formulovány konkrétně nebo s jistou mírou obecnosti, budou ze strany Dodavatele bezplatně odstraněny v termínech stanovených Smlouvou. Objednatel na žádost Dodavatele bez zbytečného odkladu specifikuje odkaz na Smlouvu, nebo jiný dokument odsouhlasený Smluvními stranami (včetně funkčních požadavků na základě implementační analýzy), kde je uveden parametr plnění, který je Dodavateli vytýkán, případně specifikuje parametr vytýkaného plnění v takovém rozsahu, aby Dodavatel mohl určit postup, jak tuto výhradu odstranit, nebo specifikuje postup, jakým bude určení takového parametru dosaženo; řádné plnění tohoto požadavku je podmínkou aplikace tohoto bodu 2.2.7.1.

- 2.2.7.2. Objednatel v rámci odstraňování každé výhrady provede, ve spolupráci s Dodavatelem, pokud je tato spolupráce zapotřebí, opětovné přetestování všech plnění nebo jeho části, u něhož byla vznesena výhrada ze strany Objednatele, a to zejména z hlediska jejich souladu s příslušnou funkční specifikací specifikovanou ve Smlouvě nebo jiném dokumentu odsouhlaseném Smluvními stranami;
- 2.2.7.3. vznikne-li v rámci opakovaného testování ve smyslu ustanovení 2.2.7.2 tohoto Dodatku potřeba provedení jiné změny implementace plnění Dodavatele, zavazuje se Dodavatel takovou změnu implementace na své náklady provést, a to ve lhůtě písemně dohodnuté Smluvními stranami; Dodavatel je oprávněn odmítnout provedení změny implementace v případě, že požadovaná změna implementace nebude v souladu se Smlouvou nebo s jiným dokumentem odsouhlaseným Smluvními stranami;
- 2.2.7.4. všechny výhrady Objednatele budou ze strany Dodavatele vypořádány a odstraněny na náklady Dodavatele nejpozději do termínu KAP tak, aby byla zajištěna plná věcná funkčnost systému e-Sbírka a e-Legislativa.

2.3. Strany se v souvislosti s dodatečným plněním Dodavatele dle článku 2.1 tohoto Dodatku dohodly, že cena za:



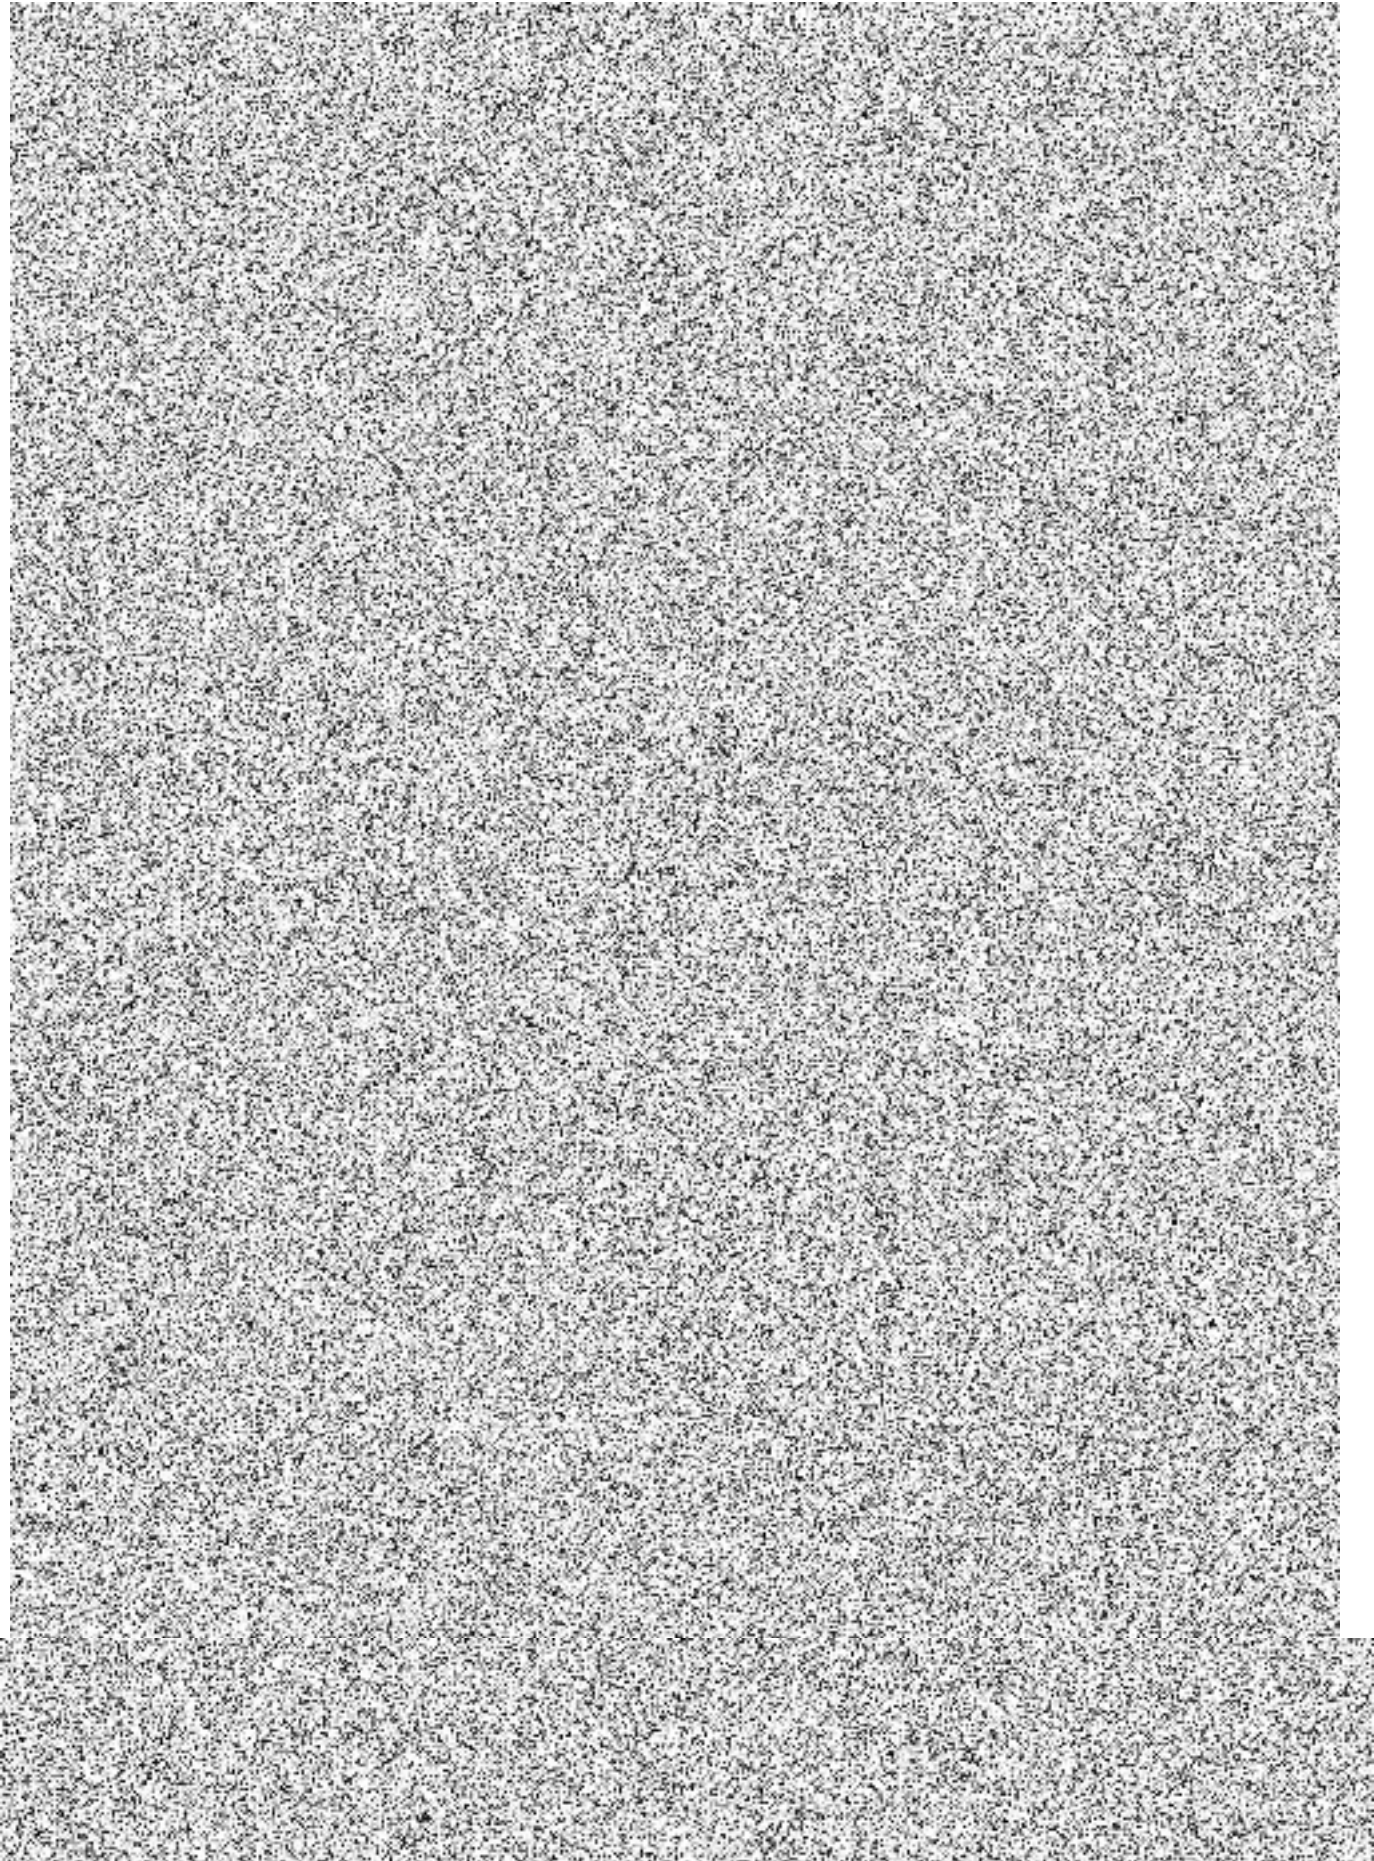



- 2.5. V návaznosti na skutečnosti uvedené výše v tomto Dodatku se Strany dohodly na úpravě termínů akceptačních milníků (bod 4.1.1 tohoto Dodatku) a jejich následujícím doplnění:
- 2.5.1. zavedení nového dílčího akceptačního milníku **Oprávnění**, který nově obsahuje plnění uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, které byly původně součástí akceptačních milníků e-Legislativa RC3c – vícepráce, Integrace 2 – vícepráce, Implementace e-Legislativa RC3c, Implementace e-Legislativa RC4 a Integrace 2;
 - 2.5.2. zavedení nového dílčího akceptačního milníku **Digitalizace 4J**, jakožto součást Akceptačního milníku „Digitalizace“ s termínem akceptace dne 31. 12. 2023, jehož předmětem je provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období;
 - 2.5.3. zavedení nových dílčích akceptačních milníků **Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023**, a **Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023** jako součást Akceptačního milníku Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí;
 - 2.5.4. nového akceptačního milníku „Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGOV“ a jeho nových dílčích akceptačních milníků **DCeGov – fáze 3 (bod 3 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy)** a **DCeGov – fáze 4 (dle Přílohy č. 2, bod 2 tohoto Dodatku)** a **DCeGov – fáze 5 (dle Přílohy č. 2, bod 3 tohoto Dodatku)** jako součást nového celkového akceptačního milníku **Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov**.
- 2.6. V návaznosti na provedené změny akceptačních milníků se Strany dohodly na úpravách termínů a výše fakturačních milníků (čl. 4.1.2 tohoto Dodatku) a na následujících doplněních fakturačních milníků:
- 2.6.1. Stanovují se nové fakturační milníky č. 4L1 až 4L3 reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.1 k milníku zaváděnému dle čl. 2.5.4;

- 2.6.2. stanovuje se nový fakturační milník č. 4R reflektující část plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.5 a čl. 2.5.1;
- 2.6.3. Stanovují se nové fakturační milníky č. 5O až 5P reflektující plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.3, k milníkům zaváděným dle čl. 2.5.3;
- 2.6.4. stanovuje se nový fakturační milník č. 8 reflektující část plnění, které je Dodavatel povinen poskytnout dle čl. 2.2.2 a čl. 2.5.2;
- 2.7. Dodavatel poskytne proškolení Objednatele nebo jím pověřené osoby na zajištění podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa úrovně L1 a L2 v období 4 měsíců končících nejpozději 4 měsíce po KAP, které souvisí s objasněním systému práce podpory úrovně L1 a L2 podle Přílohy č. 5, 7, 8 a 9 Dodatku č. 10 této Smlouvy. Toto proškolení nenahrazuje jakékoli poskytování podpory systému e-Sbírka a e-Legislativa. Dodavatel není povinen toto proškolení poskytnout v případě, že by tímto Dodavatel předal obchodní tajemství jakémukoli soutěžiteli, za kterého se nepovažuje Objednatel, nebo jím ovládané subjekty. Objednatel proškolí osoby, které budou mít dostatečnou kvalifikaci pro práci, kterou mají vykonávat.


3. ZMĚNA ČLÁNKU Č. VI SMLOUVY (CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZÁDRŽNÉ)


3.1. Strany se dohodly, že ustanovení odstavce 6.1.1 Smlouvy se mění a nově zní:


6.1.1 celková cena za provedení Díla činí 481 305 350,89 Kč (slovy: čtyři sta osmdesát jeden milion tři sta pět tisíc tři sta padesát korun českých a osmdesát devět haléřů) bez DPH, tj. 582 379 474,58 Kč (slovy: pět set osmdesát dva miliony tři sta sedmdesát devět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři korun českých a padesát osm haléřů) včetně DPH ve výši 21 %;


3.2. Strany se dohodly, že tabulka uvedená v ustanovení odstavce 6.4 písm. a) Smlouvy ve znění Dodatku č. 7 se ruší a nově zní:


Fakturační milník	Akceptační milník Díla (obsah plnění)	Výše fakturované částky z celkové ceny Díla
fakturační milník č. 1	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy
fakturační milník č. 2	dle přílohy č. 3 Smlouvy	15 % z ceny dle bodu 6.1.1 Smlouvy

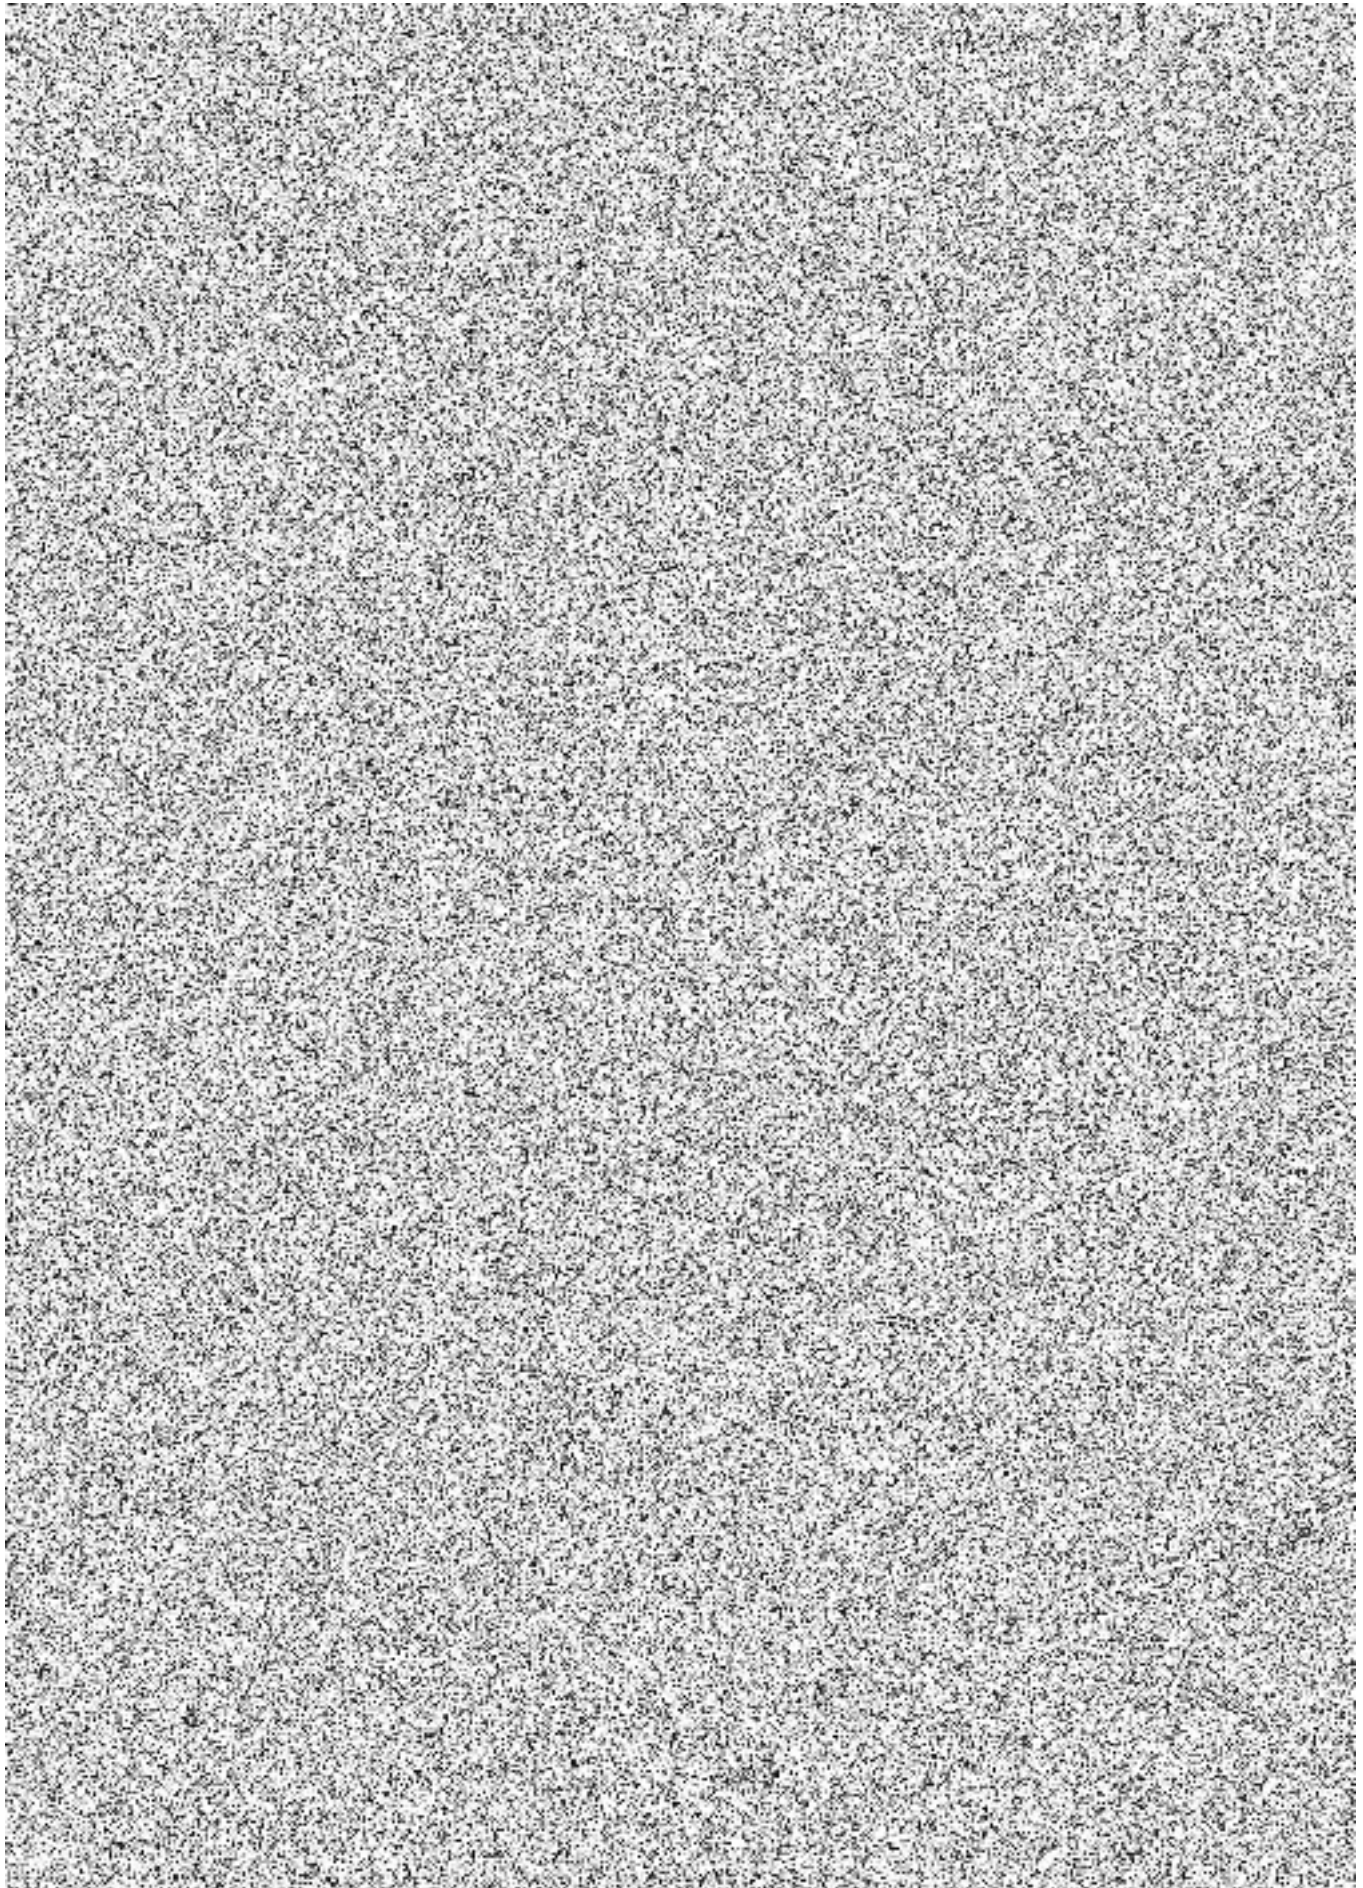

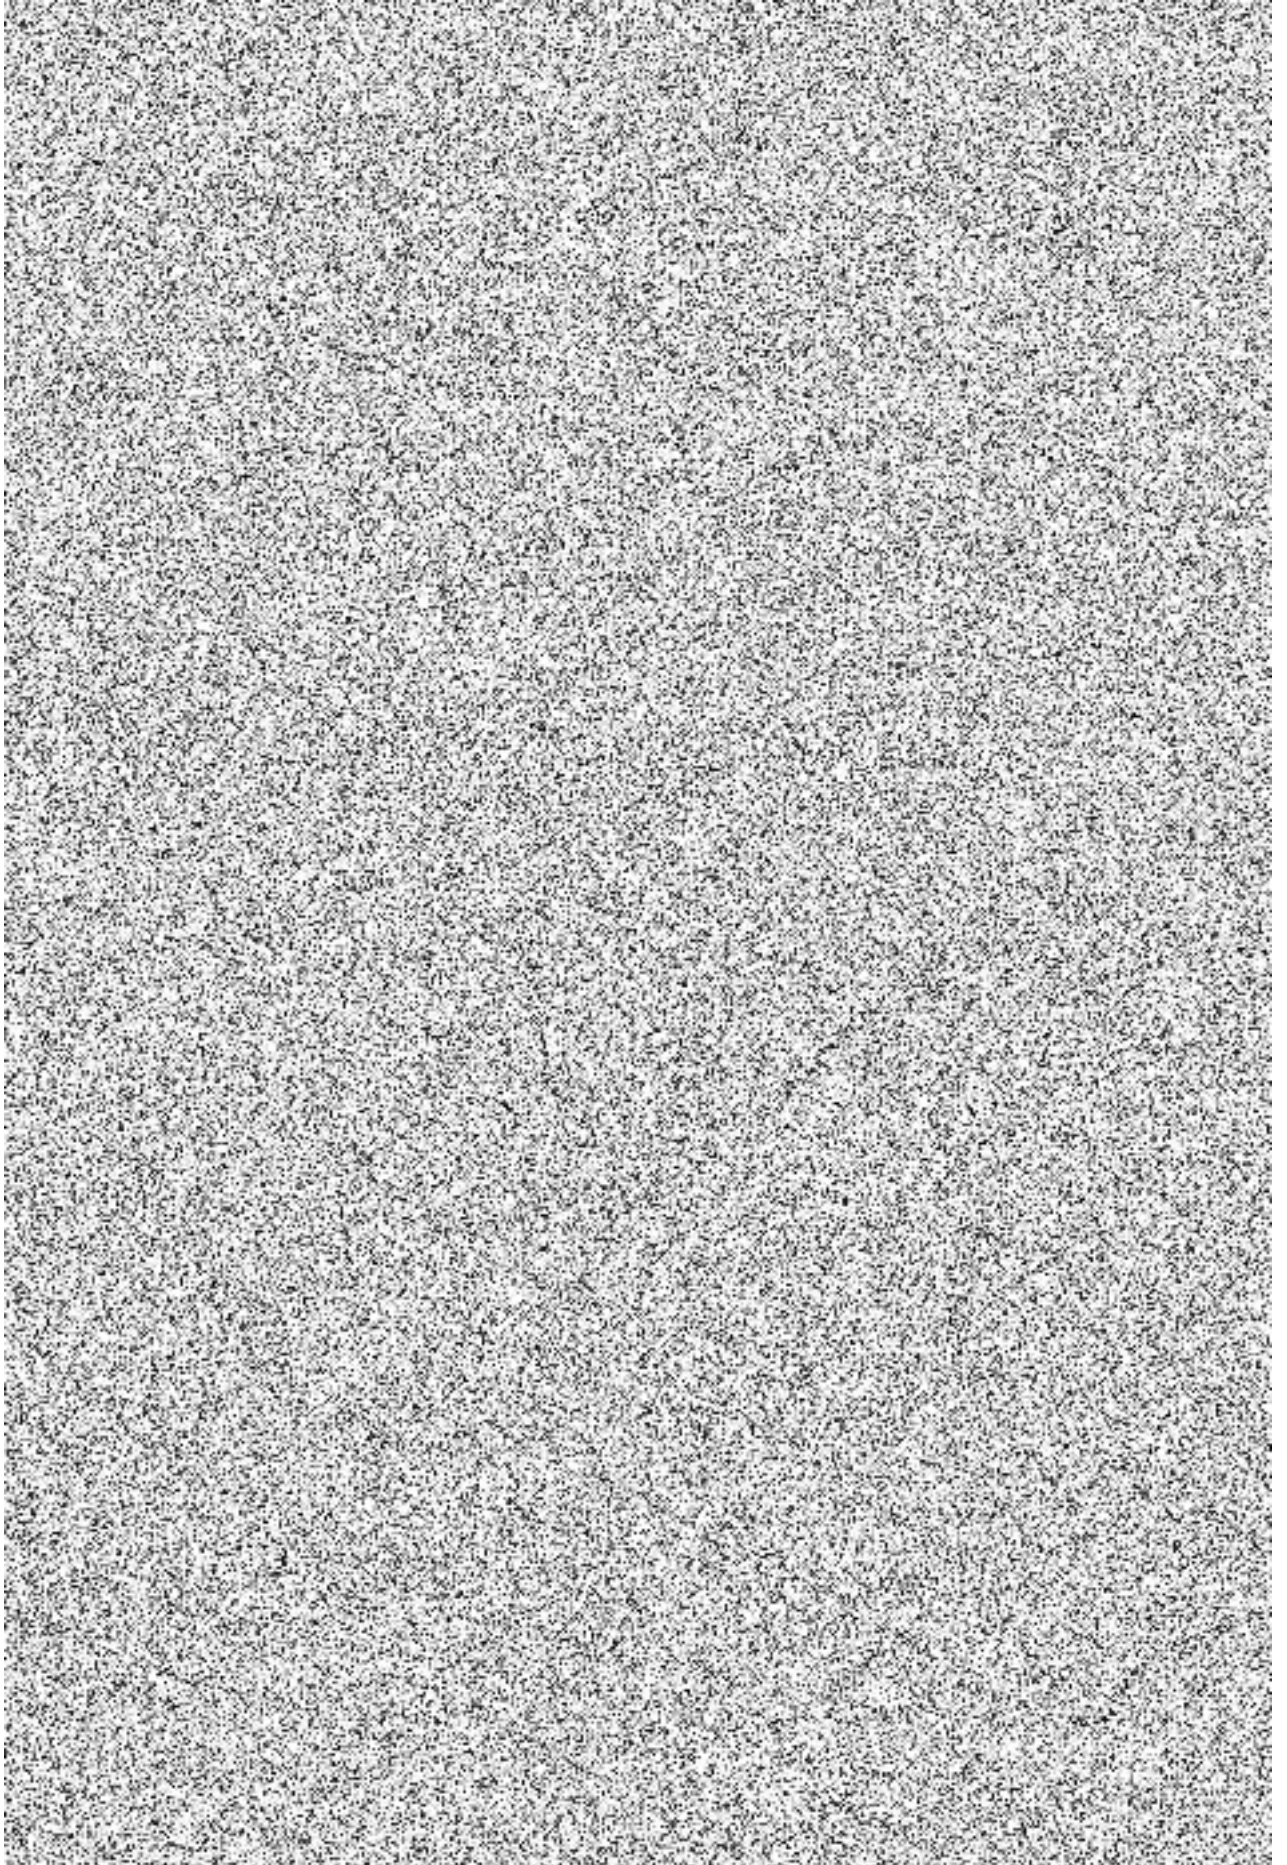

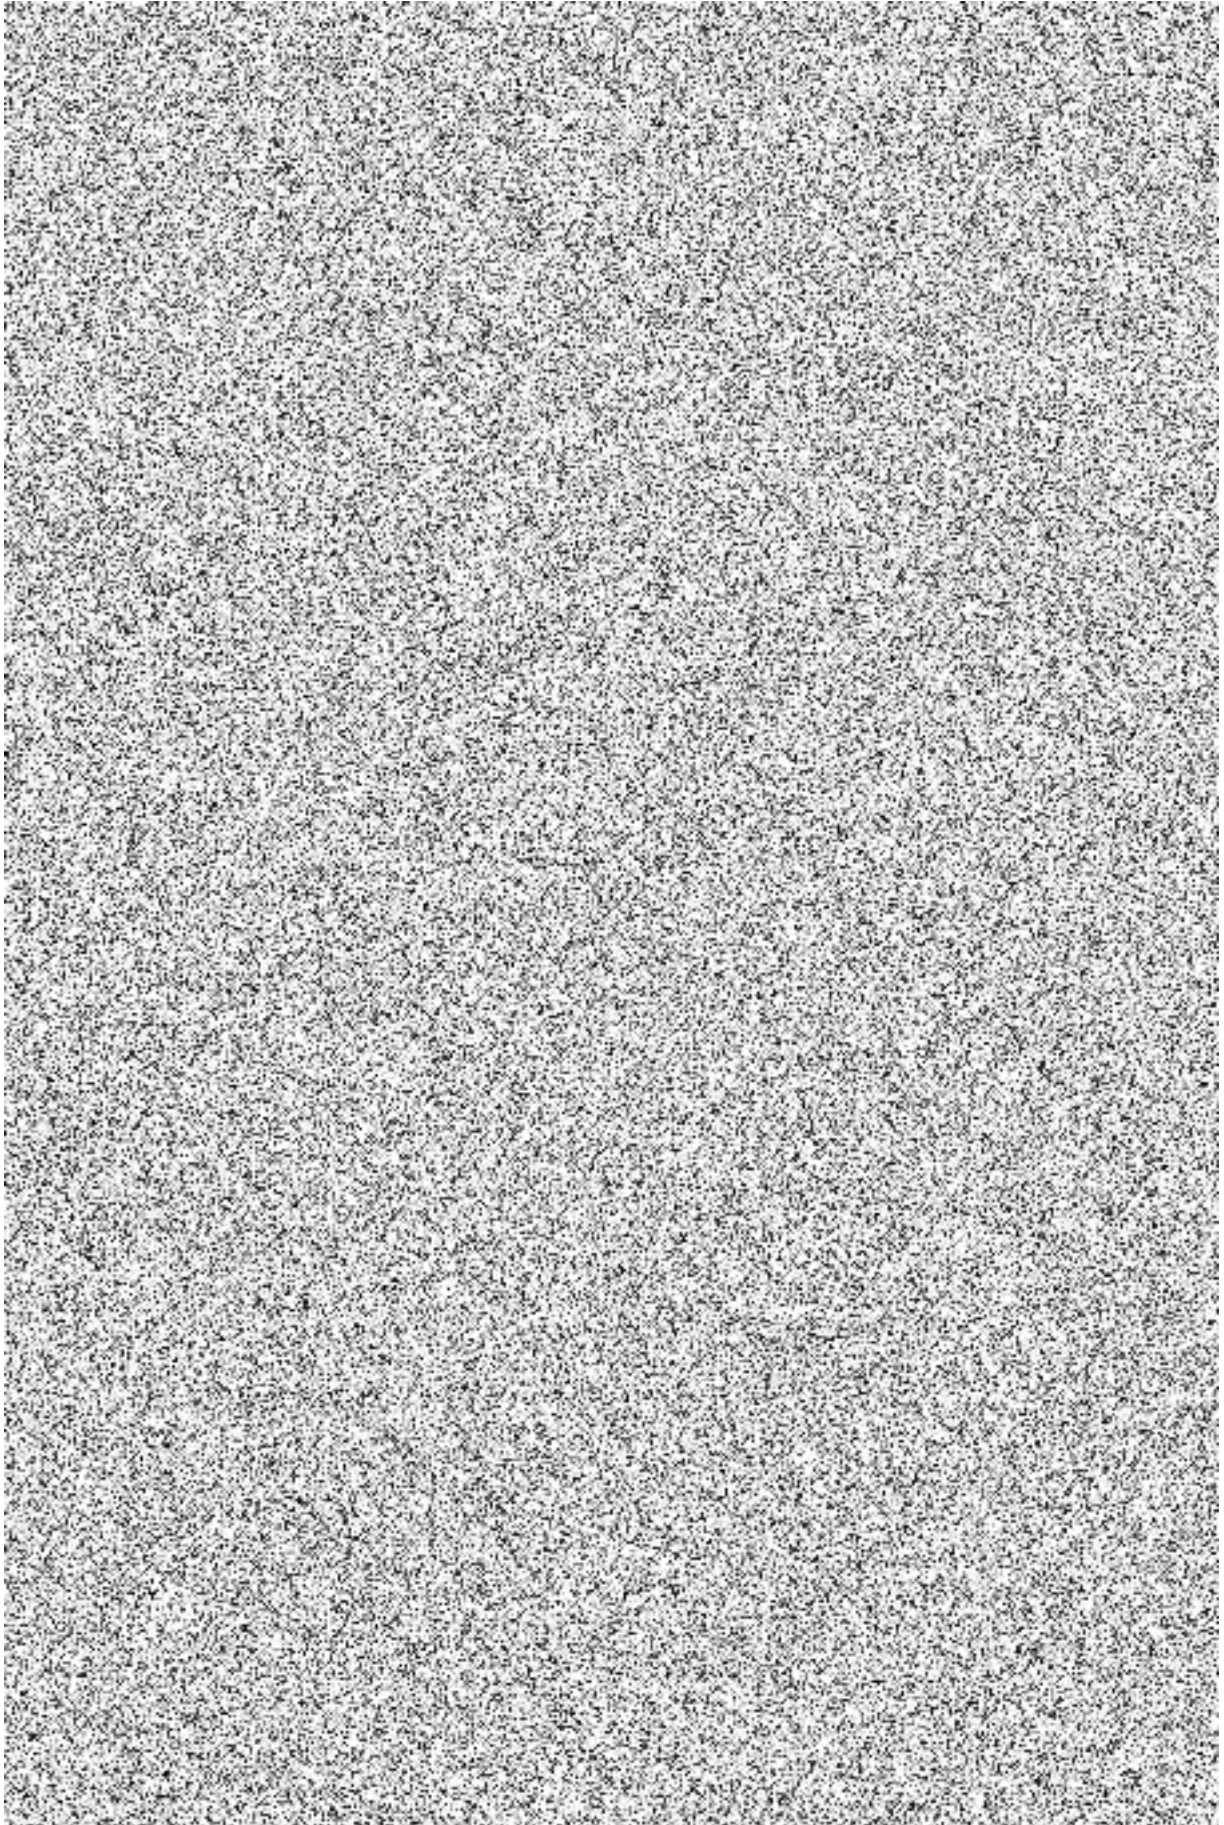

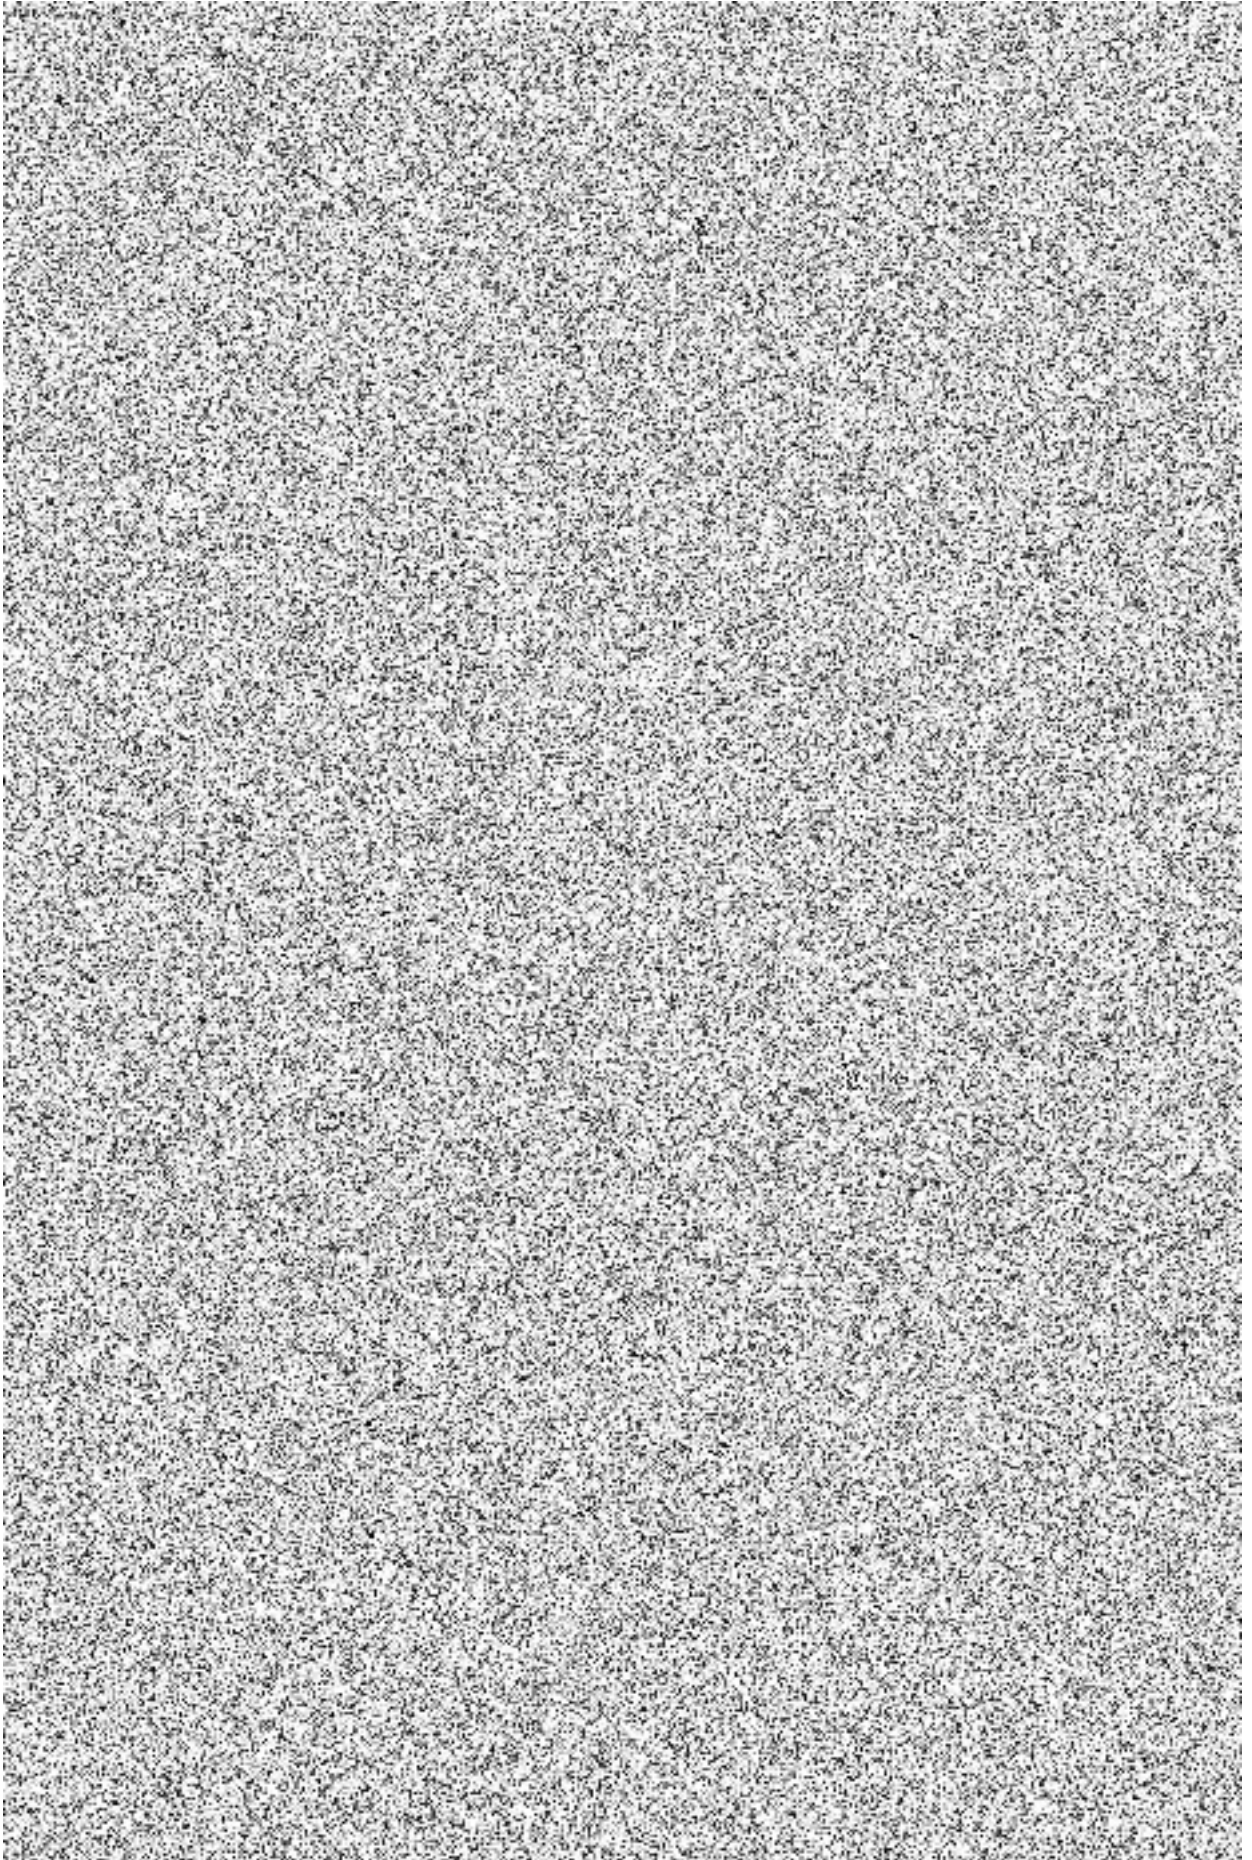

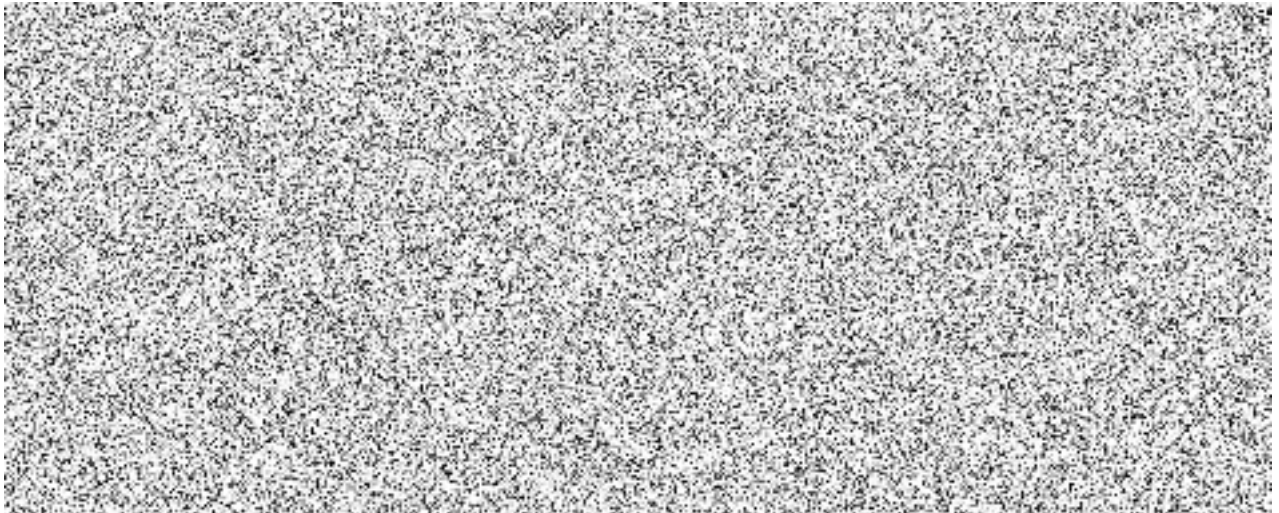

4. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 3 SMLOUVY (AKCEPTAČNÍ A FAKTURAČNÍ MILNÍKY)

4.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 3 Smlouvy (Akceptační a fakturační milníky):

4.1.1. Část 1. (Akceptační milníky), tabulka 1.1 (Akceptační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) se ruší a nově zní:

Název akceptačního milníku	Popis akceptačního milníku (obsah dodávky)	Termín akceptace
Implementační analýza	Analýza a návrh řešení Návrh datového modelu Návrh uživatelského rozhraní Detailní návrh integrace Detailní metodika digitalizace včetně tezauru CzechVoc a modulu EUR-Lex Návrh HW, SW Návrh akceptačních scénářů (smluvní) Rámcový návrh testovacích scénářů	T + 3 měsíce + 5 pracovních dnů
Implementace hardwarové infrastruktury	Dodávka HW a SW pro testovací prostředí Instalace HW a SW	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů
	Dodávka HW a SW pro ostatní prostředí Instalace HW a SW	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Úprava Díla plynoucí z analýzy rizik kybernetické bezpečnosti provedené na základě Varování NÚKIB	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Dodání komponent HW nad rámec Díla do datového centra Objednatele v lokalitě Malešic	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů

Digitalizace (Tvorba datové báze)	Datový model - vytvoření Digitalizace 1. část A – Sbírky zákonů ročník 1945-1989 včetně	T + 8 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 1. část B – Úřední listy ročník 1945-1956 včetně	T + 17 měsíců + 5 pracovních dnů
	Digitalizace 2. část – všechny sbírky z let 1990 – 2019 (Sbírky zákonů ročník 1990-2019, Sbírky mez. smluv ročník 2000-2019, Úřední listy ročník 1957-1961 včetně)	T + 20 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3A část – normalizace a tezaurus CzechVoc	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3B část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 25 měsíců, normalizace Úředního listu a Sbírky mezinárodních smluv namapování terminologické části tezauru CzechVoc na data vytvořená v rámci digitalizace	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 3C část – normalizace do upraveného modelu dat e-legislativy v T + 28 měsíců, integrace současného Věcného rejstříku a Právních oblastí, včetně přemapování indexace současného věcného rejstříku na nový věcný rejstřík, doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za využití výstupů CzechVoc v T+ 22 měsíců a v T + 25 měsíců	T + 29 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4. část A – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do 30. 6. 2020	T + 25 měsíců + 10 pracovních dnů
	Digitalizace 4 část B – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2020 vydané do od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020	1. 3. 2021
	Digitalizace 4 část C – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2021	1. 6. 2021
	Digitalizace 4 část D – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané do od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021	30. 9. 2021
Digitalizace 4 část E – Sbírky zákonů a mezinárodních smluv ročník 2021 vydané od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru	14. 12. 2022	

	terminologie CzechVoc za toto období, a dále doplnění a domapování terminologie CzechVoc za období od milníku Digitalizace 3C (1. 3. 2021) do 30. 9. 2021	
	Digitalizace 4 část F - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 3. 2023
	Digitalizace 4 část G - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a mezinárodních smluv vydaných od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 6. 2023
	Digitalizace 4 část H - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	30. 9. 2023
	Digitalizace 4 část I - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	14. 12. 2023
	Digitalizace 4 část J - provedení postupné digitalizace dokumentů Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv vydaných od 1. 10. 2023 do 30. 11. 2023, včetně doplnění a domapování tezauru terminologie CzechVoc za toto období	31. 12. 2023
Implementace e-Sbírký RC1	Vývoj (eŠablona-mínusová osa, CzechVoC), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 9 měsíců + 5 pracovních dnů
Implementace e-Sbírký RC2	Vývoj (portál e-Sbírký), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí	T + 19 měsíců + 10 pracovních dnů

	Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	
Implementace e-Legislativa RC1	Vývoj (eŠablona-plusová osa), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 22 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC2	Vývoj (Generátor novel, související dokumenty), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	T + 26 měsíců + 10 pracovních dnů
Implementace e-Legislativa RC3a	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	18. 2. 2022
Implementace e-Legislativa RC3b	Vývoj (funkční celky a související vícepráce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	31. 5. 2022
e-Legislativa RC3c - vícepráce	Vícepráce dodané v rámci milníku Implementace e-Legislativa RC3c (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7 a Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy). Akceptace je možná za předpokladu, že provázané části systému budou ve stavu, kdy bude možné plnohodnotně pro tyto vícepráce provést proces akceptace. Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023
Oprávnění	Oprávnění (Příloha č. 1 Dodatku č. 11 Smlouvy)	30. 9. 2023
Integrace 2 - vícepráce	Vícepráce dodané v rámci milníku Integrace 2 (Příloha č. 1 a 2 Dodatku č. 7, bez víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6	30. 6. 2023

	Dodatku č. 10 Smlouvy). Vyjma Oprávnění a Změnového požadavku 13 dle Dodatku č. 7 Smlouvy).	
Vícepráce dodané v rámci milníku KAP	Vícepráce dodané v rámci milníku KAP (Příloha č. 1 Dodatku č. 9 Smlouvy)	30. 11. 2023
Implementace e-Legislativa RC3c	Vývoj (funkční celky a související práce dle Přílohy č. 2 Dodatku), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů. Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023
Implementace e-Legislativa RC4	Vývoj (Veřejný web), návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů Vyjma Oprávnění.	30. 6. 2023
Implementace e-Legislativa RC5	Zpracování požadavků zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	27. 11. 2023
Integrace 1	Vývoj (technická integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, a to na úrovni testovacích volání izolovaných integračních operací), návrh detailních testovacích scénářů, Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	29. 3. 2022
Vícepráce a změnové požadavky specifikované v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Smlouvy	Vývoj víceprací a změnových požadavků specifikovaných v čl. 2.2.6 Dodatku č. 10 Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	28. 4. 2023
Integrace 2	Vývoj (zbývající část integrace s informačním systémem Poslanecké sněmovny, s informačním systémem Senátu a s informačním systémem oDok, integrace mezi ostatními	30. 6. 2023

	<p>systemy), návrh detailních testovacích scénářů (včetně otestování nástrojů systému v rámci integrovaných nástrojů, systémů a procesů) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Nasazení do testovacího prostředí Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů Vyjma Oprávnění.</p>	
Nasazení	<p><u>Nasazení pro Pilot 1. fázi</u> Nasazení v rozsahu systému e-Sbírka do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka v produkci (UAT)</p>	15. 3. 2023
	<p><u>Nasazení pro Pilot 2. fázi</u> Nasazení do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa v produkci (UAT)</p>	30. 6. 2023
	<p><u>Nasazení pro Pilot 3. fázi</u> Nasazení do produkčního prostředí Testy systému e-Sbírka a e-Legislativa v produkci (UAT)</p>	30. 9. 2023
Školení	<p>Školení administrátorů Školení L1 a L2 podpory Školení odborné podpory (legislativní Help Desk a odborných aparátů)</p>	27. 11. 2023
Pilot	<p><u>Pilot 1. fáze (15. 3. 2023 až 15. 6. 2023)</u> Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky Pilotní provoz e-Sbírky (ověření funkčnosti e-Sbírky Objednatelem)</p>	30. 6. 2023
	<p><u>Pilot 2. fáze (1. 7. 2023 až 30. 9. 2023)</u> Migrace pro Pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy Pilotní provoz e-Sbírky a e-Legislativy</p>	30. 9. 2023
	<p><u>Pilot 3. fáze (1. 10. 2023 až 30. 11. 2023)</u> Migrace pro Pilotní provoz celého systému včetně Oprávnění a implementace DCeGov Pilotní provoz (ověření funkčnosti celého dodávaného informačního systému eSeL Objednatelem) Migrace dat po ostrý provoz</p>	30.11.2023
Dokumentace	Stručný popis obsahu školení	T + 12 měsíců + 5 pracovních dnů

	Architektonická technická dokumentace	30. 9. 2023
	Provozní, instalační dokumentace	30. 9. 2023
	Uživatelská a školící dokumentace	30. 9. 2023
	Projektová dokumentace	30. 9. 2023
Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období od podpisu tohoto Dodatku do 30. 9. 2022	15. 10. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2022 do 31. 10. 2022	15. 11. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 11. 2022 do 30. 11. 2022	15. 12. 2022
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 12. 2022 do 31. 12. 2022	15. 1. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023	15. 2. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023	15. 3. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023	15. 4. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 4. 2023 do 30. 4. 2023	15. 5. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 5. 2023 do 31. 5. 2023	15. 6. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023	15. 7. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 7. 2023 do 31. 7. 2023	15. 8. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 8. 2023 do 31. 8. 2023	15. 9. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023	15. 10. 2023


	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023	15. 11. 2023
	Poskytování zvýšené podpory partnerských institucí v období 1. 11. 2023 do 30. 11. 2023	15. 12. 2023
Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1., 2. a 3. fáze	Příprava prostředí sběru a správy požadavků a tvorby procesů	15. 12. 2022
	Poskytování podpory úrovně L1 a technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 1. fáze	30. den čtvrtého měsíce po zahájení Pilotu 1. fáze
	Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 2. fáze	15. 10. 2023
	Poskytování podpory úrovně L1, technologické, aplikační a metodické podpory úrovně L2 a aplikační a technologické podpory úrovně L3 a L4 systému e-Sbírka a e-Legislativa po dobu Pilotu 3. fáze	15. 12. 2023
Napojení systému e-Sbírka a e-Legislativa na DCeGov	DCeGov – fáze 2 (bod 3 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 5. 2023
	DCeGov – DCeGov – fáze 3 (bod 4 Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění	30. 6. 2023
	DCeGov – fáze 4 (implementace) dle Přílohy č. 2, bod 2 Dodatku č. 11 Smlouvy	30. 9. 2023
	DCeGov – fáze 5 (Optimalizace) dle Přílohy č. 2, bod 3 Dodatku č. 11 Smlouvy	30. 11. 2023
Integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností	Vývoj (integrace systému e-Sbírka a e-Legislativa se systémem Registr práv a povinností) Úprava Dokumentace v souvislosti s realizací plnění Návrh detailních testovacích scénářů Nasazení do testovacího prostředí	27. 11. 2023


	Testy dle detailních testovacích scénářů Akceptace dle akceptačních scénářů	
Kompletní akceptace díla (KAP)	Předání kompletních výstupů projektu	30. 11. 2023


Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem.


4.1.2. Část 2. (Fakturační milníky), tabulka 2.1 (Fakturační milníky pro Implementátora technického řešení projektu e-Sbírka a e-Legislativa) stanovuje nově termíny a výše splátek následovně:


Fakturační milník	Výše splátky	Akceptační milník	Termín
Fakturační milník č. 1	15 procent	Implementační analýza	T + 3 měsíců + 5 pracovních dnů
Fakturační milník č. 2	15 procent	Implementace HW a SW – test. část	T + 5 měsíců + 5 pracovních dnů

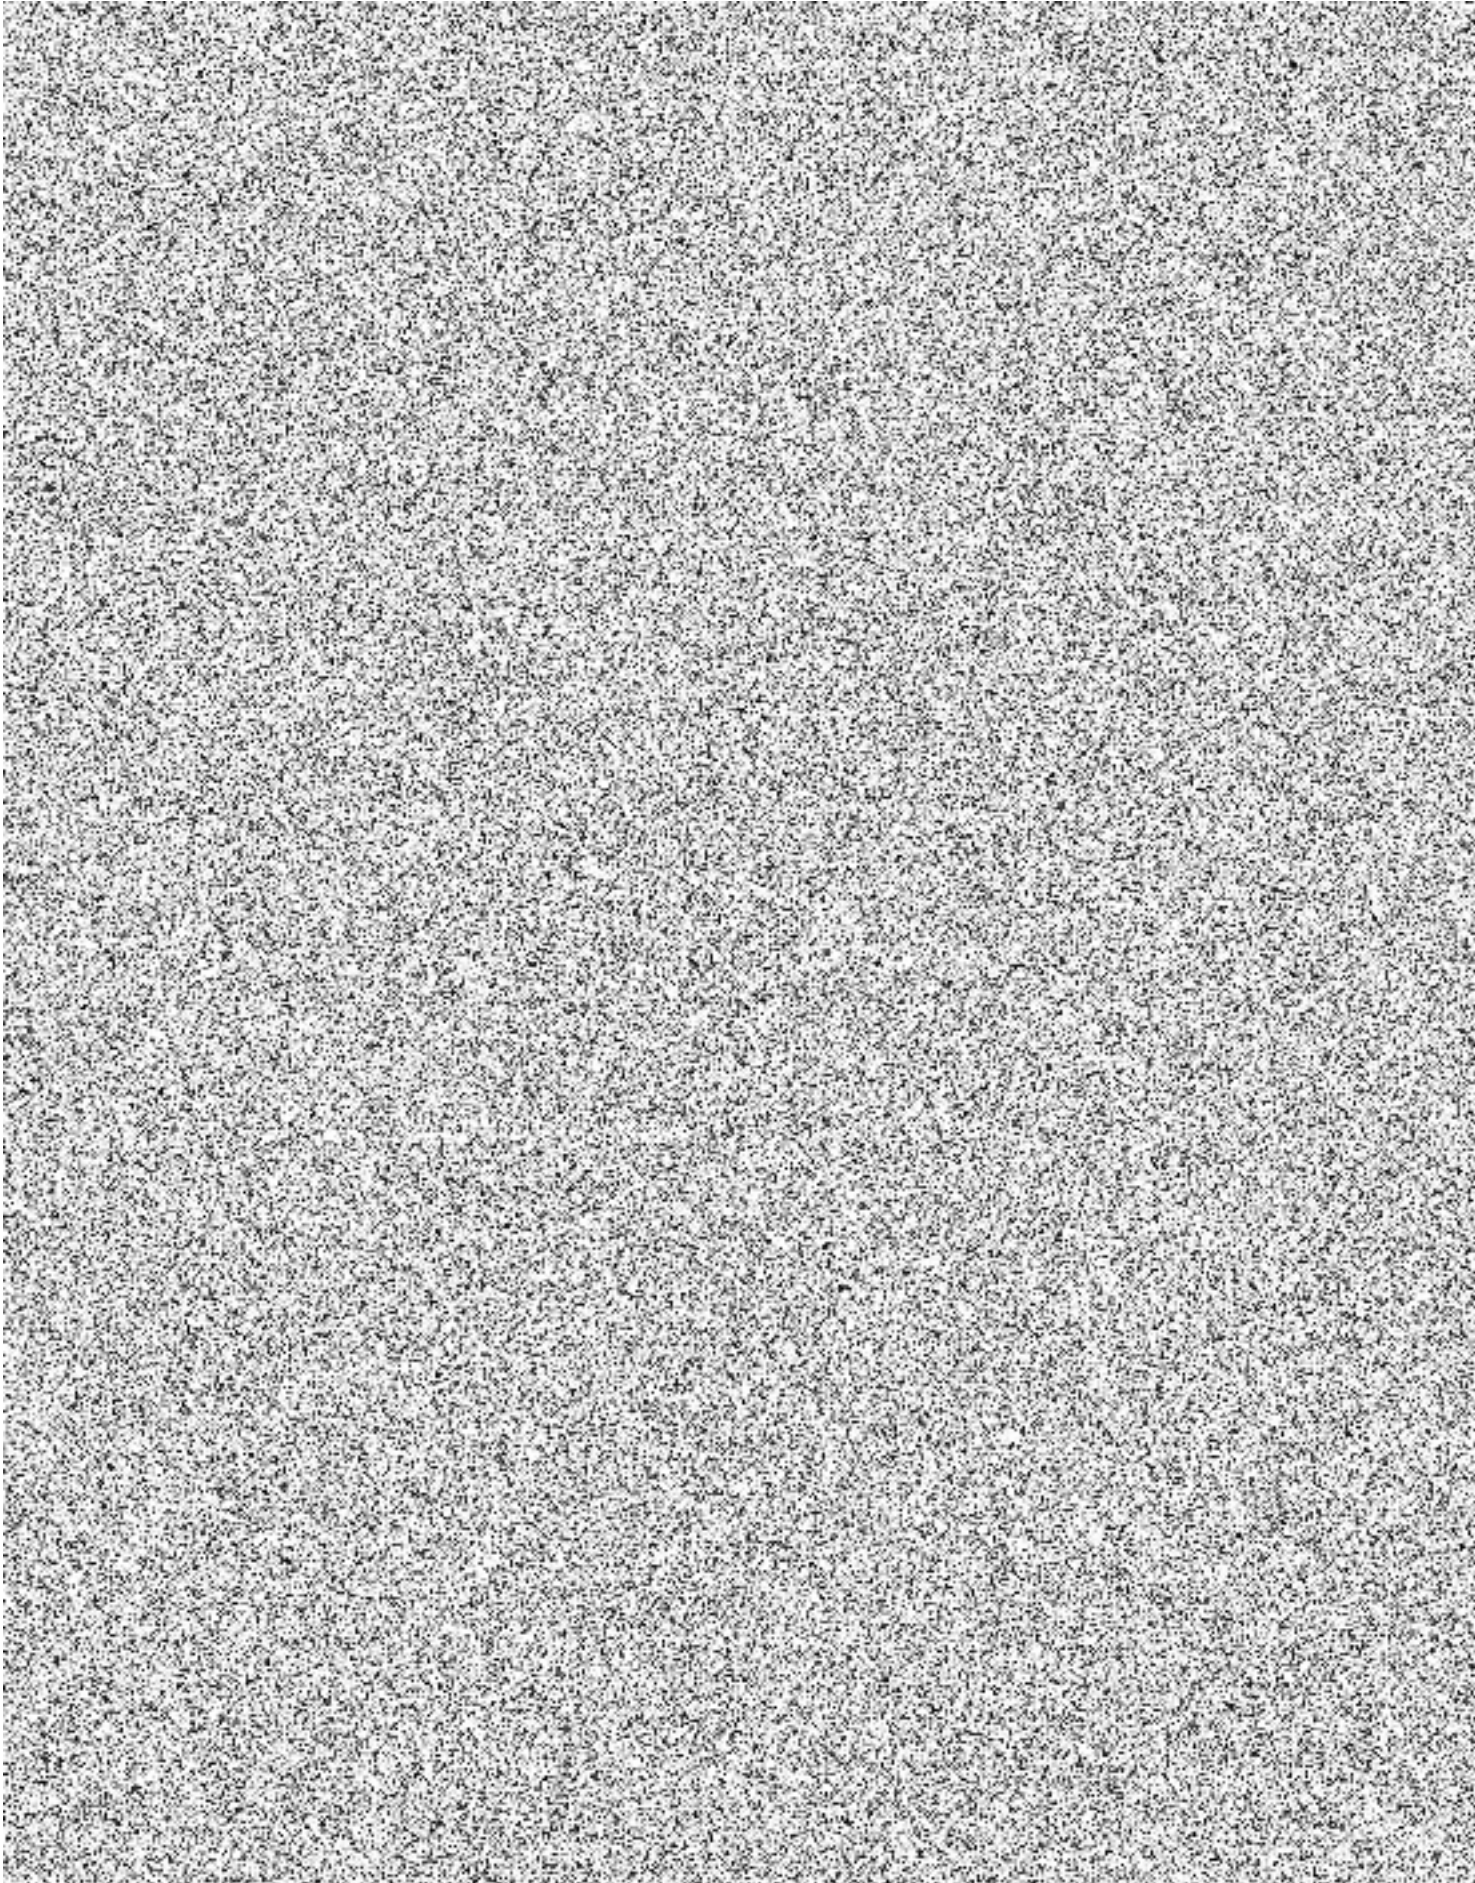

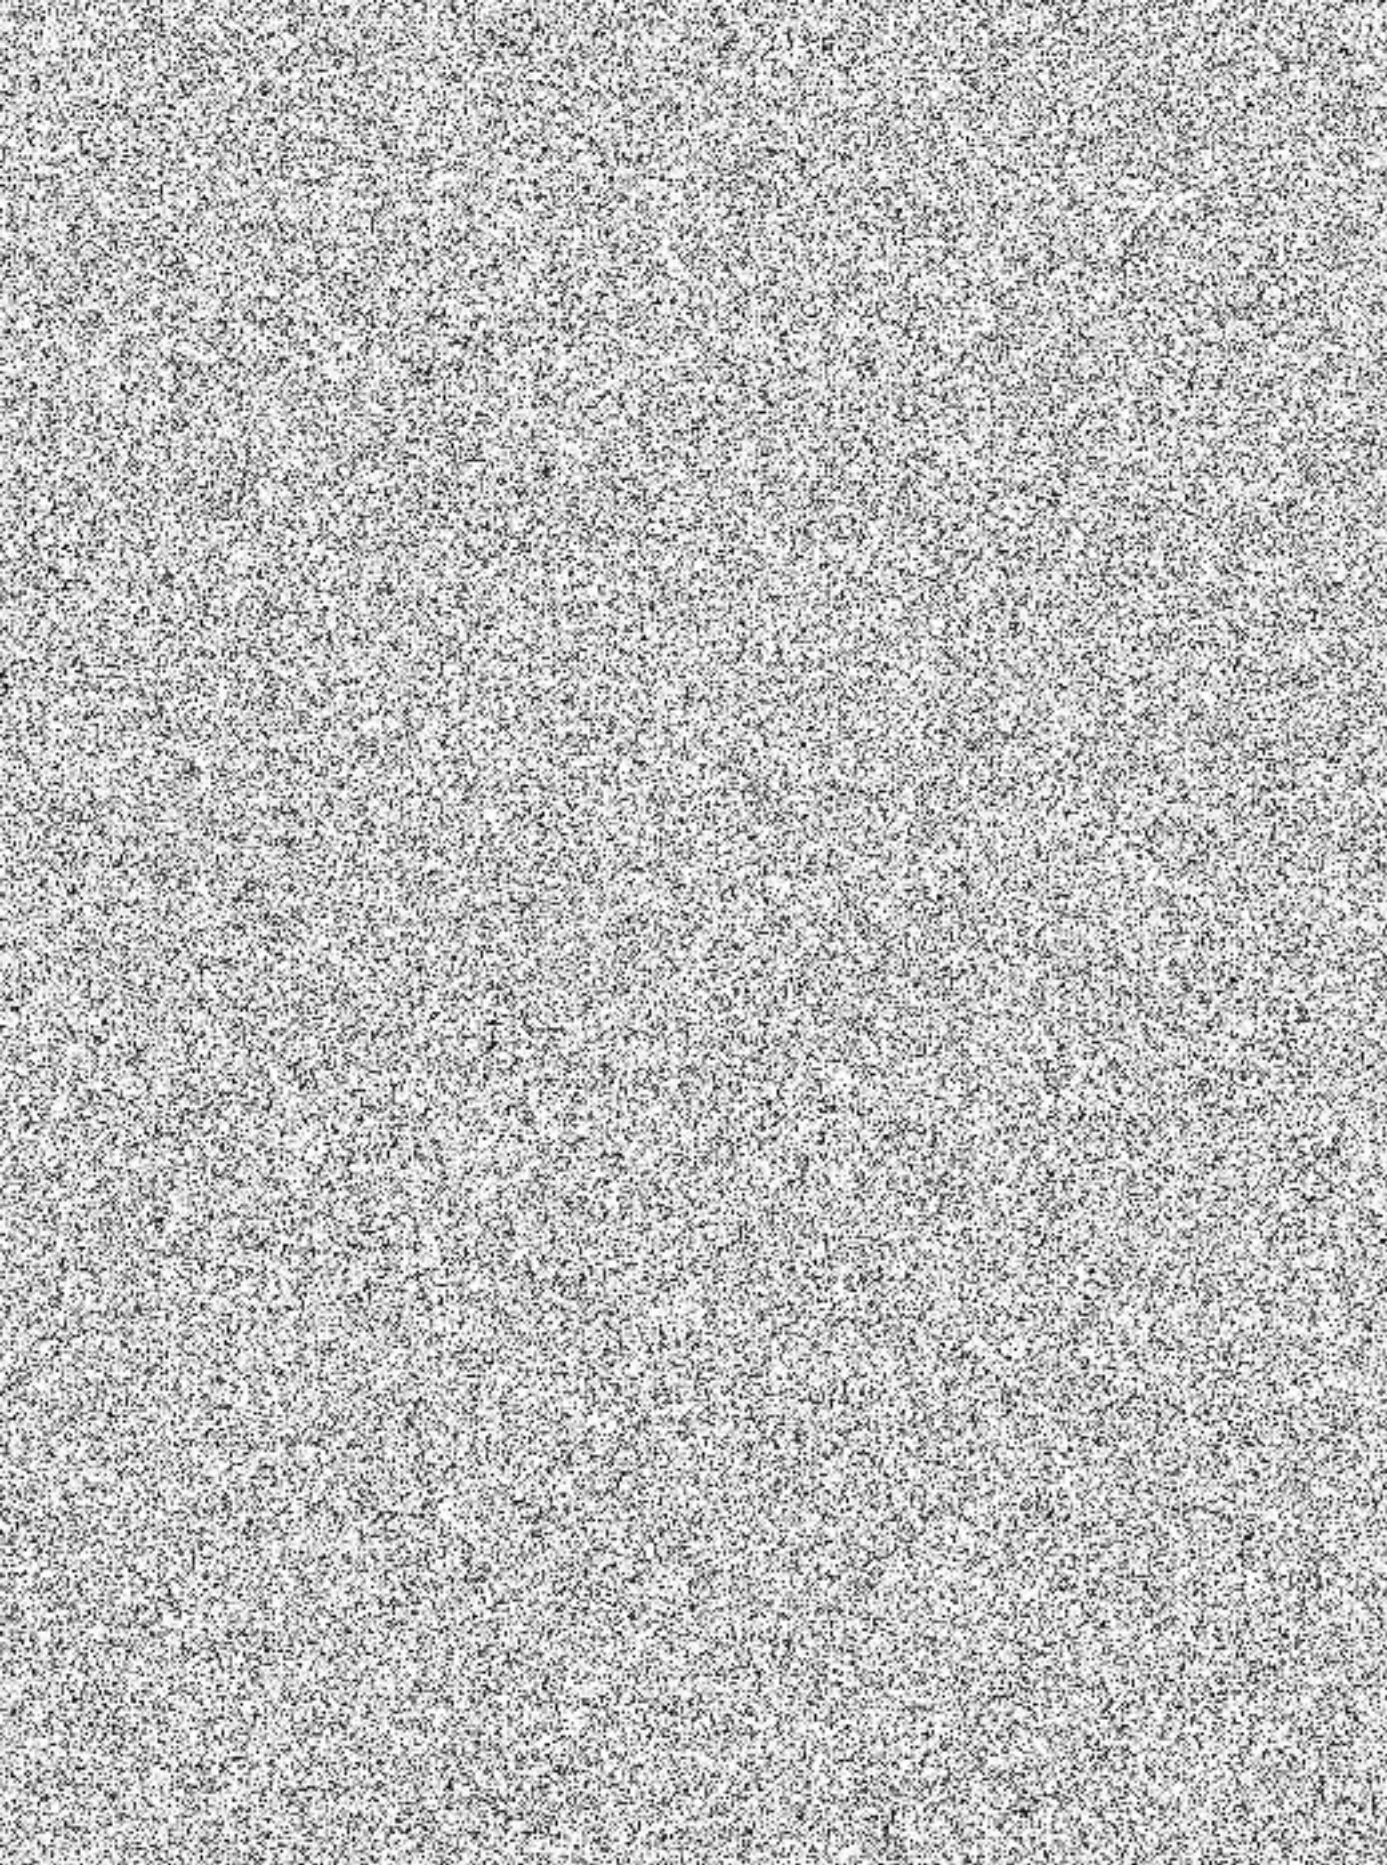

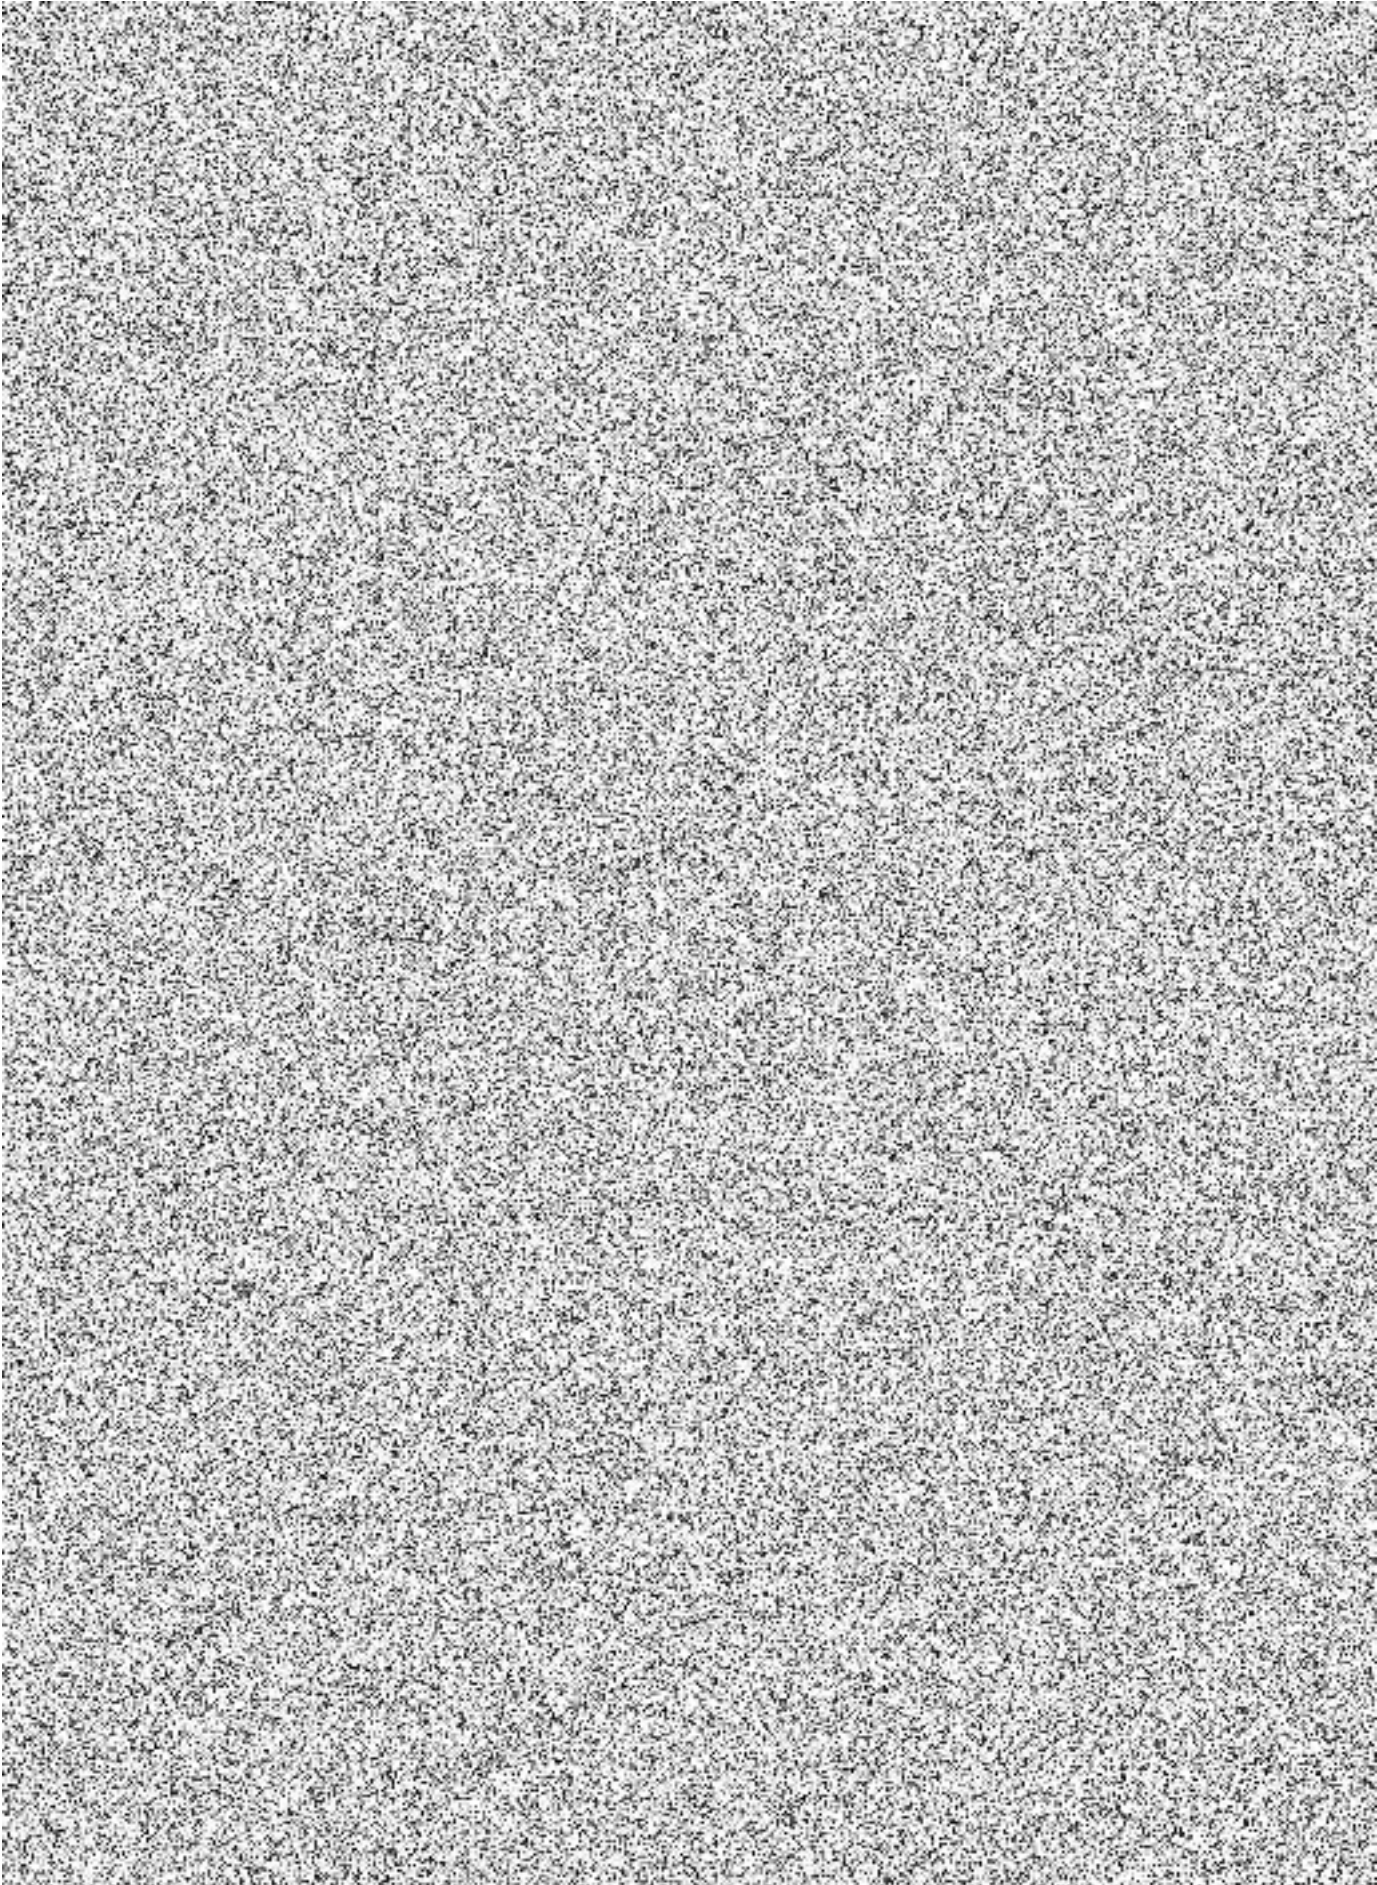

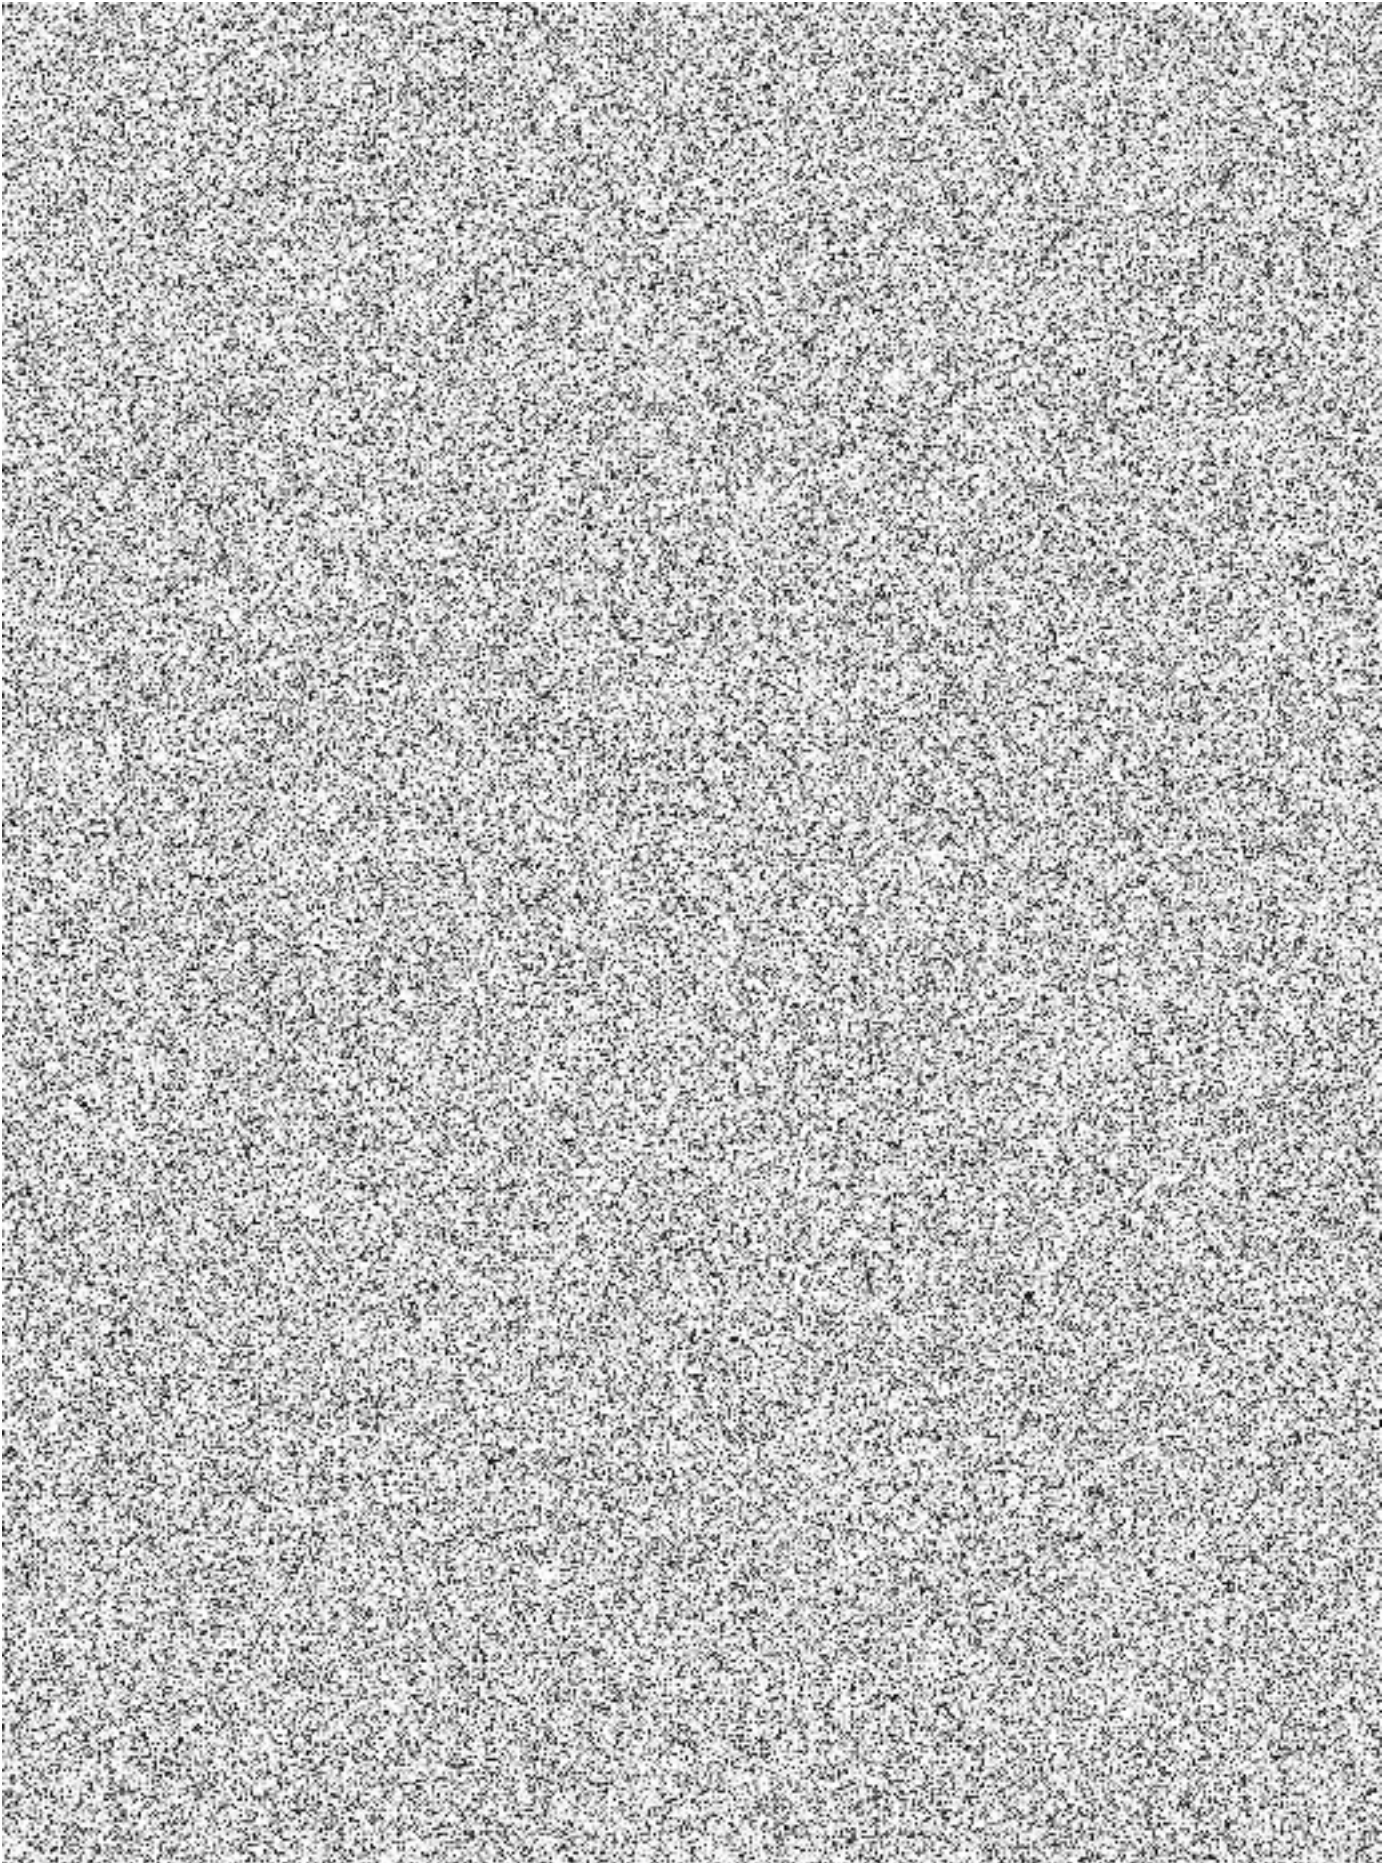

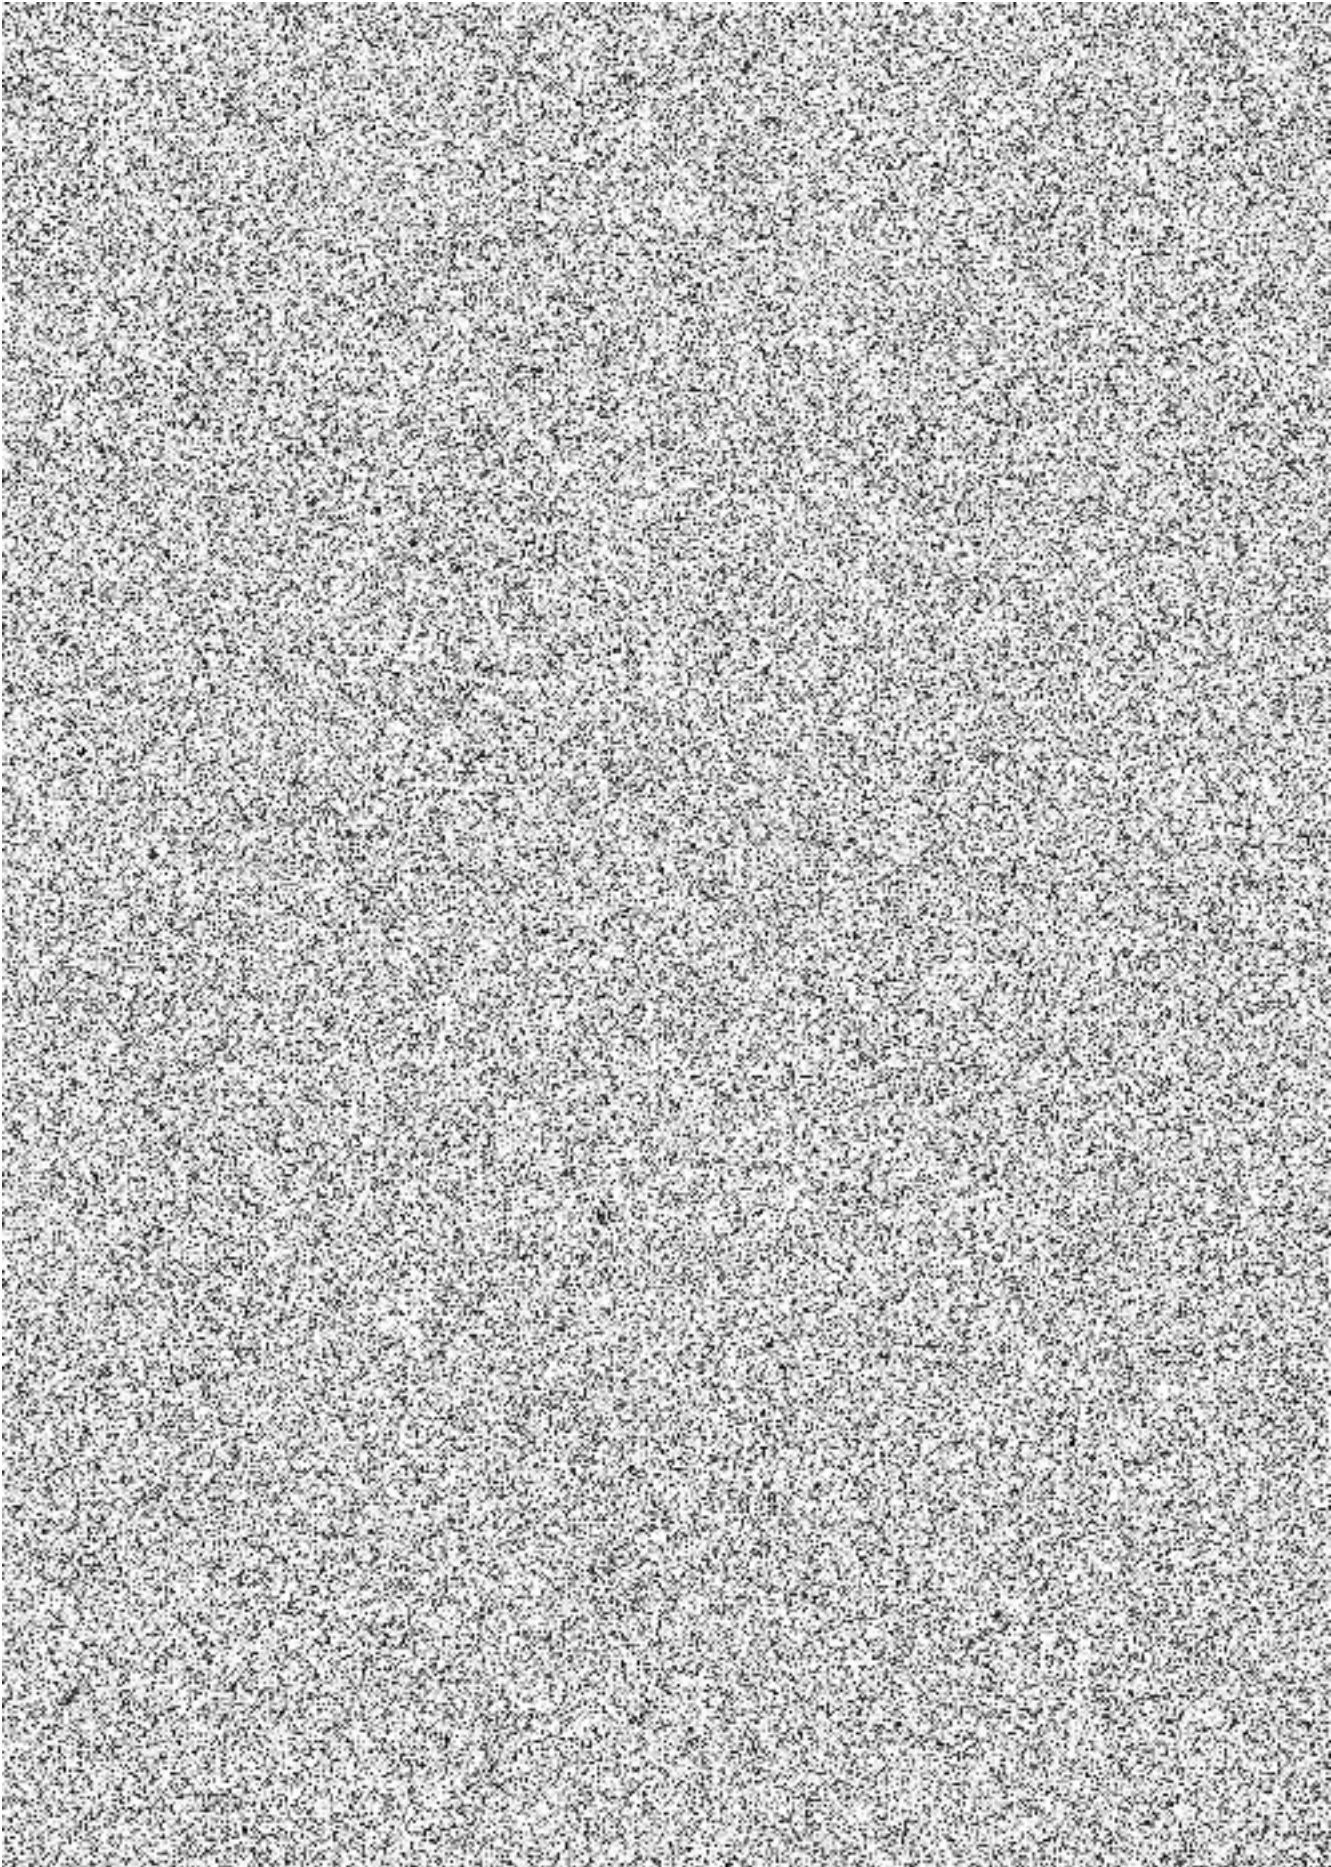




Pozn.: T = den nabytí účinnosti Smlouvy uzavřené mezi Objednatелеm a Dodavatelem.

5. ZMĚNA PŘÍLOHY Č. 1 DODATKU Č. 10 SMLOUVY (SEZNAM ZMĚNOVÝCH POŽADAVKŮ A VÍCEPRACÍ)

5.1. Strany se dohodly na následujících změnách Přílohy č. 1 Dodatku č. 10 Smlouvy (Seznam změnových požadavků a víceprací):

5.1.1. Bod 4 „DCeGov (fáze 3)“ se nahrazuje bodem 1 „DCeGOV – fáze 3“ Přílohy č. 2 tohoto Dodatku.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Tento Dodatek je platný dnem podpisu oběma Stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajišťuje Objednatel.

6.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Stran o změně Smlouvy.

6.3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto Dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k jeho uzavření.

6.4. Dodavatel souhlasí s uveřejněním elektronické verze tohoto Dodatku, na internetových stránkách Objednatele www.mvcr.cz a na profilu Objednatele.

6.5. Tento Dodatek je podepsán elektronickými podpisy.

6.6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Oprávnění
- Příloha č. 2 – Seznam víceprací DCeGov

Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Mgr. David Sláma

Asseco Central Europe, a.s.
Ing. David Šindelář

