

**DODATEK č. 19**  
**ke Smlouvě na službu**

**„Dodávání osobních dokladů vydávaných v působnosti Ministerstva vnitra,  
včetně systému zpracování žádostí, pořizování a zpracování dat“  
uzavřené dne 23. 3. 2015**

mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra, jako objednatelem  
(evidovaná u objednatele pod č.j.: MV-42493-1/SIK6-2015)  
a Státní tiskárnou cenin, s. p., jako poskytovatelem  
(evidovaná u poskytovatele pod č. 17/2015)

---

**I.**

**Preambule k dodatku č. 19**

Požadované úpravy vycházejí z novely Zákona 325/1999 Sb. Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu). Tato novela mimo jiné reagovala i na Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplnkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a následné rozsudky Soudního dvoru Evropské unie.

**II.**

S ohledem na výše uvedené se smlouva mění takto:

**1. V čl. II odst. 6 se tabulka doplňuje takto:**

”

Název	Popis
ZP021	Rozšíření položkové skladby PKP

”

**2. V č. VII odst. 7 písm. b) se tabulka doplňuje takto**

”

Název	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
ZP021	381 313,00	461 388,73

”

**3. Dosavadní příloha č. 3 se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.**

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy a přílohy ke smlouvě se nemění.

#### IV.

1. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Veškeré úkony s tím související zajistí objednatel.

#### V.

1. Tento dodatek je vyhotoven pro potřeby podpisu elektronickou formou v elektronické podobě v 1 vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

Objednatel



Mgr. Bc. Vít Rakušan  
**1. místopředseda vlády a ministr  
vnitřní**

Poskytovatel



Tomáš Hebelka, MSc  
**generální ředitel  
Státní tiskárna cenin, s. p.**

## PŘÍLOHA Č. 3 HARMONOGRAM PROJEKTU CDBP

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
M	Zahájení projektu	13. 5. 2015	
	Implementace DELT I	13. 5. 2015	1. 1. 2016
I	Analýza, návrh DELT I	13. 5. 2015	18. 6. 2015
M	Akceptace návrhových dokumentů DELT I	19. 6. 2015	
I	Vývoj DELT I	22. 6. 2015	11. 9. 2015
I	Integrační testy DELT I	22. 6. 2015	23. 10. 2015
M	Dodávka kontrolního pracoviště MV (kontrola e-Blesk)	14. 9. 2015	
I	Tvorba dokumentace	14. 9. 2015	23. 10. 2015
I	Nezávislé testy, akceptace	2. 11. 2015	11. 12. 2015
M	Akceptace celého systému	15. 12. 2015	
I	Příprava provozu	7. 12. 2015	31. 12. 2015
M	Zahájení ostrého provozu	1. 1. 2016	
P	Provoz systému	1. 1. 2016	31. 12. 2025
I	Implementace ZP001	20. 11. 2015	1. 3. 2016
	Implementace Statistik	13. 5. 2015	29. 2. 2016
I	Analýza statistik	13. 5. 2015	11. 9. 2015
I	Implementace statistik	14. 9. 2015	29. 2. 2016
P	Ověřovací provoz statistik	1. 3. 2016	29. 3. 2016
I	Implementace ZP003	7. 3. 2016	19. 9. 2016
I	Implementace ZP004	15. 3. 2016	31. 3. 2016
I	Implementace ZP005	15. 9. 2016	31. 1. 2017
I	Implementace ZP006	9. 2. 2017	1. 6. 2017
I	Ukončení podpory licencí MW podle čl. VI odst. VI.1 pododst. VI.1.7 přílohy č. 5 smlouvy		31. 3. 2017
I	Implementace DELT II	4. 1. 2016	3. 4. 2017
	Obnova CS (včetně implementace ZVS)	1. 9. 2016	1. 1. 2018
I	Analýza CS vč. akceptace	15. 11. 2016	2. 12. 2016
I	Návrh CS vč. akceptace	17. 2. 2017	3. 3. 2017
I	Implementace CS	1. 2. 2017	24. 10. 2017
S	Zajištění prostor pro umístění HW CS (CVS i ZVS) včetně napájení	1. 4. 2017	
I	Nezávislé testy	27. 9. 2017	16. 11. 2017
I	Finalizace nastavení CS a předání MV.	19. 10. 2017	15. 11. 2017
S	Akceptace implementace CS	16. 11. 2017	16. 11. 2017
I	Přechod do provozu, migrace dat	17. 11. 2017	19. 11. 2017
P	Uvedení do provozu	20. 11. 2017	
M	Garantované uvedení CS a ZVS do provozu	1. 1. 2018	
I	Implementace přípravných prací k ZP008	1. 9. 2017	30. 6. 2018
I	Implementace přípravných prací ZP009	30. 11. 2017	30. 6. 2018
I	Implementace přípravných prací ZP010	6. 11. 2017	30. 6. 2018
P	Nasazení ZP008 do provozu*)	1. 7. 2018	1. 7. 2018
P	Middleware klientský - Windows s QSCA	6. 8. 2018	6. 8. 2018
P	Nasazení ZP009 do provozu	1. 7. 2018	1. 7. 2018

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
P	Nasazení ZP010 do provozu	1. 7. 2018	1. 7. 2018
P	Middleware klientský (OS X, Linux), MW mobilní	22. 10. 2018	22. 10. 2018
I	Implementace ZP011	1. 3. 2019	26. 4. 2019
P	Zahájení podpory serverového MW	1. 3. 2019	1. 3. 2019
P	Uvedení úpravy „odesílání fotografií do evidencí ihned po pořízení žádosti“ do provozu	1. 3. 2019	1. 3. 2019
P	Uvedení ostatních úprav ZP011 do provozu	26. 4. 2019	26. 4. 2019
I	Implementace delty Antivir na KS-X	1. 1. 2017	31. 12. 2017
I	Distribuce delty Antivir a Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 12. 2016	31. 12. 2018
I	Upgrade na vyšší verzi OS Win	1. 4. 2016	31. 12. 2017
I	Implementace ZP013	26. 6. 2019	2. 8. 2019
I	Implementace ZP014	14. 10. 2019	Nejpozději do 10. 7. 2020
I	Implementace DELTY III	1. 1. 2020	31.12. 2025
I	Implementace ZP015	1. 6. 2020	2. 8. 2021
	Analýza a návrh ZP015	1. 6. 2020	30. 10. 2020
I	Vývoj	1. 8. 2020	23. 4. 2021
I	Upgrade pracovišť KS-O, dodání mobilních pracovišť, dodání pracovišť pro OAMP	1. 4. 2021	31. 7. 2021
I	Integrační testy	26. 4. 2021	4. 6. 2021
I, S	Nezávislé testy, akceptace	24. 5. 2021	28. 7. 2021
P	Nasazení do provozu	29. 7. 2021	2. 8. 2021
P	Výroba specimenů	2. 8. 2021	3. 8. 2021
I	Implementace ZP016 (fáze I)	15. 9. 2021	7. 12. 2021
I	Vývoj, interní testování	1. 10. 2021	15. 11. 2021
I	Integrační testování vůči externím systémům (NIA)	1. 11. 2021	3. 12. 2021
P	Release SW eObčanka pro všechny OS	3. 12. 2021	3. 12. 2021
I	Implementace ZP016 (fáze II)	1. 7. 2021	2. 5. 2022
I	Analýza a návrh v oblasti SI I	1. 7. 2021	15. 11. 2021
I	Předání návrhu integrace modulu SCAKOVŠ	15. 11. 2021	30. 11. 2021
I	Provedení revize BD SI I	15. 11. 2021	22. 4. 2021
I	Předání aktualizované CP CSCA	15. 11. 2021	30. 12. 2021
I	Vývoj, interní testování	18. 10. 2021	20. 12. 2021
I	Integrační testování	20. 12. 2021	22. 4. 2022
P	Uvedení do provozu	25. 4. 2022	29. 4. 2022
I	Implementace požadavků ZP016 - doplnění	24. 3. 2022	29. 4. 2022
I	Implementace ZP017	28. 2. 2022	30. 5. 2022
I	Interní analýza	28. 2. 2022	11. 3. 2022
I	Vývoj, interní testování	14. 3. 2022	30. 4. 2022
I	Testování	1. 4. 2022	1. 5. 2022
P	Release SW eObčanka pro všechny OS a implementace serverového MW	2. 5. 2022	30. 5. 2022
I	Implementace ZP018 - Modernizace expedice dokladů na MV	1. 7. 2022	30.11. 2022
I	Interní analýza*)	1. 7. 2022	29. 7. 2022
I	Vývoj, interní testování*)	1. 8. 2022	31. 10. 2022
I	Tvorba uživatelské příručky „Návod k obsluze aplikace Expedice“	1. 10. 2022	20. 11. 2022
I	Testování – aplikační a uživatelské testy	1. 11. 2022	20. 11. 2022


Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
P	Nasazení do provozu – instalace HW a školení	21. 11. 2022	28. 11. 2022
<b>I</b>	<b>Implementace ZP018 - Instalace MWeOP v prostředí DC1 pro SZR</b>	<b>1. 8. 2022</b>	<b>30. 11. 2022</b>
<b>I</b>	<b>Implementace ZP018 - Migrace na novou verzi čipu Starcos 3.7 a změna způsobu šifrování na ECC</b>	<b>26. 9. 2022</b>	<b>24. 3. 2023</b>
I	Technologický PoC	26. 9. 2022	14. 10. 2022
I	Úprava aplikačního vybavení	26. 9. 2022	9. 12. 2022
I	Integrační testy	14. 11. 2022	13. 1. 2023
I	Aktualizace bezpečnostní dokumentace	3. 10. 2022	6. 1. 2023
I	Nezávislé testy	16. 1. 2023	10. 2. 2023
I	Akceptace	16. 2. 2023	16. 2. 2023
P	Nasazení řešení do produkčního systému	16. 2. 2023	16. 2. 2023
P	Ověřovací provoz vč. vynucené obnovy certifikátů	17. 2. 2023	17. 3. 2023
P	Distribuce nových karet cestou OSČ a OAMP	20. 3. 2023	24. 3. 2023
<b>I</b>	<b>Implementace ZP019 – Integrace MZV do CDBP</b>	<b>2. 1. 2023</b>	<b>2. 1. 2025</b>
<b>I</b>	<b>Fáze 1</b>	<b>2. 1. 2023</b>	<b>3. 10. 2023</b>
S	Zřízení propoje operátora do CMS2 přes službu CMS2-08-01 pro produkční prostředí	2. 1. 2023	31. 1. 2023
S	Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech dotčených testovacích systémů		30. 6. 2023
S	Příprava testovacích dat pro integrační testy		30. 6. 2023
S	Vložení uživatelů MZV do MVCA, vytvoření logů do AIS SE	3. 7. 2023	30. 9. 2023
S	Příprava testovacích dat pro nezávislé testy		18. 8. 2023
S	Schválení implementace pro nasazení do produkce		29. 9. 2023
S	Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech dotčených externích systémů		29. 9. 2023
P	Nasazení řešení do produkčního systému	1. 10. 2023	3. 10. 2023
<b>I</b>	<b>Fáze 2</b>	<b>16. 1. 2023</b>	<b>12. 12. 2024</b>
S	Dostupnost funkčních testovacích prostředí všech dotčených testovacích systémů		6. 9. 2024
S	Příprava testovacích dat pro integrační testy		6. 9. 2024
S	Příprava testovacích dat pro nezávislé testy		11. 10. 2024
S	Schválení implementace pro nasazení do produkce		11. 11. 2024
S	Dostupnost funkčních produkčních prostředí všech dotčených externích systémů		11. 11. 2024
P	Nasazení řešení do produkčního systému	11. 11. 2024	29. 11. 2024
<b>I</b>	<b>Implementace ZP020 – Úpravy aplikace eObčanka</b>	<b>T*</b>	<b>T+30*</b>
I	Interní analýza	T	T+3
I	Vývoj, interní testování	T+3	T+16
I	Testování	T+17	T+24
P	Release SW eObčanka pro všechny OS a implementace serwerového MW	T+25	T+30
M	Akceptace díla		T+30
<b>I</b>	<b>Implementace ZP021 – Rozšíření položkové skladby PKP</b>	<b>13. 9. 2023</b>	<b>28. 11. 2023</b>
I	Analýza, Návrh	13. 9. 2023	13. 9. 2023
I	Vývoj, interní vývojové testování	14. 09. 2023	16. 10. 2023
I	Integrační testy	16. 10. 2023	30. 10. 2023
I	Tvorba dokumentace	16. 10. 2023	06. 11. 2023
I	Schválení implementace pro nasazení do produkce	27. 11. 2023	27. 11. 2023

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
P	Zahájení produkčního provozu	28.11.2023	

\*) T je den účinnosti dodatku č. 18 Smlouvy o poskytování služeb . Přírůstky času jsou uvedené v pracovních dnech.

Případné další požadavky na poskytnutí součinnosti MV budou uplatňovány na projektových jednáních v průběhu plnění této smlouvy.

Legenda:

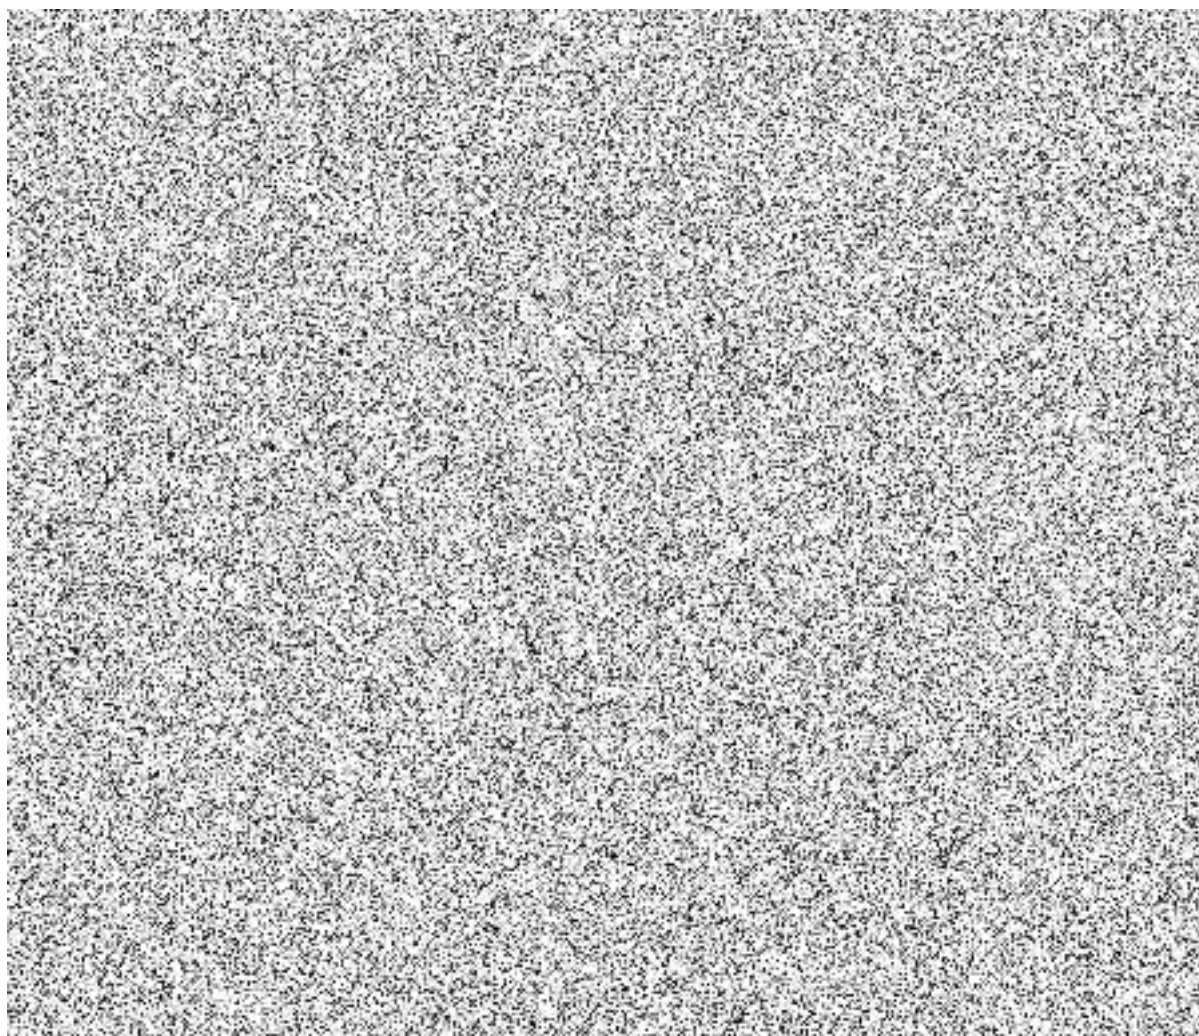

S	Požadovaná součinnost
M	Milník
I	Implementační práce
P	Provoz
