

## DODATEK č. 1

ke kupní smlouvě  
uzavřené na základě rámcové dohody č.j. MV-148466-19/PO-PSM-2021  
č.j. kupujícího: HSJI-124-4/E-2023  
(dále jen „kupní smlouva“)

### I. článek

#### Smluvní strany

##### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina

Sídlo: Ke Skalce 4960/32, 586 04 Jihlava  
Zastoupená: **plk. Mgr. Jiřím Němcem,**  
ředitelem Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina  
IČO: 708 85 184  
DIČ: CZ70885184 (není plátcem DPH)  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 15032881/0710  
E-mail:   
Telefon:   
ID datové schránky: ntdaa7v  
(dále jen „kupující“)

a

##### KOBIT, spol. s r.o.

Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6  
Zapsaná ve veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5528  
Zastoupená:   
IČO: 447 92 247  
DIČ: CZ44792247  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 5016230911/5500  
E-mail:   
Telefon:   
ID datové schránky: khif4c2  
(dále jen „prodávající“)

### II. článek

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 11., odst. 2., písm. b) kupní smlouvy dohodly na uzavření následujícího dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).
2. Uzavření dodatku předcházelo oslovení kupujícího prostřednictvím žádosti prodávajícího o prodloužení termínu plnění podložené stanoviskem subdodavatele. Uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto dodatku.

**III. článek**  
**Předmět dodatku**

1. Dodatkem se upravuje čl. 4. *Doba, místo a způsob předání zboží*, odst. 1., který nově zní:

*1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu bezvadné zboží v místě plnění nejpozději do 22. března 2024.*

**IV. článek**  
**Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní části kupní smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti v původním znění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí půjčitel.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby dodatek byl uveden v evidenci smluv, vedené Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené v dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany uzavírají dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.
6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

*Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu*

*Příloha č. 2 – Stanovisko subdodavatele*

V Praze dne viz *elektronický podpis*

V Jihlavě dne viz *elektronický podpis*



HZS Kraje Vysočina  
plk. Mgr. Jiří Němec  
krajský ředitel  
Ke Skalce 4960/32  
586 04 Jihlava

Jičín 13. 11. 2023  
Počet listů / příloh: 2/1

### Věc: Žádost o prodloužení termínu plnění

Vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás s žádostí o prodloužení termínu plnění Kupní smlouvy č. **HSJI-124-4/E-2023** uzavřené dne 22.02.2023 na dodávku **3 ks cisternových automobilových stříkaček CAS 30/9000/540 S3VH**, která má být splněna do 22.12.2023. Chceme Vás informovat o vzniku mimořádných překážek, které v průběhu plnění nastaly.

Jak je Vám jistě známo, probíhající válečný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou má zásadní dopad na světovou ekonomiku a obchod. V důsledku tohoto konfliktu došlo k dalšímu zásadnímu omezení veškerých dodavatelsko-odběratelských vztahů a negativnímu prohloubení již tak omezené výrobní produkce našich subdodavatelů.

Plnění našeho výše uvedeného smluvního závazků je zásadně ovlivněno především prodloužením termínu dodávky podvozku TATRA. Zpoždění je způsobeno omezenými dodávkami klíčových součástí podvozku, zejména PTO, kardanových hřídelů a elektronických součástek. Toto zpoždění je důsledkem celosvětového nedostatku vstupních surovin. Tento nedostatek je způsobený nejen ozbrojenými konflikty a nepředvídatelnými problémy spojenými s těmito konflikty, ale také nutností urychleně zajistit dodávky pro obranný sektor.

Vyjádření našeho subdodavatele společnosti TATRA TRUCKS a.s., se kterou máme uzavřenou smlouvu na dodávky podvozku CAS 30/9000/540 S3VH, přikládáme k této žádosti.

Z výše uvedených důvodů, které nebylo možné při uzavření Kupní smlouvy v žádném případě předjímat a naše společnost je není schopna jakkoli pozitivně ovlivnit, Vás chceme informovat, že naše společnost není schopna dodržet řádný termín dodání předmětu smlouvy.

Vzhledem k těmto nepředvídatelným a nepřekonatelným překážkám se domníváme, že došlo k naplnění podstaty čl. 11 odst. 2b Kupní smlouvy o Vyhrazené změně závazku, kdy prodávající nemůže z odůvodněných důvodů dodat bezvadné zboží v požadovaném termínu plnění.

Chtěli bychom Vás tímto požádat o zahájení jednání ohledně sjednané Kupní smlouvě s cílem vzájemné dohody na reálné úpravě dodacího termínu předmětu plnění v souladu s uvedenými skutečnostmi.



**KOBIT, spol. s r.o.** | člen skupiny KOBIT Holding, s.r.o.

sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 | provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín  
IČ: 44792247 | DIČ: CZ44792247




Po zhodnocení všech aktuálních informací a z důvodu, že výroba a kompletace nástavby trvá cca 3 měsíce, navrhujeme projednání možnosti prodloužení dodacího termínu předmětu plnění do **22.03.2024**.

Na závěr Vás chceme ujistit, že naši prioritou i nadále zůstává dokončení předmětu smlouvy v co nejkratším možném termínu a v požadované kvalitě, nicméně nastalá situace nás staví do situace, kdy vyhovění naší žádosti bude znamenat pro obě strany určitou jistotu řádného plnění.

Předem děkuji za Vaše pochopení a vyjádření ke vzniklé situaci.

S pozdravem

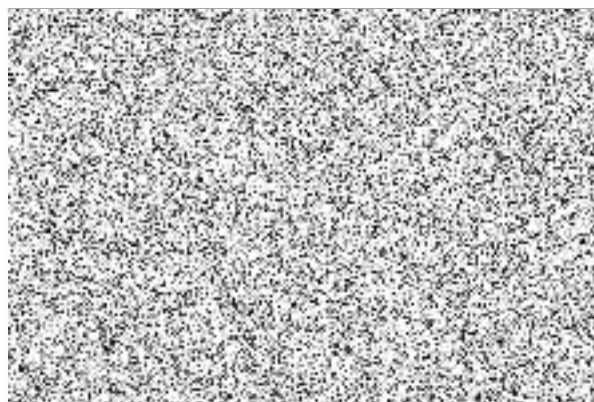

Příloha č. 1 Stanovisko TATRA TRUCKS a.s.



**KOBIT, spol. s r.o.** | člen skupiny KOBIT Holding, s.r.o.

sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 | provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín  
IČ: 44792247 | DIČ: CZ44792247





KOBIT, spol. s r.o.  
Rozvojová 269  
16500 Praha 6

V Kopřivnici dne 06.11.2023

**Věc: Informace o zpoždění ve věci plnění smluvních závazků vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy č. 2017/2628/22 a 2034/23, uplatnění okolností vyšší moci**

Vážený pane řediteli,

dovolte mi Vás informovat o zpoždění plnění našich vzájemných smluvních závazků vyplývajících z uzavřené Kupní smlouvy č. 2017/2628/22 a 2034/23 v souvislosti s omezením dodávek klíčových součástí (komponentů zejména PTO, kardanových hřídelů a elektronických součástí) našich vozidel zapříčiněných celosvětovým nedostatkem vstupních surovin, mimo jiné v důsledku ozbrojeného konfliktu na Ukrajině a Izraeli a nepředvídatelných problémů s těmito konflikty spojenými, ale také i v souvislosti s nutností urychleně zajistit dodávky pro obranný sektor.


S ohledem na výše uvedenou skutečnost, si vás tímto dovoluujeme informovat, že dojde ke zpoždění v dodávce výrobků naší společnosti TATRA TRUCKS a.s. pro vaši společnost.

Vzhledem k výše popsané okolnosti bohužel nebudeme schopni smluvní termín dodání podvozků dodržet a podvozky vám budou bohužel dodány se zpožděním s předpokládaným dodáním do 10.12.2023. Přesný termín dodání podvozků bohužel aktuálně nejsme schopni sdělit a termín jejich dodání budeme aktualizovat. Tímto tedy uplatňujeme nastalé okolnosti vyšší moci, které nastaly nezávisle na naší vůli, nemohli jsme je předpokládat a brání nám v řádném splnění našeho smluvního závazku v původně stanoveném termínu. Zároveň se na vás obracíme s žádostí o projednání posunutí dodávky Vámi objednaných výrobků naší společnosti bez uplatnění smluvní pokuty (penále) z Vaší strany.

Chtěli bychom vás současně ujistit, že společnost TATRA TRUCKS a.s. činí veškeré úkony k tomu, aby zabezpečila řádné dodání svých výrobků ke svým obchodním partnerům.

Podáváme vám tuto zprávu a věříme, že uvedené informace přijmete s porozuměním.

S pozdravem



TATRA TRUCKS a.s.

Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Czech Republic, IČO: 014 B2 B40 / Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, IČO: 014 B2 B40  
Regional Court in Ostrava, section B, insert 10443, ID No.: 014 B2 B40 / Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10443, IČO: 014 B2 B40
