



## Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

### Název zakázky: „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“

Smluvní strany:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-3258/2017/Šim

ISPROFOND: 5213720017

a

#### **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

se sídlem: Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 1441

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2017/1011/0369

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).



**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).
- 1.6 V době uzavírání této Smlouvy probíhá u Objednatele zavádění informačního systému na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML.
  - 1.6.1 Objednatel zašle Zhotoviteli do 7 dnů po uzavření Smlouvy aktualizovaný soupis prací v otevřeném datovém formátu XML, který bude mít strukturu dat dle datového předpisu XC4 (viz [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)). Zhotovitel se zavazuje zaslat Objednateli do 14 dnů od obdržení tohoto soupisu prací oceněný soupis prací dle své Nabídky Zhotovitele (v listinné formě) v otevřeném datovém formátu XML. Soupis prací v otevřeném formátu XML může Zhotovitel také vyplnit v modulu pro ocenění nabídkové ceny na zabezpečeném serveru <https://www.xc4.cz/oceni/>. Zhotovitel odpovídá za shodu obsahu listinné a elektronické formy oceněného soupisu prací.
  - 1.6.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, [www.xc4.cz](http://www.xc4.cz)):
    - daňový doklad,
    - souhrn fakturace,
    - soupis zjišťovacích protokolů,
    - zjišťovací protokoly.

**2. ÚČEL SMLOUVY**

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním dokumentu „Otevřená výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku - oznámení výběrového řízení“ na profilu zadavatele dne 30. 03. 2017 pod evidenčním číslem 10882/2017-SŽDC-SSZ-VZ svůj úmysl zadat



v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

### **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **114 869 280,65 Kč**

slovy:

**stočtrnáctmiliónůosmsetšedesátdevětstisícdvěstěosmdesátkorun českých a šedesátpěthaléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH,



neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

- 3.6 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 23 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 17 měsíců ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

- 3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.8 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.9 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektu a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.

#### 4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1. Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 10 % z Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. **11 486 928,06 Kč**.

4.2 Zhotovitel může požádat o vyluku nad rámec vyluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o vyluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst.3.17 Obchodních



podmínek, nebo o vyluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

## 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222, odst.10 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 5.10 Tato Smlouva je vyhotovena ve **sedmi** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **pět** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
- 5.11 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Obě Smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronicky



obraz Smlouvy a jejich příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/13/17
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
  - b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16
  - c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01. 03. 2017
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 8.6.2017

V Pardubicích dne

1.6.2017



**Příloha č. 1**  
**Obchodní podmínky**

OP/R/13/17



## **Příloha č. 2**

### **Technické podmínky:**

**a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)**

Přiloženy v elektronické formě na CD, které je v příloze č. 3.

Současně jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>.

**b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/07/16**

**c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01. 03. 2017**





### Příloha č. 3

#### Související dokumenty

(přiloženo na CD)

- projekt stavby – SUDOP PRAHA, a.s. – 11/2016
- posuzovací protokol projektu stavby a přeposuzovací protokol přípravné dokumentace 1434/2017/SŽDC-SSZ-ÚT1-Van ze dne 01. 02. 2017
- Stavební povolení č.j. DUCR-14012/17/Vv ze dne 8.3.2017





**Příloha č. 4**  
**Rekapitulace Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Číslo PS /SO	Název	Cena stavby
		Cena ( Kč bez DPH)
PS 02-31	Rozhlasové zařízení	██████████
PS 02-32	Informační systém	██████████
PS 02-33	Kamerový systém	██████████
PS 02-34	Přeložky a ochrana stávajících sdělovacích kabelů	██████████
PS 03-11	Úprava dispečerské řídicí techniky	██████████
PS 03-12	ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	██████████
PS 04-11	Výtahy	██████████
SO 11-01	Železniční svršek	██████████
SO 11-02	Železniční spodek	██████████
SO 12-01	Nástupiště	██████████
SO 14-01	Nové výstupy z podchodu, podchod	██████████
SO 16-01	Odvodnění výstupu z podchodu	██████████
SO 16-02	Odvodnění přístřešků	██████████
SO 18-01	Chodníky, rampa	██████████
SO 18-01.1	Přístupová cesta podél Českobrodské ulice	██████████
SO 18-01.2	Dopravní trasy	██████████
SO 21-01	Drobná architektura a oplocení	██████████
SO 21-01.1	Drobná architektura a oplocení přístupové cesty podél Českobrodské ulice	██████████
SO 22-01	Zastřešení nástupišť a výstupů z podchodu	██████████
SO 24-01	Orientační systém pro cestující	██████████
SO 31-01	Úprava trakčního vedení	██████████
SO 36-01	Úprava rozvodu NN, osvětlení nástupišť včetně přístupových cest a podchodu	██████████
SO 36-01.1	Osvětlení přístupové cesty podél Českobrodské ulice	██████████
SO 36-01.2	Osvětlení provizorního nástupiště	██████████
SO 36-02	Úprava DOÚO	██████████
SO 37-01	Ukolejnění kovových konstrukcí	██████████
SO 99-89	Všeobecný objekt	██████████
<b>Cena celkem (bez DPH)</b>		<b>114 869 280,65</b>



---


## Příloha č. 5

### Harmonogram postupu prací

Homonogram výstavby - přehled hlavních prací a činností

„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“

ID	Popis	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Příloha 2, 2017	Příloha 1, 2018	Příloha 2, 2019	Příloha 1, 2019
1	„Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Poříčany“	616 dny	1.7.17	30.11.18	1.7.17			
2	<b>Přípravné práce</b>	77 dny	1.7.17	15.9.17				
3	Výtvarná a úprava ploch ZB	7 dny	1.7.17	7.7.17				
4	Projednáni přístupových komunikací a pasport stávajícího stavu	30 dny	1.7.17	30.7.17				
5	SO 31-01 úpravy na TV, výstavba základů TV, montáž TV a napájecího přívodu + rozdělení TV do definitivních sekcí	70 dny	6.7.17	15.9.17				
6	Průzkum a čišření kanalizace	65 dny	6.7.17	31.8.17				
7	SO 36-02 úprava DOÚO	7 dny	9.9.17	15.9.17				
8	SO 16-01.1 Přístupová cesta podél Českobrodské ulice, zahájení výkopových prací	55 dny	6.7.17	31.8.17				
9	SO 14-01 výstavba podchodu, zahájení výkopových prací	55 dny	6.7.17	31.8.17				
10	<b>Stavba podchodu č. 1</b>	76 dny	16.9.17	30.11.17				
11	SO 14-01 výstavba podchodu, dokončení tubusu pod SK 6 včetně nového obložení tubusu pod SK 4,8 a výstupů na nástupiště č.1 a 4.	68 dny	16.9.17	22.11.17				
12	SO 12-01 nástupiště č.1,4	40 dny	16.9.17	25.10.17				
13	SO 16-01.1 Přístupová cesta podél Českobrodské ulice	50 dny	16.9.17	4.11.17				
14	SO 16-01 odvodnění výstupu z podchodu	50 dny	16.9.17	4.11.17				
15	SO 16-02 odvodnění příslušků	10 dny	26.10.17	4.11.17				
16	SO 22-01 zastřešení příslušků	50 dny	16.9.17	4.11.17				
17	SO 11-02 železniční svršek v místě smázané SK 8	4 dny	23.11.17	26.11.17				
18	SO 11-01 železniční svršek, položení SK 8	1 den	27.11.17	27.11.17				
19	SO 11-01 železniční svršek, směrové a výškové vyrovnání SK 6,8 včetně regulace TV	2 dny	28.11.17	29.11.17				
20	SO 37-01 ukotvení kovových konstrukcí	1 den	30.11.17	30.11.17				
21	SO 24-01 orientační systém pro cestující	5 dny	5.11.17	9.11.17				
22	SO 36-01 úprava rozvodu NN, osvětlení příslušků	5 dny	5.11.17	9.11.17				
23	PS 02-31, PS 02-30, PS 02-32 zapojení	5 dny	5.11.17	9.11.17				
24	<b>Dokončovací práce</b>	14 dny	1.12.17	14.12.17				
25	<b>Technologická přeštátna</b>	74 dny	16.12.17	28.2.18				
26	<b>Přípravné práce</b>	31 dny	1.3.18	31.3.18				
27	<b>Stavba podchodu č. 2</b>	65 dny	1.4.18	1.6.18				
28	Demontáž nálezitosti zastřešení na nástupišti č.3 (rozhlídk, osvětlení)	3 dny	1.4.18	3.4.18				
29	SO 14-01 pokračuje výstavba podchodu směrem k ulici Českobrodské, nové obložení tubusu pod SK 0,1,2 po polovinách, nové výstupy na nástupiště č.3. Dokončuje se výstup na nástupiště č.1	60 dny	1.4.18	30.5.18				
30	SO 14-01 Dokončuje se výstup na nástupiště č.1	30 dny	1.4.18	30.4.18				
31	SO 12-01 nástupiště č.3	50 dny	4.4.18	23.5.18				
32	SO 16-01.1 Přístupová cesta podél Českobrodské ulice, pokračuje výstavba	50 dny	1.4.18	20.5.18				
33	SO 16-01 odvodnění výstupu z podchodu	50 dny	1.4.18	20.5.18				
34	SO 16-02 odvodnění příslušků	10 dny	14.5.18	23.5.18				
35	SO 22-01 zastřešení příslušků	60 dny	4.4.18	2.6.18				
36	SO 11-01 železniční svršek, směrové a výškové vyrovnání SK 2,4 včetně regulace TV	2 dny	24.5.18	25.5.18				
37	SO 37-01 ukotvení kovových konstrukcí	1 den	26.5.18	26.5.18				
38	SO 24-01 orientační systém pro cestující	5 dny	3.6.18	7.6.18				
39	SO 36-01 úprava rozvodu NN, osvětlení příslušků	5 dny	3.6.18	7.6.18				
40	PS 02-31, PS 02-30, PS 02-32 zapojení	5 dny	3.6.18	7.6.18				
41	<b>Stavba podchodu č. 3</b>	21 dny	26.6.18	21.7.18				
42	Výstavba provozního nástupiště u SK 3	14 dny	6.6.18	21.6.18				
43	SO 12-01 nástupiště č.2, hrana u SK 3	20 dny	6.6.18	27.6.18				
44	SO 11-01 železniční svršek, směrové a výškové vyrovnání SK 3	2 dny	26.6.18	27.6.18				
45	SO 37-01 ukotvení kovových konstrukcí	1 den	28.6.18	28.6.18				
46	<b>Stavba podchodu č. 4</b>	16 dny	29.6.18	4.7.18				
47	Demontáž nálezitosti zastřešení na nástupišti č.2 (rozhlídk, osvětlení)	3 dny	29.6.18	1.7.18				
48	SO 14-01 nové obložení tubusu pod SK 3,5 po polovinách, nové výstupy na nástupiště č.2.	60 dny	2.7.18	30.8.18				
49	SO 12-01 nástupiště č.2	50 dny	2.7.18	20.8.18				
50	SO 16-01 odvodnění výstupu z podchodu	50 dny	2.7.18	20.8.18				
51	SO 16-02 odvodnění příslušků	10 dny	21.8.18	30.8.18				
52	SO 22-01 zastřešení příslušků	60 dny	2.7.18	30.8.18				
53	SO 11-01 železniční svršek, směrové a výškové vyrovnání SK 1,3 včetně regulace TV	2 dny	21.8.18	22.8.18				
54	SO 37-01 ukotvení kovových konstrukcí	1 den	23.8.18	23.8.18				
55	SO 24-01 orientační systém pro cestující	5 dny	31.8.18	4.9.18				
56	SO 36-01 úprava rozvodu NN, osvětlení příslušků	5 dny	31.8.18	4.9.18				
57	PS 02-31, PS 02-30, PS 02-32 zapojení	5 dny	31.8.18	4.9.18				
58	<b>Dokončovací práce</b>	67 dny	5.9.18	30.11.18				
59	Vykližení a úprava ploch po ZS	14 dny	5.9.18	18.9.18				
60	Směrové a výškové vyrovnání SK 5, odstranění zanesení	3 dny	5.9.18	7.9.18				
61	Výměna upevňovacích v SK 6,0	2 dny	15.9.18	16.9.18				
62	Směrové a výškové vyrovnání včetně regulace TV	1 den	22.9.18	22.9.18				
63	SO 14-01 dokončení prací na obkladech	14 dny	5.9.18	18.9.18				
64	Opavy neodělných zvláštních při zkušebním provozu	73 dny	19.9.18	30.11.18				

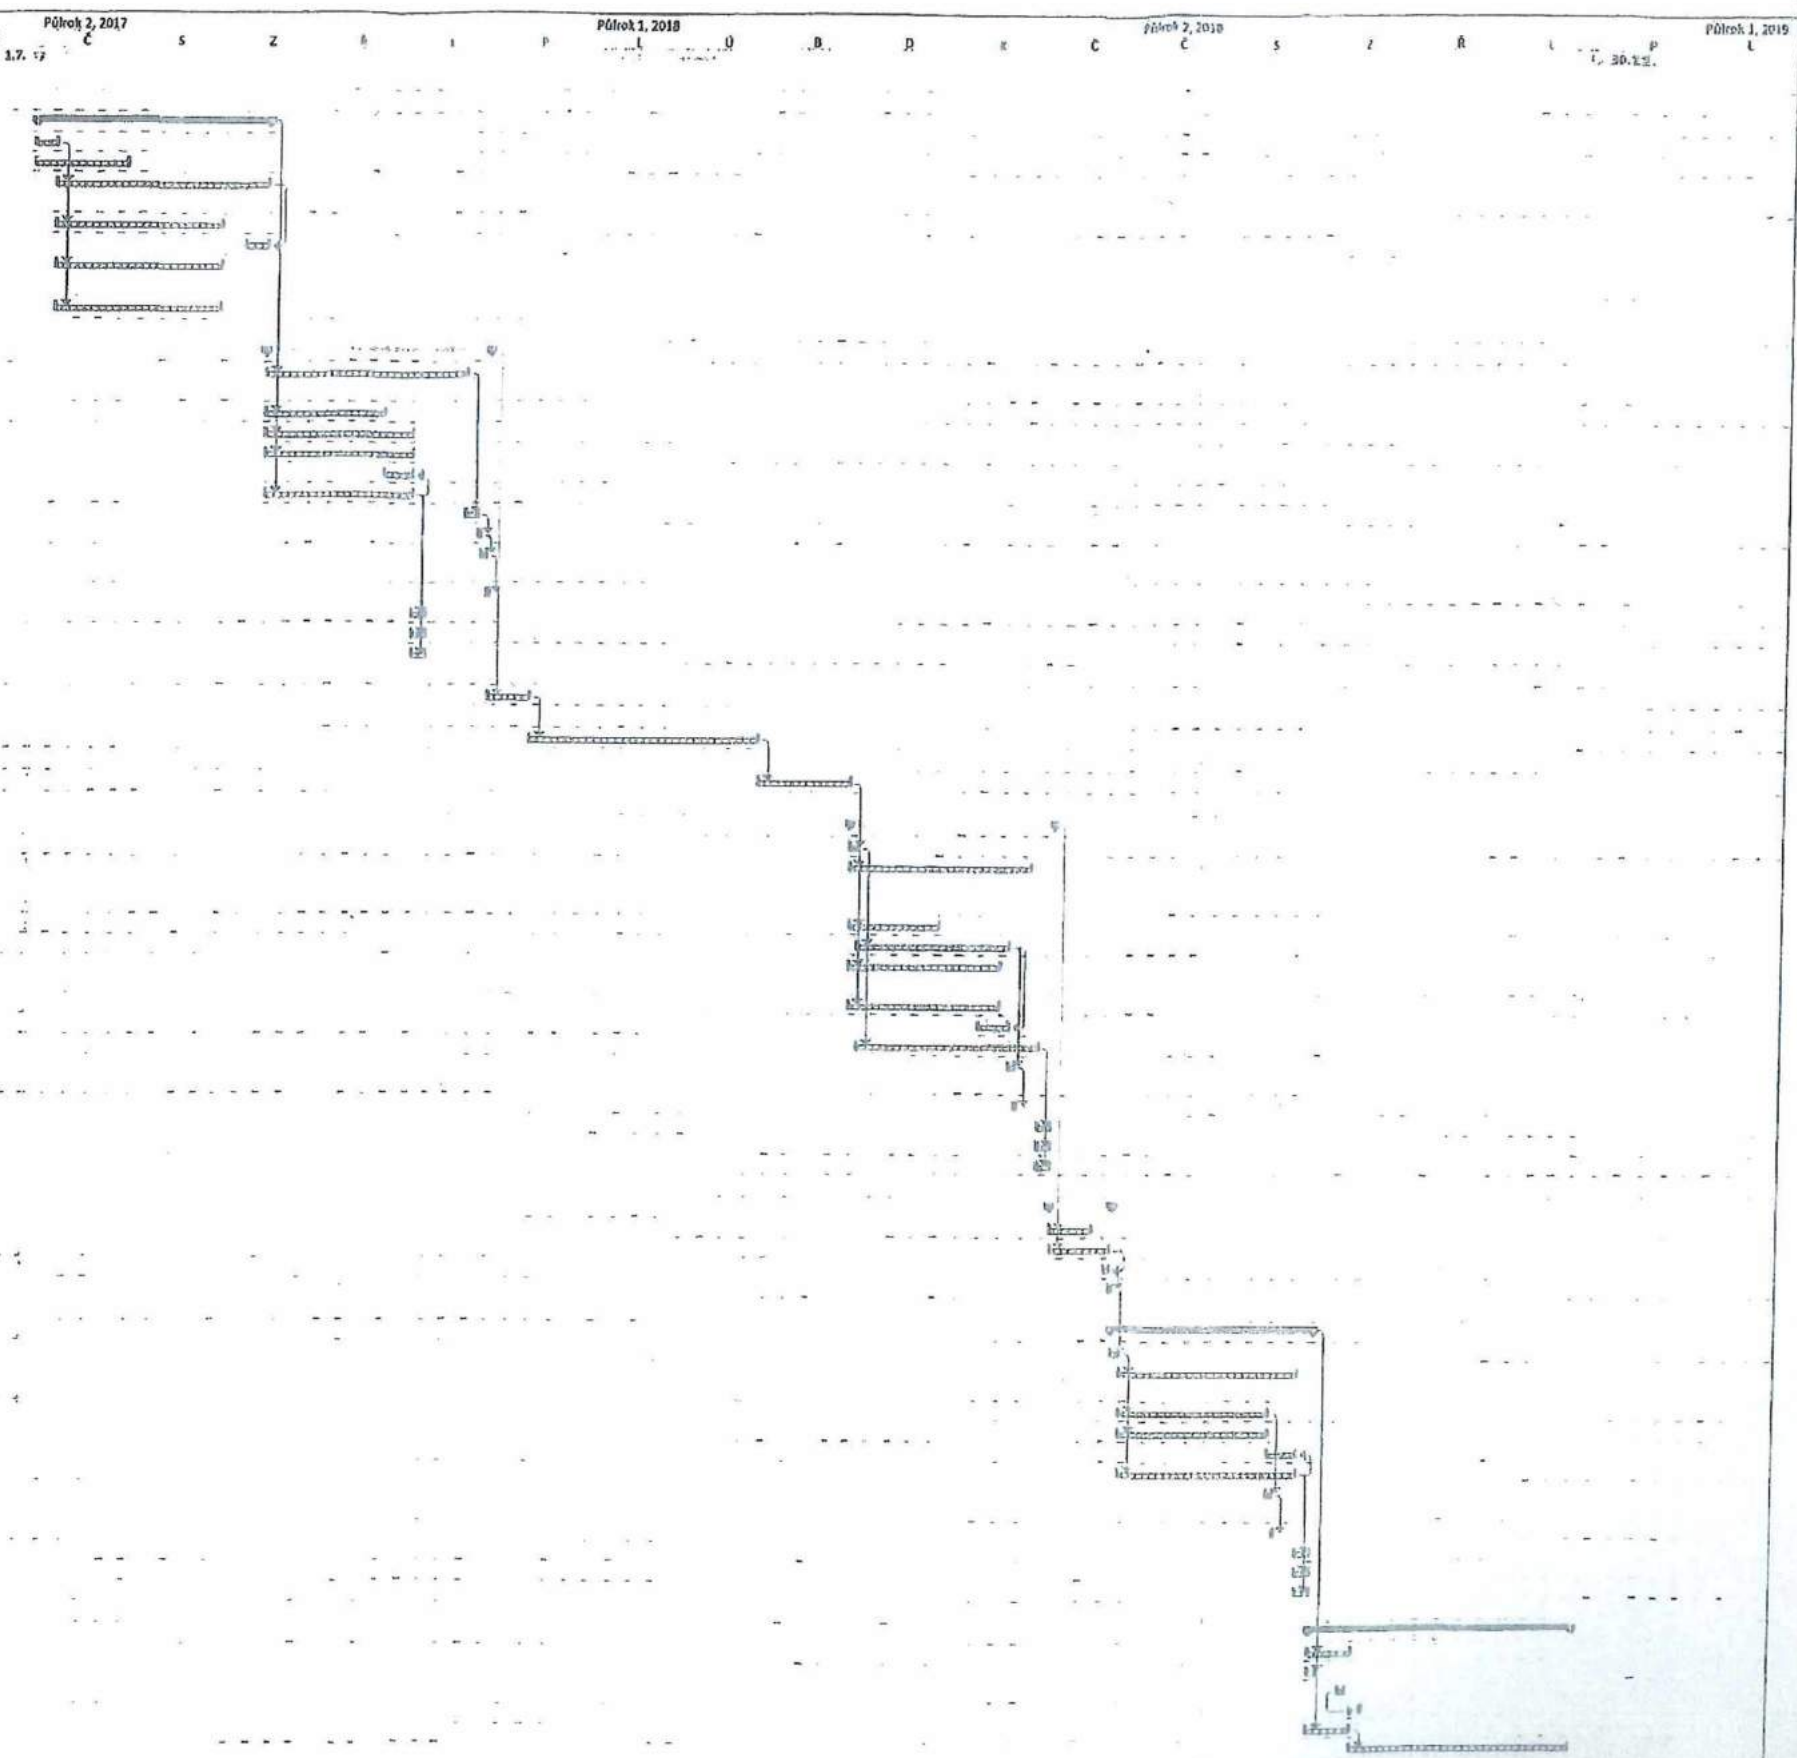



**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- Koordinátor BOZP na staveništi:

Adresa	████████████████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—



### Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	Ing. Pavel Mužík, člen představenstva
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Ing. Pavel Mužík, ředitel divize kolejové stavby
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- stavbyvedoucí (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- zástupce stavbyvedoucího (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████



- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na pozemní stavby (vedoucí prací):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na geotechniku:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	4G consite s.r.o., Praha 6, Šlikova 406/29, PSČ 169 00
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	—

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████



Fax	██████████
-----	------------

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Elektroline a.s., K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista (vedoucí prací) na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████





Telefon	██████████
Fax	██████████

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	---

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



## Příloha č. 7

### Seznam požadovaných pojištění

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

DRUH POJIŠTĚNÍ	MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	114 869 280,65 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 100 mil. Kč v úhrnu za rok



**Příloha č. 8**  
**Seznam poddodavatelů**

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA</b>
DUFONEV R.C., a.s. Lidická 2030/20, Černá Pole, 602 00 Brno; IČ: 25538748	Odpadové hospodářství	1,84 %
Elektroline a.s. K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8; IČ: 45312338	SO 31-01 Úprava trakčního vedení	4,70 %
4G consite s.r.o. Šlikova 406/29, Praha 6, PSČ 169 00; IČ: 27624218	Geotechnické práce	1 %
ČD - Telematika a.s. Praha 3, Pernerova 2819/2a, PSČ 130 00; IČ: 61459445	PS 02-31 Rozhlasové zařízení PS 02-33 Kamerový systém PS 02-34 Přeložky a ochrana stávajících sdělovacích kabelů	6,57 %
AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10; IČ: 48029483	PS 02-32 Informační systém	7,96 %
Elektrizace železnic Praha a.s. Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000; IČ: 47115921	PS 03-11 Úprava dispečerské řídící techniky PS 03-12 ED Praha Křenovka, doplnění DŘT	1,47 %
KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice; IČ: 46506934	SO 16-02 Odvodnění přístřešků	3,93 %
AQUASYS spol. s r.o. Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 59101; IČ: 25344447	SO 11-02 Železniční spodek SO 18-01 Chodníky, rampa SO 18-01.1 Přístupová cesta podél Českobrodské ulice SO 18-01.2 Dopravní trasy	2,15 %
Jiří Lorenc ETS - Express Trade Service 5.května 1387 , Rychnov nad Kněžnou, 51601; IČ: 45540161	SO 24-01 Orientační systém pro cestující	0,54 %
GAMET elektro, s.r.o. Žižkova 165, 533 03 Dašice; IČ: 25945670	SO 36-01 Úprava rozvodu NN, osvětlení nástupišť včetně přístupových cest a podchodu SO 36-01.2 Osvětlení provizorního nástupiště	4,74 %
Hroší stavby Morava a.s. Hodolanská 413/32, Hodolany, 779 00	SO 36-01.1 Osvětlení přístupové cesty podél Českobrodské ulice	1,79 %



<b>Olomouc; IČ: 28597460</b>	<b>SO 36-02 Úprava DOÚO SO 37-01 Ukolejnění kovových konstrukcí</b>	
<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Praha 3 - Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 13080; IČ: 25793349	<b>Dokumentace skutečného provedení stavby Dopracování projekt. souhrnného řešení - dPSŘ</b>	<b>0,72 %</b>
<b>Výzkumný Ústav Železniční, a.s.</b> Praha 4 - Braník, Novodvorská 1698, PSČ 14201; IČ: 27257258	<b>Hluková měření  Posouzení shody (interoperability) notifikovanou (autorizovanou) osobou</b>	<b>0,29 %</b>
	<b>CELKEM %</b>	<b>37,70 %</b>
