

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 1-03-24-001-DAAG

číslo smlouvy zhotovitele: 645 500 004 / 2024

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel:

Firma: **Správa železnic, státní organizace**

Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

Zápis v OR: zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Organizační jednotka a adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, na základě pověření č. 2381 ze dne 21. 3. 2018

Bankovní spojení: ČNB XXX

BIC: XXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

smluvních:

XXX, XXX, XXX,

mobil: XXX (mimo

podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

provozních a technických:

XXX

XXX

XXX

(dále jen „Zhotovitel“ a/nebo „Investor“)

1.2 Objednatel:

Společnost: „Společnost Masarykovo nádraží“

Správce společnosti: STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka B 1370

bank. spojení společnosti „ Společnost Masarykovo nádraží“: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník 2: STRABAG s.r.o.

se sídlem: Mlýnské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 17317282, DIČ: SK2020316298

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Bratislavě III
spisová značka Sro 991/B Budějovicích, oddíl C, vložka 17888
zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, jednatelem a Ing. Lubošem Tomáškem, jednatelem

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Objednatel“)

Číslo smlouvy: 1-03-24-001-DAAG

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních:

Bc. Jan Jedlička, telefon: XXX , email: XXX
XXX , telefon: XXX , email: [XXX](#)

- provozních a technických:

Ing. Michal Mokrý, telefon: XXX , email: XXX
XXX , telefon: XXX , email: XXX

Preambule

Investor oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 07.2023 pod evidenčním číslem zakázky Z2023-029848, svůj úmysl zadat v otevřeném řízení veřejnou zakázku s názvem „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zadávacího řízení byla investorem pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka objednatele a dne 19. 12. 2023 uzavřena mezi objednatelem a investorem smlouva na provádění stavby „**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ (ev. č. investora E618-S-5124/2023).

2. Předmět a účel smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy o dílo (dále též jen smlouva) je stanovit závazná pravidla, kterými se budou smluvní strany řídit při realizaci tzv. nezadatelných výkonů zhotovitele v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení, prováděných jako součást dodávky díla pro zhotovitele stavby (jenž je objednatelem dle této smlouvy) a financované z rozpočtu stavby v rámci stavby:

„**Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží**“ (dále též jen stavba).

Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají smluvní podmínky pro jednotlivé činnosti, které budou prováděny na základě objednávek na realizaci výkonů zhotovitele ve výše uvedených oblastech.

2.2 Účelem smlouvy je zajištění obchodní spolupráce mezi objednatelem a zhotovitelem, která bude spočívat v právu objednatele objednávat u zhotovitele provedení nezadatelných výkonů v oblasti elektrických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení v průběhu trvání této smlouvy a povinnosti zhotovitele objednaný výkon (dále též jen dílo) za podmínek sjednaných v této smlouvě provést.

2.3 Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zastoupená organizační jednotkou Stavební správou západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále též jen investor nebo SŽ).

2.4 Objednatel po dobu realizace stavby vystaví na každý kalendářní měsíc nejpozději do 15-tého dne předchozího měsíce soupis požadovaných nezadatelných výkonů formou objednávky, který bude obsahovat zejména:

a) přesnou specifikaci výkonu a jeho cenu nebo způsob jejího určení,

- b) termín plnění,
- c) jméno a funkci oprávněné osoby objednatele pro převzetí díla.

V případě, že provedení výkonu bude vyžadovat výluku provozovaného elektrického, sdělovacího, nebo zabezpečovacího zařízení, musí objednatel při stanovení požadavku na tento výkon postupovat podle platných předpisů investora (SŽ D7/2).

2.5 Zhotovitel se zavazuje každý takovýto soupis potvrdit a obratem (nejpozději do 3 pracovních dní) zaslat zpět objednateli.

2.6 Přílohou č. 1 této smlouvy je HMG předpokládané realizace zhotovitele v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení

2.7 Objednatel se zavazuje na základě písemné žádosti zhotovitele poskytnout mu veškerou součinnost nezbytnou k provedení díla a nezbytné podklady, které zhotovitel nemá k dispozici.

3. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: 09. 03. 2024

3.2 Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 31. 07. 2027

3.3 Doba plnění může být upravena na základě dohody smluvních stran.

3.4 Objednatel je oprávněn kdykoliv nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. V případě takového přerušení z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o dobu objektivně nutnou pro dokončení díla nebo jeho části.

3.5 Nařídí-li objednatel přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele, má zhotovitel nárok na úhradu prokazatelných nákladů, které již na provádění díla vynaložil.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1 Zhotovitel je oprávněn zaslat objednateli na každý kalendářní rok ceník výkonů Zhotovitele, který se po odsouhlasení Objednatelem stane přílohou č. 2 Smlouvy.

4.2 Zhotovitel bude cenu díla fakturovat na základě dílčích měsíčních faktur. Faktura bude vystavena vždy do 15-ti dnů od dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň (dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH). Podkladem pro fakturaci měsíční zhotovitele bude objednatelům odsouhlasený zjišťovací protokol (soupis provedených prací). Tento zjišťovací protokol bude obsahovat prohlášení o předání a převzetí provedených prací objednatelům a bude nedílnou přílohou každé dílčí měsíční faktury. Práce dle této smlouvy nepodléhají režimu přenesené daňové povinnosti (nejsou uvedeny v číselné řadě CZ CPA 41-43) ve smyslu § 92e zákona o DPH. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu. Důvodem pro neodsouhlasení zjišťovacího protokolu (soupisu provedených prací) objednatelům je skutečnost, že se v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy vrátit fakturu k přepracování. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody.

4.3 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Tato splatnost vychází ze smlouvy o dílo uzavřené s investorem stavby a investor stavby ji odůvodnil povahou závazku. Smluvní strany prohlašují, že lhůta

splatnosti faktur je stranami sjednána s přihlédnutím k povaze předmětu plnění. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

4.4 Smluvní strany se u plnění, které nepodléhá přenesené daňové povinnosti, dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo příslušnému správci daně.

4.5 V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.

4.6 Faktury budou mít elektronickou podobu, přičemž obě smluvní strany tímto s použitím faktur v elektronické podobě výslovně souhlasí. Elektronické faktury musí být zaslány emailem ve formátu .pdf na e-mailovou adresu:

XXX . Soubor nesmí být zašifrován a nesmí být chráněn heslem. Velikost e-mailu nesmí překročit 15 MB. E-mail může obsahovat pouze jednu fakturu nebo jeden dobropis. Součástí e-mailu může být faktura ve formátu národního standardu pro elektronickou fakturaci (ISDOC (Information System Document)) a dále případné přílohy faktury (např. zakázkový list, akceptovaná objednávka apod.) v samostatném souboru .pdf nebo jiném formátu.

4.7 Faktury musí obsahovat všechny náležitosti podle právních předpisů a dále referenční kód přidělený Objednatelem, který musí splňovat následující kritéria:

- a) musí být uveden na první straně faktury,
- b) musí být v jednom řádku,
- c) musí být čitelný,
- d) pro účely této smlouvy musí mít strukturu **RC-KST-CZ-612-DAAG**.

4.8 Objednatel není odpovědný za jakákoli prodlení při uhrazování fakturované částky v případě, že ve faktuře nejsou tyto údaje řádně uvedené. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn jej vrátit k opravě a doplnění. Od data vystavení opraveného, resp. doplněného daňového dokladu, běží nová lhůta splatnosti.

4.9 Postoupení pohledávky zhotovitele za objednatelem je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo v místě, které je uvedeno v dílčím soupisu požadovaných prací jako místo plnění. Dílo převezme oprávněný zástupce objednatele – dle čl. 1.2.

6. Jakost díla

6.1 Dílo musí splňovat jakost vyžadovanou Technickými kvalitativními podmínkami staveb drah, v platném znění.

7. Záruky a reklamace

7.1 Vzhledem k povaze díla, které bude prováděno na majetku zhotovitele, se záruka na dílo neposkytuje.

7.2 Případné zjištěné vady uplatní objednatel písemnou formou u zhotovitele a musí obsahovat zejména:

- d) popis vady,
- e) uplatňovaný nárok,
- f) přiměřené lhůty pro odstranění vady či náhradní dodávku, uplatňuje-li objednatel některý z těchto nároků.

8. Porušení smluvních povinností a jeho následky

8.1 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

9. Řešení sporů

9.1 Spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem budou přednostně řešeny dohodou zástupců obou smluvních stran. V případě, že k dohodě nedojde, budou všechny tyto spory rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

10. Zvláštní ujednání

10.1 Jestliže na jednotlivé dodávky budou dle oboustranně potvrzené objednávky dohodnuta odchylná ujednání oproti této smlouvě, mají přednost odchylná ujednání dohodnutá oboustranně potvrzenou objednávkou.

10.2 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/onas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze dohodou smluvních stran formou písemných, postupně číslovaných dodatků. Písemná forma platí i pro zrušení této smlouvy.

11.2 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy. Případné odstoupení od této smlouvy se netýká jednotlivých smluv uzavřených na jejím základě v době její platnosti. Strany se zavazují splnit povinnosti z jednotlivých smluv založených objednávkou i po odstoupení od této smlouvy. Každá ze stran má právo odstoupit za podmínek stanovených v této smlouvě také od jednotlivých smluv založených objednávkou.

11.3 Údaje v této smlouvě obsažené jsou obchodním tajemstvím smluvních stran ve smyslu § 17 a následujících obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé strany, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

11.4 Smluvní vztah se v oblastech, které neřeší tato smlouva, řídí obecné platnými právními normami.

11.5 Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této smlouvy seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad přijímají.

11.6 Objednatel prohlašuje, že souhlasí, aby zhotovitel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.

11.7 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.

11.8 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.9 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.

11.10 Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že je se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.11 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

11.12 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvy v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.13 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 2 vyhotovení smlouvy.

Přílohami a současně nedílnými součástmi této smlouvy jsou:

1. Harmonogram předpokládané realizace v oblasti elektrotechnických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
2. Ceník výkonů zhotovitele
3. Společenská smlouva

V Ústí nad Labem dne: 04. 03. 2024

V Praze dne: 06. 03. 2024

Za objednatele společnosti:

„Společnost Masarykovo nádraží“

Za zhotovitele:

Ing. Jakub Svoboda, v. r.
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s. / Správce

Ing. Vladimír Filip, v. r.
ředitel Oblastního ředitelství Praha
Správa železnic, státní organizace

Ing. Luboš Tomášek, v. r.
člen představenstva
STRABAG Rail a.s. / Správce

Ing. Jakub Svoboda, v. r.
jednatel
STRABAG s.r.o.

Ing. Luboš Tomášek, v. r.
jednatel
STRABAG s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

Technická zpráva „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ (sloučené postupy na Sluncové)

STAVEBNÍ POSTUPY

Předpokládaný termín realizace stavby 9.3.2024 – 26.04.2027.

Práce probíhají bez zimních a letních přestávek ani bez vazby na úpravy grafikonů.

Předpokládá se, že každý rok v období 23.12. až 1.1. vč. zhotovitel nebude pracovat.

Hmg neuvažuje s přestávkami na státní svátky.

Noční výluky se předpokládají vždy mezi 23:30 a 3:30. V tomto materiálu jsou uvedeny předpokládané výluky s tím, že Zhotovitel je povinen rozsah a data jednotlivých výluk upřesnit a odsouhlasit se SŽ. Návrhem výluk není Zhotovitel vázán, může si je projednat odlišně.

Obecná poznámka:

rámci každého SP, kde došlo k zásahu do ZabZař se předpokládá proměření a kontrola funkčnosti zařízení v souladu s platnými předpisy. Obecně platí, že pro všechny SP s výjimkou SP1c a SP6 se přepojení uskuteční ve lhůtě daného SP!

Není-li uvedeno jinak, úpravy trakčního vedení na navazujících úsecích se realizují vždy v rámci daného SP, kterého se SP týká!

Je-li výhybka označena xxxN, tak to znamená, že se jedná o nově osazenou výhybku v rámci SP.

Primárně se předpokládá, že základy stožárů a bran, není-li uvedeno jinak, se realizují v rámci každého příslušného SP, a to co nejdříve. Doba zrání betonu se uvažuje 21 dní od betonáže, teprve po této lhůtě se mohou osadit sloupy a brány. Na konci SP se následně osazují sloupy, brány a natahuje se trakce

Aktivaci a odzkoušení ZabZař zajišťuje zhotovitel. V hmg se uvažuje jednotná lhůta 14 kalendářních dní na vlastní odzkoušení a aktivaci.

6.11.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - DEMOLICE A1, A2

Rozsah práce - kolej č. 7

- a) vytyčení, oplocení a zřízení zařízení staveniště - zajišťuje GD
- b) snesení části troleje a kolejí v prostoru stávající koleje 7, týká se pouze koleje 7
 - c) zahájení dlouhodobé výluky koleje č. 7
 - d) zajištění podsklepených prostor pažením
 - e) vlastní demolice drážní stavby A1, A2 . Je nutné po dobu demolic přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k pádu suti do koleje č. 6 a na nástupiště č. 4. Po dohodě s dopravním inženýrem doporučuji tyto práce (strojní demolice nadzemní části) realizovat v rámci víkendových výluk. Vlastní odstraňování suti příp. práce pod úrovní terénu lze realizovat kdykoliv).
- f) odpojení trakce
- g) demontáž trakce
- h) snesení koleje
- i) přemístění TS
- j) ZS a přístupové trasy
- k) bezpečnostní opatření

doba realizace

– zahájení 09.03.2024 -

Vyloučené koleje

Nepřetržitá výluka

Výluka koleje č.7 po celou dobu trvání SP až do konce SP5 od námezničku výhybky č. 10. Úprava TV v rámci této výluky. Omezení šířky nástupiště na polovinu oplocením po dobu demolic, výluka koleje č. 6 o víkendech během strojních demolic nadzemní části objektů. Předpoklad do 2 týdnů.

Po skončení demolic zůstane nástupiště č. 4 oploceno směrem ke koleji č. 7 a provoz bude pouze na koleji č. 6..

7.13.1. SP1

7.13.1.1. PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 1

- a) Vytyčení, oplocení a zřízení zařízení staveniště
- b) výkopy pro archeologický průzkum v rozsahu bud. koleje 7, 8, 9
- c) archeologický průzkum v prostoru kolejí a ploch
- d) betonáže základů pro trakci v oblasti Sluncová, Balabenka, Hrabovka, Dvorana

Vyloučené koleje:

Nepřetržitá výluka

Výluka SK 103, 103a – **odstavování mechanizace**


29.04.2024 - 31.05.2024

Výluka SK 103, 103a – **demontáž kolejí** – zahájení výstavby a opravy opěrných zdí

01.06.2024 – 11.06.2024

Budoucí koleje 8, 9 se budou realizovat v rámci SP1, kolej 7 v rámci SP1 a SP5

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

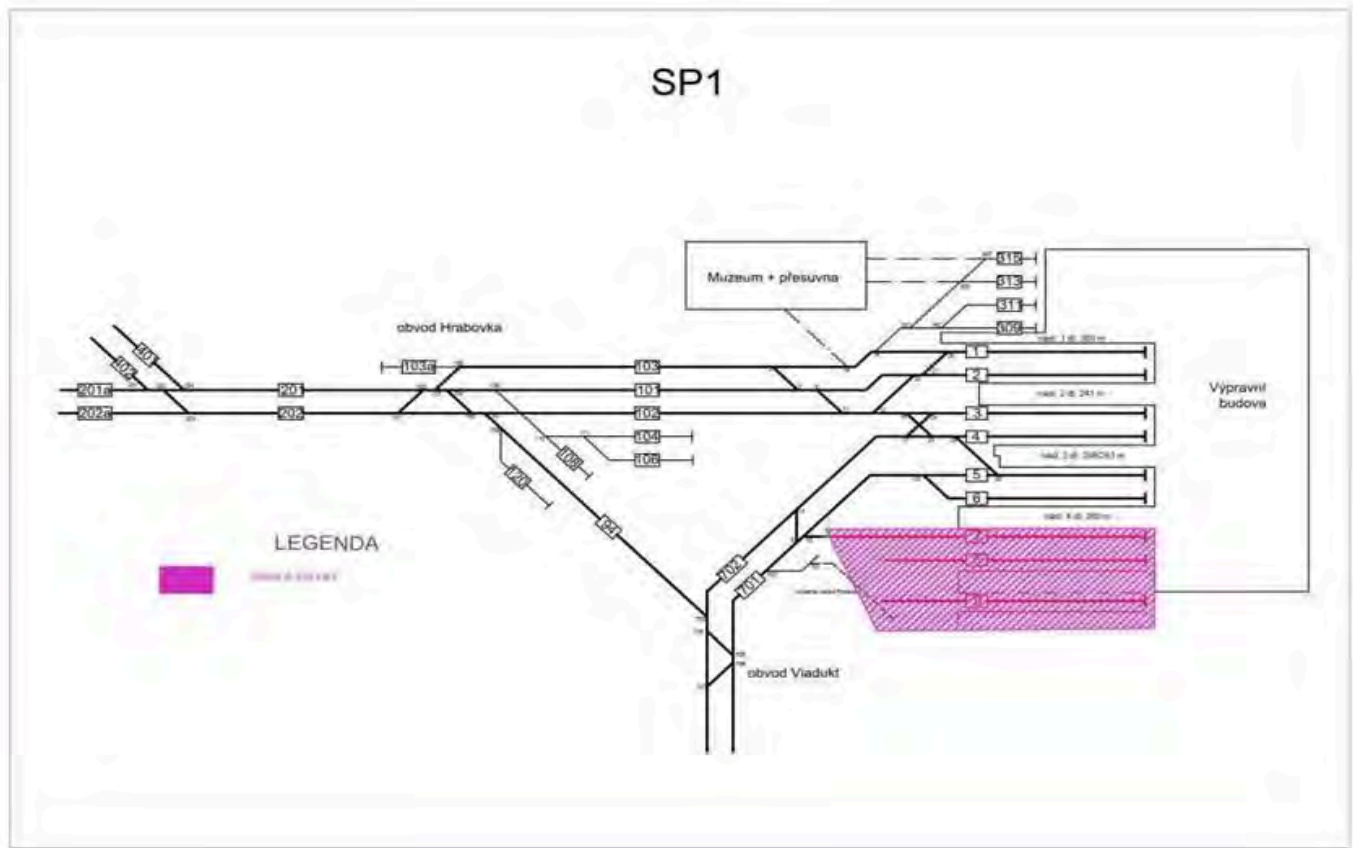

Přístup na SP

Z ulice Na Florenci přes ZS1 přímo přístup k místu SP1 (žlutá barva).

Vyloučené koleje

Dne 09.3.2024 zahájena výluka koleje č. 7

Koleje 8 a 9 jsou v realizaci - nejsou v provozu

- **09.03.2024 – 10.03.2024 – trvalá výluka TV sekce 701 + 4-7 na dmt TV**

Přípravné práce po montáži trakce:

V rámci SP1 10 dní na budování základů trakce v prostoru kolejí 7-9 v rámci výluky pro SP

Vypnutí trakčního vedení

Nad vyloučenou kolejí SK 7 - trvalá výluka - TV sneseno v rámci PP

Omezení rychlosti

Kolem pracovního místa max 50 km/h

Činnost zabezpečovacího zařízení

Činnost zabezpečovacího zařízení je popsána v jednotlivých podetapách SP1a, SP1 b, SP1c.

Jízdy vlaků

Provoz na SK č 1,2,3,4,5,6 a 309

Výluková propustnost

Omezena odstavná kapacita, ve Dvoraně pouze 6 nástupištních hran do doby zprovoznění provizorního nástupiště u SK č. 309

Dopravní opatření

6 nástupištních hran umožní provoz v uvažovaném rozsahu dopravy bez omezení.

7.13.2. STAVEBNÍ POSTUP 1b


Pokračují práce na SP1 a pokračují práce na Sluncové. Probíhá montáž MPZZ.

Rozsah práce

- vložení výhybek 204N, 207N včetně přilehlých částí koleje
- Nový železniční svršek a spodek základy a nové trakční sloupy
- pověšení troleje

Délka stavebního postupu

21 dní 11.06.2024 – 01.07.2024

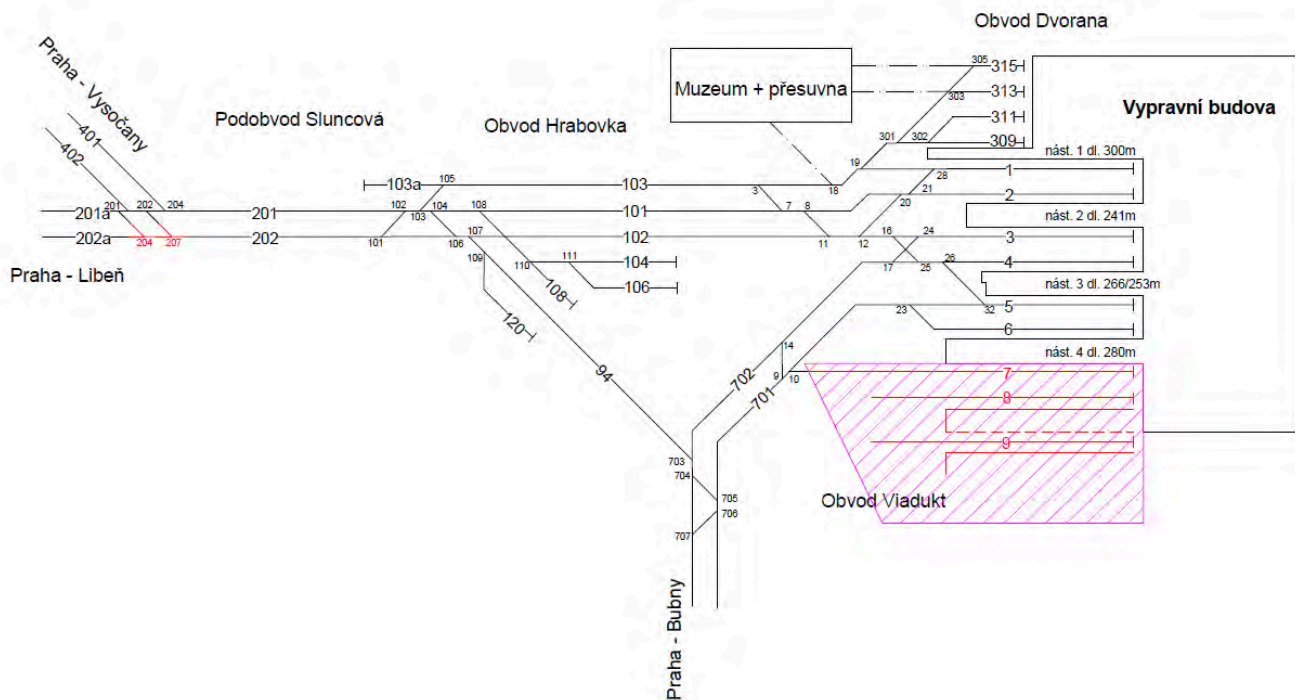

Vypnutí trakčního vedení

Vypnutí TV kol. č. 202 a 202a. odizolování 202a - noční výluka

Úprava TV dotčených úseků k.č. 202 a 202a na konci SP - 2 dny trvalá výluka v rámci SP

Omezení rychlosti

Kolem pracovního místa max 50 km/h

Činnost zabezpečovacího zařízení

V konci výluky dojde k montáži PN a úpravě zab.zař

Omezení rychlosti

Kolem pracovního místa max 50 km/h

7.13.3. STAVEBNÍ POSTUP 2a

Pokračují práce na SP1 Na Florenci a pokračují práce v rámci obvodu na Hrabovce

Rozsah práce


- a. vložení výhybky 201N, 202N, 203N, 205N, 206N a 208N včetně přílehlých částí kolejí
- b. snesení části koleje 201, 101, 103 a 105 v rozsahu výhybek námezníku 208 - po námezníky vých. č. 17, resp. 5
- c. snesení kolejí 104 a 106 od výhybky 110 po zarážedla
- d. nové koleje 309a, 311a od výhybky 12
- e. provedení pažení mezi kolejemi 101 a 102 v úseku 408,380 – 408,600 (noční výluky
- f. Nový železniční svršek a spodek uvedené koleje
- g. vložení nových výhybek 8,12,115,110,111, 112,101,105, 208
- h. položení nových kolejí 101, 201, 103, 105, 309a, 311a
- i. Výstavba umělých staveb
 - j. u kolejí 105, 309a, 311a
 - ii. ve stanici pokračuje výstavba SP1
- i. Sanace zdí SO 11-24-01,02
- k. základy a nové trakční sloupy
- l. pověšení/převěšení troleje na nezměněné sloupy
- m. **aktivace provizorního zabezpečovacího zařízení v 7-mi denním nickolejním provozu za vypnutí zabezpečovacího zařízení žst. Masarykovo nádraží**

Sanace zdí bude probíhat za provozu po k.č. 202 se zapnutou trakcí, tudíž je nutné počítat s výstavbou lešení s pečlivým zakrytím plachtovinou, aby bylo zabráněno odletu tryskačí směsi a tryskaného materiálu na k.č. 202. Návoz materiálu bude probíhat z místa snesené k.č. 103 z postupu č. 1 s přístupem ze ZS3, v případě kladného projednání s ČD as je možný i přístup z plánovaného parkoviště

Délka stavebního postupu

57 dní 02.07.2024 – 27.08.2024
7 dní zastavení provozu 21.08.2024 – 27.08.2024

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

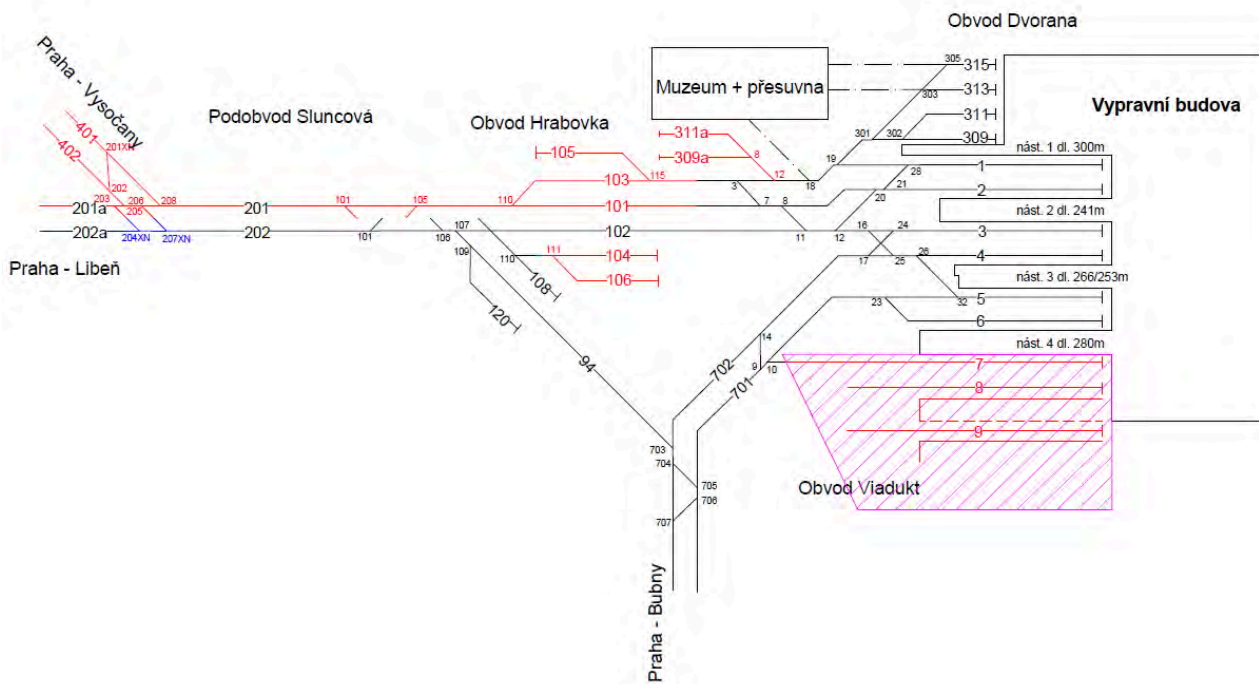

Vyloučené koleje

Zastavení provozu Obvod Masarykovo nádraží 21.08.2024 – 27.08.2024

Nepřetržitá výluka

SK č 201 v celé délce SK č. 103 k námezníku výh. 17

SK č.201a

SK č.401

SK č.402

SK č.309 až 315 - výstavba provizorního nástupiště u SK

SK č. 101 včetně navazující části zhlaví k námezníku výhybky č. 4 koleje 104,106 od námezníku výhybky 110 po zarážedla

pokračuje výluka SK 7

Krátkodobé výluky

Krátkodobé noční výluky kolejí 102 a 202 pro práce na kolejích 101, 201, 103, 105, 104, 106, 309a, 311a

- k.č. 120 - výluka a betonáž základů
- k.č. 94 - výluka a betonáž základů
- k.č. 102 - noční výluka pro brány, pažení v ose os kolejí 102 a 101 15x
- k.č. 108, 94, 120 - denní výluka pro brány

Vypnutí trakčního vedení

Demontáž TV v kol.č.201,101,401,402 a pro práce v liché kolejové skupině a nad kolejí č.104 pro práce nad touto kolejí. Dělič P1 bude nadále funkční - TV nad výhybkou 208 bude vypnuto. Pro zachování napájení TV kol.č.1 a 2 při vložení nové výh.č. 12 bude vložen dělič P3 do TV kol.č.103 a dělič č.8 do TV nad spojkou 3-7. Napájení TV liché skupiny pomocí příčného sepnutí odpojovačů č.3A a 3B.

Bude odpojena trakce mezi stožáry 1 (151) až 41 (starý).

Bude odpojena kolej 201A po dělič P1.

Úprava TV na dotčených úsecích k.č. 101, 201, 201a, 401, 402, 103 v rámci SP začátku SP - 3 dny a 1 noční výluka

Úprava TV na konci SP na dotčených úsecích 101, 201, 203 pro připojení dotčených kolejí v rámci SP- 10 nocí

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

Betonáž základů v rámci SP bez výluk:

- Kolej č.101 po vytržení kol.č.103a
- Kolej č.101 po vytržení kol.č.103, Kolej č.103
- Kolej č.105
- Kolej č.309a + 311a
- Plán v místě budoucího stožáru č.47B - 1 den

Stavba stožárů a bran v rámci SP bez výluk:

- Kolej č.103
- Kolej č.105
- Kolej č.309a + 311a
- Plán v místě budoucího stožáru č.47B
- Koleje č.105 - 106 v šířce odpovídající počtu kolejí a délce bran

Omezení rychlosti

Kolem pracovního místa max 50 km/h

Zabezpečovací zařízení

V konci stavebního postupu bude na 7 dní zastaven železniční provoz v žst. Masarykovo nádraží. V této době bude aktivováno PZZ s ovládním z CDP a zálohově z konteineru umístěného u stávající technologické budovy v místě trianglu na Negreliho viadukt.

Po ukončení postupu bude toto zařízení v provozu včetně aktualizovaného softwaru.

Dále dojde k vymístění stávajícího zabezpečovacího zařízení z tech.budovy do konteineru č.2 a budou zahájeny práce na stavebních úpravách z důvodu instalace nového zab.zařízení.

V CDP dojde k úpravám, aby bylo možné bezpečně provozovat nově aktivované zab.zařízení i s návaznostmi na aktivaci dalších stavebních postupů.

7.13.4. STAVEBNÍ POSTUP 2b

Pokračují práce na SP1 Na Florenci a pokračují práce v rámci obvodu na Hrabovce

Rozsah práce


- a. nové koleje 309a, 311a od výhybky 12
- b. Nový železniční svršek a spodek uvedené koleje
- c. vložení nových výhybek 8,12,115,110,111, 112,101,105, 208
- d. položení nových kolejí 101, 201, 103, 105, 309a, 311a
- e. Výstavba umělých staveb
 - i. u kolejí 105, 309a, 311a
 - ii. ve stanici pokračuje výstavba SP1
- f. Sanace zdí SO 11-24-01,02
- g. pověšení/převěšení troleje na nezměněné sloupy
- h. výstavba provizorního nástupiště u SK 309

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

Sanace zdí bude probíhat za provozu po k.č. 202 se zapnutou trakcí, tudíž je nutné počítat s výstavbou lešení s pečlivým zakrytím plachtovinou, aby bylo zabráněno odletu tryskačí směsi a tryskaného materiálu na k.č. 202. Návoz materiálu bude probíhat z místa snesené k.č. 103 z postupu č. 1 s přístupem ze ZS3, v případě kladného projednání s ČD as je možný i přístup z plánovaného parkoviště

Délka stavebního postupu

42 dní 28.08.2024 – 08.10.2024

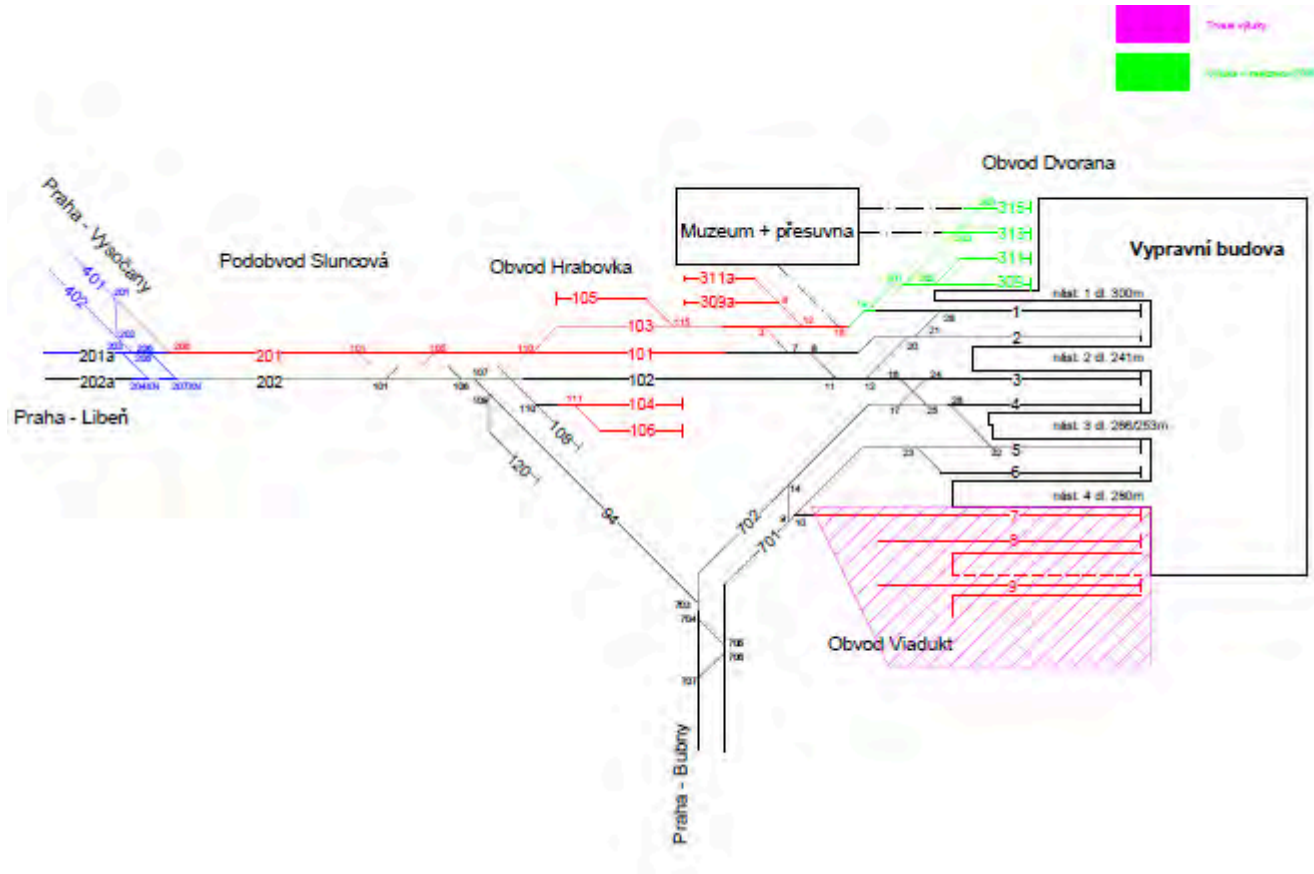

Vyloučené koleje

Nepřetržitá výluka

SK č 201 v celé délce včetně v.č.208N

SK č. 103 k námezníku výh. 17

SK č.401

SK č. 101 včetně navazující části zhlaví k námezníku výhybky č. 4 koleje 104,106 od námezníku výhybky 110 po zarážedla pokračuje výluka SK 7

Krátkodobé výluky

Krátkodobé noční výluky kolejí 102 a 202 pro práce na kolejích 101, 201, 103, 105, 104, 106, 309a, 311a

- k.č. 102 - noční výluka pro brány

- k.č. 108, 94, 120 - denní výluka pro brány

Vypnutí trakčního vedení

Pro zachování napájení TV kol.č.1 a 2 při vložení nové výh.č. 12 bude vložen dělič P3 do TV kol.č.103 a dělič č.8 do TV nad spojkou 3-7. Napájení TV liché skupiny pomocí příčného sepnutí odpojovačů č.3A a 3B. Bude odpojena trakce mezi stožáry 1 (151) až 41 (starý).

Bude odpojena kolej 201A po dělič P1.

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

Úprava TV na konci SP na dotčených úsecích 101, 201, 203 pro připojení dotčených kolejí v rámci SP- 10 nocí

Betonáž základů v rámci SP bez výluk:

- Plán v místě budoucího stožáru č.47B - 1 den

Stavba stožárů a bran v rámci SP bez výluk:

- Kolej č.103
- Kolej č.105
- Kolej č.309a + 311a
- Plán v místě budoucího stožáru č.47B
- Koleje č.105 - 106 v šířce odpovídající počtu kolejí a délce bran

Omezení rychlosti

Kolem pracovního místa max 50 km/h

Zabezpečovací zařízení

Je v činnosti MPZZ s úvazkami stávajících TZZ Výluka staničních kolejí č. 7, 201, 101, a 103

V rámci MPZZ je možné ovládat všechny nové výhybky v obvodu Sluncová (kromě 208N) a stávající pojižděné výhybky ve stávající části kolejiště. Výhybky pojižděné ve vlakových cestách a odbočující do vyloučené části kolejiště budou drženy přestavným ústrojím a zároveň budou uzamčeny do potřebné polohy výměnovými zámky, výsledné klíče budou uloženy u výpravčího. Během postupu probíhá demontáž vnitřní části stávajícího SZZ a montáž nového zabezpečovacího zařízení. Montáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízení v dokončované části kolejiště a jejich zapínání do MPZZ a přezkušování.

7.13.6. STAVEBNÍ POSTUP č. 3

Rozsah práce

- a. betonáž základů v rámci SP na začátku SP. Nové základy, které jsou v kolizise stávající kolejí po snesení k.č. 102.
- b. Převěšení bran v rámci nočních výluk koleje 101.
- c. Snesení části koleje č. 202, SK č 102,104,106 a části kolejí č. 94 ve směru na Negrelliho viadukt. a SK 102, 104, 106 a koleje č. 120. Snesení SK č. 104 a 106 by mělo proběhnout především v rámci SP2:
- d. Snesení st. výhybek č. 101, 106,107,109,110,111
- e. Nový železniční svršek a spodek SK č. 202
- f. Nový železniční svršek a spodek kolejí č 102,104,106,včetně napojení zhlaví ve směru na Negrelliho viadukt
- g. Položení nových výhybek č. 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 113 a 114
- h. Výstavba pracovní plochy mezi SK č 104,106 a nového kabelovodu
- i. Pokračuje výstavba umělých staveb ve stanici, SO 11 - 23 - 01 základy a nové trakční sloupy
- j. nové stožáry a brány na konci SP
- k. pověšení/převěšení trolej na nové sloupy a brány

Zabezpečovací zařízení

Během postupu je v činnosti MPZZ s úvazkami stávajících TZZ Výluka staničních kolejí č. 7, 202, 102, 104, 106, 108, 110

V rámci MPZZ je možné ovládat všechny nové výhybky v obvodu Sluncová, nové výhybky v kolejích 201, 101 a 103 a stávající pojížděné výhybky ve stávající části kolejiště. Výhybky pojížděné ve vlakových cestách a odbočující do vyloučené části kolejiště budou drženy přestavným ústrojím a zároveň budou uzamčeny do potřebné polohy výměnovými zámky, výsledné klíče budou uloženy u výpravčího. Během postupu probíhá montáž nového zabezpečovacího zařízení včetně definitivní venkovní kabelizace. Montáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízení v dokončované části kolejiště a jejich zapínání do MPZZ a přezkušování, V rámci MPZZ je možné zajíždět vlakovými cestami k provizornímu nástupišti u koleje č. 309

7.13.7. STAVEBNÍ POSTUP č. 3.1

Rozsah práce

- a. Přepínání zabezpečovacího zařízení

Délka stavebního postupu

7 dní zastavení provozu

07.12.2024 - 13.12.2024

Zabezpečovací zařízení

Ve stavebním postupu bude na 7 dní zastaven železniční provoz v žst. Masarykovo nádraží. Důvodem je aktualizace provizorního zab.zařízení v CDP

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

7.14. STAVEBNÍ POSTUP č. 4


Rozsah práce

- a. Rekonstrukce zhlaví ve směru na Negrelliho viadukt
- b. Výstavba umělých staveb ve stanici:
- c. výstavba kabelovodu pod kolejemi 701,702 ve směru ŽST Praha-Bubny
- d. základy a nové trakční sloupy u kolejí 7, 8, 9, 701, 702
- e. koleje 8,9, 701, 702
- f. pověšení/převěšení troleje
- g. **na konci SP budou uvedeny do provozu koleje 8 a 9. Předpoklad k 31.07.25 spolu se zavedení provozu v žst. Bubny**

Délka stavebního postupu

149 dní

05.03.2025 - 31.07.2025

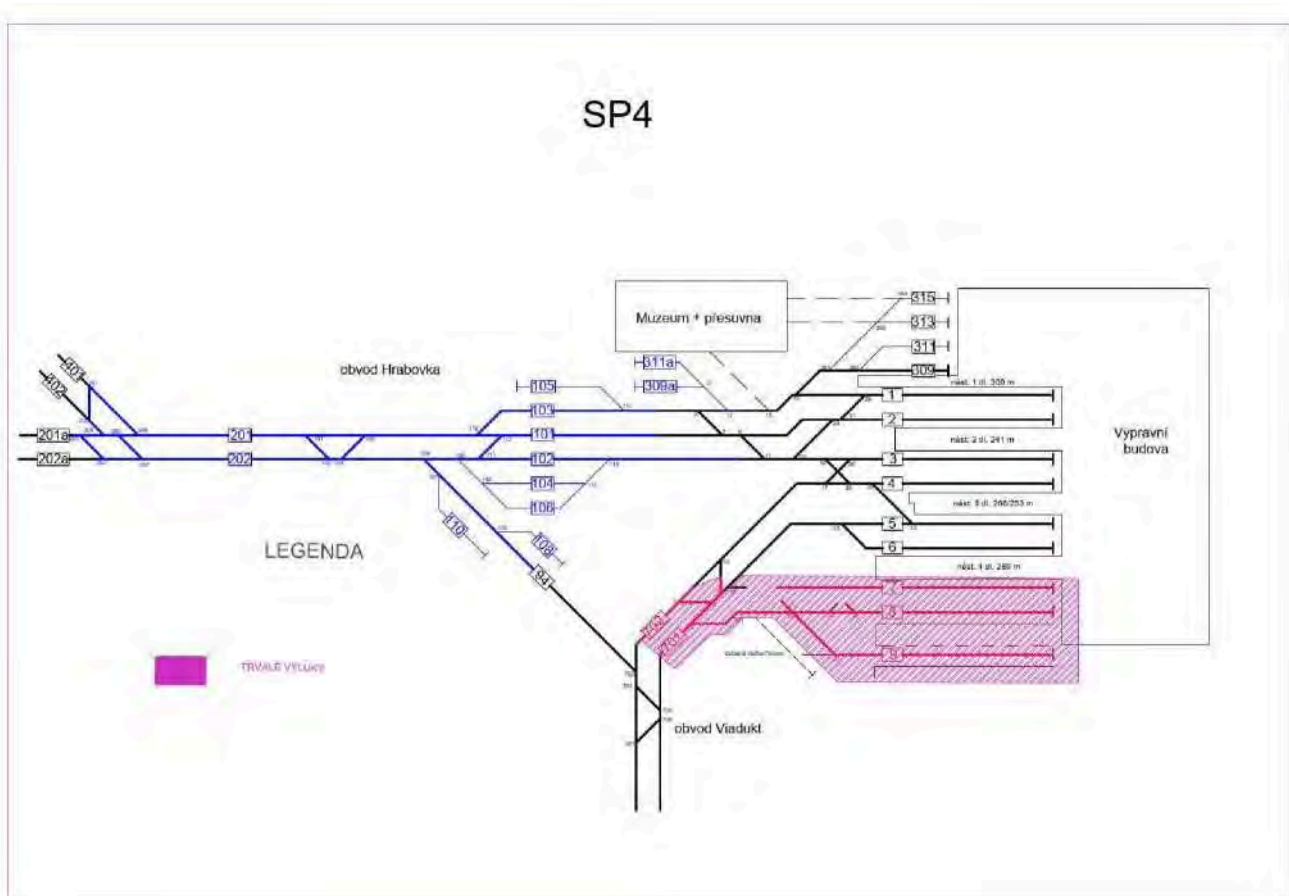

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

Přístup na SP

Z ulice Na Florenci Z ulice Na Florenci společným vjezdem s DPP přístup do stavby a následně po samostatné trase k místu SP4.

Vyloučené koleje

Nepřetržitá výluka

- SK č 701 mezi námezníkem u výh. č. 705 a 7, k.č. 702 mezi námezníkem u výh. č. 703 a 14, úsek mezi námezníky výhybek 7 a 14, k.č. 6 z důvodu nepřístupnosti
- pokračuje výluka SK 7

Krátkodobé výluky

Veškeré výluky pro návoz materiálu budou v režimu nočních výluk (předp. 23:30 - 3:30).

krátkodobá výluka kolejí 4,5,6 (2x dvě noční výluky) pro vložení děličů na začátku a pro překlenutí děličů na konci tohoto SP

Vypnutí trakčního vedení

SK č 701,702,6 od odpojovačů č 411,412 na Negrelliho viaduktu V případě jízd na SK č 94 jízdy samotíží mezi odpojovači č 206 a 412/411 Aby byly umožněny jízdy na Sk č 4,5 závislou trakcí vložení provizorních děličů P1, P2 do k.č. 701,702 a sepnutí příčného napájení ze SK č. 3 k.č. 701 a 702 bez napětí koleje 8 a 9 je možné zapnout na hlavním napájecím portálu vloženy provizorní děliče P1, P2. Odpojení TV na dotčených kolejích na začátku SP - noční výluka 2 dny Připojení TV na dotčených kolejích na konci SP - 5 nocí na konci SP

Omezení rychlosti

Kolem pracovního místa max 50 km/h

Zabezpečovací zařízení

Během postupu je v činnosti MPZZ s úvazkami stávajících TZZ

Výluka staničních kolejí č. 7, 8, 9, 701, 702

V rámci MPZZ je možné ovládat všechny nové výhybky v obvodu Sluncová, nové výhybky v kolejích 201, 202, 101, 102, 103, 94 a stávající pojízdné výhybky ve stávající části kolejiště. Výhybky pojízdné ve vlakových cestách a odbočující do vyloučené části kolejiště budou drženy přestavným ústrojím a zároveň budou uzamčeny do potřebné polohy výměnovými zámky, výsledné klíče budou uloženy u výpravčího. Během postupu probíhá montáž nového zabezpečovacího zařízení včetně definitivní venkovní kabelizace. Montáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízení v dokončované části kolejiště a jejich zapínání do MPZZ a přezkušování, V rámci MPZZ je možné zajíždět vlakovými cestami k provizornímu nástupišti u koleje č. 309

7.15. STAVEBNÍ POSTUP Č. 5

Po dokončení oblasti Hrabovky rozšíření stavebních prací v oblasti dvorany na SK č 3,4,5, 6, 7
Přípravné práce v rámci SP5 budou zahájeny 01.08.2025.

Rozsah práce

- a) Demolice nástupiště č. 3 a 4 a snesení SK č 3,4,5
- b) Archeologický průzkum v místě stavby II dilatačního celku
- c) základy a nové trakční sloupy
- d) Stávající nástupiště č. 2 bude podélně rozděleno, aby bylo možné pokračovat na druhém dilatačním celku platformy zastřešení, a přitom zůstala v provozu nástupištní hrana u SK č. 2
V této fázi nebude ještě nástupiště č. 2 rekonstruováno
- e) Výstavba SK č. 3,4,5,6,7
- f) Výstavba zastřešení na nástupištích
- g) Výstavba umělých staveb ve stanici
- h) Výstavba II dilatačního celku platformy
- i) Výstavba kolektoru pod novými k.č. 3,4,5
- j) Výstavba kabelovodu - 2. etapa se základy a nové trakční sloupy
- k) pověšení/převěšení troleje
- l) Kolej č. 7 do provozu

Délka stavebního postupu
373 dní

01.08.2025 – 08.08.2026

Přístup na SP

Z ulice Na Florenci společným vjezdem s DPP přístup do stavby a následně po samostatné trase a následně neveřejným úrovněm křížením přístup k SP5. Zhotovitel musí odsouhlasit se SŽ povolení ke zřízení a užívání neveřejného úrovněm křížení. Obecně je možné toto křížení používat v nočních hodinách s výjimkou betonáží, kdy z hlukových důvodů není možné betonovat.


Vyloučené koleje

Nepřetržitá výluka

SK č 3,4,5 6 od námezníků u výhybek 15, 16, ,7 po zarážedla

Pokračuje výluka k.č. 7. - končí v tomto SP.

Kolej 9a

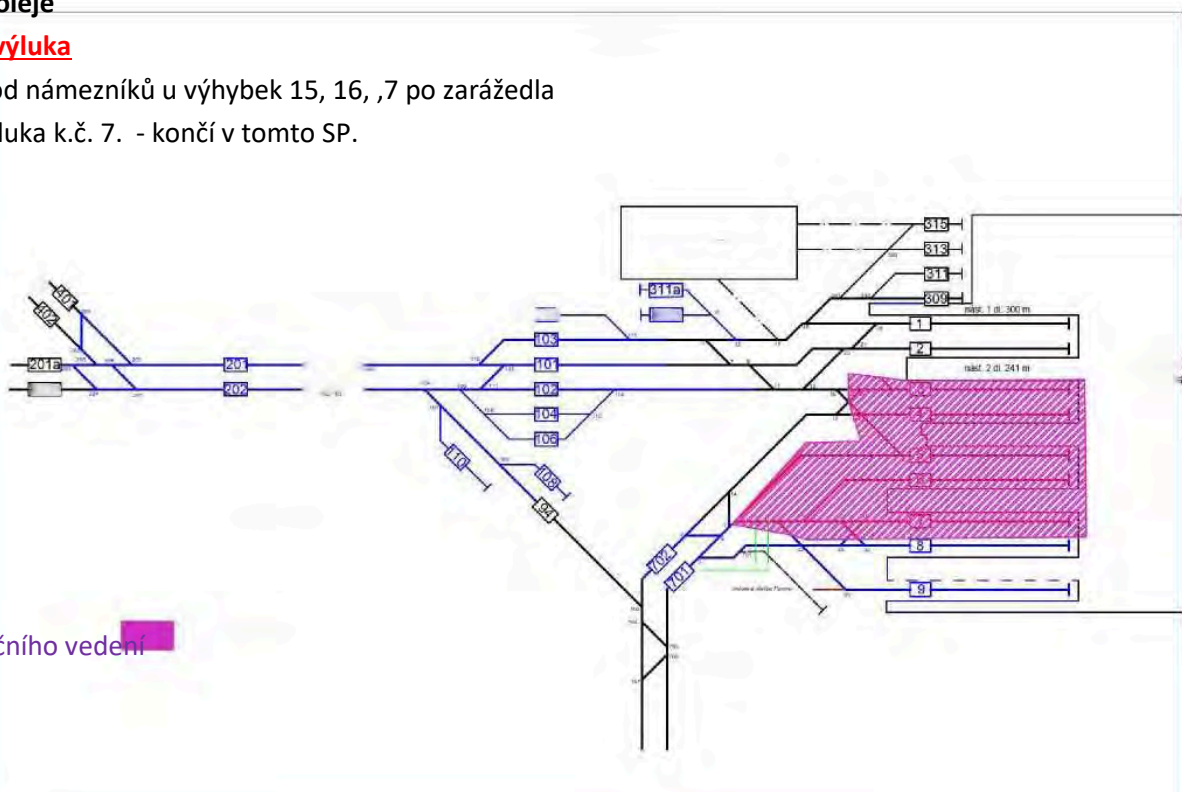

Vypnutí trakčního vedení

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

Odpojení koleje 102 od brány 42 - 45 k zarážedlu, koleje 4 od stožáru 70 k zarážedlu a koleje 5 od stožáru 71 k zarážedlu. SK 3,4,5 v místě dvorany TV SK č 102 provizorně vykotveno za výhybkou č 16 Provoz na koleje 8,9 pod TV budto překlenutím děliče za výhybkou č 3 nebo příčným sepnutím ze SK č. 1 nebo 2 Odizolování kolejí provizorními děliči P1, P2, P3

Odpojení TV na dotčených úsecích k.č. 701 (7, 5), 4, 3 začátku SP - 4 dny v rámci SP

Připojení TV na dotčených úsecích k.č. 701, 4,3 na konci SP - v rámci SP 8 dní trvalé a 2 dny noční výluky

Betonáž základů:

- Pláň v místě kolejí č.3 - 6 po vytržení kolejiště - v rámci SP, bez výluk Stavba stožárů a bran
- Pláň v místě kolejí č.3 - 6 po vytržení kolejiště - v rámci SP - bez výluk Demontáž stožárů a základů TV - v rámci SP

Demontáž bran v rámci SP

Omezení rychlosti

Kolem pracovního místa max 50 km/h

Zabezpečovací zařízení

V provozu MPZZ Vyloučené jízdní cesty do oblasti dotčené stavbou Výhybky pojížděné ve vlakových cestách, které nebude možno přestavovat (vedou do vyloučené části kolejiště) budou kromě přestavníku navíc uzamčeny, jejich klíče budou uloženy u výpravčího

Montáž vnitřní části nového zabezpečovacího zařízení

Zabezpečovací zařízení

Během postupu je v činnosti MPZZ s úvazkami stávajících TZZ Výluka staničních kolejí č. 3, 4, 5, 6 a 7.

V rámci MPZZ je možné ovládat všechny nové výhybky v obvodu Sluncová, nové výhybky v obvodu Hrabovka a stávající pojížděné výhybky ve stávající části kolejiště obvodu Dvorana. Výhybky pojížděné ve vlakových cestách a odbočující do vyloučené části kolejiště budou drženy přestavným ústrojím a zároveň budou uzamčeny do potřebné polohy výměnovými zámky, výsledné klíče budou uloženy u výpravčího. Během postupu probíhá montáž nového zabezpečovacího zařízení včetně definitivní venkovní kabelizace. Montáž venkovních prvků zabezpečovacího zařízení v dokončované části kolejiště a jejich zapínání do MPZZ a přezkušování, V rámci MPZZ je možné zajíždět vlakovými cestami k provizornímu nástupišti u koleje č. 309. Úrovňové křížení pro pohyb stavebních vozidel bude zabezpečeno PZM 2 - mechanickými uzamykatelnými závory. Obsluhu závor bude provádět proškolená osoba dodaná stavební firmou ve spolupráci s obsluhou MPZZ.

7.16. STAVEBNÍ POSTUP Č. 6 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 3

Rozsah ploch je identický s SP6

Rozsah práce

- a. Demolice nástupiště č 1,2 a snesení SK č 1,2,3,309
- b. Archeologický průzkum v místě stavby III dilatačního celku
- c. Výstavba umělých staveb ve stanici:
- d. zahájení výstavby III dilatačního celku platformy zastřešení
- e. základy a nové trakční sloupy
- f. pověšení/převěšení troleje

Délka stavebního postupu

45 dní

09.08.2026 – 22.09.2026

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

Vyloučené koleje [Nepřetržitá výluka](#)

- SK č.1 - bude vyloučena k námezníku výh. č. 28
- SK č.2 - bude vyloučena vč. navazujících zhlaví až po námezník č. 5
- SK č.3 - bude vyloučena vč. navazujícího zhlaví až po námezník výhybky č. 15
- SK309,311,313,315 - budou vyloučeny celé

Výluky ve vazbě na postup prací je nutné organizovat tak, aby bylo možné zajistit přístup posunových dílů na 309a a 311a.

Vypnutí trakčního vedení

Postupně SK č. 1,2,3,309 TV SK č 1,2 resp. (101,103) provizorně vykotveno za výh. č 3,8. Odizolování pomocí provizorních děličů č. P1, P2 a P3 před oblastí stavebních prací. Napájení TV sudé skupiny pomocí příčného sepnutí odpojovačů č. 3A a 3B.

Omezení rychlosti

Kolem pracovního místa max 50 km/h

Zabezpečovací zařízení

V provozu MPZZ Vyloučené jízdní cesty do oblasti dotčené stavbou Výhybky poježděné ve vlakových cestách, které nebude možno přestavovat (vedou do vyloučené části kolejiště) budou kromě přestavníku navíc uzamčeny, jejich klíče budou uloženy u výpravčího,

Během realizace zpevněné plochy v místě České pošty musí být stále zachován, byť omezený, přístup pro dodávková vozidla pošty ve směru od k.č. 309-313

VLASTNÍ SP 6

Rozsah práce


- a. Demolice nástupiště č. 1,2 a snesení SK č 1,2,309-315
- b. Výstavba nových nástupišť č 1,2 a SK n. č. 1,2, 309-315
- c. Výstavba umělých staveb ve stanici
- d. Výstavba posledního III dilatačního celku platformy
- e. Výstavba kolektoru pod novými k.č. 1,2, s napojením na stávající stav
- f. Výstavba nového kabelovodu v nást. č. 2
- g. Výstavba kolektoru CETIN
- h. Sjednání dlažeb v prostoru nádraží
- i. dokončení stavebních prací v prostoru nádraží
- j. zrušení provizorního nástupiště
- k. dokončení a zprovoznění koleje č. 9a
- l. základy a nové trakční sloupy
- m. pověšení/převěšení troleje
- n. zprovoznění koleje 3 k 12.04.2027

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

Délka stavebního postupu

246 dní

23.09.2026 – 26.05.2027

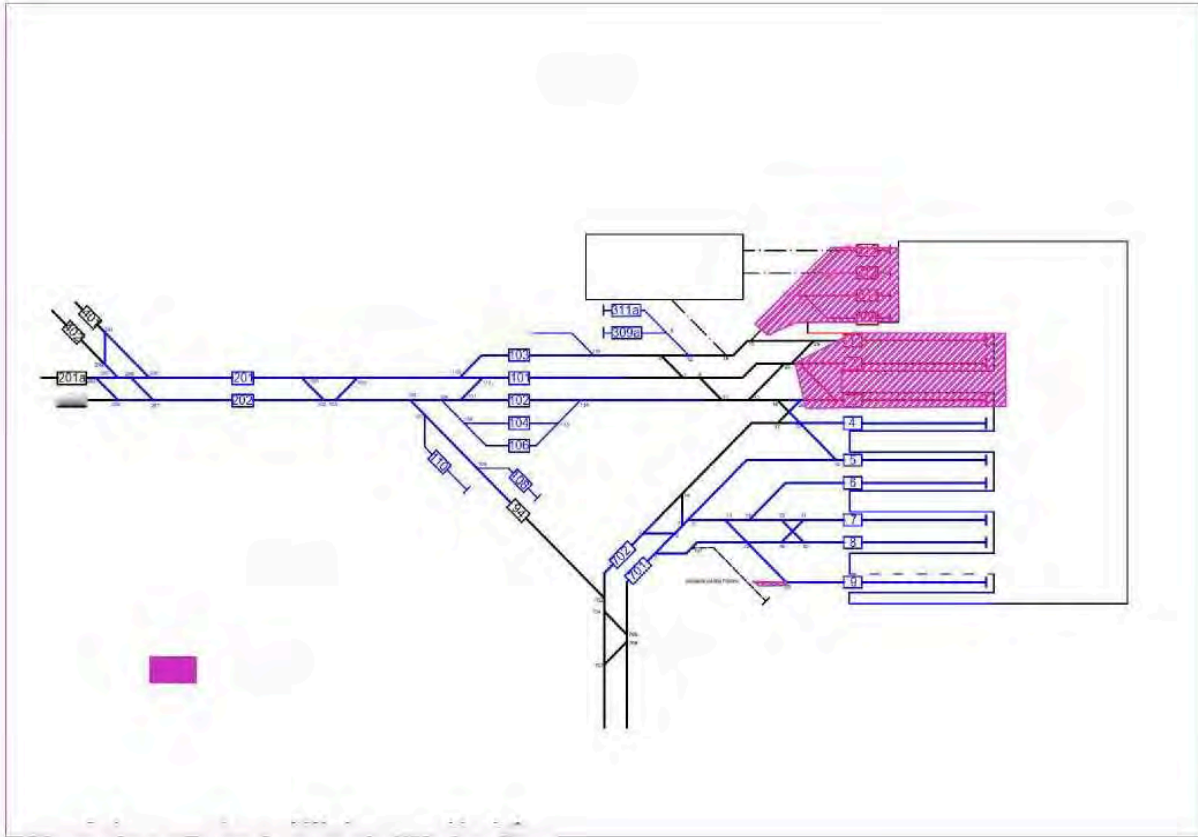

Přístup na SP

Z ulice Hybernská / Opletalova přímo přístup k místu SP6 (hnědá barva).

Vyloučené koleje

Nepřetržitá výluka

- SK č. 1 - bude vyloučena k námezníku výh. č. 28
- SK č.2 - bude vyloučena vč. navazujících zhlaví až po námezník č. 5
- SK č. 3 - bude vyloučena vč. navazujícího zhlaví až po námezník výhybky č. 15
- SK309,311,313,315 - budou vyloučeny celé
- SK č. 9a - do snesení dočasné vlečky

Výluky ve vazbě na postup prací je nutné organizovat tak, aby bylo možné zajistit přístup posunových dílů na 309a a 311a.

SK3 bud od 1.9 zprovozněna celá, přilehlá nástupní hrana bude zprovozněna v délce 30m od zarážedla

Výluky pro aktivaci definitivního ZabZař - 27.05.2027 - 09.06.2027

Harmonogram stavby – Technická zpráva
„Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“
Aktualizace 20.02.2024

Vypnutí trakčního vedení

Koleje skupiny 300 odpojeny od brány 47 - 48 k zarážedlům Všechny práce v rámci SP
Postupně SK č. 1,2,3,309 TV SK č 1,2 resp. (101,103) provizorně vykotveno za výh. č. 3, 8, 16

Odizolování pomocí provizorních děličů č. P1, P2 a P3 před oblastí stavebních prací. Napájení TV sudé skupiny pomocí
příčného sepnutí odpojovačů č. 3A a 3B.

Betonáž základů:

- Pláň v místě kolejí skupiny 300 po vytržení kolejiště - 1 den

Odpojení TV na dotčených úsecích na začátku SP - 4 noční výluky

Připojení TV na dotčených kolejích konci SP - 16 dní trvalé výluky a 2 noční výluky

Stavba stožárů a bran:

- Pláň v místě kolejí skupiny 300 po vytržení kolejiště - 1 den
- Demontáž stožárů a základů TV - 4 dny
- Demontáž bran 1 noční výluka.

Omezení rychlosti

Kolem pracovního místa max 50 km/h

Zabezpečovací zařízení

Během postupu je v činnosti MPZZ s úvazkami stávajících

TZZ

Výluka staničních kolejí č. 1, 2, 3, 9a, 315, 313, 311, 309.

V rámci MPZZ je možné ovládat všechny nové výhybky v obvodu Sluncová, nové výhybky v obvodu Hrabovka, obvodu Dvorana a stávající pojížděné výhybky ve zhlaví obvodu Dvorana. Výhybky pojížděné ve vlakových cestách a odbočující do vyloučené části kolejiště budou drženy přestavným ústrojím a zároveň budou uzamčeny do potřebné polohy výměnovými zámky, výsledné klíče budou uloženy u výpravčího. Během postupu probíhá montáž nového zabezpečovacího zařízení a příprava na přepínání na definitivní SZZ a TZZ. Po konci stavebního postupu dojde k přepnutí na definitivní SZZ, včetně nového obvodu Praha-Bubny a výhradního provozu ETCS s benefity.

Po skončení SP6 v období 29.05.2027. – 09.06.2027 bude probíhat aktivace a přezkušování definitivního ZabZař za stejných předpokladů jako provizorního ZabZař

7.17. DOKONČOVACÍ PRÁCE

Budou probíhat dokončovací práce na platformě zastřešení s možnými výlukami SK č. 309-315 z důvodu manipulace jeřábovou technikou na zbylé ploše ZS 2 u výdejny zásilek České pošty, bez omezení této výdejny S ohledem na omezení ploch ZS vlivem realizace staveb CBD se bude jednat o jediný přístup pro návoz materiálu na horní plochu platformy. Budou probíhat krátkodobé denní výluky SK a zhlaví při broušení výhybek a následném podbití

Příloha č. 2

Ceník výkonů

Název stavby:

Nezadatelné výkony OŘ Praha v oblasti elektrických, sdělovacích a zabezpečovacích zařízení

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1) Přezkoušení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
hodin ová sazba | 600,- Kč bez DPH |
| 2) Výkon funkce OZOV (odpovědný zástupce objednatele výluk) při výlukách sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení a činností s tím spojené, příprava výluk, příprava ROV
hodin ová sazba | 600,- Kč bez DPH |
| 3) Zaměřování kabelových vedení v prostoru stavby
hodin ová sazba | 600,- Kč bez DPH |
| 4) dozor při práci v blízkosti trakčního vedení za 1 hodinu dozoru
hodinová sazba (mimo zajištění a odjištění TV) | 600,- Kč bez DPH |
| 5) Příplatek za práce ve státní svátek a o víkend
hodinová sazba (mimo zajištění a odjištění TV) | 100,- Kč bez DPH |
| 6) Příplatek za práce v nočních hodinách 22:00 – 6:00
hodinová sazba (mimo zajištění a odjištění TV) | 100,- Kč bez DPH |

Objednávka na vypnutí a zajištění TV

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1 Vypnutí a zajištění trakčního vedení v rámci výluky v jeden den a jednom úseku:
Fixní sazba za přistavení MVTV | 7 100,- Kč bez DPH |
| hodinová sazba za pronájem MVTV | 1 560,- Kč bez DPH |
| hodinová sazba za posádku MVTV (3 osoby x 600 Kč) | 1 800,- Kč bez DPH |

Pro tyto potřeby se počítá na zajištění 1 hod – tj. sazba 10 **460 Kč bez DPH**

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2a Odjištění a zapnutí trakčního vedení v rámci výluky v jiný den než bylo zajištěno:
Fixní sazba za přistavení MVTV | 7 100,- Kč bez DPH |
| hodinová sazba za pronájem MVTV | 1 560,- Kč bez DPH |
| hodinová sazba za posádku MVTV (3 osoby x 600 Kč) | 1 800,- Kč bez DPH |

Pro tyto potřeby se počítá na odjištění 1 hod – tj. sazba 10 **460 Kč bez DPH**

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 2b Odjištění a zapnutí trakčního vedení v rámci výluky v jeden a jednom úseku:
hodinová sazba za pronájem MVTV | 1 560,- Kč bez DPH |
| hodinová sazba za posádku MVTV (3 osob x 600 Kč) | 1 800,- Kč bez DPH |

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi níže uvedenými smluvními stranami

č. smlouvy Správce: 3-01-23-005-DZKZ

Název zakázky: „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“

a) Správce společnosti:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949

DIČ: CZ254 29 949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370 zastoupena Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „**Správce**“),

b) Druhý společník:

STRABAG s.r.o.

se sídlem: Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 18

IČO: 17 317 282

DIČ: SK2020316298

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Bratislavě III, oddíl Sro, vložka č. 991/B zastoupena Ing. Branislav Lukáč, jednatel, Ing. Milada Kušnírová, jednatelka

(dále jen „**Druhý společník**“),

(kterákoliv z výše uvedených osob dále jen jako „**Společník**“, všechny výše uvedené osoby dále společně jen „**Společníci**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Každý ze Společníků má zájem na podání nabídky na plnění níže uvedené zakázky;
- (B) Žádný ze Společníků není schopen samostatně splnit veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení na níže uvedenou zakázku a pro případné její plnění kladené níže uvedeným zadavatelem na účastníky; a proto
- (C) Každý Společník má z výše uvedených důvodů zájem sdružit se ve smyslu § 2716 a násl. OZ s dalšími Společníky;

UZAVŘELI SPOLEČNÍCI TUTO SMLOUVU O SPOLEČNOSTI:

Článek I.

ÚČEL SMLOUVY, POPIS SPOLEČNOSTI

- 1.1 Společníci se touto smlouvou o společnosti (dále jen „**Smlouva**“) ve smyslu § 2716 a násl. OZ sdružují za účelem podání společné nabídky Společníků (dále jen „**Nabídka**“) v zadávacím řízení zahájeném dne 11.07.2023 zadavatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00, IČO: 709 94 234, (dále jen „**Zadavatel**“) na zakázku na stavební práce s názvem „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-029848 (dále jen „**Zadávací řízení**“ a uvedená zakázka jen „**Zakázka**“).
- 1.2 Společným záměrem Společníků, tedy účelem založení společnosti podle Smlouvy je vybrání jejich Nabídky v Zadávacím řízení jako ekonomicky nejvýhodnější, uzavření smlouvy na realizaci Zakázky mezi Společníky a Zadavatelem (dále jen „**Smlouva o dílo**“) a následné společné provádění díla, které je předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „**Dílo**“), Společníky v rozsahu, termínech a za dodržení zadávacích podmínek Zadávacího řízení (dále jen „**Zadávací podmínky**“) a Smlouvy o dílo.
- 1.3 Společníci se touto Smlouvou zavazují společně vyvíjet činnost směřující k dosažení sjednaného účelu Smlouvy a záměru uvedeného v předchozím odstavci Smlouvy.
- 1.4 Společnost vzniklá na základě této Smlouvy bude vystupovat pod názvem: „Společnost Masarykovo nádraží“ (dále jen „**Společnost**“).
- 1.5 Sídlem Společnosti je adresa: STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem.

Článek II.

VZNIK A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

- 2.1 Společnost vzniká uzavřením Smlouvy a trvá po celou dobu existence jakýchkoliv závazků plynoucích z Nabídky podané v Zadávacím řízení, případně ze Smlouvy o dílo, bude-li mezi Společníky a Zadavatelem uzavřena.
- 2.2 Společnost zanikne v následujících případech:
 - a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho pravomocného zrušení;
 - b) Zadavatel uzavře v souladu s právními předpisy Smlouvu o dílo s jiným dodavatelem než Společností, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) možné podat námitky (v případě, že Společnost takovou námitku ve lhůtě pro její podání nepodá) nebo návrh na přezkoumání úkonu Zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (v případě, že Společnost takový návrh ve lhůtě pro jeho podání nepodá) nebo žalobu proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonu Zadavatele při Zadávacím řízení vedeném u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, včetně řízení o kasační stížnosti (v případě, že Společnost takovou žalobu nebo kasační stížnost ve lhůtě pro její podání nepodá), případně po vrácení veškerých jistot za Nabídku, dojde-li k němu později;
 - c) soud pravomocně zamítne žalobu nebo kasační stížnost proti rozhodnutí vydanému v řízení o přezkoumání úkonu Zadavatele při Zadávacím řízení, byla-li taková žaloba nebo kasační stížnost podána;

- d) Zadavatel pravomocně vyloučí Společnost ze Zadávacího řízení, a to dnem nabytí právní moci oznámení o vyloučení Společnosti ze Zadávacího řízení, případně po vrácení veškerých jistot za Nabídku, dojde-li k němu později;
 - e) dnem zániku posledního závazku vyplývajícího z uzavřené Smlouvy o dílo, vč. uplynutí lhůt pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady Díla a z odpovědnosti za případné škody;
 - f) uzavřená Smlouva o dílo bude později soudem pravomocně posouzena jako neplatná, a to jednak dnem nabytí právní moci předmětného rozsudku a jednak dnem vypořádání veškerých nároků, závazků a povinností dle Smlouvy o dílo a této Smlouvy (musí být kumulativně splněny veškeré v tomto písmenu uvedené podmínky); nebo
 - g) nastanou jiné důvody pro zánik Společnosti dle právních předpisů či této Smlouvy.
- 2.3 Za trvání Společnosti i po zániku Společnosti odpovídají Společníci za závazky vzniklé ze společné činnosti dle této Smlouvy společně a nerozdílně, není-li ve Smlouvě nebo mezi Společníky písemně dohodnuto jinak. Mezi sebou tyto nároky Společníci vypořádají na principu odpovědnosti, tj. za závazek odpovídá ten Společník, který způsobil vznik předmětného závazku. Pokud bude vůči některému Společníkovi uplatněn nárok, za který odpovídá jiný Společník, je povinen Společník, který odpovídá za uplatněný nárok, tento nárok uspokojit namísto Společníka, vůči kterému byl nárok uplatněn. V případě nemožnosti určení odpovědnosti dle tohoto odstavce se Společníci vzájemně vypořádají v poměru dle odst. 3.4 Smlouvy.

Článek III.

PRÁVNÍ POSTAVENÍ SPOLEČNÍKŮ

- 3.1 Společnost vzniklá touto Smlouvou je společností dvou právnických osob nadaných právní osobností.
- 3.2 Společnost není samostatnou právnickou osobou; nemá tedy právní osobnost a nezapisuje se do obchodního rejstříku nebo do jiné evidence právnických osob. Společnost není samostatnou účetní jednotkou, ani plátcem daně z příjmů, nebo jiné daně podle příslušných právních předpisů. Touto jednotkou a plátcem je každý Společník sám.
- 3.3 Společníci jako dodavatelé podávající společnou Nabídku ponесou v případě získání Zakázky Společníky odpovědnost za plnění Veřejné zakázky společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění předmětu Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo. Každý Společník prohlašuje, že splňuje požadavky kladené právními předpisy a Zadávacími podmínkami na jeho způsobilost a kvalifikaci a zaručuje i způsobilost a kvalifikaci svých případných poddodavatelů.
- 3.4 Výše podílů účasti jednotlivých Společníků na činnosti Společnosti činí:
- Správce 95 %
 - Druhý společník 5 %
- 3.5 Podrobné vymezení výkonů, dodávek a dalších plnění souvisejících s prováděním Díla jednotlivými Společníky, včetně jejich podrobného ocenění, specifikující podíl každého Společníka na plnění Smlouvy o dílo (dále jen „**Svěřené části Díla**“), bude řešeno stanovami Společnosti tvořícími dodatek k této Smlouvě, které budou zpracovány a přijaty Společníky do 60 dní po případném doručení oznámení Zadavatele o výběru Nabídky v Zadávacím řízení Společnosti. Návrh stanov předloží Dalším společníkům Správce, nedohodnou-li se Společníci jinak. V případě dohody Společníků o nezpracování stanov Společnosti dle odst. 6.2 této Smlouvy bude vymezení Svěřených částí Díla obsaženo v (jiném) dodatku k této Smlouvě. V rámci vzájemného vztahu Společníků je každý Společník

zavázán realizovat samostatně, na své náklady a svou odpovědnost jemu Svěřené části Díla.

Článek IV. PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÍKŮ

- 4.1 O všech otázkách, které se týkají činnosti Společnosti a vzájemných vztahů mezi Společníky, nejsou-li tyto záležitosti výslovně upraveny ve Smlouvě, rozhodují Společníci společně a jednomyslně. Pokud by však před přijetím příslušného rozhodnutí hrozilo prodlení s plněním závazků Společnosti nebo jakákoliv jiná situace mající za následek vznik nároků ze strany Zadavatele nebo jiných třetích osob vůči Společnosti, Správce přijme na základě vlastního uvážení nezbytná opatření do doby, než Společníci dle výše uvedeného rozhodnou.
- 4.2 Správce je tímto Druhým společníkem pověřen správou Společnosti a zmocněn k níže uvedeným právním jednáním. Druhý společník uděluje Správci příslušnou plnou moc, která tvoří přílohu č. 1 Smlouvy. Správce je oprávněn a povinen zejména k následujícím právním jednáním:
- veškerá komunikace se Zadavatelem a jeho případným zmocněným zástupcem ohledně zpracování a podání Nabídky schválené všemi Společníky do Zadávacího řízení;
 - veškerá jednání související se Smlouvou o dílo, včetně podpisu Smlouvy o dílo a jejích případných dodatků; v případech jednání a při poskytování podkladů a informací, které souvisejí s plněním povinností Společníků ze Smlouvy o dílo nebo v případech, kdy je nutno operativně jménem Společnosti rozhodnout a odklad tohoto rozhodnutí by v souvislosti se Smlouvou o dílo vyvolal rizika vzniku nároků ze strany Zadavatele nebo jiných třetích osob vůči Společnosti, je Správce oprávněn podklady a informace poskytnout, rozhodnout a Společníky zavázat, a to i bez účasti zástupců Druhého společníka;
 - zajištění koordinace činnosti Společníků při zpracování Nabídky;
 - kontrola a odsouhlasení obsahu Nabídky společně s Druhým společníkem před jejím podáním do Zadávacího řízení. Kontrola a odsouhlasení dle předchozí věty na základě výzvy Správce zaslané Druhému společníku nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zamýšlenou společnou kontrolou a odsouhlasením obsahu Nabídky; správnost a úplnost Nabídky si Společníci potvrdí následujícími osobami řídícími zpracování Nabídky u jednotlivých Společníků:
 - za Správce:
 - za Druhého společníka:
 - podpis a podání Nabídky, odsouhlasené všemi Společníky, do Zadávacího řízení ve lhůtě pro podání nabídek v Zadávacím řízení;
 - zajištění jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v Zadávacím řízení dle odst. 4.10 Smlouvy a dalších záruk (vč. příslušných příslibů, pokud je Zadavatel vyžaduje) dle odst. 4.11 Smlouvy, případně dalších záruk požadovaných Zadavatelem v souvislosti se Zakázkou, dle požadavků Zadavatele, ve spolupráci s Druhým společníkem;

- poptávka a zajištění pojištění požadovaného Zadávacími podmínkami v rozsahu a za podmínek stanovených Zadavatelem;
- v případě výběru Nabídky v Zadávacím řízení jako nejvýhodnější vyzvání Druhého společníka ke spolupodepsání (uzavření) Smlouvy o dílo;
- v případě uzavření Smlouvy o dílo komplexní realizace svojí Svěřené části Díla, případně za tímto účelem zajištění v souladu se Zadávacími podmínkami a Smlouvou o dílo dostatečně způsobilého poddodavatele (resp. poddodavatelů);
- v odůvodněném případě podání námitek týkajících se Zakázky dle ZZVZ, dále podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele týkajících se Zakázky dle ZZVZ, vč. příslušných opravných prostředků, příp. podání podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele z moci úřední týkajících se Zakázky dle ZZVZ. Finanční náklady související s jednáním a řízeními dle této odrážky ponese Společníci v poměru dle odst. 3.4 Smlouvy;

4.3 Druhý společník má zejména následující práva a povinnosti:

- zpracování svojí části Nabídky (dokladové a cenové části dle dohody Společníků) a předání této části Správci v dostatečném předstihu před uplynutím lhůty pro podání nabídek v Zadávacím řízení, tzn. alespoň 5 (pět) pracovních dnů před uplynutím této lhůty, nedohodnou-li se se Správcem jinak;
- kontrola a odsouhlasení (společně se Správcem) obsahu odevzdávané Nabídky před jejím podáním do Zadávacího řízení za podmínek dle čtvrté odrážky bodu odst. 4.2 Smlouvy;
- v případě výběru Nabídky v Zadávacím řízení jako nejvýhodnější poskytnutí veškeré požadované součinnosti Správci při projednávání a uzavírání Smlouvy o dílo (a jejich případných dodatků) tak, aby Smlouva o dílo mohla být uzavřena v zákonné lhůtě;
- v případě uzavření Smlouvy o dílo komplexní realizace svojí Svěřené části Díla, případně za tímto účelem zajištění v souladu se Zadávacími podmínkami a Smlouvou o dílo dostatečně způsobilého poddodavatele (resp. poddodavatelů);
- poskytnutí Správci veškeré požadované součinnosti týkající se případného podání námitek týkajících se Zakázky dle ZZVZ, dále případného podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele týkajících se Zakázky dle ZZVZ, vč. opravných prostředků, případného podání podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele z moci úřední týkajících se Zakázky dle ZZVZ. Podílení se na finančních nákladech souvisejících s jednáním a řízeními dle této odrážky v poměru dle odst. 3.4 Smlouvy;

4.5 Každý Společník nese samostatně náklady mu vzniklé v souvislosti s přípravou a podáním Nabídky. Totéž platí ohledně úhrady dalších nákladů nutných k plnění předmětu Smlouvy o dílo, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak nebo nedohodnou-li se Společníci jinak.

4.6 Každý ze Společníků je v souladu se Zadávacími podmínkami a ZZVZ povinen prokázat splnění příslušné kvalifikace a způsobilosti stanovené Zadavatelem v Zadávacích podmínkách. Pokud podle ZZVZ a Zadávacích podmínek prokazují Společníci kvalifikaci a způsobilost společně, koordinuje získání, zpracování a předložení příslušných dokladů Správce; Druhý společník mu přitom poskytuje veškerou požadovanou a včasnou

součinnost. Za řádné prokázání kvalifikace a způsobilosti odpovídají všichni Společníci společně.

- 4.7 Každý Společník je povinen doložit do Nabídky pouze takové informace a podklady, které odpovídají skutečnosti. Společník je povinen zajistit, aby tuto podmínku splňovaly i informace a podklady předkládané poddodavatelem příslušného Společníka. V případě porušení těchto povinností je příslušný Společník povinen uhradit jinému Společníku veškerou vzniklou škodu či jinou újmu, včetně případných sankcí.
- 4.8 Každý ze Společníků je povinen organizovat provádění svých Svěřených částí Díla tak, aby byly ve lhůtách sjednaných dle Smlouvy o dílo realizovány nejen jejich Svěřené části Díla, ale aby bylo každému Společníkovi umožněno řádné provedení jeho Svěřených částí Díla ve lhůtách dle Smlouvy o dílo. Případné vícenáklady spojené s prováděním Svěřených částí Díla nese Společník, o jehož Svěřenou část Díla se jedná. To však neplatí při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný Společník nesplnil řádně a včas své povinnosti. V takovém případě je vícenáklady povinen nést v plné výši ten Společník, který způsobil jejich vznik.
- 4.9 Každý ze Společníků odpovídá v plné míře za případné škody, které vznikly jinému Společníku v souvislosti s jeho neplněním či porušením závazků z této Smlouvy nebo Smlouvy o dílo, a to z jakéhokoliv důvodu. Veškeré náklady plynoucí z porušení smluvní povinnosti nese ze svého ten Společník, který je prokazatelně způsobil. Pokud budou vůči jednomu Společníkovi vzneseny ze strany Zadavatele či jiné třetí osoby nároky, za které odpovídá jiný Společník, je Společník, který za vznik těchto nároků odpovídá, povinen tyto uplatněné nároky plně uspokojit.
- 4.10 Jistotu k zajištění plnění povinností Společníků vyplývajících z účasti v Zadávacím řízení podle požadavků Zadavatele ve formě bankovní záruky ve prospěch Zadavatele zajistí Správce.
- 4.11 Veškeré další bankovní záruky, včetně příslušných bankovních příslibů (jsou-li Zadavatelem požadovány), požadované v Zadávacích podmínkách, případně další záruky požadované Zadavatelem v souvislosti se Zakázkou, ve prospěch Zadavatele zajistí Správce.
Využije-li Zadavatel práva na plnění z bankovní záruky z důvodu, který zapříčinil některý Společník, vzniká dalšímu Společníkovi vůči tomuto Společníkovi nárok na náhradu újmy, který v sobě zahrnuje zejména právo na zaplacení veškerých plnění poskytnutých v souvislosti s plněním z bankovní záruky dalším Společníkem bance, jež sdílenou bankovní záruku vystavila
- 4.12 Nepoužije se
- 4.13 Společníci jsou oprávněni využít ke splnění svých povinností při provádění Svěřených částí Díla poddodavatele v souladu se Zadávacími podmínkami. Za tyto své případné poddodavatele Společník v plném rozsahu odpovídá, včetně plateb poddodavatelům. Pokud využití těchto poddodavatelů podléhá schválení Zadavatele, Společník, který hodlá poddodavatele využít, je povinen poskytnout včas Správci veškeré potřebné doklady a součinnost za účelem projednání této skutečnosti se Zadavatelem a dále je povinen vyčkat s nasazením takového poddodavatele do jeho schválení Zadavatelem.
- 4.14 Nepoužije se .

- 4.15 Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Každý Společník eviduje samostatně ve své evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje požadované v příslušném ustanovení ZDPH, týkající se jeho činnosti v rámci Společnosti i mimo ni. Taktéž ve svém daňovém přiznání, souhrnném hlášení a kontrolním hlášení uvádí každý Společník údaje týkající se jeho ekonomické činnosti v rámci Společnosti i mimo ni.
- 4.16 Zásady fakturace vůči Zadavateli budou v podrobnostech upraveny ve stanovách Společnosti. V případě dohody Společníků o nezpracování stanov Společnosti dle odst. 6.2 této Smlouvy budou zásady fakturace vůči Zadavateli obsaženy v (jiném) dodatku k této Smlouvě.
Fakturaci za Společnost vůči Zadavateli na základě Smlouvy o dílo zajišťuje Správce. Na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) Správce jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Další zásady fakturace vůči Zadavateli budou v podrobnostech upraveny ve stanovách Společnosti. V případě dohody Společníků o nezpracování stanov Společnosti dle odst. 6.2 této Smlouvy budou zásady fakturace vůči Zadavateli obsaženy v (jiném) dodatku k této Smlouvě
- 4.17 Společníci se zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí osobou další nabídku, že nebudou působit jako poddodavatelé žádného dalšího účastníka Zadávacího řízení a že zajistí, aby tak neučinila ani žádná z osob, která je součástí stejného koncernu jako Společník. Společníci současně prohlašují, že nedošlo k žádné z okolností specifikované v tomto odstavci před uzavřením této Smlouvy.
- 4.18 Nepoužije se
- 4.19 V případě přechodného neplnění povinností dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo kterýmkoliv ze Společníků bude v neodkladných případech (např. ohrožení termínů plnění ze Smlouvy o dílo) tyto povinnosti plnit zbývající Společník, přičemž Společník, o jehož neplnění se jedná, bude o tomto kroku předem informován. Přechodným neplněním povinností se rozumí neplnění příslušných smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo Společníkem, přičemž toto neplnění trvá po nepřetržitou dobu maximálně 2 (dvou) měsíců, s tím, že z okolností lze důvodně předpokládat, že se nebude jednat o trvalé neplnění příslušných povinností dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo Společníkem. Veškeré náklady zbývajícího Společníka podle výše uvedeného budou následně přeúčtovány dotčenému Společníkovi, který přechodně neplnil své povinnosti dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo a ten je povinen uhradit je v plné výši zbývajícím Společníku do 30 (třiceti) dnů od doručení uvedeného vyúčtování.

Náklady spojené s plněním povinností za jiného Společníka podle tohoto odstavce si Společník, který takto plnil, vyfakturuje jako vlastní výkony a bude mít nárok na jejich úhradu Zadavatelem. Prováděním Díla podle tohoto odstavce není dotčeno vymezení podílů dle odst. 3.4 Smlouvy

- 4.20 Trvalým neplněním povinností se rozumí jednak neplnění příslušných smluvních závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo Společníkem, přičemž toto neplnění trvá po nepřetržitou dobu déle než 2 (dva) měsíce, a jednak neplnění příslušných smluvních závazků vyplývajících z této Smlouvy, přičemž toto neplnění trvá po nepřetržitou dobu déle než 2 (dva) měsíce.
Trvalým neplněním povinností není neplnění Smlouvy o dílo v případech, kdy za neplnění není odpovědný zhotovitel dle Smlouvy o dílo (např. v důsledku řádně oznámené okolnosti vyšší moci). Trvalé neplnění povinností dle předchozí věty jedním ze Společníků představuje podstatné porušení Smlouvy podle § 2740 OZ - v takovém případě může být tento Společník ze Společnosti zbývajícím Společníkem vyloučen.

Vyloučen může být Společník rovněž,

- bylo-li o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh,
- přistoupil-li Společník k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek, nebo
- bylo-li v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku Společníka.

4.21 O vyloučení Společníka ze Společnosti rozhoduje zbývající Společník. Oznámení o vyloučení bude písemné, a bude doručeno vylučovanému Společníkovi. Doručením oznámení o vyloučení vylučovanému Společníkovi nastává účinnost vyloučení. Podíl vyloučeného Společníka nabývá zbývající Společník..

4.22 V případě neplnění povinností dle této Smlouvy a/nebo Smlouvy o dílo po nepřetržitou dobu déle než 3 (tři) měsíce některým ze Společníků z jakéhokoliv důvodu (dále jen „**Dotčený Společník**“) převezme zbývající Společník předmětné závazky Dotčeného Společníka, pokud ještě Dotčený Společník nevystoupil ze Společnosti nebo nebyl ze Společnosti vyloučen. V tomto případě Dotčený Společník nemá nárok na úhradu jakéhokoliv finančního plnění vyplývajícího z převzatých závazků Dotčeného Společníka (vč. úhrady části ceny Díla, za části Díla, které byly realizovány zbývajícím Společníkem na základě tohoto odstavce Smlouvy). V tomto případě bude finanční plnění dle předchozí věty náležet zbývajícím Společníkům. Pokud je Dotčeným Společníkem Správce, převezme jeho práva a povinnosti z titulu správce společnosti ze Smlouvy k okamžiku uvedenému v první větě tohoto odstavce Smlouvy Druhý společník, přičemž výše uvedený postup v tomto odstavci Smlouvy zůstává nedotčen.

Článek V. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 5.1 Společníci se dohodli, že Nabídka bude podána jako společná nabídka více osob, a to jako společná nabídka všech Společníků dle této Smlouvy.
- 5.2 Nabídka plně v souladu s požadavky Zadavatele uvedenými v Zadávacích podmínkách. Kopii odevzdané Nabídky v elektronické podobě zašle Správce Druhému společníkovi ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dnů ode dne jejího podání v Zadávacím řízení.
- 5.3 Za včasné předložení Nabídky Zadavateli je odpovědný Správce. Druhý společník je povinen se Správcem spolupracovat, poskytovat mu včas veškeré potřebné informace a podklady a na jeho výzvu se v uvedeném termínu zúčastňovat svolaných jednání. Zástupci Společníků na těchto jednáních budou osobami způsobilými k projednání daných otázek či problematiky.
- 5.4 V případě, že Zadavatel vybere Nabídku jako nejvýhodnější nabídku v Zadávacím řízení, zavazují se Společníci uzavřít Smlouvu o dílo se Zadavatelem a realizovat komplexně, řádně a včas své Svěřené části Díla, jakož i splnit další podmínky dané právními předpisy, Smlouvou, Smlouvou o dílo a Zadávacími podmínkami.
- 5.5 Společníci se zavazují, že veškeré informace, které se dozvěděli od ostatních Společníků v souvislosti s jejich spoluprací v rámci této Smlouvy, použijí výhradně pro účely přípravy Nabídky a v případě uzavření Smlouvy o dílo pro účely provedení Díla. Tyto informace budou poskytnuty k dispozici třetím osobám pouze do míry nezbytně nutné pro přípravu

Nabídky a provedení Díla. Tento závazek trvá také po zániku Společnosti či zániku členství Společníka ve Společnosti, a to po dobu dalších 5 let.

- 5.6 Společníci jsou povinni zdržet se jakéhokoliv jednání, které by znemožňovalo dosažení účelu, pro který Společnost vznikla nebo by vedlo k újmě jiného Společníka, Zadavatele nebo jiné třetí osoby. V takovém případě je Společník, který zapříčinil vznik újmy nebo nepřijal taková opatření, kterými bylo možno újmě zabránit nebo snížit její rozsah, povinen uhradit vzniklou újmu v plném rozsahu.
- 5.7 Společníci jsou povinni jednat ve prospěch oprávněných zájmů Společnosti i Společníků s náležitou odbornou péčí, chránit dobré jméno Společnosti i Společníků, nesdělovat informace důvěrného charakteru třetím osobám a starat se s náležitou odbornou péčí o dosažení účelu Společnosti.

Článek VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 6.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech Společníků.
- 6.2 V případě vybrání Nabídky jako nejvýhodnější a uzavření Smlouvy o dílo Společníci bezodkladně upraví v návaznosti na odst. 3.5 Smlouvy, na základě stanov Společnosti a v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo, konkrétní způsoby a zásady vzájemné spolupráce Společníků při plnění předmětu Smlouvy o dílo, zejména pak otázky související s organizačně-řídícími záležitostmi vedení Společnosti či řízení provádění Díla. Stanovy Společnosti nebudou zpracovávány, pokud se na tom Společníci dohodnou. V takovém případě bude mezi Společníky uzavřen (jiný) dodatek ke Smlouvě obsahující vymezení Svěřených částí Díla jednotlivých Společníků (dle odst. 3.5 této Smlouvy), zásady fakturace (dle odst. 4.16 této Smlouvy) a konkrétní způsoby a základní zásady vzájemné spolupráce Společníků při realizaci předmětu Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v první větě tohoto odstavce Smlouvy. Nedodržení tohoto postupu ze strany kteréhokoliv Společníka je považováno za podstatné porušení Smlouvy podle § 2740 OZ.
- 6.3 Žádný ze Společníků nesmí bez předchozího písemného souhlasu dalšího Společníka postoupit, zastavit nebo jinak zatížit svá práva a závazky (případně jejich část) vyplývající z této Smlouvy nebo ze Smlouvy o dílo třetí osobě. Všichni Společníci berou na vědomí, že v případě porušení tohoto zákazu kterýmkoliv ze Společníků je takové jednání považováno za absolutně neplatné a nevyvolává žádné právní účinky.
- 6.4 Každý ze Společníků bere na vědomí, že kterýkoliv ze Společníků za podmínek zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, může zpracovávat a shromažďovat osobní údaje daného Společníka, jakož i třetích osob, jejichž osobní údaje jim budou dalším ze Společníků předány, a to za účelem týkajícím se této Smlouvy, a Nabídky a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou. Každý ze Společníků prohlašuje, že je oprávněn k předání osobních údajů svých zaměstnanců a třetích osob, které kdykoliv po dobu platnosti této Smlouvy předá ostatním Společníkům.
- 6.5 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Společníky ohledně jejího předmětu a nahrazuje veškeré předchozí jednání a úmluvy mezi Společníky týkající se Smlouvy. Veškerá praxe

Společníků, jakož i veškeré obchodní zvyklosti jsou obsaženy v této Smlouvě a jejich případných dodatcích. Společníci prohlašují, že se nebudou dovolávat obchodních zvyklostí, které výslovně z této Smlouvy nevyplývají.

- 6.6 Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Práva a povinnosti Společníků neupravené Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Pod pojmy Smlouva či Smlouva o dílo se vztahují také dodatky a přílohy k těmto smlouvám.
- 6.7 Měnit nebo doplňovat tuto Smlouvu lze pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, potvrzenými oprávněnými zástupci všech Společníků.
- 6.8 Pokud by mezi Společníky došlo kdykoli v budoucnosti k rozporu o obsahu, smyslu anebo účelu této Smlouvy nebo jejích jednotlivých ustanovení, pak se pro takový případ sjednává, že pro výklad Smlouvy mají rozhodující význam její účel, principy vzájemné slušnosti, obchodní a podnikatelské korektnosti, poctivého jednání a plnění účelu Smlouvy ve společném zájmu všech Společníků.
- 6.9 V případě neplatnosti kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy, není dotčena platnost ostatních ustanovení Smlouvy. Neplatné ustanovení bude nahrazeno ustanovením, které odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení, nedohodnou-li se Společníci jinak. V daném případě smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této Smlouvě.
- 6.10 Tato smlouva se vyhotovuje v šesti stejnopisech, z nichž Správce obdrží dva, a všechny mají platnost originálu. V případě elektronického podpisu se počet vyhotovení neurčuje.
- 6.11 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Plná moc/Plné moci pro Správce.

V Ústí nad Labem., dne

Správce: STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Jakub Svoboda
Předseda představenstva

.....
Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva

Druhý společník: STRABAG s.r.o., dne
04.09.2023

STRABAG
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25299979

.....
Jméno Ing. Branislav Lukáč
funkce konatel

.....
Jméno Ing. Milada Kušnířová
Funkce konatelka

Plná moc

udělená ve smyslu § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zmocnitel:

STRABAG s.r.o.

se sídlem: Mlynské Nivy, 61/A, Bratislava 825 18

IČO: 17 317 282

DIČ: SK2020316298

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Bratislavě III, oddíl Sro, vložka č. 991/B
zastoupená Ing. Branislav Lukáč, jednatel, Ing. Milada Kušnířová, jednatelka,

(dále jen „Zmocnitel“)

Zmocněnec:

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949

DIČ: CZ254 29 949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B
1370

zastoupena Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem
Tomáškem, členem představenstva

(dále jen „Zmocněnec“)

Zmocnitel, jako společník společnosti vystupující pod názvem „Společnost Masarykovo nádraží“ (dále jen „**Společnost**“), uzavřel se Zmocněncem jako správcem Společnosti smlouvu o společnosti (číslo Zmocněnce 3-01-23-005-DZKZ) (dále jen „**Smlouva**“), a to za účelem vybrání jejich společné nabídky v zadávacím řízení na realizaci zakázky s názvem „Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží“ (dále jen „**Nabídka**“ a uvedené zadávací řízení dále jen „**Zakázka**“), uzavření smlouvy na realizaci Zakázky mezi společníky Společnosti a zadavatelem (dále jen „**Smlouva o dílo**“) a následného společného provádění díla, které je předmětem Smlouvy o dílo (dále jen „**Dílo**“).

S ohledem na shora uvedené Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce k zastupování Zmocnitele při:

- podpisu a podání Nabídky na realizaci Zakázky, včetně všech dalších dokumentů tvořících součást Nabídky nebo s Nabídkou souvisejících;
- jednání ve věci Nabídky se zadavatelem Zakázky a jeho případným zmocněným zástupcem, a dále jednání ve věci navazující účasti v zadávacím řízení na Zakázku;
- podání případných námitek proti úkonům zadavatele v zadávacím řízení na Zakázku;
- podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení na Zakázku k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (vč. opravných prostředků proti prvoinstančnímu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže);
- podání podnětu k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v zadávacím řízení na Zakázku z moci úřední k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;

- uzavření Smlouvy o dílo, včetně všech jejích případných dodatků;
- provádění veškerých dalších úkonů v zadávacím řízení na Zakázku v rozsahu dle Smlouvy;
- zastupování při realizaci Zakázky v rozsahu dle Smlouvy nebo dle stanov Společnosti.

V Bratislavě, dne 04.09.2023

Zmocnitel:

.....
Jméno Ing. Branislav Lukáč
funkce jednatel

.....
Jméno Ing. Milada Kušnířová
Funkce jednatelka

Zmocněnec spol. STRABAG Rail a.s. tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá.

V Ústí nad Labem dne

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

STRABAG ³
STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem
DIČ/VAT ID: CZ25429949

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 159617860-396533-230913094824.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 159617860-396533-230913094824. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 12

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt:

Pracoviště:

Datum vyhotovení: 13.09.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



159617860-396533-230913094824

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4446638

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8095bb56-c6d4-49cd-9e04-5b85ac15ed14

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.03.2024 12:18:08



cbb544b5-6b33-4e7e-b006-aabb6c219545
