



## **Návrh řešení k Nabídce:**


Služby postupné digitalizace Sbírký zákonů a mezinárodních smluv

**Předkládá Asseco Central Europe, a. s.  
pro Česká republika – Ministerstvo vnitra**


**02/2024**


## Obsah


6	Návrh řešení.....	3
6.1	Plán projektu .....	3
6.1.1	Organizace projektu.....	4
6.1.2	Harmonogramy projektu .....	9
6.1.3	Plnění smlouvy.....	12
6.1.4	Úvodní seznam rizik .....	24
6.1.5	Očekávaný rozsah součinnosti zadavatele a třetích stran zapojených do projektu.....	27
6.2	Přístup dodavatele k realizaci postupné digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv .....	29
6.2.1	Popis činností prováděných v rámci jednotlivých úloh postupné digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.....	29
6.2.2.	Metodika zajištění kvality postupné digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv .....	62
6.2.3.	Komunikační systém (KMS) .....	66





## 6 Návrh řešení

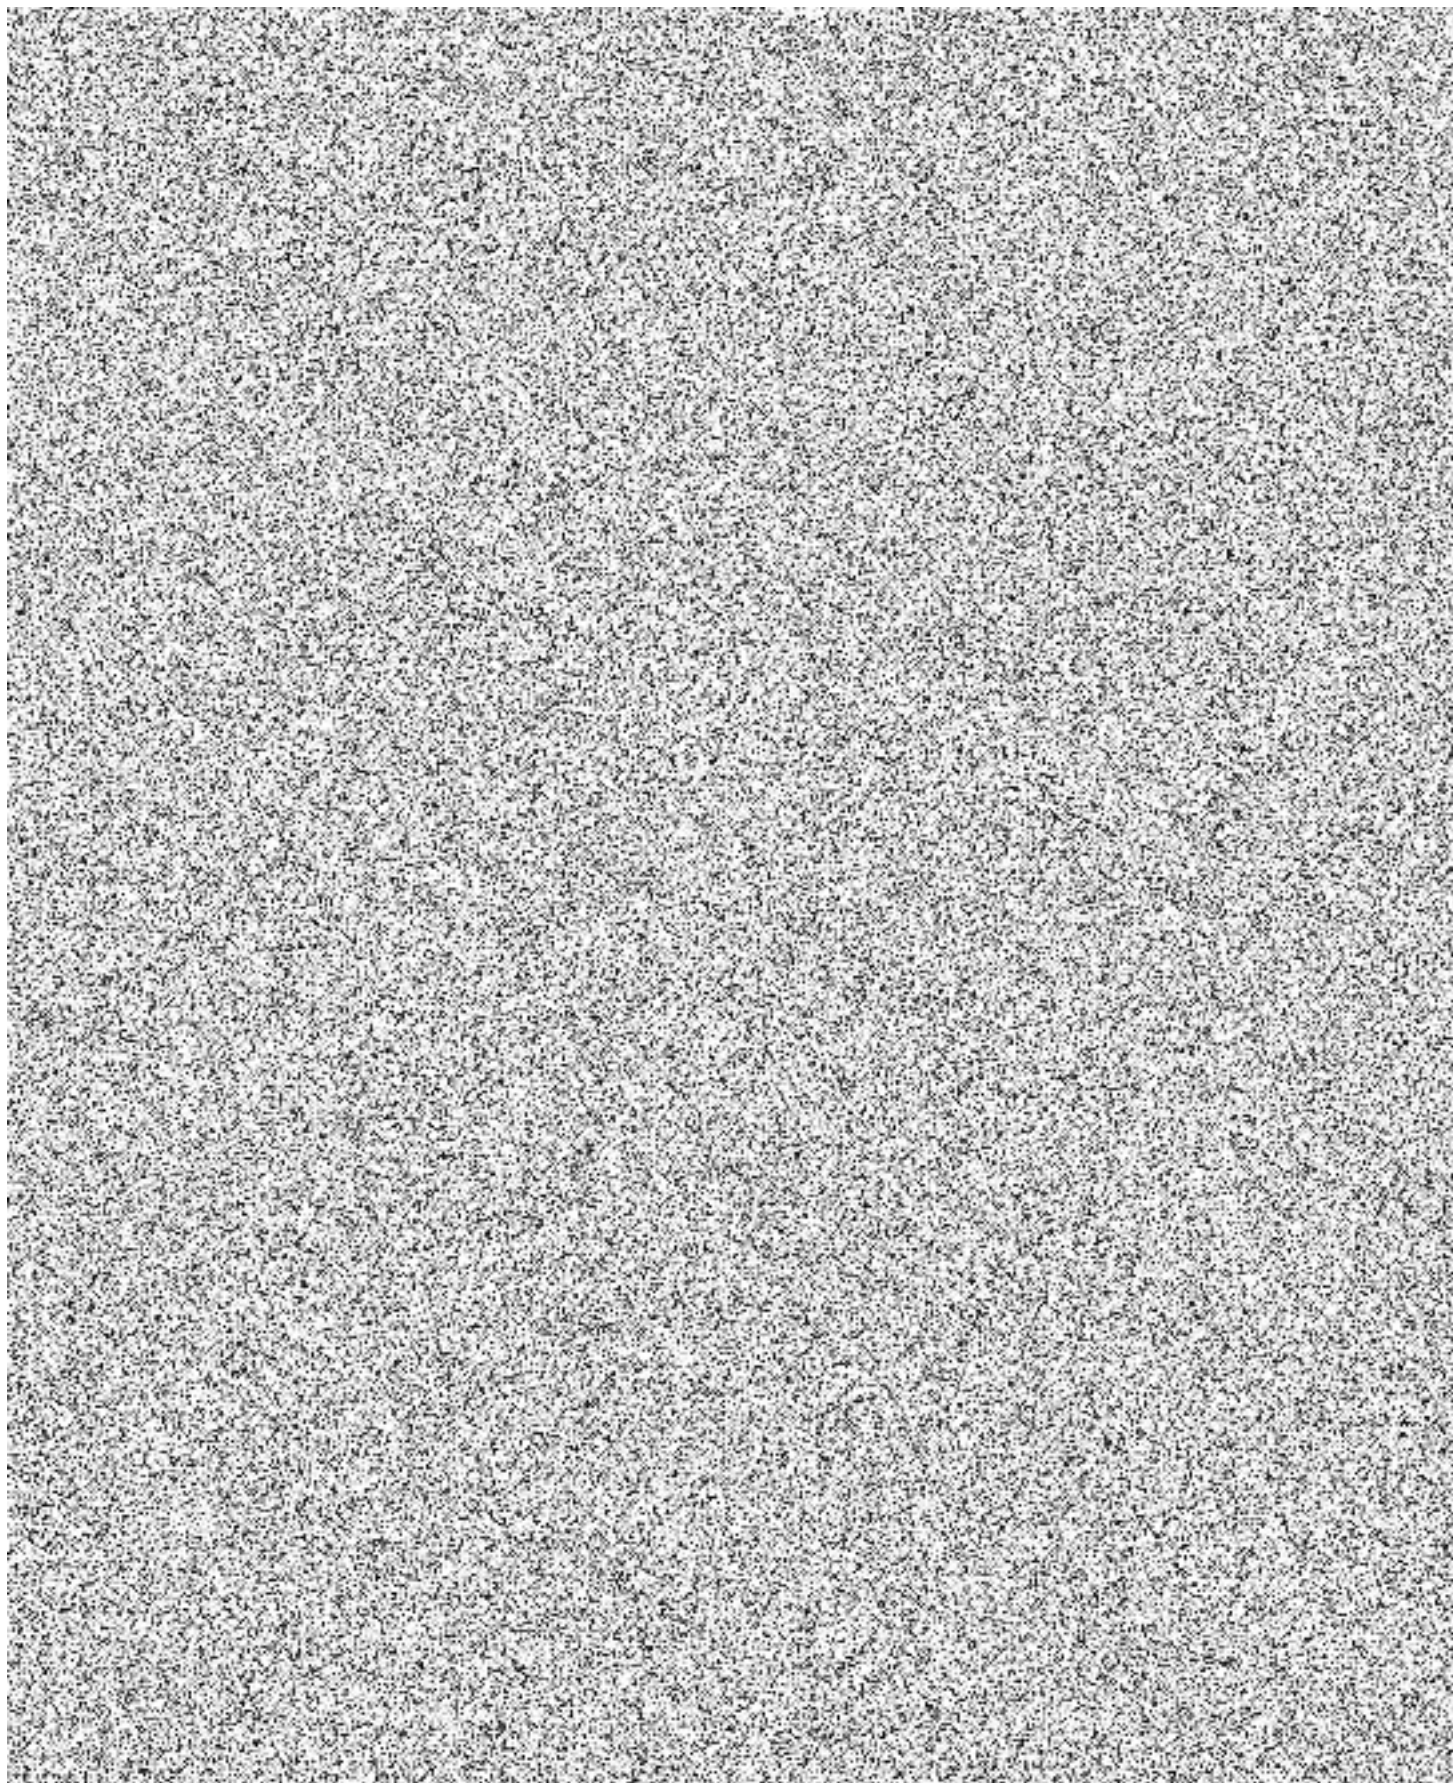


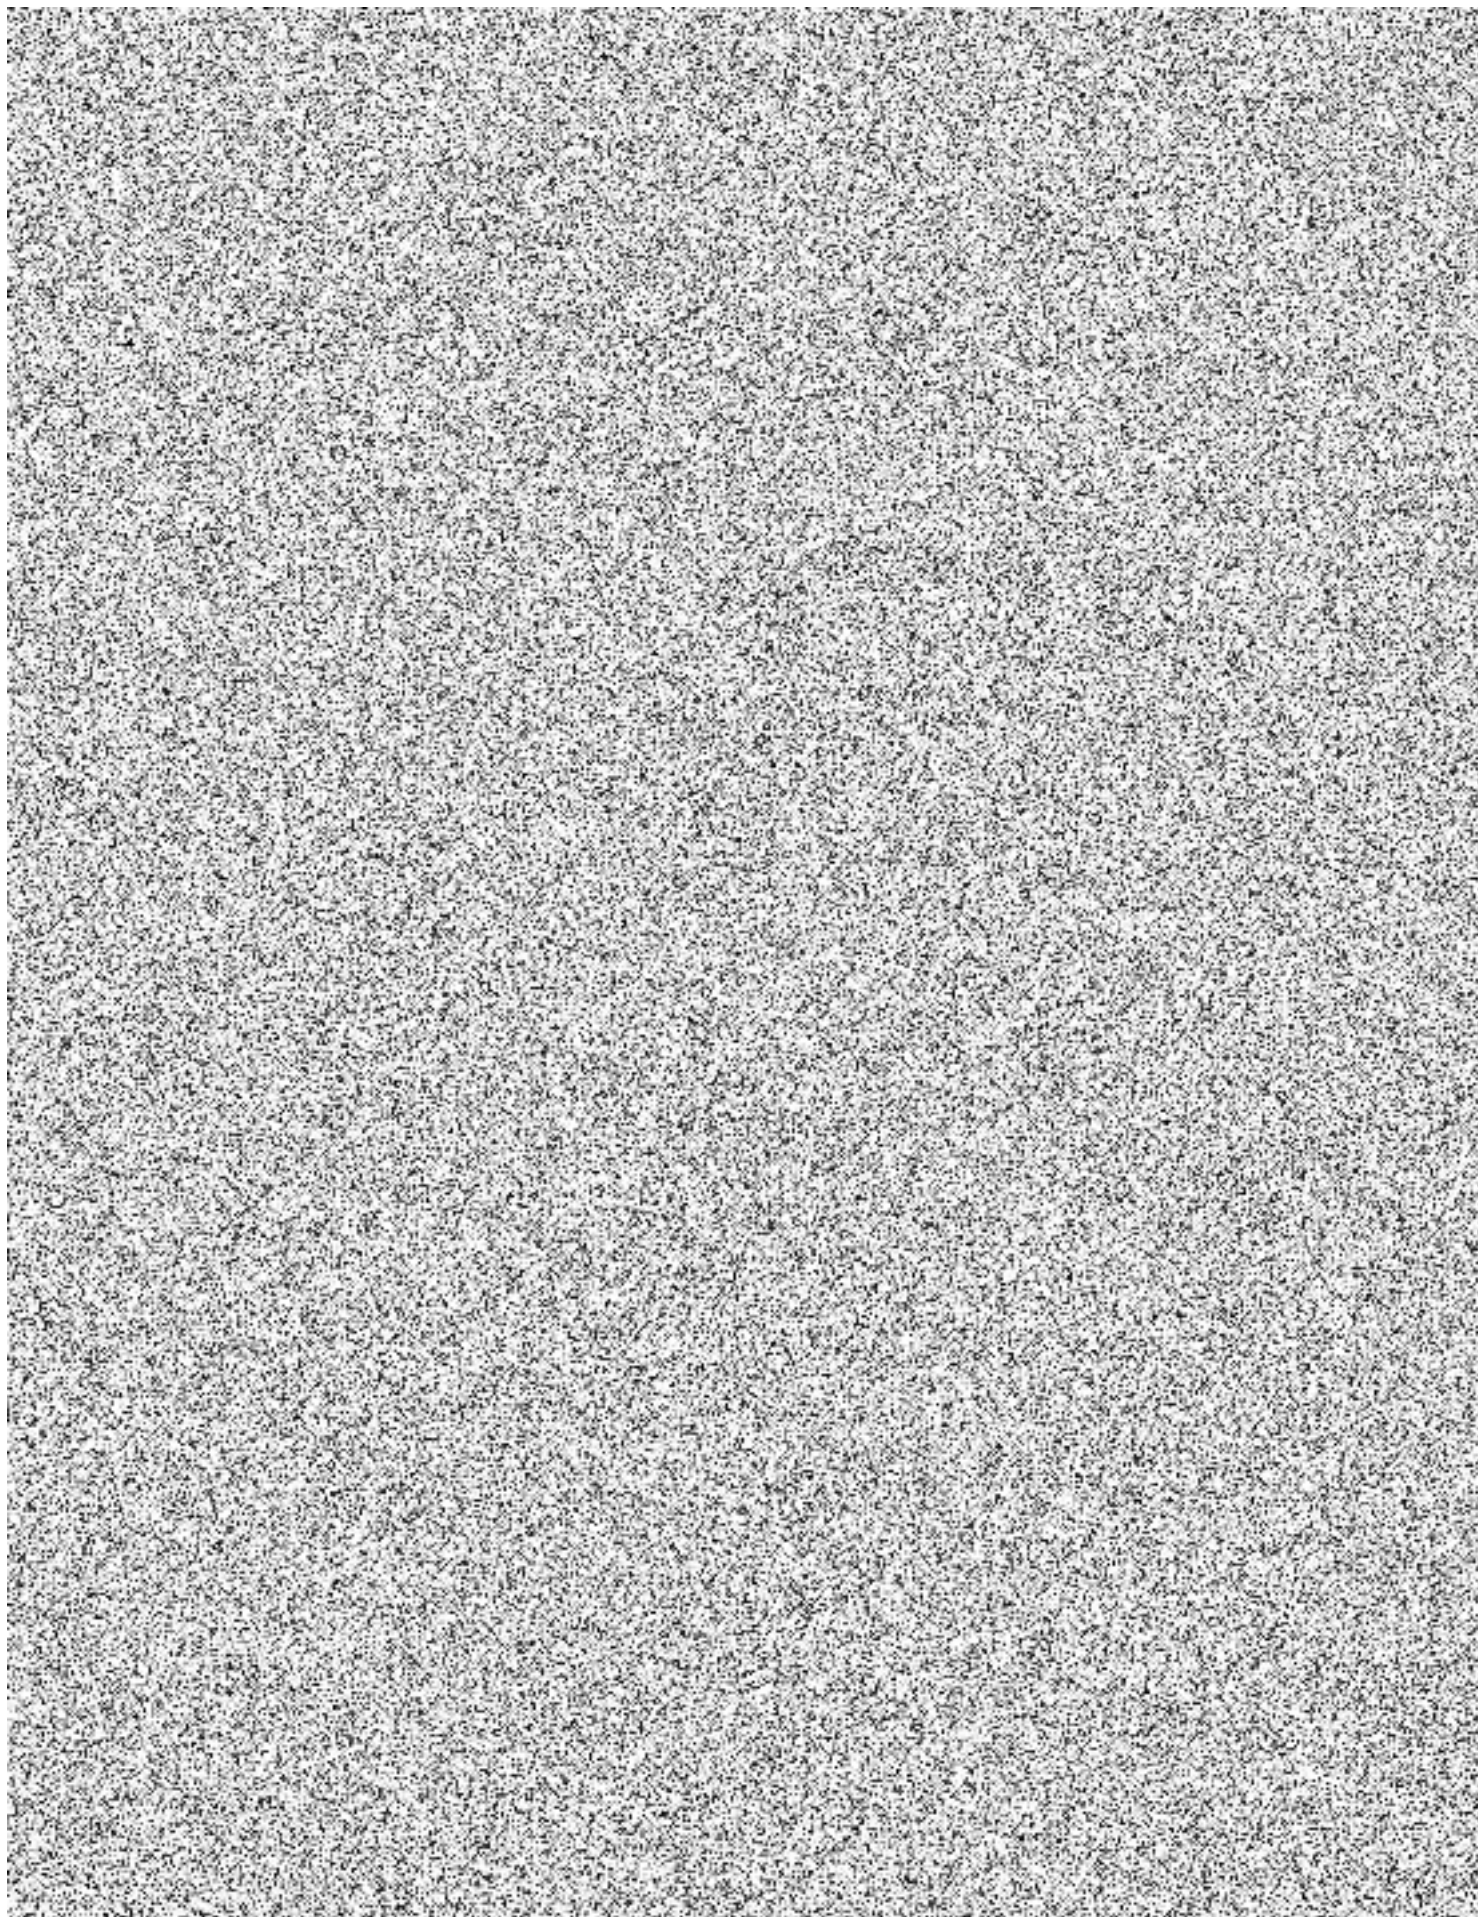

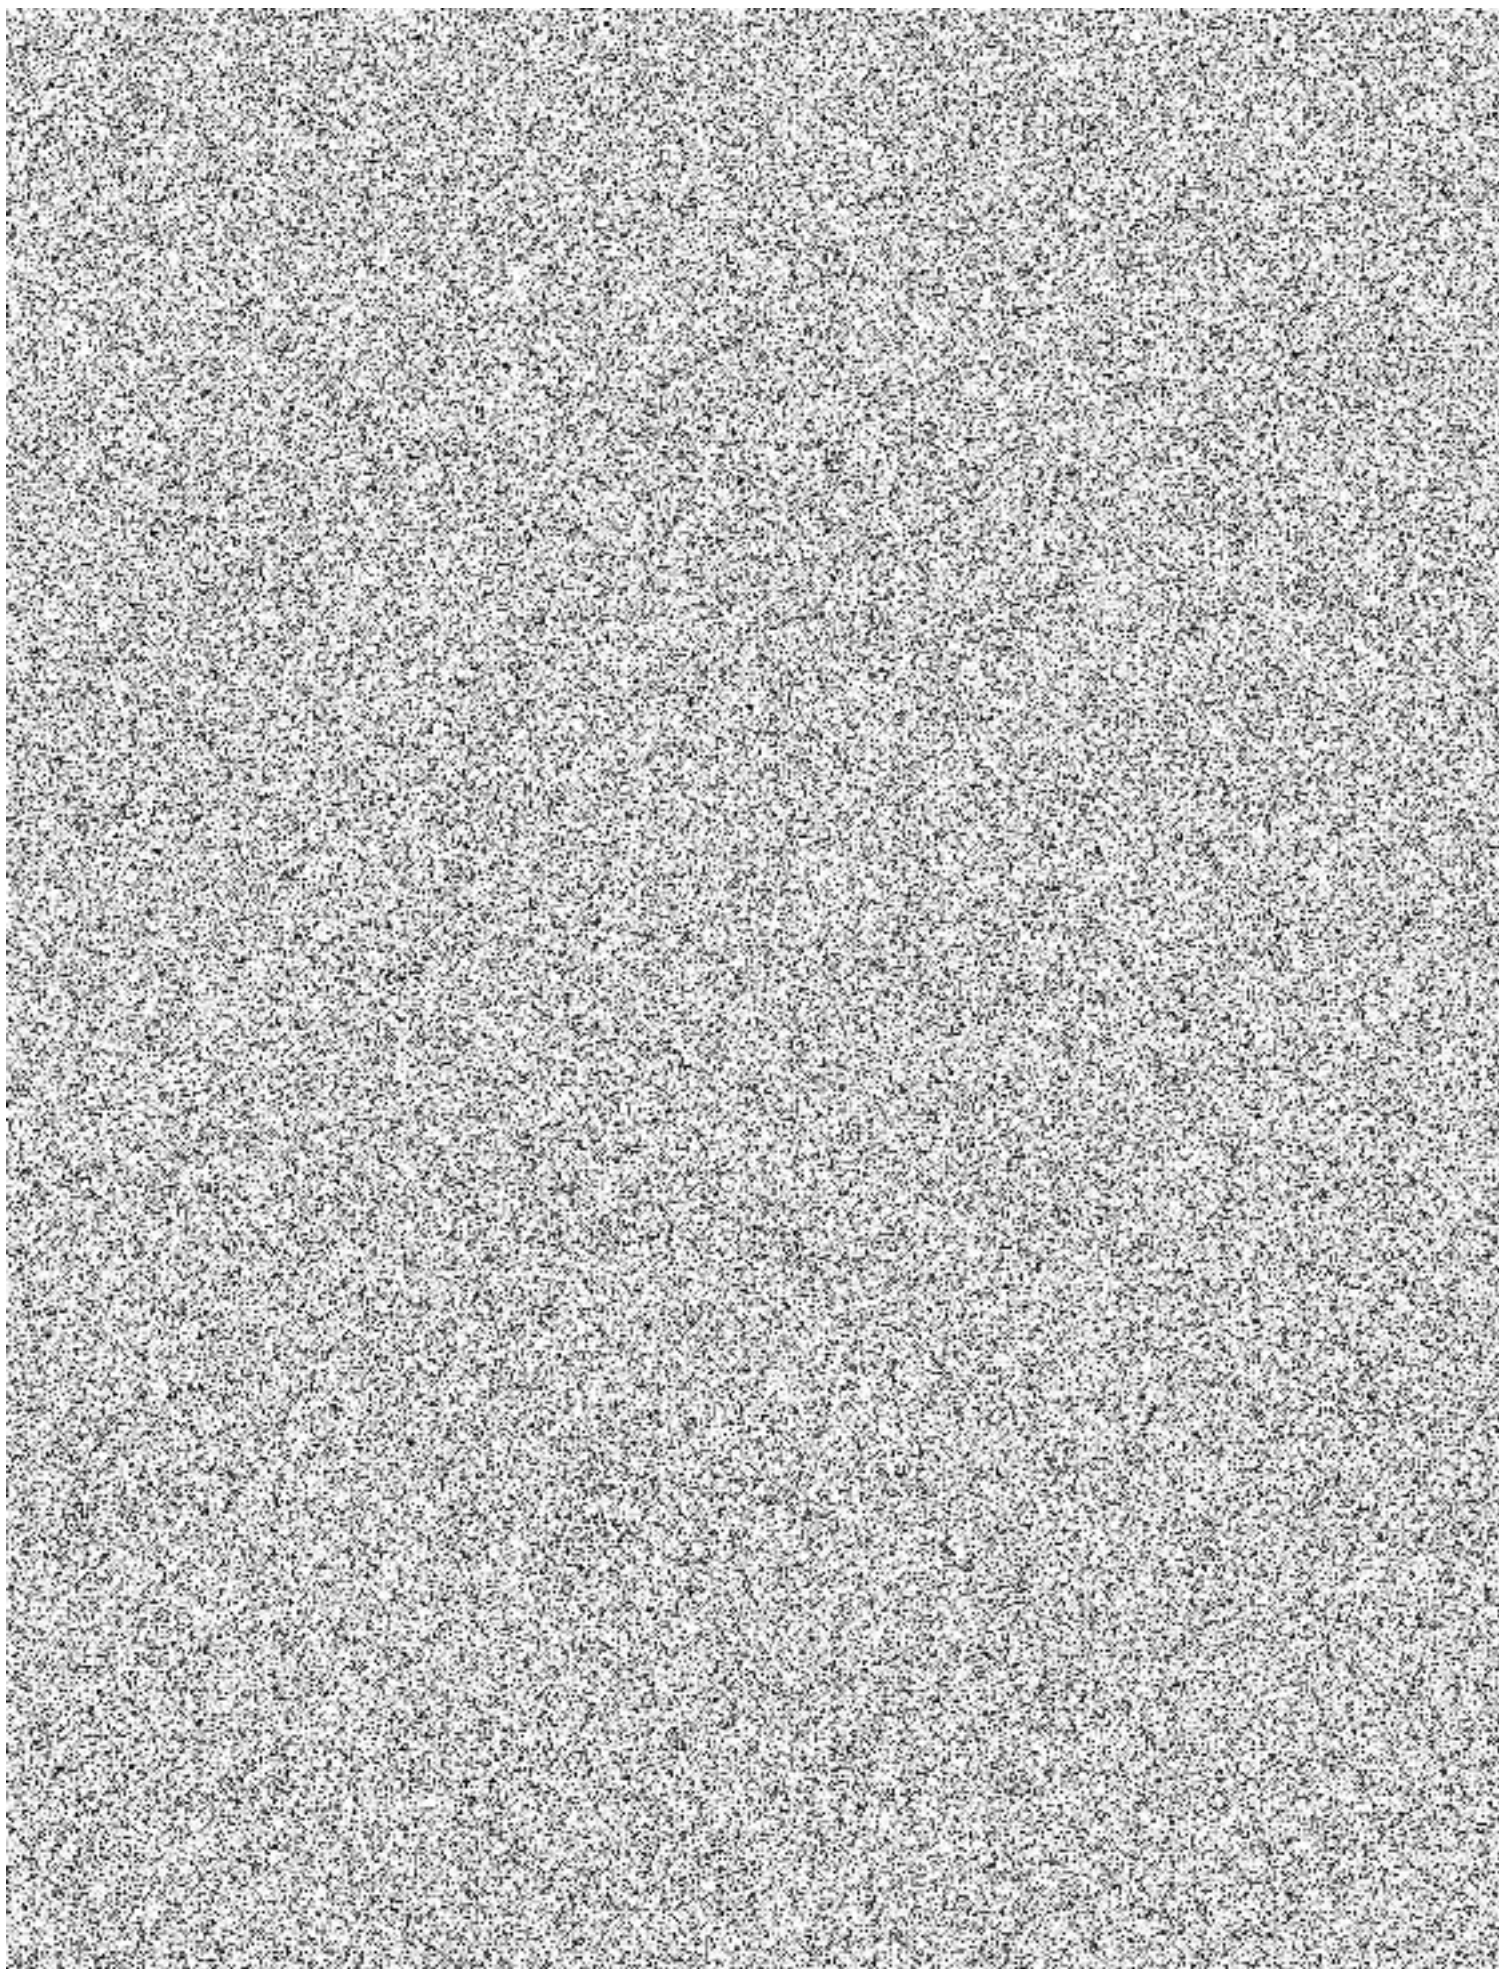


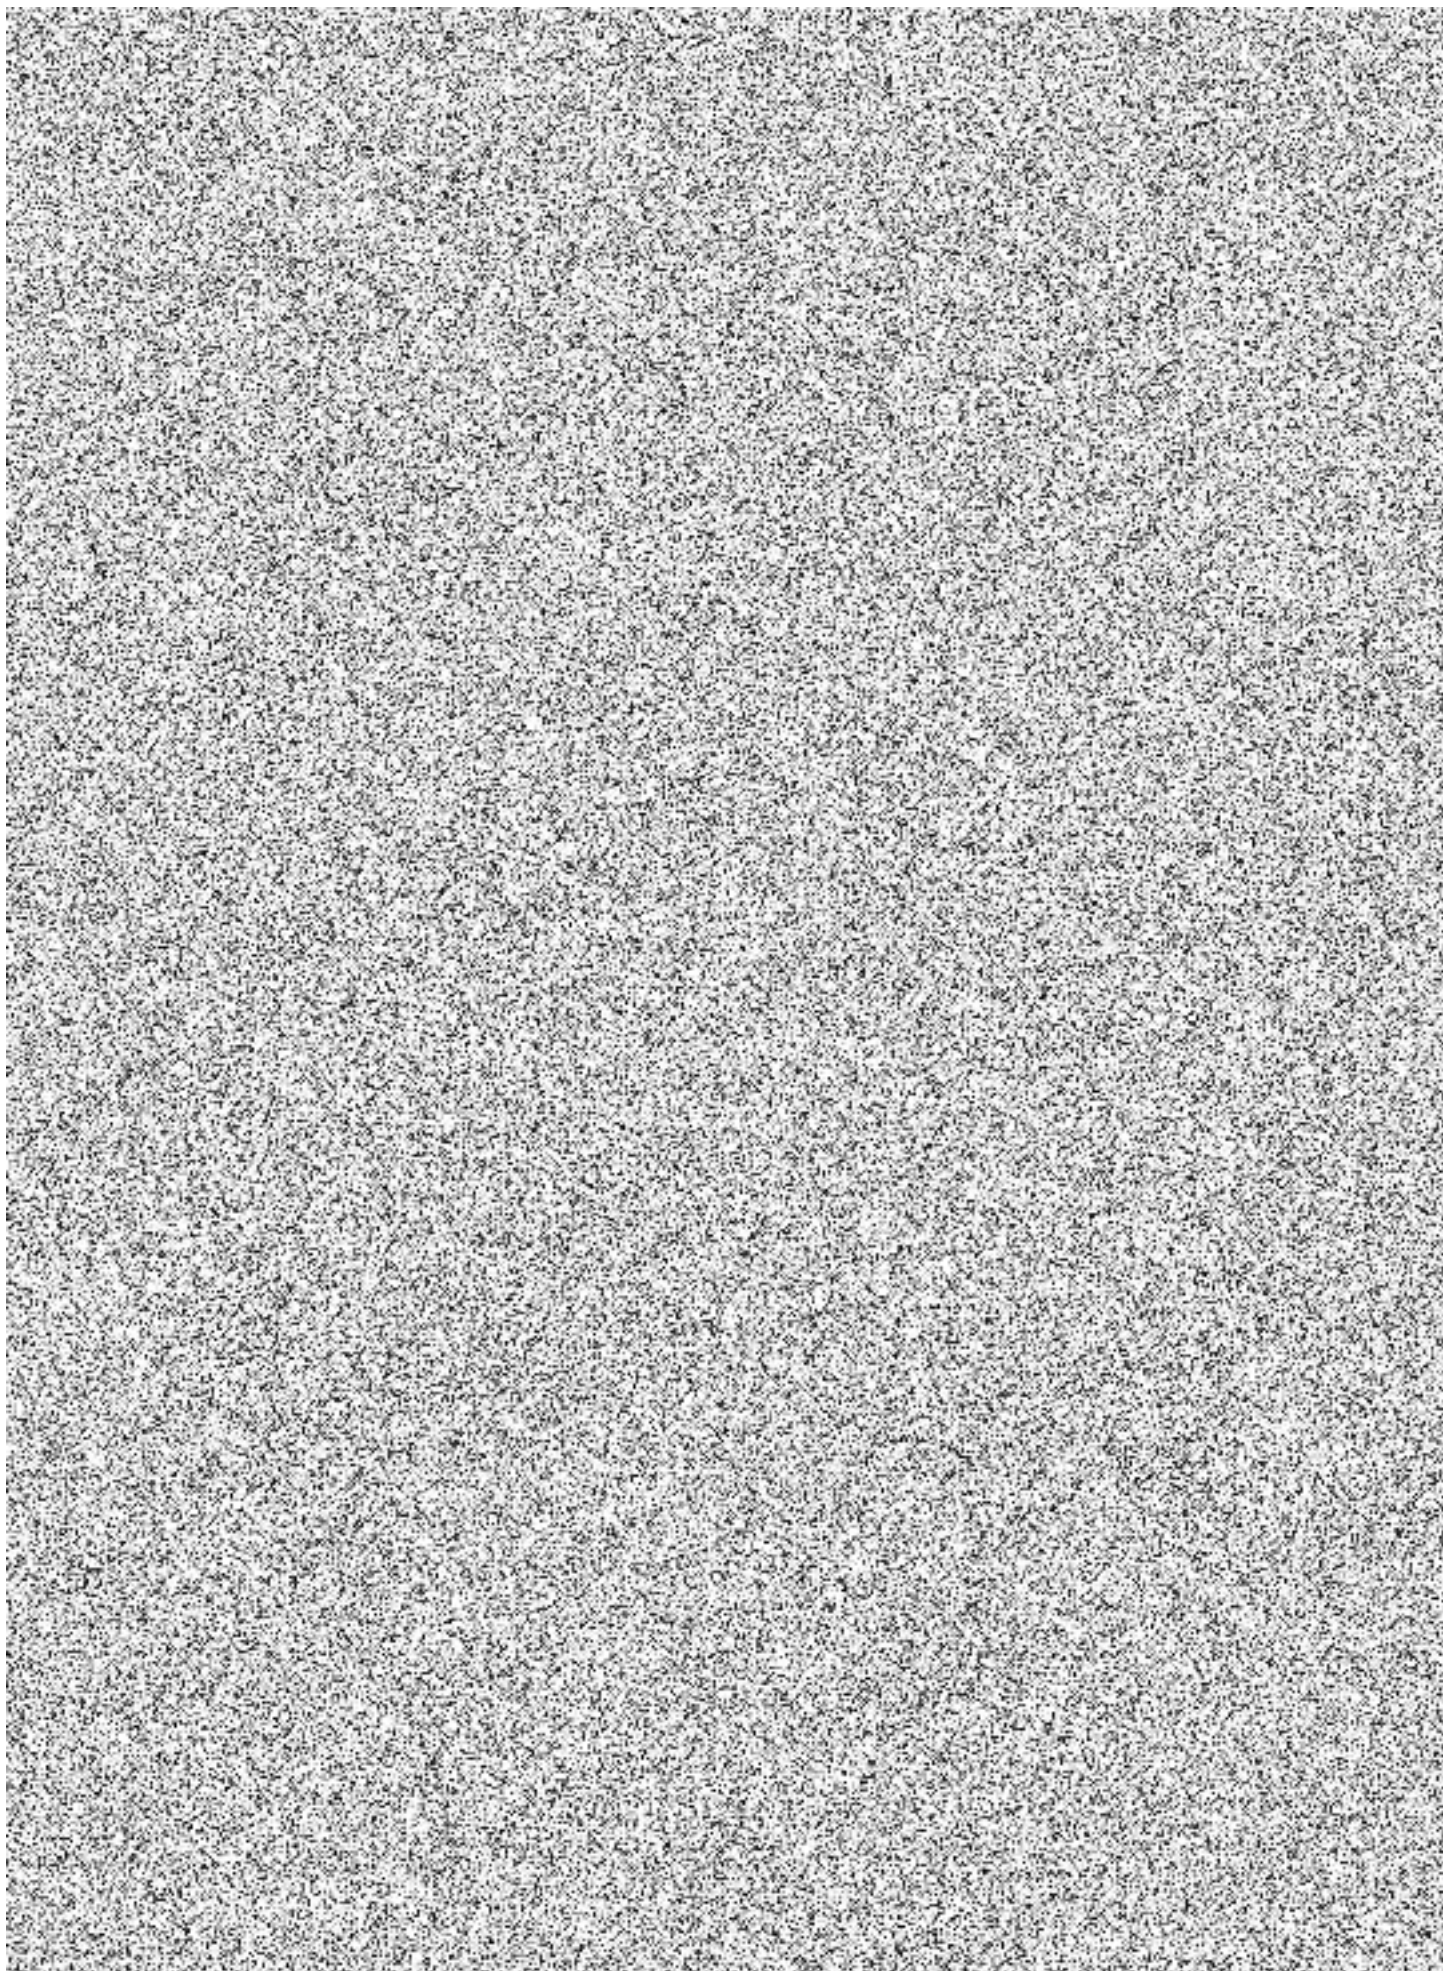

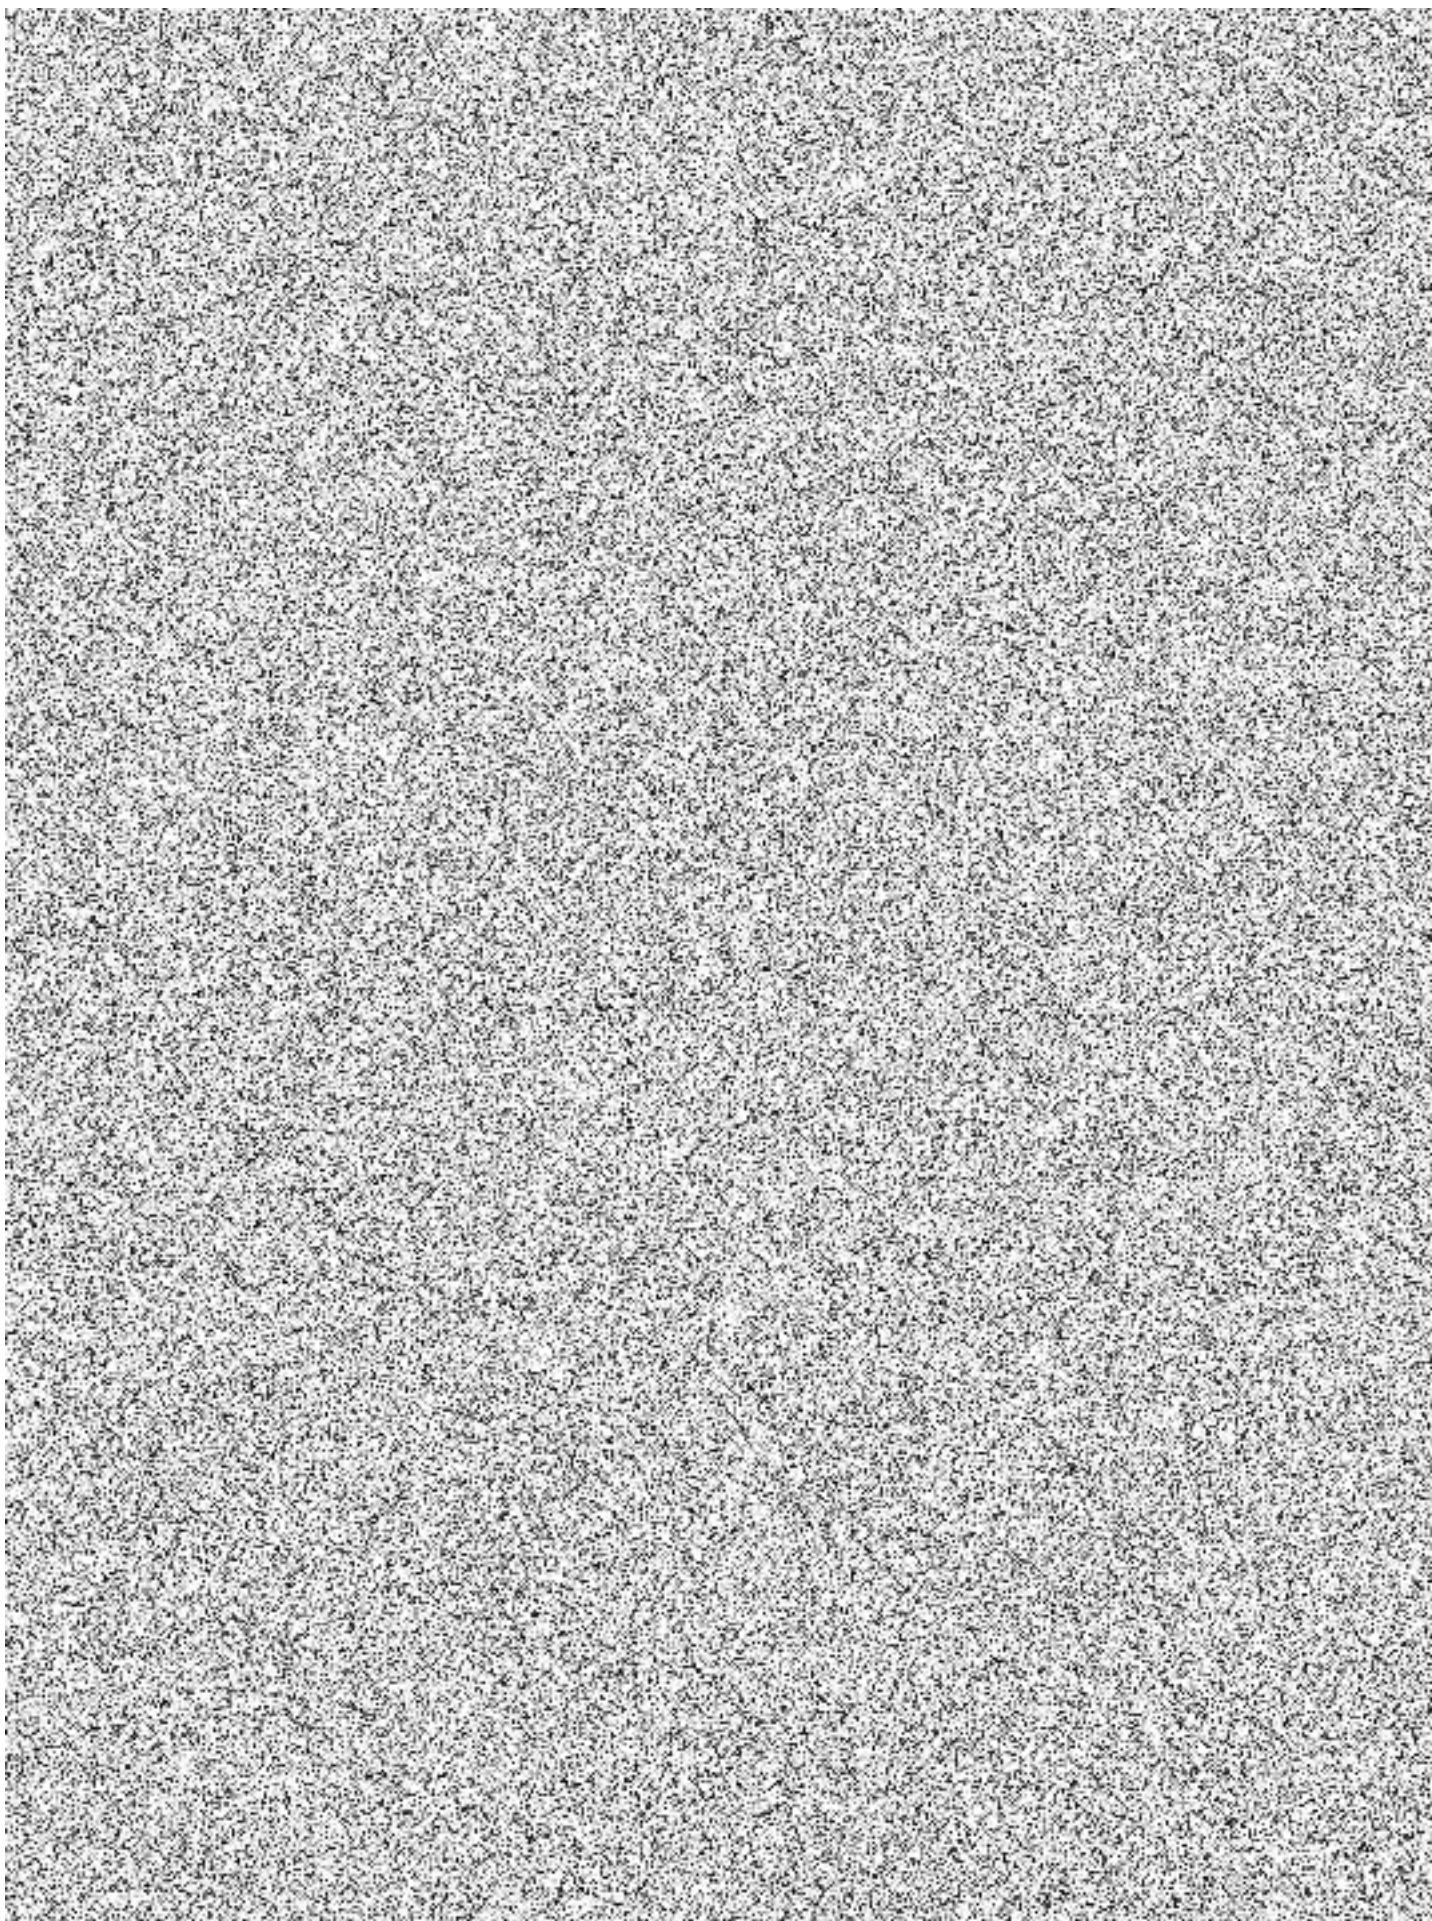







## 6.1.2 Harmonogramy projektu

### 6.1.2.1 Etapizace projektu

Projekt digitalizace je strukturován do pěti etap, které se liší jak svým rozsahem, tak metodami zpracování. Předpokládá se, že mezi jednotlivými etapami bude docházet k překrývání, což klade vysoké nároky na řízení projektu a koordinaci mezi týmy. Tyto nároky mohou být zvýšeny i potřebou opravy chyb, které odhalí IMP nebo Objednatel, a to v různých prostředích a s různými nástroji.

#### **Etapa 1 (15. duben 2024–30. červen 2024)**

V této počáteční etapě projektu budou oba týmy TD1 a TD2 realizovat digitalizaci všech typů legislativních aktů specifikovaných v § 2 až 4 zákona č. 222/2016 Sb. a tvorbu tezauru CzechVoc (definiční a výskytové vazby).

Zdrojem budou částky předané objednatelem ve formátu PDF. Tato etapa bude zahrnovat všechny akty vyhlášené v tomto období.

Plně bude zapojen též tým TKK a všechny akty budou též akceptovány objednatelem.

#### **Etapa 2 (1. červenec 2024–30. září 2024)**

V této etapě dojde k určitému zúžení rozsahu digitalizace. Předmětem rekonstrukce textu z PDF formátů již nebudou akty definované v § 3 a 4 zákona č. 222/2016 Sb. s výjimkou nálezů Ústavního soudu a aktů, které byly předloženy k vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nejpozději do 30. června 2024.

Tyto akty však budou kvůli nutnosti zachování konzistence a celistvosti databáze dále předmětem zpracování týmem TD1. Jejich data však již nebudou rekonstruována z PDF a místo toho budou „nabírána“ z rozhraní e-Sbírky poskytnutých objednatelem (OpenData e-Sbírky a data přístupná prostřednictvím veřejného API e-Sbírky). Na takto rekonstruovaná data pak zpracovávána dalšími procesy digitalizace s důrazem na správnost a úplnost odkazového aparátu.

Ostatní typy aktů nad výše specifikovaný rozsah budou zpracovávány i akceptovány kompletně, tedy identicky s etapou 1.

#### **Etapa 3 (1. říjen 2024–31. prosinec 2024)**

V této etapě se rozsah digitalizace dále diverzifikuje. Z aktů podle § 2 budou vyloučeny nařízení vlády a vyhlášky s výjimkou těch, které byly předloženy k vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nejpozději do 30. září 2024.

Vyloučená nařízení vlády i akty budou však dále týmem TD1 zpracovávána obdobně jako v etapě 2, zdrojem dat budou opět OpenData e-Sbírký resp. veřejné API e-Sbírký.

Tato etapa se kryje s posledním kvartálem roku, který bývá „nejplodnější“ na počet aktů. Do hry zde v plné míře nastoupí i podstatně zvýšená kadence vyhlášení nových předpisů způsobená faktem, že jedna částka se rovná jeden předpis. Týmy TD2 a TKK tak využijí uvolněnou kapacitu na podporu týmu TD1.

#### **Etapa 4 (1. leden 2025–konec 9. volebního období PS, předpoklad počátek října 2025):**

První část této etapy bude ve znamení digitalizace zákonů, ústavních zákonů a zákonných opatření Senátu, které byly do 31. prosince 2024 byly předloženy k projednání Poslanecké sněmovně. Lze předpokládat, že jejich počet bude výrazně vyšší, než by tomu bylo bez náběhu e-Legislativy.

Na základě našich analýz musí konzistence digitalizační databáze být nadále zachovávána, proto tým TD1 bude stále pracovat v plném rozsahu, včetně přípravy CzechVoc.

Týmy TD2 a TKK budou týmu TD1 poskytovat podporu směřovanou zejména na realizaci „zvláštních postupů“ dle zadávací dokumentace a k eliminaci případných rizik, která mohou nastat v souvislosti s plným náběhem e-Legislativy od 1. ledna 2025.

#### **Etapa 5 (konec 9. volebního období PS–31. listopad 2025):**

Poslední etapa projektu bude soustředěna na digitalizaci návrhů zákonů a ústavních zákonů, které byly přijaty Poslaneckou sněmovnou do konce 9. volebního období a po schválení Senátem byly předloženy k vyhlášení a zároveň nebyly připravovány za využití e-Legislativy.


#### 6.1.2.2 Harmonogram celkového plnění

Celkový harmonogram projektu Služby postupné digitalizace Sbírký zákonů a mezinárodních smluv vytvořený v nástroji MS Project (formát .mpp) je uveden v samostatném dokumentu, který je nedílnou součástí nabídky Dodavatele – viz soubor: 240125\_Nabidka\_MV\_Digi\_ESEL\_2024\_Harmonogram\_v1.0.mpp.

Na obrázcích níže ilustrujeme plánovaný časový průběh prací požadovaných v zadávací dokumentaci ze strany Zadavatele včetně dílčích výstupů a klíčových milníků.

Detailní popis jednotlivých pracovních postupů a verifikačních kontrol je uveden ve druhé části Návrhu řešení - Přístup dodavatele k realizaci postupné digitalizace Sbírký zákonů a mezinárodních smluv.

High-level pohled na části projektu

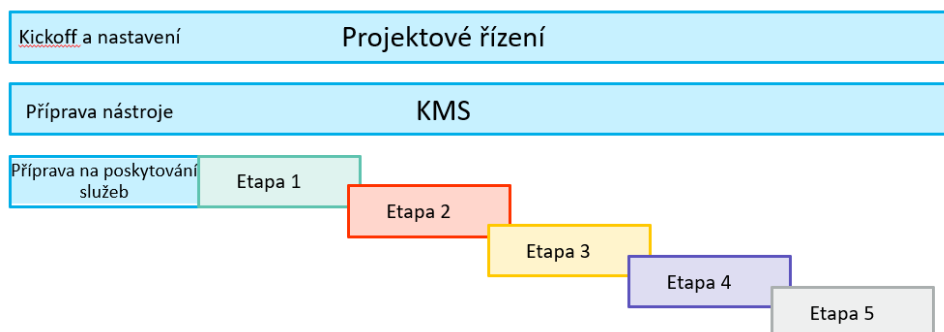

## 6.1.2.3 Detailní rozvrh prací pro první tři měsíce plnění

## Detail období od podpisu smlouvy do zahájení digitalizace Etapy 1

	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Názvy zdrojů
1	<b>Služby postupné digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv</b>	<b>469 dny</b>	<b>15.3. 24</b>	<b>31.12. 25</b>	
2	T = Podpis a zveřejnění smlouvy v RS	1 den	15.3. 24	15.3. 24	MV
3	Kick-off projektu a představení členů týmu, projednání návrhu řešení postupné digitalizace	10 dny	18.3. 24	29.3. 24	MV, ACE
4	<b>Zprovoznění KMS</b>	<b>19 dny</b>	<b>18.3. 24</b>	<b>11.4. 24</b>	
5	Vývojové, instalační a konfigurační práce	14 dny	18.3. 24	4.4. 24	ACE
6	Zprovoznění HW infrastruktury	2 dny	3.4. 24	4.4. 24	ACE
7	Zaškolení uživatelů KMS	1 den	5.4. 24	5.4. 24	ACE
8	Výstup: Předání KMS k akceptaci MV (T+15WD), vyškolení uživatelé	0 dny	5.4. 24	5.4. 24	ACE
9	Akceptační řízení MV pro KMS	4 dny	8.4. 24	11.4. 24	MV
10	Zpracování a aktualizace datové báze před zahájením rutinní digitalizace	20 dny	18.3. 24	12.4. 24	ACE

## Detail Etapy 1 – vzor pro částku předanou od 15.4.2024

	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Názvy zdrojů
12	<b>Etapa 1 (15. duben 2024–30. červen 2024)</b>	<b>100 dny</b>	<b>15.4. 24</b>	<b>30.8. 24</b>	
13	Předání PDF nové PDF částky ke zpracování	1 den	15.4. 24	15.4. 24	MV
14	TD1 a TD2 - Zpracování a předání primárních/alternativních dat z digitalizace sbírek a CzechVoc	4 dny	16.4. 24	19.4. 24	ACE
15	TKK - 1. - n-té kolo verifikačních kontrol, výstup: protokoly v KMS	4 dny	16.4. 24	19.4. 24	ACE
16	TD1 - Zpracování nahlášených chyb od TKK	1 den	22.4. 24	22.4. 24	ACE
17	TKK - Kontrola zpracování chyb týmem TD1 a předání k akceptaci, výstup: protokoly v KMS	1 den	22.4. 24	22.4. 24	ACE
18	Akceptační kontrola ze strany MV	3 dny	23.4. 24	25.4. 24	MV
19	TD1 - Oprava chyb identifikovaných MV	1 den	26.4. 24	26.4. 24	ACE
20	TKK - Ověření zpracování identifikovaných chyb	1 den	29.4. 24	29.4. 24	ACE
21	Finální akceptace MV	3 dny	30.4. 24	2.5. 24	MV
22	Předání dat IMP pro publikaci v eSbírce, výstup: datový balíček s daty částky	1 den	3.5. 24	3.5. 24	ACE
23	Analogická tvorba dat a kontrola kvality pro publikované částky (TD1, TD2, TKK)	41 dny	3.5. 24	28.6. 24	ACE
24	Akceptace a fakturace služeb za období 15.4.2024 - 30.06.2024 (1.)	1 den	30.8. 24	30.8. 24	MV, ACE

Detailní popis obsahu jednotlivých kroků a odpovědností týmů, které je realizují, je předmětem kapitoly Přístup dodavatele k realizaci postupné digitalizace Sbírky zákonů a mezinárodních smluv.

### 6.1.3 Plnění smlouvy

