

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava staničních kolejí a výhybek
v ŽST Cheb“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E650-S-1786/2024** č. j. 9251/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

Společnost „Výhybky Cheb“

TSS GRADE, a.s. - vedoucí společník

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava

IČO: 35 802 723, DIČ: 2020281571

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Bratislava III

spisová značka: oddíl B, vložka č. 5590/B

zastoupena: Ing. Dušan Chovanec, předseda představenstva

Ing. Marek Choma, člen představenstva

Podnikající na území ČR prostřednictvím organizační složky:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno IČO: 02765055, DIČ: CZ02765055

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Spisová značka: oddíl A, vložka 26126

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. – společník

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 445 64 287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem

spisová značka oddíl C, vložka 1805

zastoupena: Ing. Tomáš Novák, jednatel

Korespondenční adresa:

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: ZOD/24019/001

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil uveřejněním na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> dne 28. 02. 2024 pod evidenčním číslem 65024017 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě tohoto výběrového řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **19 857 633,18 Kč**

slovy: devatenáct milionů osm set padesát sedm tisíc šest set třicet tři korun českých a osmnáct haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č.2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 9 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **4 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **5 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v čl. 1.7.3.2 odst. 5 a čl. 1.11.5.1 odst. 3 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatel převzato sjednaným způsobem.
- 3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 b) této smlouvy umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci nahrazují (dále jen „Technická specifikace stavby“). Tyto dokumenty jsou označeny v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové dokumentaci, avšak není obsažena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 12 hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. ZÁRUKY, DALŠÍ USTANOVENÍ A ODLIŠNÁ USTANOVENÍ OD OBCHODNÍCH PODMÍNEK

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatel z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluk nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.

- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přijímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č.10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

- 4.7 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

- 4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě, které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „odpovědné zadávání“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „smluvní partneři Zhotovitele“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele;

musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele sčítat.

6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem tři (3) osob znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů.

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen „evidence zapojení znevýhodněných osob“). V evidenci zapojení znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních

úkolů souvisejících s realizací Díla zvláště pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob tvoří Přílohu č. 11 této Smlouvy.

- 6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.
- 6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.
- 6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a

čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,

- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
 - d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnícká či fyzická osoba podílející se na dodávkách

zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace stanovená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží „**jedno**“ vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím

registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.

- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky –OPOŘ/S/S/1/23
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 03. 04. 2024

V Bratislavě dne 26. 03. 2024

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

Ing. Dušan Chovanec
předseda představenstva
TSS GRADE, a.s.

.....

Ing. Marek Choma
Člen představenstva
TSS GRADE, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

OPOŘ/S/S/1/23

Příloha č. 1

Obchodní podmínky

Zhotovení stavby

OPOŘ/S/S/1/23

Datum vydání: 5.2.2024

OBSAH

1.	DEFINICE POJMŮ	3
2.	VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE.....	6
3.	DOBA PLNĚNÍ.....	8
4.	ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE	13
5.	OPRÁVNĚNÉ OSOBY	14
6.	PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE	14
7.	PODDODAVATELÉ.....	16
8.	BEZPEČNOST	17
9.	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA	18
10.	DOKONČENÍ DÍLA	21
11.	AKCEPTACE DOKUMENTŮ	21
12.	CENA DÍLA.....	22
13.	PLATEBNÍ PODMÍNKY	23
14.	BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A POJISTNÁ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA	24
15.	BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD A POJISTNÁ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD.....	25
16.	VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA	26
17.	ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ.....	27
18.	ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ	28
19.	ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY	29
20.	SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ	31
21.	ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE	34
22.	ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE.....	36
23.	ŘEŠENÍ SPORŮ	36

Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva a povinnosti neupravené ve Smlouvě.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže:

Bankovní záruka	finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou bankou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci svého podnikání
Cena Díla	celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy
Část Díla	stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací
Den zahájení prací	Den nabytí účinnosti Smlouvy
Den zahájení stavebních prací	Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy
Dílo	plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“
Dodatečná výluka	výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 Obchodních podmínek
Dokumentace Zhotovitele	dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla nebo po jeho dokončení předána Objednateli;
Dokumentace pro povolení záměru	je dokumentace pro povolení stavby, rámcové povolení a povolení změny využití území dle ust. § 157 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „NSZ“)
Harmonogram postupu prací	grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke Smlouvě jako příloha č. 5
Interní předpisy Objednatele	interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost se seznámit
Jiná oprávněná osoba	třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva z odpovědnosti za vady
Koordinátor BOZP	koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Měřicí protokol	dokument, zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla
Nabídka Zhotovitele	nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku
Oznámený subjekt	je právnická osoba, která provádí posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověřování subsystému, která splňuje požadavky dle § 49r zákona č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon od drahách“).

Obchodní podmínky	tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy
Objednatel	smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“
Pojistná záruka	je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká pojišťovna“) nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být zaručena českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci svého podnikání.
Podrobný harmonogram	dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek
Projektová dokumentace	Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro provádění stavby, a to včetně kompletní dokladové části nebo Dokumentace pro povolení záměru ve smyslu NSZ a jeho prováděcích právních předpisů.
Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 7 Směrnice SM011 v nezbytném rozsahu.
Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)/Projektová dokumentace pro povolení stavby	je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, nebo dokumentace odpovídajícího typu ve smyslu NSZ a jeho prováděcích předpisů. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace požadavky dle přílohy č. 6 Směrnice SM011 v nezbytném rozsahu.
Předávací protokol	písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem a převzetí Objednatelem
Překročená výluka	výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 Obchodních podmínek
Realizační dokumentace stavby (RDS)	je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou č. 8 Směrnice SM011 v nezbytném rozsahu.

Seznam Interních předpisů Objednatele	seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah
Smlouva	smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky
Soupis provedených prací	písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla v příslušném kalendářním měsíci
Staveniště	území určené k realizaci Díla
Stát	Česká republika
Poddodavatel	podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy
SŽ	zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC)
TDS	technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále je „NSZ“). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 14písm. g) NSZ.
Technické podmínky	souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy
Veřejná zakázka	veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka“
Vyšší moc	výjimečná událost nebo okolnost: <ul style="list-style-type: none"> a) kterou smluvní strana nemůže ovládat; b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením Smlouvy; c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. <p>Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené podmínky (a) až (d):</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí; (ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, násilné převzetí a občanská válka; (iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů; (iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko náleží Zhotoviteli, protože municí, výbušniny, radiaci a radioaktivitu použil nebo vyvolal; (v) (v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, povodeň apod.
Zadávací dokumentace	dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“
Zápis o předání a převzetí Díla	písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla
Zhotovitel	smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“
Zkušební provoz	proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního správního úřadu
ZOV	zásady organizace výstavby

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:
- 2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;
 - 2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelům na základě Smlouvy;
 - 2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla;
 - 2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených zařízení;
 - 2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu obvyklému;
 - 2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými povoleními a souhlas; a
 - 2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 občanského zákoníku.
- 2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověřené osoby za podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu

těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.

- 2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu NSZ.
- 2.8 NEOBSAZENO
- 2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Oznamovaného subjektu podle § 49r zákona o drahách.
- 2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
- 2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.
- 2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
- 2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem.
- 2.14 Zhotovitel je povinen do pěti (5) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.

- 2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle Technických podmínek.
- 2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje i jejich zápis do stavebního deníku.
- 2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.
- 2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv z dokumentů, tvořících Smlouvu.
- 2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zmocnění Objednatelem pravomoc zbavit kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy.
- 2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočnicka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
- 2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy předkládat, musí být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.
- 2.22 V případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 13.6.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací.
- 3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce bránící zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.
- 3.3 V případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli

nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž:

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla.

3.6 Podrobný harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat:

- 1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,
- 2) seznam výluk (traťových a trakčních),
- 3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na Stavenišť, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti faktur,
- 4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a
- 5) průvodní zprávu, která obsahuje:
 - (i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a
 - (ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze zaznamenaných etap.

3.6.2 Pokud TDS do sedmi (7) dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých činností na Podrobný harmonogram.

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

- 1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,

- 2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních podmínek,
 - 3) vyšší moc,
 - 4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro prodloužení lhůty prokáže.
- 3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.
- 3.6.7 V případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.
- 3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodloužení Zhotovitele s plněním Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.
- 3.6.9 Sankce za prodloužení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogramu dotčeny.
- 3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán.
- 3.8 V případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušování prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušování postupu prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů v důsledku přerušování postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.

- 3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu přičitatelných.
- 3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.
- 3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.
- 3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn TDS k obnově prací.
- 3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatel. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. V případech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Nižší uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.
- | | |
|--|----------------------------|
| výluka trakčního vedení traťové koleje | 3.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka traťové koleje | 5.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka dvou a více traťových kolejí | 10.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka staničních kolejí – dopravní | 2.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka ostatních kolejí | 1.000 Kč/ započatá hodina |
| výluka zabezpečovacího zařízení | 3.000 Kč/započatá hodina |
- 3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.
- 3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti.
- 3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít

splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:

- 1) nemohl předvídat, patří zejména:
 - zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,
 - nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení,
- 2) mohl předvídat, patří zejména:
 - veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu zadávacího řízení.

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka traťové koleje	10.000 Kč/ započatá hodina
výluka dvou a více traťových kolejí	20.000 Kč/ započatá hodina
výluka staničních kolejí – dopravní	5.000 Kč/ započatá hodina
výluka ostatních kolejí	1.000 Kč/ započatá hodina
výluka zabezpečovacího zařízení	5.000 Kč/započatá hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 1 hodinu):

- smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze,
- veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly k překročení, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel

- a) nemohl předvídat, patří zejména
 - zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,
 - nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení,
- b) mohl předvídat, patří zejména:

- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky v průběhu zadávacího řízení.

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

- 4.1.1 výčet provedených stavebních prací;
- 4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních požadavků;
- 4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;
- 4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;
- 4.1.5 další údaje dle požadavků ust. § 166 NSZ a jeho prováděcích právních předpisů a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele.

4.3 NEOBSAZENO

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:

- 4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
- 4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.
- 4.4.3 Zhotovitel může do zpracování zapojit poddodavatele pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě souhlasu se Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních opatření poddodavatelem.
- 4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.
- 4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování

povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

- 4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas Objednatel.
- 4.4.8 V případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR.

5. OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak zmocněnými k jednání za smluvní stranu.
- 5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, jimiž v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen doložit tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.
- 5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE

- 6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.
- 6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočnicka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.
- 6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na

- odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při provádění Díla, která podle mínění TDS:
- 6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,
 - 6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,
 - 6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo
 - 6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního prostředí.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, pokud byla stanovena.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.
- 6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GR-010 z 18.12.2019 s účinností od 1.1.2020 v platném znění).
- 6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů a dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice; a u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 7 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.. i osvědčení o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., řád určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování elektrických zařízení.
- 6.8 Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit při předání staveniště a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě. Doklady dle tohoto bodu Obchodních podmínek se předkládají v kopiích s tím, že Objednatel si kdykoliv může vyžádat předložení originálů či ověřených kopií dokladů.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený GR SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GR-030 s účinností od 1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: prukazy@spravazeleznice.cz. Příslušné obecně závazné

právní předpisy a interní předpisy Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných technických podmínkách.

- 6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich aktualizaci.
- 6.11 V případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby jim byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná.
- 6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatel, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.

7. Poddodavatelé

- 7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.
- 7.3 NEOBSAZENO
- 7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat stroji a zařízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech) mají stroje, zařízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má

Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostředky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé.

- 7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud není stanoveno jinak:
- 7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;
- 7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení prostřednictvím původního Poddodavatele. V případě, že si Objednatel vyžádá předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů předložených dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od žádosti Objednatele.
- 7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně pět (5) dnů předem předpokládané datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové práce na Staveništi.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

8. BEZPEČNOST

- 8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:
- 8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,
- 8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,
- 8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,
- 8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a

- 8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.
- 8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po uzavření Smlouvy.
- 8.3 V případě, že bude být jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostředně po vzniku této skutečnosti.
- 8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své Poddodavatele.
- 8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.
- 8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS odůvodněně požadovat.
- 8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi a v jeho okolí.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9.
- 9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém bude připraven provést přijímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem dohodnuto jinak, budou přijímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přijímacích zkoušek vyrozumí Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přijímce Díla nebo Části Díla své Poddodavatele.
- 9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená část Části Díla s tím, že přijímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přijímacích zkoušek bude vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla již nebude

- předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.
- 9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.
- 9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:
- 9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro účinné provedení zkoušek;
- 9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový příslušný pokyn TDS;
- 9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené v přítomnosti TDS. Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno;
- 9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit.
- 9.5.5 V případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíše Zápis o předání a převzetí Díla. TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku jako řádně provedenou.
- 9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu požadavku TDS na provedení měření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:
- 9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti požadované TDS.
- 9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisejícími dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.
- 9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho zastoupení) považováno za přesné.
- 9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.

- 9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo nepodepíše Měřicí protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil záznamy a podepsal Měřicí protokol, budou záznamy považovány za přesné.
- 9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.
- 9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem Měřicího protokolu TDS a Zhotovitelem.
- 9.7 Jestliže v průběhu přijímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena řádně a v souladu se Smlouvou, tak:
- 9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;
- 9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přijímacích zkoušek po provedení těchto prací;
- 9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přijímací zkoušky kterékoliv související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při přijímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.
- 9.8 V případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečně přiměřené lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- 9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:
- 9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle Harmonogramu postupu prací;
- 9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
- 9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje; 9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.
- 9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.
- 9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy na jiných Částech Díla.
- 9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

10. DOKONČENÍ DÍLA

- 10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
- 10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:
- 10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a
 - 10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a
 - 10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a
 - 10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí Díla; a
 - 10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních deníků.
- 10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.
- 10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž Předávací protokol musí obsahovat:
- 10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných k dokončení Díla jako celku;
 - 10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
- 10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.
- 10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že Objednatel toto právo zvláště výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ

- 11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat v souladu s tímto článkem.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má přednost lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později.
- 11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.
- 11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do dvou (2) dnů, provést veškeré

potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

- 11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný.
- 11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.
- 11.7 V případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.

12. CENA DÍLA

- 12.1 Cena Díla je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.
- 12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.4 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:
 - 12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,
 - 12.2.2 na základě písemné dohody stran.
- 12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je zahrnuta v Ceně Díla.
- 12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace skutečného provedení, i náklady na činnost Oznamovaného subjektu. Dále obsahuje náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.
- 12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zařízení Staveniště ve smyslu NSZ. V ceně jsou zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel.
- 12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.
- 12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část soupis prací).
- 12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude

dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije.

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci na Stavenišťe za účelem zhotovení Díla a je řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS.

13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽSM041. Vystavené daňové doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:

- a) soupis zjišťovacích protokolů,
- b) zjišťovací protokoly,
- c) Objednatelem, resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.

13.3 Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

- a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- d) prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách Objednatele <https://www.spravazeleznic.cz/kontakty/podatelna>

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese. V případě, že je daňový doklad zasílán na výše uvedenou e-mailovou adresu, považuje se daňový doklad za doručený po obdržení notifikace doručení, která je automaticky odesílána odesílateli.

Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech nebo jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad.

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli.

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacená připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS.

- 13.8 V případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.
- 13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.
- 13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas Objednatele.
- 13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.
- 13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.
- 13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A POJISTNÁ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- 14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla (dále v tomto článku 14 obě též jen jako Záruka) ve výši uvedené ve Smlouvě. Záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V případě porušení povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti Záruku dle podmínek této Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy.
- 14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Zárukou ve výši, která odpovídá výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.
- 14.3 Záruka musí splňovat tyto podmínky:
- a) Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž výstavce se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného,
 - b) Záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu podle toho, která z těchto událostí nastane později,
 - c) Záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.
- 14.4 Právo ze Záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit v případech, pokud:
- Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy;
 - Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;

- Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatелеm uplatněna;
 - vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- 14.5 Pokud podmínky Záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti výstavce, který vydal Záruku ("datum ukončení platnosti Záruky ") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti Záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Záruky, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.
- 14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky dále v případech, pokud:
- 14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případech, kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky,
- 14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,
- 14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové povinnosti. V případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, se má za to, že je do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžitě povinnosti.
- 14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisích o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad, podle toho, který termín nastane později.
- 14.8 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového Zhotovitele.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD A POJISTNÁ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku 15 obě též jen jako Záruka). Záruka bude vystavena na částku odpovídající výši 50 % Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistné záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 Smlouvy.
- 15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Záruka bude vydána na dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Záruky specifikují datum ukončení platnosti Záruky a Zhotovitel neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení platnosti Záruky, potom je Zhotovitel povinen platnost Záruky prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky pouze v případech, pokud:

- 15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v případě, že její platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky Záruky,
- 15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,
- 15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,
- 15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut a nároku na náhradu škody,
- 15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv,
- 15.3 V případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 8.8 Smlouvy, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového Zhotovitele.
- 15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Záruky Zhotoviteli do 21 dnů poté, co tato Záruka pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA

- 16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo zařízení Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
- 16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.
- 16.4 V případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni licenci využít.

- 16.5 V případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob použití výslovně zřídka práva licenční smlouvy vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

- 17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.
- 17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhopvat změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.
- 17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.
- 17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost druhé straně a zároveň popíše předmět změny, její důvody, předpokládané technické řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším jednání návrh změny projednají.
- 17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla (tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů navrhované změny.
- 17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).
- 17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny schválí nebo odmítne.
- 17.8 V případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
- 17.9 V případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.

- 17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v platném znění, nevyskytuje, porovná se jejich skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
- 17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací.
- 17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.
- 17.13 Ujednání tohoto článku se užití ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelům.
- 17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je TDS oprávněn sjednávat za Objednatelů se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ NÁHRADĚ

- 18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS.
- 18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.
- 18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy.
- 18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že porušení práv třetích osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.
- 18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smlouvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen překonat, ho však

povinnosti k náhradě nezprostití. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY

- 19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.
- 19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:
- 19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,
 - 19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo
 - 19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.
- 19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.
- 19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v záručních dobách stanovených v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací.
- 19.6 Záruční doba neběží:
- 19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,
 - 19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.
- 19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související Část Díla.
- 19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.
- 19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení neběží.
- 19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční doby uvedené v příslušných technických podmínkách.
- Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční době jsou uvedeny v Technických podmínkách.
- 19.11 V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky

nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

- 19.12 Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.
- 19.13 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná osoba.
- 19.14 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo sama prokáže.
- 19.15 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv.
- 19.16 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.
- 19.17 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad. Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho příslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.
- 19.18 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.
- 19.19 V případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V případě, že Zhotovitel nesplní svou

povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.

- 19.20 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.
- 19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro odstranění vad.

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ

- 20.1 V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady škody.
- 20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.
- 20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody v plné výši.
- 20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 občanského zákoníku.
- 20.6 V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho části) v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.
- 20.7 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 20.8 V případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.
- 20.9 V případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, že taková změna

nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto ustanovení se nepoužije.

- 20.10 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezačíná činností směřující ke zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ.
- 20.11 V případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem.
- 20.12 V případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 1.500.000 Kč za měsíc.
- 20.13 V případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu přerušování prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech dotčených Částí Díla za každý takový případ.
- 20.14 V případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.15 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení.
- 20.16 V případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:
- a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo
 - b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.
- 20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.
- 20.18 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatel vyžadované pojistné smlouvy anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.19 V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo neudrzuje v platnosti Bankovní záruku nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.20 NEOBSAZENO
- 20.21 V případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy nebo postoupil být i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

- 20.22 V případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí.
- 20.23 V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejími přílohami, zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.
- 20.24 NEOBSAZENO
- 20.25 V případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč za každý zjištěný případ.
- 20.26 V případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentací pro stavební povolení, případně, na něž pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.
- 20.27 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jinými předpisy závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této povinnosti.
- 20.28 V případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 20.29 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních podmínek, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každé jednotlivé porušení.
- 20.30 NEOBSAZENO
- 20.31 NEOBSAZENO
- 20.32 NEOBSAZENO
- 20.33 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 4.8 Smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ a za každou započatou hodinu prodlení.
- 20.34 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu:

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;
 - za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;
 - za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;
 - za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej.
- 20.35 V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.
- 20.36 V případě, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku 20 Obchodních podmínek stanoví smluvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, uplatní při výpočtu výše smluvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:
- a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 10.000,- Kč,
 - b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 20.000,- Kč,
 - c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení činit méně než 5.000,- Kč.
- 20.37 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena ve výši **30 %** zCeny díla.

21. Odstoupení Objednatele

- 21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:
- 21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu postupu prací delším než čtrnáct (14) dní.
 - 21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu na straně Zhotovitele trvá i po čtrnácti (14) dnech ode dne písemného upozornění Objednatele na tuto skutečnost.
 - 21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatелеm vyžadovaných pojistných smluv.
 - 21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti ve stanovené přiměřené lhůtě.
 - 21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.
 - 21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla nebo Zhotovitel písemně vyzoomí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že nebude pokračovat v provádění Díla.

- 21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla.
- 21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.
- 21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.
- 21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.
- 21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.
- 21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných prací nezbytný.
- 21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst. 8.8 Smlouvy.
- 21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení Zhotoviteli.
- 21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Objednatele podle Smlouvy.
- 21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.
- 21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:
- 21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;
- 21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za něž obdržel platbu;
- 21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a
- 21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění Díla převzal.
- 21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít

Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

- 21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být odsouhlasen a potvrzen TDS.
- 21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.
- 21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by vedlo k vadám Díla.

22. Odstoupení Zhotovitele a nároky Zhotovitele

- 22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:
- 22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do třiceti (30) dnů poté, co Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek Obchodních podmínek;
- 22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než třicet (30) dnů od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.
- 22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli.
- 22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv Zhotovitele podle Smlouvy.
- 22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.
- 22.5 Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení Zhotovitele.

23. Řešení sporů

- 23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému obecnému soudu České republiky.

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

- b) Zvláštní technické podmínky „**Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb**“

Příloha č. 2 b)

Zvláštní technické podmínky

Zhotovení stavby

**Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST
Cheb**

Datum vydání: 5.2.2024

OBSAH

SEZNAM ZKRATEK.....	2
POJMY A DEFINICE.....	3
1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA.....	4
1.1 Účel a rozsah předmětu Díla	4
1.2 Umístění stavby	4
2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ.....	4
2.1 Projektová dokumentace.....	4
2.2 Související dokumentace	4
3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI.....	4
4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA	4
4.1 Všeobecně.....	4
4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele	9
4.3 Doklady překládané zhotovitelem.....	11
4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu	11
4.5 Centrální nákup materiálů	11
4.6 Životní prostředí	11
5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY.....	12
6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY	13
7. PŘÍLOHY.....	13

SEZNAM ZKRATEK

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

AZI	Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI)
BZ.....	Bezpečnostní zábrana
ESD	Elektronický stavební deník
OUA	Opravné a údržbové akce
PD	Projektová dokumentace
SPS.....	Správa pozemních staveb
ÚMVŽST	Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích
ŽP	Životní prostředí

POJMY A DEFINICE

- o **Projektová dokumentace** (dále také „PD“) pro tyto ZTP se může pohybovat v rozsahu od technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném. dle stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo udržovacích prací či v rozsahu pro dokumentaci pro provádění stavby. Členění dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení se provádí v souladu se směrnici SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) a to i pro potřeby položkového rozpočtu.
- o **Projektová dokumentace pro provádění stavby** (PDPS) je projektovou dokumentací, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, Přílohy P7. Jedná se o dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena, kterou dopracovává a rozpracovává do větších podrobností a rozsahu potřebných pro výběr zhotovitele stavby v zadávacím řízení, a to s dodržением zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení. PDPS lze zpracovat se zohledněním konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního Zhotovitele pouze v případě, že je stavba zadávána v režimu D+B.
- o **Realizační dokumentace stavby** (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.
- o **Dokumentace skutečného provedení stavby** (DSPS) je dokumentace, která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravou prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících opravných prací). Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace.
- o **Zadávací dokumentace** (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek).
- o **Etapa** je ucelená část Díla určená v Harmonogramu postupu prací.
- o **Technický dozor stavebníka** (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 písm. g) stavebního zákona.
- o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu.
- o **Pojmy s velkými začátečními písmeny** použité v těchto **Zvláštních technických podmínkách** (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Obchodních podmínkách (dále jen „OP“), není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy věci.
- o V ZTP jsou použité odkazy na **oddíly, články a podčlánky** souboru **Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah** (dále jen „TKP“)

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

- 1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb“, jejímž cílem je souvislá výměna pražců, kolejového lože, ocelových částí výhybek a zřízení bezstykové koleje.
- 1.1.2 Rozsah Díla „**Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb**“ je stanoven Dílem 3 Zadávací dokumentace – Technická zpráva + její přílohy
1. zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,
 2. vypracování geodetické dokumentace provedení stavby výhybky č. 5 a přípojných polí (vč. geodetické činnosti v průběhu stavby)

1.2 Umístění stavby

- 1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Plzeň hl. n.-os.n. – Cheb, 0203V1 v ŽST Cheb, na výhybkách č. 5, 6, 8, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 56, 57, 59 a 61.

Údaje o stavbě

Označení (PA)	650190210
Kraj	Karlovarský
Okres	Cheb
Katastrální území	Cheb
Správce	ORŮ Ústí nad Labem

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

- 2.1.1 Projektová dokumentace na stavbu „**Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb**“ není vyhotovena. Její obsah nahrazuje Díl 3 Zadávací dokumentace – Technická zpráva + její přílohy a Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr.

2.2 Související dokumentace

- 2.2.1 Povolení stavebního úřadu se nevyžaduje.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI

- 3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst., apod.
- 3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:
- a) Investiční akce ETCS Plzeň (mimo) - Cheb

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PŘEDMĚT DÍLA

4.1 Všeobecně

- 4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP.
- 4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy.

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „...nejméně 5 pracovních dnů před termínem...“ se mění na „...nejméně 2 pracovní dny před termínem ...“.

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „...se zásadami směrnice SŽ SM011 (Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace) směrnice SŽDC č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a pokynu GR č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty) a pokynu GR SŽ PO-06/2020-GR (Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této kapitole citovanými.“

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije.

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto:

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu s vyhláškou č. 357/2013 Sb., s výjimkou případu, kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí vlastník (správce) technické infrastruktury.

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6.

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „...byla-li RDS zpracována...“.

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „... tj. zpravidla Stavební správa SŽ...“.

4.1.2.11 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 3 se mění lhůta z 14 kalendářních dní na 7 kalendářních dní.

4.1.2.12 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části – Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů...“

4.1.2.13 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije.

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti Stavby.

4.1.2.15 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto:

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů pokud to charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování

strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.

- 4.1.2.16 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů.
- 4.1.2.17 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „... (zpravidla Stavební správa)“.
- 4.1.2.18 V člancích 1.10.9 TKP a navazujících je „stavebním deníkem v listinné podobě“ pro údržbu a opravy myšlena vždy forma dle čl. 1.10.9.1 TKP, odst. 4.
- 4.1.2.19 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající Stavební dozor k posouzení a ke schválení.
- 4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek na 3 soupravy závěrových tabulek.
- 4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto:
Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.
- 4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů.
- 4.1.2.23 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto:
DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy P9. Podkladem pro vypracování je projektová dokumentace a RDS pro zhotovovací práce.
- 4.1.2.24 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto:
Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se díla Zhotovitelem Objednateli proběhne **v listinné podobě ve třech vyhotoveních** pro technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 měsíců a kompletní **dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle čl. 4.1.2.26 těchto ZTP** do 3 měsíců ode dne, kdy byl vydán poslední Zápis o předání a převzetí díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního vztahu.
- 4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce 4 a 5.
- 4.1.2.26 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto:
Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GR č. 4/2016 na záznamovém médiu uvedeném v ZD:
- kompletní dokumentace stavby v otevřené formě
 - kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě
 - kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo (InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě.
- 4.1.2.27 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „...*.XML (datový předpis XDC)“.
- 4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky (VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP.
- 4.1.3.1 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli právo užívání Staveniště, včetně železniční dopravní cesty, v době, kdy je toho třeba, aby mohl Zhotovitel Dílo dokončit řádně a včas za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.4 těchto ZTP.

- 4.1.3.2 Předání Staveniště dalších částí Díla se uskutečňuje na základě žádosti Zhotovitele. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro realizaci dalších částí Díla nejpozději 7 kalendářních dnů před termínem zahájení realizace v souladu s „Harmonogramem postupu prací a finančního plnění“ prostřednictvím TDS.
- 4.1.3.3 Vzhledem k charakteru liniových staveb je Objednatel oprávněn předávat Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Části Díla.
- 4.1.3.4 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se Smlouvou, má TDS právo nařídít přerušování prací na Díle nebo jeho části až do doby, kdy Zhotovitel takového Podzhotovitele z provádění prací na Díle odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště.
- 4.1.3.5 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do zkušebního provozu (pod napětím)
- a. Kontroly a zkoušky TV:
- i. Kontrolní zkoušky a revize TV včetně ověření parametrů trolejového vedení budou provedeny dle příslušných kapitol TKP a platných ČSN a ČSN EN. Ověření parametrů trakčního vedení při provádění technicko-bezpečnostních zkoušek bude sledováno dle příslušného vnitřního předpisu Objednatele.
- 4.1.3.6 **U majetkoprávního vypořádání s ČD** se Zhotovitel zavazuje respektovat aktuální stav a postupy vypořádání v rámci **UMVŽST**.
- 4.1.3.7 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky **nezasahovaly do majetku a práv třetích osob**.
- 4.1.3.8 Pokud je **podzemní vedení** a zařízení technické infrastruktury ve správě místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje požádat písemnou objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.
- 4.1.3.9 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel.
- 4.1.3.10 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště.
- 4.1.3.11 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) **zásahy do jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury**.
- 4.1.3.12 **Změny během výstavby**, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ SM105.
- 4.1.3.13 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování **ucelených úseků kolejového lože** z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných reklamací.
- 4.1.3.14 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. V případě, že je mezideponie kameniva pojížděna dopravními prostředky v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro

kolejové lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa odběru zkušebních vzorků určí TDS ve spolupráci se specialistou/garantem na ŽP.

- 4.1.3.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit **kompatibilitu nových vnitřních a vnějších částí zabezpečovacího zařízení** se sousedními a stávajícími systémy zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců Objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní dokumentace v souladu s příslušným vnitřním předpisem Objednatele se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před uvedením zařízení do provozu.
- 4.1.3.16 Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů prokazatelné seznámení **s plánem BOZP** Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.
- 4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů v technických funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí a podobenkou, ostatní zaměstnanci Zhotovitele budou na pracovním ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou nebo jménem Zhotovitele nebo Poddodavatele.
- 4.1.3.18 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele a Poddodavatelů, používaných na Staveništi, bude viditelně vyznačena obchodní firma nebo jméno.
- 4.1.3.19 Zhotovitel u provozované činnosti **se zvýšeným/vysokým požárním nebezpečím** (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již před uvedením do provozu / zkušebního provozu.
- 4.1.3.20 Pro přesnou **identifikaci podzemních sítí**, metalických a optických kabelů, kanalizace, vody a plynu budou použity **RFID markery**. Mohou se používat pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů jsou následující:
- Silová zařízení a kabely** (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích zařízení) – **červený marker** [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklapy; rozvodové smyčky.
 - Rozvody vody a jejich zařízení** – **modrý marker** [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.
 - Rozvody plynu a jejich zařízení** – **žlutý marker** [383,0 kHz] trasy potrubí; paty rozvodných sloupců; paty servisních sloupců; křížení, všechny typy ventilů;

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur a spojů.

- d. **Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker** [101,4 kHz] - trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - e. **Zabezpečovací zařízení – fialový marker** [66,35 kHz] - trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení).
 - f. **Odpadní voda – zelený marker** [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů.
- 4.1.3.21 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou).
 - 4.1.3.22 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“.
 - 4.1.3.23 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat ve stejném znění do dokumentace.
 - 4.1.3.24 Informace o použití markerů bude zaznamenána do DSPS.
 - 4.1.3.25 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě markeru.
- 4.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.
 - 4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti **nelze provádět hlučné stavební činnosti v době nočního klidu**. Ve výjimečných případech, nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Zhotovitel zajistí, aby hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního klidu byly před jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce).
 - 4.1.6 **Zhotovitel je povinen vést stavební deník** dle ustanovení v oddílu 1.10.9 TKP STAVEBNÍ DENÍK. Objednatel požaduje typizovanou formu „Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) – smluvní vzor objednatele“. Distribuci typizovaného deníku zajišťuje Správa železnic, s.o. – Technická ústředna dopravní cesty, oddělení ÚATT – oddělení typové dokumentace. Stavební deník je také zveřejněn na internetových stránkách <http://typdok.tudc.cz> pod odkazem stavební deníky.

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele

- 4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) Objednatele XXX (XXX, XXX) o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z

- požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu předání Staveniště.
- 4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-06/2020-GR, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí.
 - 4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsáný v následujících bodech.
 - 4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“). V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele.
 - 4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).
 - 4.2.6 Dostupné podklady uvedené v čl. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy Správy železnic.
 - 4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole.
 - 4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.
 - 4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.
 - 4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.
 - 4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje).
 - 4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).
 - 4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin (epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.

- 4.2.14 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.
- 4.2.15 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na webovém odkazu <https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/zaborovy-elaborat>.

4.3 Doklady překládané zhotovitelem

- 4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci s právníčkou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech.
- 4.3.2 Zhotovitel doloží **mimo jiné** před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění:
- Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou pomocí dat naměřených měřicím zařízením PPK;
 - Oprávnění na provádění svařování kolejnic požadovanou metodou, specifikovanou v soupisu prací.
- 4.3.3 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

- 4.4.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.
- 4.4.2 Zhotovitel zpracuje technologické postupy (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.5 Centrální nákup materiálu

4.5.1 Materiál železničního svršku - CNM-II

- 4.5.1.1 Zadavatel poskytne zhotoviteli bezplatně níže uvedený materiál včetně kódů položek s výčtem příslušných stavebních objektů (SO), které jsou uvedeny v Položkovém rozpočtu soupisu prací s výkazem výměr:

5957201010 Kolejnice užitě tv. S49: SO A.1 (A.1.2), A.2 (A.2.2), A.3 (A.3.2)

4.6 Životní prostředí

4.6.1 Ochrana přírody a krajiny

- 4.6.1.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření dotčených orgánů státní správy.
- 4.6.2 **Nakládání s odpady**
- 4.6.2.1 Zhotovitel předloží TDS nejméně 60 dní před dokončením Díla **Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ SM096**, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy B.2 směrnice SŽ SM096. TDS zajistí kontrolu Závěrečné zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.
- 4.6.2.2 TDS nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání Závěrečné zprávy a Výkazu.
- 4.6.2.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těžného kameniva kolejového lože, výkopových zemin ze stavby a dalších druhotných materiálů, stavebních a demoličních odpadů, kde je v rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných hodnot z provedeného vzorkování v Projektové dokumentaci a realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální využití těžných materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady). Vzorkování bude probíhat dle **Metodického návodu Správy železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů v rámci přípravy a realizace staveb**, který je přílohou B.3 směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání s odpady
- 4.6.2.4 **Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů č. 17) v co největší možné míře recyklovat.** Do procesu recyklace nespadá vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační místa/centra.
- 4.6.2.5 **Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně položky.**
- 4.6.2.6 **Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené v Projektové dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby Objednatele a řízení. o povolení záměru Umístění zařízení k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter.**

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- 5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:
- Při zpracování harmonogramu je nutné dodržet množství a délku předjednaných výluk.
- 5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a termíny:

- termín zahájení a ukončení stavby
 - možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu
 - výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů
- 5.1.3 Zhotovitel se zavazuje považovat uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb.
- 5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Stavební postupy /Etapy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
1. etapa	Zahájení stavby (den předání staveniště)		Předpokládané zahájení 03/2024
2. etapa	Přípravné práce, zařízení staveniště	Bez výluky	Duben 2024
Sekce 1 stavební (3. etapa)	Realizace stavby Oprava staničních kolejí a výhybek	Předpokládané rozsahy a termíny výluk jsou uvedeny v Technické zprávě – D. Přípravné práce	4 měsíce od data zahájení prací
Sekce 2 (4. etapa)	Dokladová část		9 měsíců od data zahájení stavebních prací
	Dokončení Díla		Prosinec 2024 *)

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

- 6.1.1 **Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy Objednatele** (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), **vše v platném znění.**
- 6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a předpisy“ (<https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitri-predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy>) a **<https://typdok.tudc.cz/> v sekci „archiv TD“.**

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

**Správa železnic, státní organizace
Centrum telematiky a diagnostiky
Odbor servisních služeb, OHČ**

Jeremenkova 103/23
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782

Ceníky: <https://typdok.tudc.cz/>

7. PŘÍLOHY

- 7.1.1 Příloha č. 1 ZTP – Technická zpráva + její přílohy (tyto přílohy byly součástí Zadávací dokumentace a tvoří nedílnou součást vyhotovení Smlouvy).

Průvodní (Technická) zpráva

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

**Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
ST Karlovy Vary**

A. Identifikační údaje

<u>Název stavby:</u>	Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb	
<u>Místo stavby:</u>	Trať:	Plzeň – Cheb
	DU/TUDU:	ŽST Cheb/0203 VI
	Výh./SK (pasp. urč.):	A.1 VČ5/SK8, VČ6/SK8, VČ8/SK8 A.2 VČ30/SK3, VČ31/SK3, VČ32/SK3 VČ34/SK7A, VČ35/SK3, VČ37/SK1 A.3 VČ56/SK20, VČ57/SK18, VČ59/SK16 VČ61/SK14
<u>Traťová rychlost:</u>		40-80 km/h
<u>Traťová třída zatížení:</u>		D4/22,5 t
<u>Traťový okrsek:</u>		TO Cheb

Místo vymezení staveniště:

- Místo stavby se nachází na pozemcích ČD, a.s., parcelní číslo 2615/1, 2615/2 (Příloha č. 1 a).
- Přístup na staveniště kolejovou mechanizací je po pozemcích ČD, a.s. a Správy železnic, s.o.
- Skládka a meziskládka ukládaného a vyzískaného materiálu bude na pozemcích ČD, a.s., parcelní číslo 2615/1, 2615/2 (Příloha č. 1a)

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem-ST Karlovy Vary
Nákladní 21, 360 05

Zhotovitel: Stavební práce budou provedeny dodavatelskou činností.

Technický dozor objednatele:

ST Karlovy Vary
VPI ST K. Vary: XXX, tel. XXX

B. Pasportní údaje (viz tištěný pasport)

A.1 TSO výhybek č. 5, 6, 8

Výhybky

- km 454,066 výhybka č. 5 – Obl-j S49 1:12-500(600/272)-L, (SK8)
rychlost → $v = 60/40$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm
- km 454,066 výhybka č. 6 – J S49 1:9 300-P, (SK8)
rychlost → $v = 60/40$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm
- km 454,174 výhybka č. 8 – J S49-1:12-500-P, (SK8)
rychlost → $v = 60/60$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm

A.2 TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Výhybky

- km 454,610 výhybka č. 30 – J S49-1:12-500-L, (SK3)
rychlost → $v = 60/60$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm
- km 454,648 výhybka č. 31 – J S49-1:7,5-190-P, (SK3)
rychlost → $v = 60/40$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm
- km 454,649 výhybka č. 32 – Obl-o S49 1:12-500(2548/622)-L, (SK3)
rychlost → $v = 60/60$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm
- km 454,691 výhybka č. 34 – J S49-1:12-500-L
rychlost → $v = 60/60$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm, (SK7A)
- km 454,698 výhybka č. 35 – Obl-j S49 1:9-300(1350/245)-P, (SK3)
rychlost → $v = 60/40$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm
- km 454,777 výhybka č. 37 – Obl-o S49 1:9-300(995/430)-P, (SK1)
rychlost → $v = 80/40$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm

A.3 TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Výhybky

- km 455,263 výhybka č. 56 – J S49-1:9-300-P, (SK20)
rychlost → $v = 40/50$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm
- km 455,296 výhybka č. 57 – Obl-j S49 1:9-300(2115/263)-P, (SK18)
rychlost → $v = 50/40$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm
- km 455,329 výhybka č. 59 – J S49-1:9-300-P, (SK16)
rychlost → $v = 50/50$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm
- km 455,362 výhybka č. 61 – Obl-j S49 1:9-300(2094/262)-P, (SK14)
rychlost → $v = 50/40$ km/h; převýšení → $D = 0,0$ mm

Geometrické parametry výhybek vč. výběhů nebo přípojných polí budou vyrovnány dle stávajícího pasportního stavu. Zhotovitel si zajistí geodetickou činnost potřebnou k úpravě GPK.

C. Stávající stav

Železniční stanice: je elektrifikovaná

Železniční svršek:

A.1 TSO výhybek č. 5, 6, 8

Výhybky

- **výhybka č. 5**
 - Obl-j S49 1:12-500(600/272)-L, dřevěné pražce, vložena v roce 1996 (nová)
 - dl. = 41,594 m; r.d.v. = 62,391 m
 - Ekoslidle – 6 ks; HZ-EMP, EOv-ano, svařená
- **výhybka č. 6**
 - J S49 1:9 300-P, dřevěné pražce, vložena v roce 1996 (nová)
 - dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,846 m
 - Ekoslidle – 4 ks; HZ-EMP, EOv-ano, svařená
- **výhybka č. 8**
 - J S49-1:12-500-P, dřevěné pražce, vložena v roce 1996 (nová)
 - dl. = 41,594 m; r.d.v. = 62,391 m
 - Ekoslidle – 6 ks; HZ-EMP; EOv-ano, svařená

A.2 TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Výhybky

- **výhybka č. 30**
 - J S49-1:12-500-L, dřevěné pražce, vložena v roce 1996 (nová)
 - dl. = 41,594 m; r.d.v. = 62,391 m
 - Ekoslidle – 6 ks; ČZ-EMP; EOv – ano, svařená
- **výhybka č. 31**
 - J S49-1:7,5-190-P, dřevěné pražce, vložena v roce 1996 (nová)
 - dl. = 25,222 m; r.d.v. = 37,833 m
 - Ekoslidle – 4 ks; ČZ-EMP; EOv-ano, svařená
- **výhybka č. 32**
 - Obl-o S49 1:12-500(2548/622)-L, dřevěné pražce, vložena v roce 1996 (nová)
 - dl. = 41,594 m; r.d.v. = 62,391 m
 - Ekoslidle – 6 ks; ČZ/ČZ-EMP; EOv- ano, svařená
- **výhybka č. 34**
 - J S49-1:12-500-L, dřevěné pražce, vložena v roce 1996 (nová)
 - dl. = 41,594 m; r.d.v. = 62,391 m
 - Ekoslidle – 6 ks; ČZ/ČZ-EMP; EOv – ano, svařená
- **výhybka č. 35**
 - Obl-j S49 1:9-300(1350/245)-P, dřevěné pražce, vložena v roce 1996 (nová)
 - dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,846 m
 - Ekoslidle – 4 ks; ČZ-EMP; EOv – ano, svařená
- **výhybka č. 37**
 - Obl-o S49 1:9-300(995/430)-P, dřevěné pražce, vložena v roce 1996 (nová)
 - dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,846 m
 - Ekoslidle – 4 ks; ČZ-EMP; EOv – ano, svařená

A.3 TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Výhybky

- **výhybka č. 56**
 - J S49-1:9-300-P, dřevěné pražce, vložena v roce 1994 (nová)
 - dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,846 m
 - Ekoslid - 4 ks; HZ-EMP; EOVS - ano, svařená
- **výhybka č. 57**
 - Obl-j S49 1:9-300(2115/263)-P, dřevěné pražce, vložena v roce 1994 (nová)
 - dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,846 m
 - Ekoslid - 4 ks; HZ-EMP; EOVS - ano, svařená
- **výhybka č. 59**
 - J S49-1:9-300-P, dřevěné pražce, vložena v roce 1994 (nová)
 - dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,846 m
 - Ekoslid - 4 ks; HZ-EMP; EOVS - ano, svařená
- **výhybka č. 61**
 - Obl-j S49 1:9-300(2094/262)-P, dřevěné pražce, vložena v roce 1994 (nová)
 - dl. = 33,231 m; r.d.v. = 49,846 m
 - Ekoslid - 4 ks; HZ-EMP; EOVS - ano, svařená

Železniční spodek

Práce na železničním spodku nejsou požadovány.

D. Přípravné práce

Předpokládaná délka výluk:

- A.1 - Nepřetržitá výluka-15 N od 8. 4. do 22. 4. 2024 (výhybka č. 5, 6, 8)
A.2 - Nepřetržitá výluka-30 N od 9. 5. do 7. 6. 2024 (výhybka č. 30, 31, 32, 34, 35, 37)
A.3 - Nepřetržitá výluka-20 N od 12. 7. do 31. 7. 2024 (výhybka č. 56, 57, 59, 61)

Zpracování projektové dokumentace:

Geometrické parametry výhybek vč. výběhů nebo přípojných polí budou vyrovnány dle stávajícího pasportního stavu. Zhotovitel si zajistí geodetickou činnost potřebnou k úpravě GPK.

Laboratorní rozbor kontaminace bude proveden na:

Odpad z čištění kolejového lože.

Vytyčení sítí infrastruktury:

Vyjádření o existenci sítí bude dodáno od zadavatele. Před zahájením prací budou vytyčeny trasy kabelového vedení od správ SSZT, SEE. Vytyčení trasy kabelového vedení společnosti ČD Telematika, a.s. případně jiných vlastníků, ocení a zajistí zhotovitel.

Zpracování harmonogramu:

Zadavatel požaduje na zhotoviteli dodat před zahájením prací harmonogram v tištěném i grafickém provedení.

Oznámení Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ):

Charakter stavebních prací nevyžaduje Ohlášení ani Stavební povolení vydávané DESÚ.

E. Zabezpečení stavby

a) Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy, normy, vyhlášky a zákony:

- zákon 262/2006 Sb., Zákoník práce
- vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ze dne 31. 7. 1990
- TKP staveb státních drah třetí aktualizované vydání – se zapracovanými změnami č. 1 až 12 s účinností od 1. 9. 2018
- Předpisy:
 1. SŽ Bp1-Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací (platnost od 1. 3. 2023)
 2. SŽ Bp3-Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech v prostorách Správy železnic, státní organizace (platnost od 1. 3. 2023)
- zákona č 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- zákonem č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
- zhotovitel při své činnosti musí respektovat a dodržovat uvedené předpisy se zvláštním přihlédnutím k:
 - práci v průjezdném průřezu provozované trati
 - práci ve výškách
- zhotovitel odpovídá za pracovní schopnosti a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků podzhotovitelů, včetně doložení dokladů pro vstup do vyhrazených prostorů Správy železnic, s.o.
- zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinností
- zhotovitel si zajišťuje na vlastní náklady bezpečnostní hlídku, která je povinna řídit se předpisem SŽ Bp1-Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací (platnost od 1. 3. 2023)

b) Likvidace odpadů

- nakládání s odpady během výstavby a při vlastním provozu se bude řídit ustanovením zákona č.185/2001 Sb. o odpadech a dalšími předpisy v odpadovém hospodářství
- původce odpadů musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k negativním dopadům na životní prostředí
- dosavadní likvidace odpadů je prováděna podle programu odpadového hospodářství viz vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb. (příloha č. 1, katalog odpadu) a vyhl. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady

- skládka pro uložení odpadů je vybírána z okolí místa opravné práce (např. Chocovice u Chebu, SAFER – CHODOV, ČINOV u K. Varů, Vrbička u Podbořan)
- v případě, že výzisky zemního materiálu ze strojního čištění vyhoví předepsaným laboratorním rozběrům, zapracují se do stavby (např. bankety, zpevnění cest atd.)
- součástí odevzdané dokumentace bude vyhotovena Závěrečná zpráva odpadového hospodářství stavby vyplývající ze Zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) jednotlivých akcí a ze Směrnice SŽ SM096 pro nakládání s odpady (dále jen „SM096“). Dále bude vyplněn „Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady“ (Příloha č. 1e)

c) Vliv stavby na životní prostředí

- v průběhu výstavby bude okolí stavby zatíženo samotnou stavební činností (hluk, zvýšený pohyb dopravních prostředků apod.). Z hlediska vlivu na životní prostředí lze charakterizovat materiály použité na stavbě jako nezávadné.
- při provozu dokončené stavby nedojde ke změnám v působení stavby na životní prostředí.

d) Požadavky na přípravu a realizaci stavby

- při realizaci stavby nesmí dojít ke střetu se zájmy touto stavbou dotčených organizací a fyzických osob
- při provádění terénních úprav drážního tělesa nesmí dojít k zásahu na sousední pozemky, které nejsou ve vlastnictví Správy železnic, s.o. (v kritických místech je nutno tyto hranice případně vytyčit)
- při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození stávajících inženýrských sítí a znečištění přemostované překážky (vodoteče, komunikace, trati apod.)
- zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení realizační dokumentaci, která bude zpracována v souladu s TKP staveb státních drah, TPD, OTP, ČSN, TN, vyhlášek a zákonů v platném znění.
- při akci je třeba minimalizovat nároky na rozsah zařízení staveniště pouze na pozemek dráhy. Případné využití okolních mimodrážních pozemků a přístupových komunikací si projedná a zajistí zhotovitel stavby.

e) Požadavky na zajištění geodetických činností při přípravě a realizaci stavby

- zhotovitel zajistí, že veškerá geodetická činnost při přípravě a realizaci stavby bude provedena na základě předložené geodetické dokumentace, která bude vyhotovena v soustavě ŽBP poskytnuta správcem SŽG Praha, prostřednictvím jmenovaného AZI investora, Ing. Roman Poustka, kontakt. údaje: tel. 972 524 657, 724 986 116, email: poustka@spravazeleznic.cz.
- v průběhu provádění geodetických činností bude postupováno dle stanovených metodických pokynů pro jednotlivé geodetické činnosti. V průběhu realizace stavby musí být chráněny měřické body ŽBP, v případě jejich možného ohrožení bude konzultováno se správcem ŽBP.

f) Požadavky na evidenci a kontrolu překážek prostorové průchodnosti tratí

- Všeobecně budou překážky evidovány a kontrolovány dle Předpisu SŽ S11 Prostorová průchodnost tratí.
- Zadavatel předá zhotoviteli evidenční seznam překážek. Zhotovitel zajistí jejich kontrolu před a po opravné práci orientačním ručním měřením, které bude doloženo při přejímce prací.

g) Bezстыková kolej – zhotovení svarů a zřízení bezстыkové koleje ve výhybkách.

- Všeobecně bude bezстыková kolej zřízena dle postupu prací určených Předpisem SŽDC S 3/2 Bezстыková kolej.
- Zhotovitel bezстыkové koleje musí v rámci technologické přípravy vyhotovit návrh "Schématu zřizování BK – opravy vad a lomů v BK" (podle vzoru v Předpisu SŽDC S3/2 – příloha č. 6). Tento návrh musí projednat s určeným zaměstnancem Správy tratí před zahájením prací. Při projednání návrhu musí být dohodnut i způsob navázání na stávající bezстыkovou kolej. Upínací teplota navazující bezстыkové koleje se upraví shodně s nově zřizovanou bezстыkovou kolejí na délce nejméně 50 m.
- Svařování montážních svarů v koleji smí být zahájeno za podmínky, že směrová a výšková poloha koleje umožňuje zhotovit svar stanovené geometrie a byla ověřena SŽG Plzeň.
- Svařování závěrných svarů při zřizování bezстыkové koleje smí být zahájeno až po písemném potvrzení vyhovujícího stavu svršku zhotovitelem stavby do stavebního deníku vč. překontrolování kolejového lože do předepsaného profilu. Dále musí být vyhotoveno kontrolní měření prostorové polohy koleje. Při přejímce musí zhotovitel bezстыkové koleje prokázat zachování směrové polohy koleje před svařováním závěrných svarů a před předáním bezстыkové koleje (viz Příloha č. 1c – Dokumentace provedených prací).
- U provádění závěrných svarů bude vždy přítomen VPST Cheb pan Jiří Kubalík – tel: 724 960 829.

F. Obecně platné podmínky

Jednotlivé soupisy prací jsou rozděleny do stavebních objektů, vždy s odkazem na jednu cenovou soustavu. Základní soupisy prací jsou oceněné na základě **Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury pro rok 2024 (ze dne 14. 11. 2023)** s účinností od 1. 1. 2024. Součástí sborníku jsou „Pravidla (metodika) pro použití Sborníku“ včetně veškerých nákladů obsažených ve výkonu (**obsah cen**). Soupisy prací, které nejsou obsaženy v tomto Sborníku, jsou vybrány z cenové soustavy **URS Praha 2024 01**.

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník. Objednatel požaduje typizovanou formu „Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) – smluvní vzor objednatele“. Distribuci typizovaného deníku zajišťuje Správa železnic, s.o. – Technická ústředna dopravní cesty, oddělení ÚATT – oddělení typové dokumentace. Stavební deník je také zveřejněn na internetových stránkách <http://typdok.tudc.cz> pod odkazem stavební deníky.

Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují čitelně a musí být podepsány vedoucím prací (popř. jeho zástupcem) zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Provádí se minimálně ve dvou vyhotoveních.

Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během provádění stavby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy budou odstraněny všechny vady a nedodělky.

Originály stavebních deníků předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí díla.

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků i pracovníků podzhotovitelů. Všichni tito pracovníci musí dodržovat znění předpisu SŽ Bp1. Přepis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dále se řídí ustanovením zákona č 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Zhotovitel odpovídá za pracovní schopnosti a zdravotní způsobilost všech svých pracovníků i pracovníků podzhotovitelů, včetně doložení dokladů pro vstup do vyhrazených prostorů Správy železnic, s.o. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu, která vznikne objednateli při nedodržení výše uvedených povinností.

G. Soupis vlastních stavebních prací

Přípravné práce

Před zahájením vlastních opravných prací budou vytyčeny inženýrské sítě a místy odpojeno ukolejnění a demontovány snímací body počítačů náprav.

Budou odpojeny a demontovány elektromotorické přestavníky. Z výhybek č.30, 31, 32, 34, 35 a 37 budou demontovány čelistové závěry a z výhybek č.5, 6, 8, 56, 57, 59 a 61 budou demontovány hákové závěry.

Z výhybek budou demontovány kompletní topné soupravy elektrických ohřevů výhybek a budou demontovány válečkové stoličky.

Práce na výhybkách

A.1 TSO výhybek č. 5, 6, 8

Výhybka č. 5:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m a betonových pražců vystrojených. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovací v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovací v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 5 - dlouhé společné pražce – 4,3 m x 2 + 4,4 m x 2 + 4,5 m x 2
- KV č. 5 (sp 5-4) - 5 ks pražce příčné + 29 ks pražce betonové B91S/2 vystrojené
- KV č. 5 (sp 5-102) – 11 ks pražce příčné

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 5 (sp 5-4) - 10 ks pražce příčné
- KV č. 5 (sp 5-102) – 11 ks pražce příčné


Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí, budou vyměněny kolejnice v přípojných polích s kombinací s posuny kolejnic:

Výměna výhybkových součástí:

- Středová kolejnice přímá - L vnitřní – 15,1 m; P vnější – 15,1 m
- Středová kolejnice ohnutá - L vnější – 5,0 m (vločka); P vnitřní – 18,2 m

Výměna kolejnic a posuny kolejnic:

- KV č. 5 (sp 5-4) Lp, Pp – 5,0 m x 2 (vločka) + posun 16,8 m

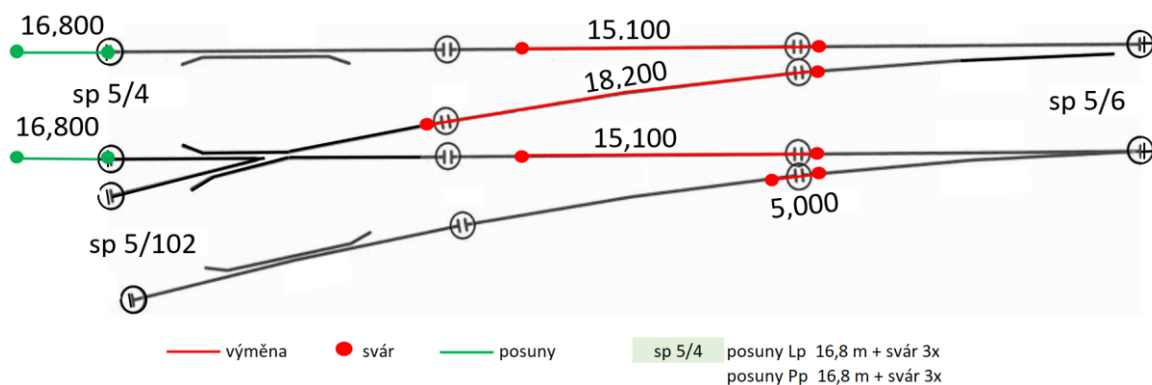

Výhybka č. 6:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m a betonových pražců vystrojených. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovací v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovací v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 6 - dlouhé společné pražce – 4,4 m x 1 + 4,5 m x 3 + 4,6 m x 1
- KV č. 6 (sp 6-8) - 4 ks pražce příčné + 108 ks pražce betonové B91S/2 vystrojené
- KV č. 6 (sp 5-107) – 22 ks pražce příčné

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 6 (sp 6-8) - 4 ks pražce příčné
- KV č. 6 (sp 6-107) – 13 ks pražce příčné


Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí, budou vyměněny kolejnice v přípojných polích s kombinací s posuny kolejnic:

Výměna výhybkových součástí:

- Středová kolejnice přímá - P vnitřní – 12,4 m; L vnější – 13,3 m
- Středová kolejnice ohnutá - P vnější – 8,5 m
- Přídržnice ohnutá + přímá – 4,5 m x 2

Výměna kolejnic a posuny kolejnic:

- KV č. 6 (sp 6-8) Lp, Pp – 5,0 m x 2 (vločka) + posun 72,0 m
- KV č. 6 (sp 6-107) Lp, Pp – 5,0 m x 2 (vločka) + posun 25,0 m
- KV č. 6 (sp 6/5) Pp – 2,0 m x 2 (vločka)

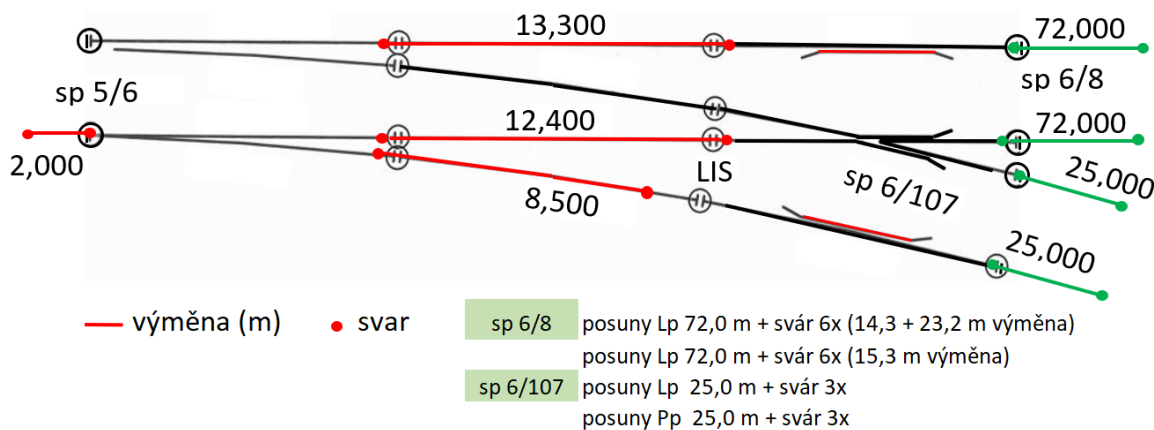

Výhybka č. 8:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m a betonových pražců vystrojených. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovací v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovací v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 8 - dlouhé společné pražce – 4,3 m x 2 + 4,4 m x 2 + 4,5 m x 2
- KV č. 8 (sp 8-11) - 10 ks pražce příčné
- KV č. 8 (sp 8-15) – 12 ks pražce příčné + 60 ks pražce betonové B91S/2 vystrojené

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 8 (sp 8-11) - 10 ks pražce příčné
- KV č. 8 (sp 8-15) – 12 ks pražce příčné

Ve výhybce bude provedena regenerace a výměna ocelových součástí, budou vyměněny kolejnice v přípojných polích s kombinací s posuny kolejnic:

Výměna výhybkových součástí:


- Jazyk L, P – 13,800 m x 2
- Opornice L, P – 15,886 m x 2

Navaření srdcovky:

- Srdcovka J S49-1:12-500-P

Výměna kolejnic a posuny kolejnic:

- KV č. 8 (sp 8-11) Lp, Pp – 6,8 m + LIS 2,7 m (nová poloha – o 0,65 m blíž k výhybce)
- KV č. 8 (sp 8-15) Lp, Pp – 6,0 m x 2 (vločka) + posun 93,0 m

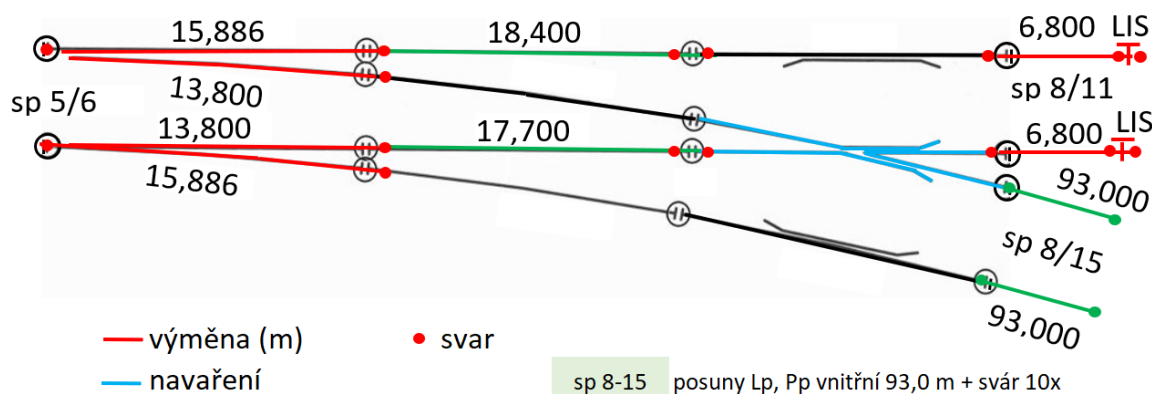

A.2 TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Výhybka č. 30:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m a betonových pražců vystrojených. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovací v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovací v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 30 - dlouhé společné pražce – 4,3 m x 2 + 4,4 m x 2 + 4,5 m x 2
- KV č. 30 (sp 30-25) - 21 ks pražce příčné
- KV č. 30 (sp 30-13) – 19 ks pražce příčné + 300 ks pražce betonové B91S/2 vystrojené
- ZV č. 30 (sp 30-31) - 17 ks pražce příčné

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 30 (sp 30-25) - 10 ks pražce příčné
- KV č. 30 (sp 30-13) – 10 ks pražce příčné


Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí, budou vyměněny kolejnice v přípojných polích s kombinací s posuny kolejnic:

Výměna výhybkových součástí:

- Středová kolejnice přímá - L vnitřní – 19,1 m; P vnější – 19,1 m
- Středová kolejnice ohnutá - L vnější – 19,1 m; P vnitřní – 19,1 m
- Přídržnice ohnutá 5,5 m x 1

Výměna kolejnic a posuny kolejnic:

- KV č. 30 (sp 30-25) Lp, Pp – LIS 4,6 m
- KV č. 30 (sp 30-13) Lp, Pp – 7,0 m x 2 (vločka) + posun 170,0 m
- ZV č. 30 (sp 30-31) Lp, Pp – 13,5 x 2 m

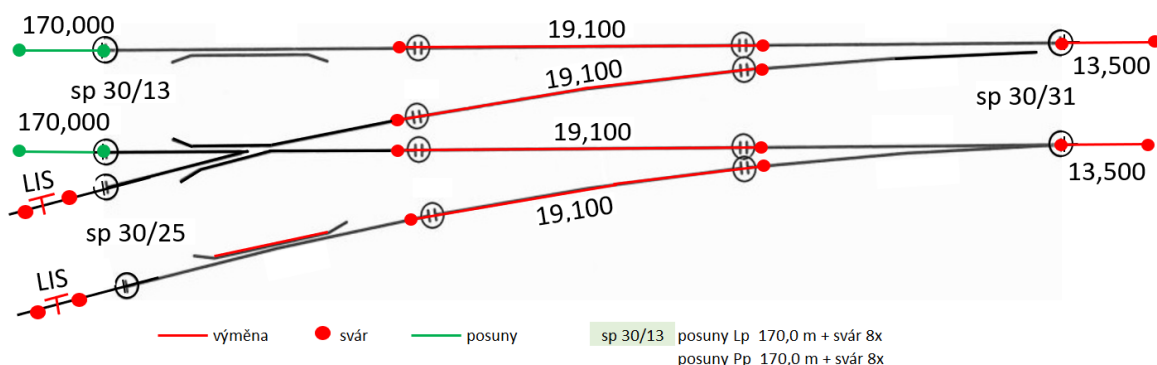

Výhybka č. 31:


Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovadla v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovadla v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 31 - dlouhé společné pražce – 4,2 m x 2 + 4,3 m x 2 + 4,4 m x 1

Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí:

Výměna výhybkových součástí:

- Srdcovka J S49-1:7,5-190 - P

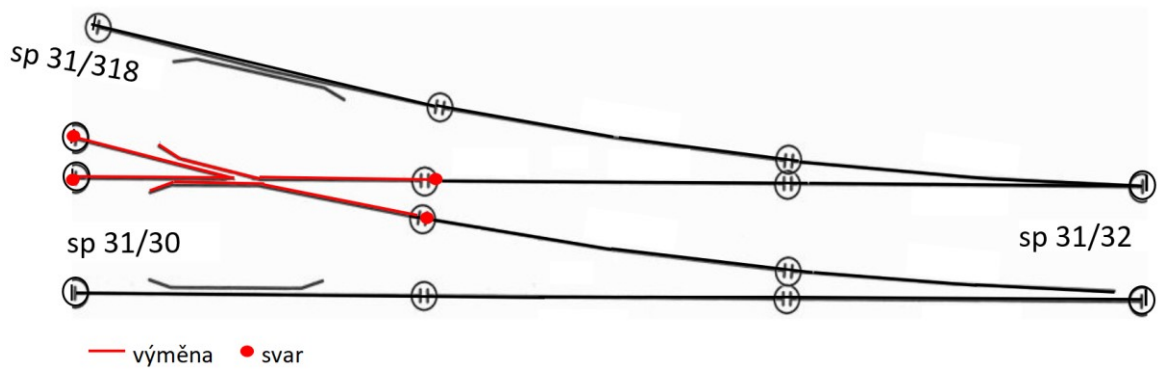

Výhybka č. 32:


Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovadla v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovadla v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 32 - dlouhé společné pražce – 4,3 m x 2 + 4,4 m x 2

Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí:

Výměna výhybkových součástí:

- Srdcovka Obl-o S49-1:12-500(2548/622) - L
- Kolejnice u přídržnice přímá - P vnější - 14,8 m
- Kolejnice u přídržnice ohnutá - L vnější - 9,8 m
- Přídržnice ohnutá 5,5 m x 1

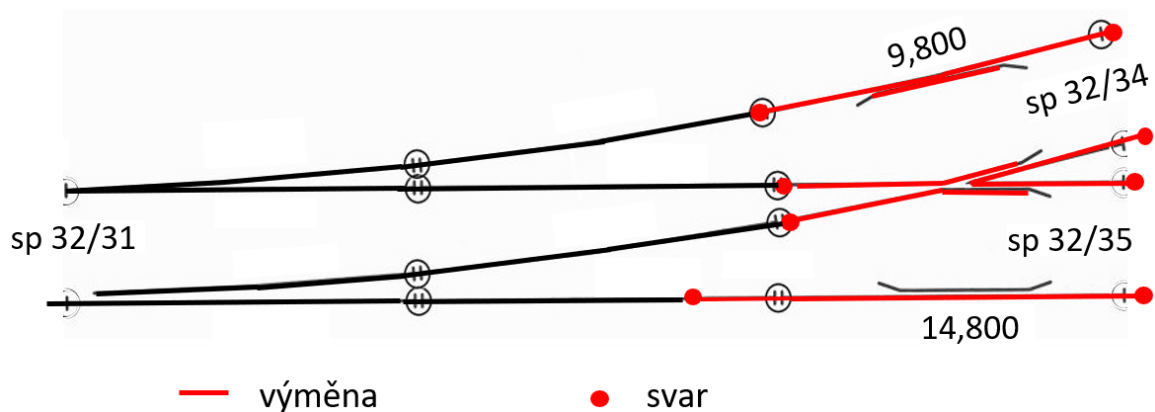

Výhybka č. 34:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m a betonových pražců vystrojených. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovací v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovací v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 34 - dlouhé společné pražce – 4,3 m x 2 + 4,4 m x 2 + 4,5 m x 1
- KV č. 34 (sp 34-36) - 8 ks pražce příčné
- KV č. 34 (sp 34-7a) - 11 ks pražce příčné + 300 ks pražce betonové B91S/2 vystrojené


Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 34 (sp 34-36) - 5 ks pražce příčné
- KV č. 34 (sp 34-7a) - 9 ks pražce příčné

Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí, v místech s nevyhovujícím svary budou svary vyřezány a budou provedeny posuny kolejnic:

Výměna výhybkových součástí nebo posuny:

- Srdcovka J S49-1:12-500 - L
- Středová kolejnice ohnutá - L vnější - 18,8 m; P vnitřní - 18,8 m
- Středová kolejnice přímá - L vnitřní - posun 17,4 m
- Středová kolejnice přímá - P vnější - posun 17,4 m + výměna u přídrž. 9,7 m
- Přídržnice ohnutá 5,5 m x 1

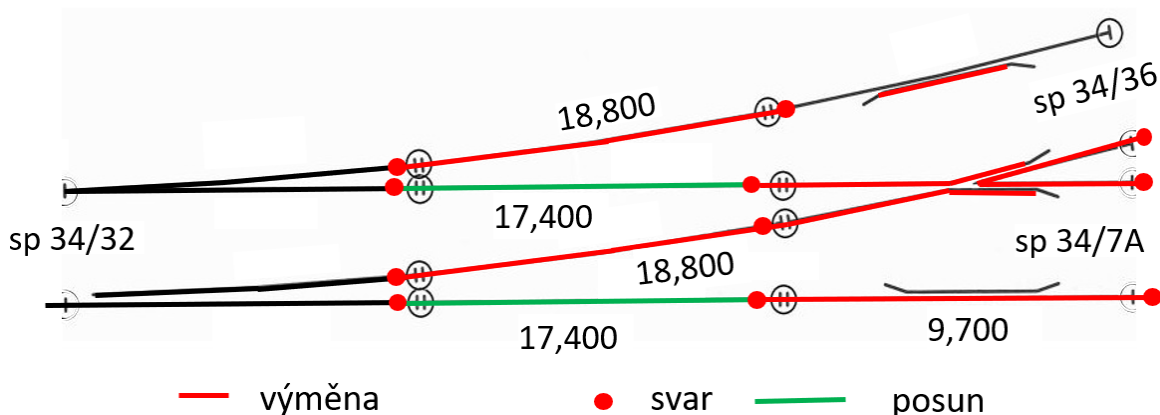

Výhybka č. 35:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m a betonových pražců vystrojených. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovací v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovací v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 35 - dlouhé společné pražce – 4,4 m x 1 + 4,5 m x 2 + 4,6 m x 1
- KV č. 35 (sp 35-3SK) - 9 ks pražce příčné + 28 ks pražce betonové B91S/2 vystrojené
- KV č. 35 (sp 35-37) - 10 ks pražce příčné

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 35 (sp 35-3SK) - 9 ks pražce příčné
- KV č. 35 (sp 35-37) - 10 ks pražce příčné


Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí, budou vyměněny kolejnice v přípojných polích s kombinací s posuny kolejnic:

Výměna výhybkových součástí:

- Srdcovka Obl-j S49-1:9-300(1350/245) - P
- Středová kolejnice přímá - P vnitřní - 11,7 m
- Středová kolejnice přímá - L vnější 12,7 m + u přídržnice 9,0 m
- Středová kolejnice ohnutá - P vnější 12,7 m + u přídržnice 6,4 m

Výměna kolejnic a posuny kolejnic:

- KV č. 35 (sp 35-3SK) Lp, Pp - 2,0 m + posun 13,0 m
- KV č. 35 (sp 35-37) Lp, Pp - LIS 2,7 m

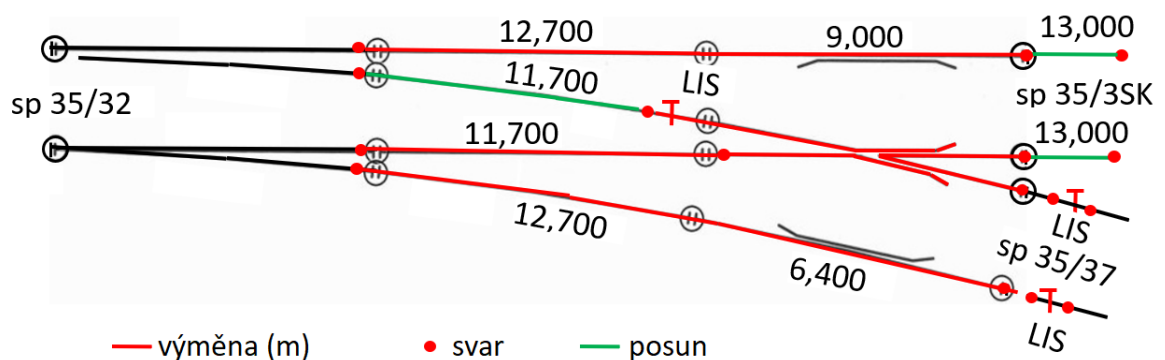

Výhybka č. 37:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m a betonových pražců vystrojených. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejiwo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovadla v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovadla v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 37 - dlouhé společné pražce - 4,4 m x 1 + 4,5 m x 2 + 4,6 m x 1
- KV č. 37 (sp 37-25) - 8 ks pražce příčné + 292 ks pražce betonové B91S/2 vystrojené

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 37 (sp 37-25) - 7 ks pražce příčné


Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí, v místech s nevyhovujícím svary budou svary vyřezány a budou provedeny posuny kolejnic:

Výměna výhybkových součástí:

- Středová kolejnice přímá - L vnější - 13,0 m; P vnitřní - 12,2 m
- Středová kolejnice ohnutá - L vnitřní - posun 11,1 m + LIS 2,7 m
- Středová kolejnice ohnutá - P vnější - LIS 2,7 m + posun 20,0 m (přídr. kol.) + LIS 2,7 m

Výměna kolejnic a posuny kolejnic:

- KV č. 37 (sp 37-35) Lp – posun 12,6 m + LIS 2,7 m

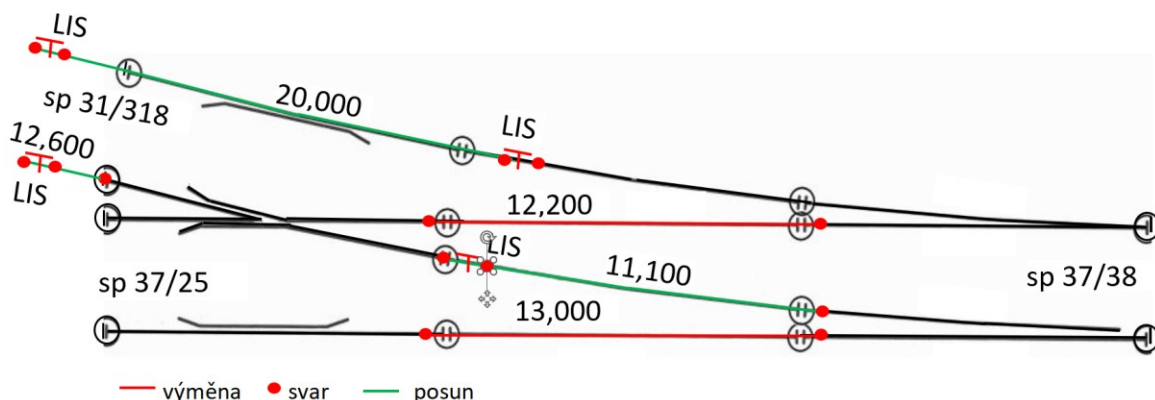

A.3 TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Výhybka č. 56:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovací v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovací v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 56 - dlouhé společné pražce – 4,4 m x 1 + 4,5 m x 3
- KV č. 56 (sp 56-55) - 3 ks pražce příčné
- KV č. 56 (sp 56-SK20) – 37 ks pražce příčné

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 56 (sp 56-55) - 3 ks pražce příčné
- KV č. 56 (sp 56-SK20) – 6 ks pražce příčné


Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí:

Výměna výhybkových součástí:

- Jazyk L – 12,025 m
- Opornice L – 13,607 m
- Středová kolejnice přímá - P vnitřní – 13,0 m
- Přídržnice ohnutá 5,5 m x 1

Výměna kolejnic:

- KV č. 56 (sp 56-SK20) Lp, Pp – 5,0 x 2

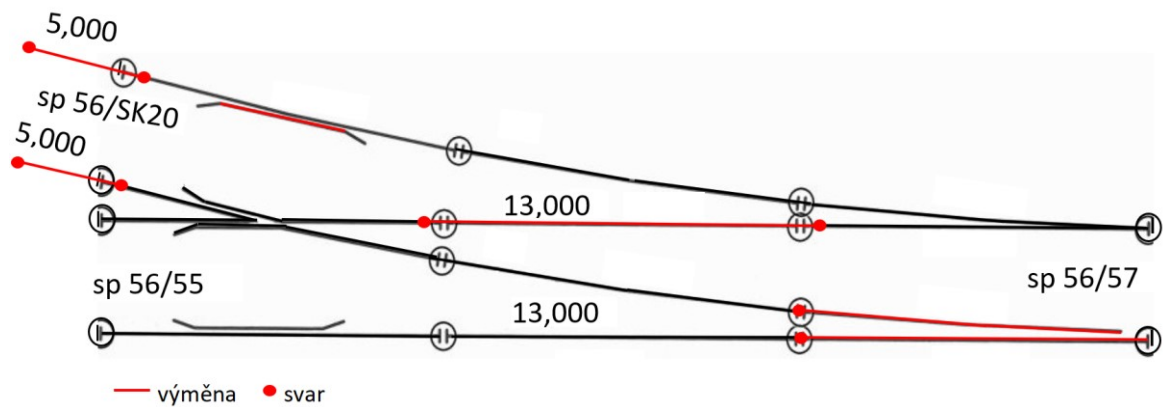

Výhybka č. 57:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovadla v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovadla v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 57 - dlouhé společné pražce – 4,4 m x 1 + 4,5 m x 2
- KV č. 57 (sp 57-SK18) - 37 ks pražce příčné

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 57 (sp 57-SK18) - 10 ks pražce příčné


Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí:

Výměna výhybkových součástí:

- Středová kolejnice ohnutá - L vnitřní – 10,0 m
- Středová kolejnice přímá - P vnitřní – 10,0 m

Výměna kolejnic:

- KV č. 57 (sp 57-SK18) Lp, Pp – 5,0 x 2

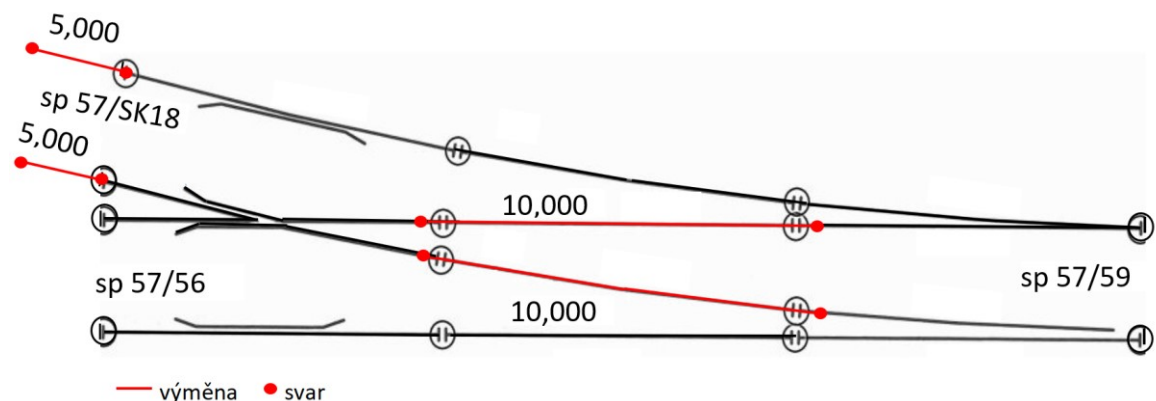

Výhybka č. 59:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovací v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovací v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 59 - dlouhé společné pražce – 4,4 m x 1 + 4,5 m x 3
- KV č. 59 (sp 59-SK16) - 37 ks pražce příčné

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 59 (sp 59-SK16) - 37 ks pražce příčné


Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí:

Výměna výhybkových součástí:

- Středová kolejnice ohnutá - L vnitřní – 14,7 m

Výměna kolejnic:

- KV č. 59 (sp 59-SK16) Lp, Pp – 5,0 x 2

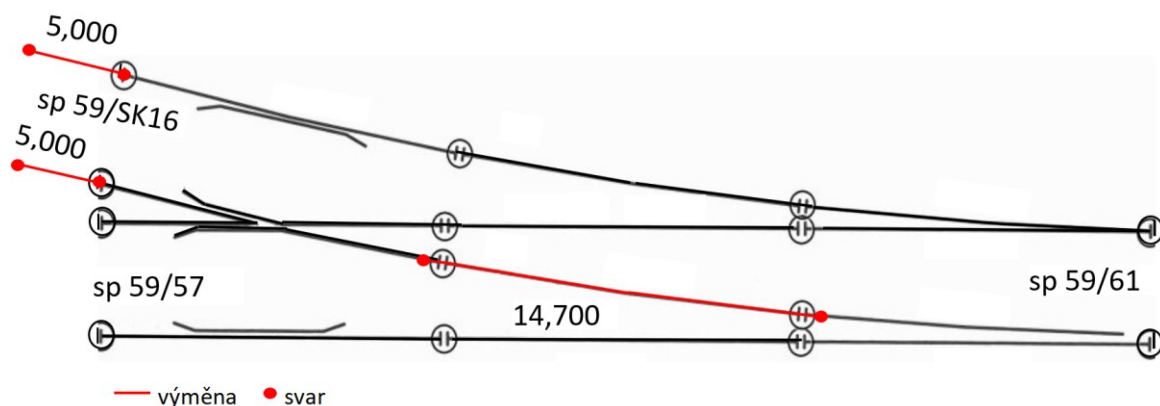

Výhybka č. 61:

Ve výhybce budou postupně vyměněny nové dřevěné výhybkové a dlouhé společné pražce, na výhybku bude navázáno s výměnou dřevěných příčných pražců v dl. 2,6 m. Dřevěné pražce budou dodány nevystrojené, drobné kolejivo bude použito nové (vrtule R1+R2, dvoj. pruž. kroužky a PVC). Na výhybkových podkladnicích budou vyměněna upevňovací v kompletech ŽS4 s pryž. podložkami a upevňovací v kompletech V2T (příp. šr. T10):

- Sada dle montážního plánu
- KV č. 61 - dlouhé společné pražce – 4,4 m x 1 + 4,5 m x 3
- KV č. 61 (sp 61-65) - 2 ks pražce příčné
- KV č. 61 (sp 61-SK14) - 39 ks pražce příčné

Z důvodu zachování rozdělení a skladby uložení pražců budou pražce zkráceny zařezáním s osazením protištěpné mřížky.

- KV č. 61 (sp 61-SK14) - 13 ks pražce příčné


Ve výhybce bude provedena výměna ocelových součástí:

Výměna výhybkových součástí:

- Středová kolejnice ohnutá - L vnitřní – 13,7 m
- Středová kolejnice ohnutá - P vnitřní – 13,7 m

Výměna kolejnic a posuny kolejnic:

- KV č. 61 (sp 61-SK14) Lp, Pp – 5,8 x 2 + posun 24,2 m

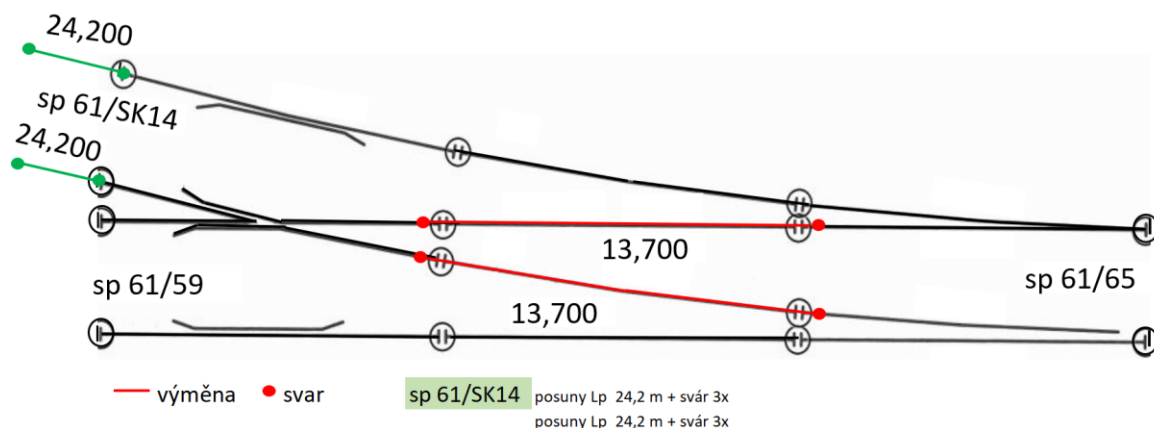

Souhrnné výkony

Společně s výměnou výhybkových a příčných pražců bude odstraněno kolejové lože do hl. 0,20 m pod ložnou plochou pražců. Veškerý vytěžený materiál z kolejového lože bude v místě opravné práce recyklován mobilní recyklační linkou a výzisk (předpoklad 50 %) bude zabudován zpět do stavby, jako podkladní a vyrovnávací vrstva. Zbýlý odpad bude odvezen na nejbližší skládku. Při nakládání se zemními odpady bude postupováno dle výše uvedeného článku v kap. E. Zabezpečení stavby, čl. b) Likvidace odpadů čištění.

Do výhybek a v místech výměny příčných pražců bude doplněn nový štěrk fr. 31,5/63 BI. Pomocí strojní podbíječky ASPv budou ve všech výhybkách včetně výběhů a přípojných polí upraveny geometrické parametry.

Ve výhybkách bude po provedení prací na železničním svršku zřízena bezстыková kolej. Zhotovení svarů a zřízení bezстыkové koleje ve výhybkách (dle zadaných podmínek uvedených v kap. E. Zabezpečení stavby, čl. f) Bezстыková kolej.

Vzhledem k tomu, že výhybky budou svařeny do bezстыkové koleje, musí být na všech výhybkách osazeny na jazyky a opornice zádržné opěrky proti putování (zámky). Zajišťují rámovou a konstrukční tuhost výhybek, díky tomu nedochází při změnách teplot k podélným posunům výhybkových ocelových součástí. Před přivařením jazyka ve výhybce vevařené v bezстыkové koleji musí být nastaven hrot jazyka proti montážní značce na opornici (osa otvoru) v závislosti na teplotě kolejnic a velikosti smršštění svaru (podle Předpisu SŽDC S3/2 – příloha č. 5).

Dokončovací práce

Po ukončení vlastních opravných prací budou připojeny snímací body počítačů náprav.

Budou připojeny a namontovány elektromotorické přestavníky. Na výhybky č.30, 31, 32, 34, 35 a 37 budou namontovány čelistové závěry a na výhybky č.5, 6, 8, 56, 57, 59 a 61 budou namontovány hákové závěry.

Na výhybky budou namontovány kompletní topné soupravy elektrických ohřevů výhybek a budou namontovány válečkové stoličky.

H. Dokončovací práce

Součástí převzetí prací bude předložení dokladů potřebných k ukončení výluky a stavebních prací, dle přiloženého soupisu dokladů (viz Příloha č. 1c – Dokumentace provedených prací). Jedná se o soubor TBZ, **bod č. 9 a, b, c, e, g, h.**

CH. Předání a převzetí díla

V rámci přejímacího řízení je zhotovitel povinen doložit nezbytnou dokumentaci dle přiloženého soupisu dokladů (viz Příloha č. 1c – Dokumentace provedených prací).

Jedná se o soubor PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, **bod č. 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 a 23.**

Seznam příloh:

- Příloha č. 1a** – katastrální mapa + výpis vlastnictví majitele pozemku stavby a skládky, meziskládky
- Příloha č. 1b** – Pasport PŽSv
- Příloha č. 1c** – Dokumentace provedených prací
- Příloha č. 1d** – Pasport překážek
- Příloha č. 1e** – Výkaz o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpad
- Příloha č. 1f** – Vyjádření o existenci sítí

Termín plnění: duben–prosinec 2024

V Karlových Varech 29. ledna 2024

XXX
přednosta ST Karlovy Vary

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

- neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

Do přílohy Smlouvy vložen Položkový soupis prací s výkazem výměr předložený v nabídce účastníka.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 120124
Stavba: Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

KSO:
Místo: ŽST Cheb

CC-CZ:
Datum: 08.03.2024

Zadavatel:
Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

IČ: 02765055
DIČ: CZ02765055

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Monika Roztočilová, DiS.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **19 857 633,18**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	19 857 633,18	4 170 102,97
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **24 027 736,15** **v CZK**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 120124

Stavba: Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Místo: ŽST Cheb

Datum: 08.03.2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová,
DiS.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

19 857 633,18 **24 027 736,15**

A.1	TSO výhybek č. 5, 6, 8	4 752 663,29	5 750 722,58
A.1.1	Práce na ŽSv	4 250 003,85	5 142 504,66
A.1.2	Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00
A.1.3	Práce SSZT a SEE	502 659,44	608 217,92
A.2	TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37	10 983 676,44	13 290 248,49
A.2.1	Práce na ŽSv	10 020 106,72	12 124 329,13
A.2.2	Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00
A.2.3	Práce SSZT a SEE	963 569,72	1 165 919,36
A.3	TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61	3 693 634,91	4 469 298,24
A.3.1	Práce na ŽSv	3 138 234,11	3 797 263,27
A.3.2	Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00
A.3.3	Práce SSZT a SEE	555 400,80	672 034,97
A.4	VON	427 658,54	517 466,83

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8

Soupis:

A.1.1 - Práce na ŽSv

KSO:

Místo: ŽST Cheb

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8

Soupis:

A.1.1 - Práce na ŽSv

Místo: ŽST Cheb

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Monika
Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8

Soupis:

A.1.1 - Práce na ŽSv

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ5" 6		6,000			
	VV		"VČ6" 4		4,000			
	VV		"VČ8" 6		6,000			
	VV		Součet		16,000			
2	K	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ5" 6		6,000			
	VV		"VČ6" 4		4,000			
	VV		"VČ8" 6		6,000			
	VV		Součet		16,000			
3	K	5911005310	Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ5" 6		6,000			
	VV		"VČ6" 4		4,000			
	VV		"VČ8" 6		6,000			
	VV		Součet		16,000			
4	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
	VV		"VČ5" 1		1,000			
	VV		"VČ6" 1		1,000			
	VV		"VČ8" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
5	K	5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
	VV		"VČ5" 1		1,000			
	VV		"VČ6" 1		1,000			
	VV		"VČ8" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
6	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvihu, rozveření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opornicí v místě první hákové stěžečky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
	VV		"VČ5" 1		1,000			
	VV		"VČ6" 1		1,000			
	VV		"VČ8" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	5910135010	Demontáž pražcové kotvy v koleji	kus	17,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.					
	VV		"VČ5 (sp 4-5)" 17		17,000			
58	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	17,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž pražcové kotvy v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ5 (sp 4-5)" 17		17,000			
7	K	5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	98,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce: dle montážního plánu Pražec=kus</i>					
	VV		VČ5					
	VV		"04-01" 4		4,000			
	VV		"2-33" 32		32,000			
	VV		VČ6					
	VV		"03-01" 3		3,000			
	VV		"2-25" 24		24,000			
	VV		VČ8					
	VV		"03-01" 3		3,000			
	VV		"2-33" 32		32,000			
	VV		Součet		98,000			
8	K	5906035040	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	83,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>					
	VV		VČ5					
	VV		"34-63" 30		30,000			
	VV		VČ6					
	VV		"26-48" 23		23,000			
	VV		VČ8					
	VV		"34-63" 30		30,000			
	VV		Součet		83,000			
9	K	5906035050	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	42,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>					
	VV		VČ5					
	VV		"1, 64-70, 71-76 (dl. spol.)" 1+7+6		14,000			
	VV		VČ6					
	VV		"1, 49-55, 56-61 (dl. spol.)" 1+7+6		14,000			
	VV		VČ8					
	VV		"1, 64-70, 71-76 (dl. spol.)" 1+7+6		14,000			
	VV		Součet		42,000			
10	K	5906035010	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	64,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>					
	VV		"KV5 (sp 5-4)" 5		5,000			
	VV		"KV5 (sp 5-102)" 11		11,000			
	VV		"KV6 (sp 6-8)" 4		4,000			
	VV		"KV6 (sp 6-107)" 22		22,000			
	VV		"KV8 (sp 8-15)" 12		12,000			
	VV		"KV8 (sp 8-11)" 10		10,000			
	VV		Součet		64,000			
11	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	69,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zkrácení dřevěného pražce odřezáním Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem včetně impregnačního materiálu a osazení mřížky.					
	VV		"KV5 (sp 5-4)" 5*2		10,000			
	VV		"KV5 (sp 5-102)" 11		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "KV6 (sp 6-8)" 4		4,000			
			VV "KV6 (sp 6-107)" 22		22,000			
			VV "KV8 (sp 8-15)" 12		12,000			
			VV "KV8 (sp 8-11)" 10		10,000			
			VV Součet		69,000			
12	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čišťením KL pražce betonové příčné vystrojené	kus	197,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čišťením KL pražce betonové příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		Poznámka k položce: Pražce betonové B91S vystrojené					
	VV		"KV5 (sp 5-4)" 29		29,000			
	VV		"KV6 (sp 6-8)" 108		108,000			
	VV		"KV8 (sp 8-15)" 60		60,000			
	VV		Součet		197,000			
13	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	258,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		Poznámka k položce: Výměna kompl. ŽS4 a pryž. podložky Pražec=kus					
	VV		"ve VČ5 + dř. příč. pražce" 68+16		84,000			
	VV		"ve VČ6 + dř. příč. pražce" 59+26		85,000			
	VV		"ve VČ8 + dř. příč. pražce" 67+22		89,000			
	VV		Součet		258,000			
14	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	70,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		Poznámka k položce: Výměna kompl. V2T (sř. T10) Pražec=kus					
	VV		"VČ5" 27		27,000			
	VV		"VČ6" 16		16,000			
	VV		"VČ8" 27		27,000			
	VV		Součet		70,000			
15	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	194,121		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výtisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ5" (62,39+4+4)*3,2*0,35 - (9,047+1,025) "pražce"		68,765			
	VV		"VČ6" (49,85+4+4)*3,2*0,35 - (7,168+1,033) "pražce"		56,591			
	VV		"VČ8" (62,39+4+4)*3,2*0,35 - (9,047+1,025) "pražce"		68,765			
	VV		Součet		194,121			
16	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	142,076		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výtisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	VV		"KV5 (sp 5-4)" 3,0*3,5*0,35 - 0,505 "dř. pr."		3,170			
	VV		"KV5 (sp 5-102)" 7,0*3,5*0,35 - 1,111 "dř. pr."		7,464			
	VV		"KV5 (sp 5-4)" 19,0*3,5*0,35 - 3,045 "B91S"		20,230			
	VV		"KV6 (sp 6-8)" 3,0*3,5*0,35 - 0,404 "dř. pr."		3,271			
	VV		"KV6 (sp 6-8)" 71,0*3,5*0,35 - 11,340 "B91S"		75,635			
	VV		"KV6 (sp 6-107)" 15,0*3,5*0,35 - 2,222 "dř. pr."		16,153			
	VV		"KV8 (sp 8-15)" 8,0*3,5*0,35 - 1,212 "dř. pr."		8,588			
	VV		"KV8 (sp 8-11)" 7,0*3,5*0,35 - 1,010 "dř. pr."		7,565			
	VV		Součet		142,076			
17	K	5911011020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	59,372		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovačů, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovačů, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		Poznámka k položce: - jazyky a opornice s prodloužením Délka jazyků + opornic=m					
	VV		"VČ8 - jazyk" 13,8*2		27,600			
	VV		"VČ8 - opornice" 15,886*2		31,772			
	VV		Součet		59,372			
20	K	5911059020	oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	51,650		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> úprava polohy jazyka					
	VV		Délka jazyka=m					
	VV		"VČ5" 13,8*2		27,600			
	VV		"VČ6" 12,025*2		24,050			
	VV		Součet		51,650			
18	K	5911060030	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49	m	60,900		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=metr					
	VV		"VČ5 - L vnitřní" 15,1		15,100			
	VV		"VČ5 - P vnější" 15,1		15,100			
	VV		"VČ6 - L vnější" 13,3		13,300			
	VV		"VČ6 - P vnitřní" 12,4		12,400			
	VV		"VČ8 - L vnější" 5,0 "posun + vložka před přídrž. kolejnicí		5,000			
	VV		Součet		60,900			
19	K	5911060130	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49	m	31,700		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=metr					
	VV		"VČ5 - L vnější" 5,0 "vložka za jazykem"		5,000			
	VV		"VČ5 - P vnitřní" 18,2		18,200			
	VV		"VČ6 - P vnější" 8,5		8,500			
	VV		Součet		31,700			
23	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	413,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> posuny + vložky Metr kolejnice=m					
	VV		"sp 5-4 - Lp,Pp" 16,8*2		33,600			
	VV		"sp 6-8 - Lp,Pp" 72,0*2		144,000			
	VV		"sp 6-107 - Lp,Pp" 25,0*2		50,000			
	VV		"sp 8-15 - Lp,Pp" 93,0*2		186,000			
	VV		Součet		413,600			
24	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	100,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=m					
	VV		"sp 5-4 - Lp,Pp" 5,0*2		10,000			
	VV		"sp 5-6 - Pp" 2,0		2,000			
	VV		"sp 6-8 - Lp" 14,3+23,2 "výměna+posuny+výměna"		37,500			
	VV		"sp 6-8 - Pp" 15,3 "výměna+posuny"		15,300			
	VV		"sp 6-107 - Lp,Pp" 5,0*2		10,000			
	VV		"sp 8-15 - Lp,Pp" 6,0*2		12,000			
	VV		"sp 8-11 - Lp,Pp" 6,8*2 "+ LIS"		13,600			
	VV		Součet		100,400			
25	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	70,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Řez=kus					
	VV		"VČ5" 16		16,000			
	VV		"VČ6" 28		28,000			
	VV		"VČ8" 26		26,000			
	VV		Součet		70,000			
50	K	5911117030	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49	m	4,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 přímé soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m					
	VV		"VČ6" 4,5		4,500			
51	K	5911117130	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49	m	4,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu. <i>Poznámka k položce:</i> Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m					
	P							
	VV		"VČ6" 4,5		4,500			
28	K	5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic montované z kolejnic úhel odbočení 3,5°-4,9° (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm Poznámka: 1. V cenách jsou obsaženy náklady na uvolnění upevňovačů, vyrovnání srdcovky, opravu navaření, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, dotažení upevňovačů a kontrola měřidlem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití srdcovky a nedestruktivní kontrolu ultrazvukem. <i>Poznámka k položce:</i> VČ 8 Srdcovka=kus					
29	K	5910105010	Navaření lokální vady jazyka	cm2	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Navaření lokální vady jazyka Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, vizuální prohlídka, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.					
	VV		"VČ8 - levý" (2*3)*2		12,000			
30	K	5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm2	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Navaření lokální vady opornice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navaření dle schváleného postupu, broušení po navaření v rozsahu schváleného technologického postupu, vizuální prohlídka, PT nebo MT po vybroušení a navaření a kontrolu doléhání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.					
	VV		"VČ8 - levá" (2*3)*2		12,000			
31	K	5907010035	Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1	m	5,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna LISÚ tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu LISU, montáž upevňovačů, demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. <i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=m					
	VV		"KVČ8 Lp+Pp" 2,7*2		5,400			
49	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> Vrt=kus					
	VV		vrtání kolejnic - propojky					
	VV		"VČ5-L vým. část" 2		2,000			
21	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	194,121		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ5" (62,39+4+4)*3,2*0,35 - (9,047+1,025) "pražce"		68,765			
	VV		"VČ6" (49,85+4+4)*3,2*0,35 - (7,168+1,033) "pražce"		56,591			
	VV		"VČ8" (62,39+4+4)*3,2*0,35 - (9,047+1,025) "pražce"		68,765			
	VV		Součet		194,121			
22	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	142,076		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
	VV		"KV5 (sp 5-4)" 3,0*3,5*0,35 - 0,505 "df. pr."		3,170			
	VV		"KV5 (sp 5-102)" 7,0*3,5*0,35 - 1,111 "df. pr."		7,464			
	VV		"KV5 (sp 5-4)" 19,0*3,5*0,35 - 3,045 "B91S"		20,230			
	VV		"KV6 (sp 6-8)" 3,0*3,5*0,35 - 0,404 "df. pr."		3,271			
	VV		"KV6 (sp 6-8)" 71,0*3,5*0,35 - 11,340 "B91S"		75,635			
	VV		"KV6 (sp 6-107)" 15,0*3,5*0,35 - 2,222 "df. pr."		16,153			
	VV		"KV8 (sp 8-15)" 8,0*3,5*0,35 - 1,212 "df. pr."		8,588			
	VV		"KV8 (sp 8-11)" 7,0*3,5*0,35 - 1,010 "df. pr."		7,565			
	VV		Součet		142,076			
32	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	258,240		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. <i>Poznámka k položce:</i> Rozvinutá délka výhybky					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ6" 49,85+4+4		57,850			
	VV		"VČ8" 62,39+4+4		70,390			
	VV		Mezisoučet		128,240			
	VV		"KV5 (sp 5-102)" 7,0		7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "KV5 (sp 5-4)" 19,0		19,000			
			VV "KV6 (sp 6-8)" 3,0		3,000			
			VV "KV6 (sp 6-8)" 71,0		71,000			
			VV "KV6 (sp 6-107)" 15,0		15,000			
			VV "KV8 (sp 8-15)" 8,0		8,000			
			VV "KV8 (sp 8-11)" 7,0		7,000			
			VV Mezisoučet		130,000			
			VV Součet		258,240			
56	K	5909042010	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	73,390		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: podbití do APK Rozvinutá délka výhybky=m					
	VV		"VČ5" 62,39+4+4		70,390			
	VV		"KV5 (sp 5-4)" 3,0		3,000			
	VV		Součet		73,390			
36	K	5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	58,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřhřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.					
	VV		"VČ5" 14		14,000			
	VV		"VČ6" 22		22,000			
	VV		"VČ8" 22		22,000			
	VV		Součet		58,000			
37	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	432,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
	VV		"VČ5" 16,8*2		33,600			
	VV		"VČ6" (72,0*2)+(25,0*2)		194,000			
	VV		"VČ8" (9,5*2)+(93,0*2)		205,000			
	VV		Součet		432,600			
38	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačů výhybka I. generace	m	198,630		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačů výhybka I. generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ5" 62,39+4+4		70,390			
	VV		"VČ6" 49,85+4+4		57,850			
	VV		"VČ8" 62,39+4+4		70,390			
	VV		Součet		198,630			
39	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačů výhybka I. generace	m	198,630		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačů výhybka I. generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					
	P		Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ5" 62,39+4+4		70,390			
	VV		"VČ6" 49,85+4+4		57,850			
	VV		"VČ8" 62,39+4+4		70,390			
	VV		Součet		198,630			
40	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ5"2		2,000			
	VV		"VČ6"2		2,000			
	VV		"VČ8"2		2,000			
	VV		Součet		6,000			
42	K	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	605,154		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Poplatek za recyklaci kameniva Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	P		Poznámka k položce: mobilní recyklační linka - předpoklad 50% odpad					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ5" ((62,39+4+4)*3,2*0,35 - (9,047+1,025) "pražce")*1,8		123,777			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "VC6" ((49,85+4+4)*3,2*0,35 - (7,168+1,033) "pražce")*1,8		101,864			
			VV "VC8" ((62,39+4+4)*3,2*0,35 - (9,047+1,025) "pražce")*1,8		123,777			
			VV Mezisoučet		349,418			
			VV "KV5 (sp 5-4)" (3,0*3,5*0,35 - 0,505 "dř. pr.")*1,8		5,706			
			VV "KV5 (sp 5-102)" (7,0*3,5*0,35 - 1,111 "dř. pr.")*1,8		13,435			
			VV "KV5 (sp 5-4)" (19,0*3,5*0,35 - 3,045 "B91S")*1,8		36,414			
			VV "KV6 (sp 6-8)" (3,0*3,5*0,35 - 0,404 "dř. pr.")*1,8		5,888			
			VV "KV6 (sp 6-8)" (71,0*3,5*0,35 - 11,340 "B91S")*1,8		136,143			
			VV "KV6 (sp 6-107)" (15,0*3,5*0,35 - 2,222 "dř. pr.")*1,8		29,075			
			VV "KV8 (sp 8-15)" (8,0*3,5*0,35 - 1,212 "dř. pr.")*1,8		15,458			
			VV "KV8 (sp 8-11)" (7,0*3,5*0,35 - 1,010 "dř. pr.")*1,8		13,617			
			VV Součet		605,154			
41	K	9909000110	Poplatek za uložení výtisků ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	302,577		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Poplatek za uložení výtisků ze štěrkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu. předpoklad odpad 50%					
			PP					
			VV					
			VV 605,154*0,5		302,577			
43	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,100		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
			PP					
45	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	588,445		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. předpoklad odpad 50% skládka - zemní výtisk					
			PP					
			P					
			VV 605,154*0,5		302,577			
			VV plastové součásti - skládka					
			VV 0,1		0,100			
			VV štěrk fr. 31,5/63					
			VV ((194,121*1,7)*0,5 "výhybky"		165,003			
			VV ((142,076*1,7)*0,5 "koleje"		120,765			
			VV Součet		588,445			
46	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 714,605		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. štěrk fr. 31,5/63					
			PP					
			P					
			VV ((194,121*1,7)*0,5)*6 "výhybky"		990,017			
			VV ((142,076*1,7)*0,5)*6 "koleje"		724,588			
			VV Součet		1 714,605			
54	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	36,624		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. pražec betonový B91S/2					
			PP					
			P					
			VV 112*0,327		36,624			
55	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 281,840		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. pražec betonový B91S/2					
			PP					
			P					
			VV (112*0,327)*35		1 281,840			
60	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
			PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Měrnou jednotkou je kus stroje.					
	VV		"pražcové kotvy" 1		1,000			
	VV		"zádržné opěrky proti putování" 1		1,000			
	VV		"protištěpné destičky" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
61	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	55,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Měrnou jednotkou je kus stroje.					
	VV		"pražcové kotvy" 1*10		10,000			
	VV		"zádržné opěrky proti putování" 1*35		35,000			
	VV		"protištěpné destičky" 1*10		10,000			
	VV		Součet		55,000			
63	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MHS, ASPV, PUSL, mobilní recyklační linka					
44	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	285,768		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI					
	VV		štěrku fr. 31,5/63					
	VV		(194,121*1,7)*0,5 "výhybky"		165,003			
	VV		(142,076*1,7)*0,5 "koleje"		120,765			
	VV		Součet		285,768			
47	M	5961170080	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R500 pro jazky ohnuté i přímé	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R500 pro jazky ohnuté i přímé					
	VV		"VČ5" 2		2,000			
	VV		"VČ8" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
48	M	5961170070	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 pro jazky ohnuté i přímé	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 pro jazky ohnuté i přímé					
	VV		"VČ6" 2		2,000			
52	M	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	69,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)					
53	M	5956140030	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	112,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40					
	VV		197-85 "dodává TO"		112,000			
59	M	5960101000	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91S/1, B 91S/2, B 91P	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91S/1, B 91S/2, B 91P					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8

Soupis:

A.1.2 - Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT

KSO:

Místo: ŽST Cheb

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8

Soupis:

A.1.2 - Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT

Místo: ŽST Cheb

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Monika
Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8

Soupis:

A.1.2 - Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 2 2600x260x150 mm	kus	64,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 2 2600x260x150 mm					
2	M	5956122020	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150					
3	M	5956122025	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150	kus	22,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150					
4	M	5956122030	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150	kus	21,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150					
5	M	5956122035	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150	kus	14,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150					
6	M	5956122040	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150					
7	M	5956122045	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150					
8	M	5956122050	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150					
9	M	5956122055	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150					
10	M	5956122060	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150					
11	M	5956122065	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150					
12	M	5956122070	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150					
13	M	5956122075	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150					
14	M	5956122080	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150					
15	M	5956122085	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150					
16	M	5956122090	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150					
17	M	5956122095	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150					
18	M	5956122100	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150					
19	M	5956122105	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150					
20	M	5956122110	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150					
21	M	5956122115	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus	5,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150					
22	M	5956122120	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150					
23	M	5961146315	Jazyk prodloužený JS49 1:12-500 levý ohnutý 13800 mm+1300 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Jazyk prodloužený JS49 1:12-500 levý ohnutý 13800 mm+1300 mm					
24	M	5961146300	Jazyk prodloužený JS49 1:12-500 pravý přímý 13800 mm+1300 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
PP			Jazyk prodloužený JS49 1:12-500 pravý přímý 13800 mm+1300 mm					
25	M	5961147305	Opornice prodloužená JS49 1:12-500 levá přímá 15886 mm+1400 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Opornice prodloužená JS49 1:12-500 levá přímá 15886 mm+1400 mm					
26	M	5961147310	Opornice prodloužená JS49 1:12-500 pravá ohnutá 15886 mm+1400 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Opornice prodloužená JS49 1:12-500 pravá ohnutá 15886 mm+1400 mm					
27	M	5961149045	Přidrznice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300 4500 mm přímá	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Přidrznice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300 4500 mm přímá					
28	M	5961149050	Přidrznice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300 4500 mm ohnutá	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Přidrznice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300 4500 mm ohnutá					
29	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1 288,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)					
30	M	5958134035	Součásti upevňovací svěrka VT2	kus	240,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací svěrka VT2					
31	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	3 201,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6					
32	M	5958134042	Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80)	kus	271,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80)					
33	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	271,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací matice M24					
34	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	2 014,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací vrtule R1(145)					
35	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	916,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací vrtule R2 (160)					
36	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	526,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
37	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	510,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)					
38	M	5957131002	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 2,70 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 2,70 m					
39	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	45,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Polyetylenové pásy v kotoučích					
40	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m	136,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Kolejnice užitě tv. S49					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8

Soupis:

A.1.3 - Práce SSZT a SEE

KSO:

Místo: ŽST Cheb

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8

Soupis:

A.1.3 - Práce SSZT a SEE

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8

Soupis:

A.1.3 - Práce SSZT a SEE

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	7493371010	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190 - veškeré výstroje EOJ na výhybce, topných tyčí, přípojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ5, VČ6, VČ8					
2	K	7493371012	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:12-500	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:12-500 - veškeré výstroje EOJ na výhybce, topných tyčí, přípojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ5, VČ6, VČ8					
3	K	7493351022	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytke hlavice topných tyčí, pérových příchytke vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ5, VČ6, VČ8					
4	K	7493351024	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 500 m	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 500 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytke hlavice topných tyčí, pérových příchytke vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ5, VČ6, VČ8					
5	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ5, VČ6, VČ8					
6	K	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ5, VČ6, VČ8					
7	K	7591015030	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na pražci	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na pražci - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, opravný nátěr. Bez zemních prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ5, VČ6, VČ8					
8	K	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a seřízení přestavnickové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ5, VČ6, VČ8					
9	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
10	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech					
11	K	7594107400	Demontáž propojky kolíkové	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Demontáž propojky kolíkové - demontáž matic a podložek, vyražení kolíků propojení ze stojiny kolejnice					
			VV "VČ5" 6		6,000			
			VV "VČ6" 6		6,000			
			VV "VČ8" 8		8,000			
			VV Součet		20,000			
15	K	7594105400	Montáž propojky kolíkové	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Montáž propojky kolíkové - naražení kolíků do děr ve stojině kolejnice, nasazení podložky a dotažení matice					
			VV "VČ5" 6		6,000			
			VV "VČ6" 6		6,000			
			VV "VČ8" 8		8,000			
			VV Součet		20,000			
12	K	7594105046	Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 10 nebo 13,5 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 10 nebo 13,5 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámů mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámům P Poznámka k položce: VČ8 - lanové propojení k zařízení DT					
13	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1					
14	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Soupis:

A.2.1 - Práce na ŽSv

KSO:

Místo: ŽST Cheb

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Soupis:

A.2.1 - Práce na ŽSv

Místo: ŽST Cheb

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Monika
Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Soupis:

A.2.1 - Práce na ŽSv

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ30" 6		6,000			
	VV		"VČ31" 4		4,000			
	VV		"VČ32" 6		6,000			
	VV		"VČ34" 6		6,000			
	VV		"VČ35" 4		4,000			
	VV		"VČ37" 4		4,000			
	VV		Součet		30,000			
2	K	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ30" 6		6,000			
	VV		"VČ31" 4		4,000			
	VV		"VČ32" 6		6,000			
	VV		"VČ34" 6		6,000			
	VV		"VČ35" 4		4,000			
	VV		"VČ37" 4		4,000			
	VV		Součet		30,000			
3	K	5911005310	Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice	kus	30,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ30" 6		6,000			
	VV		"VČ31" 4		4,000			
	VV		"VČ32" 6		6,000			
	VV		"VČ34" 6		6,000			
	VV		"VČ35" 4		4,000			
	VV		"VČ37" 4		4,000			
	VV		Součet		30,000			
53	K	5910135020	Demontáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž pražcové kotvy ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a naložení výzisku na dopravní prostředek.					
	VV		"VČ37" 12		12,000			
54	K	5910136020	Montáž pražcové kotvy ve výhybce	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž pražcové kotvy ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění kameniva, montáž, ošetření součástí mazivem a úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		Poznámka k položce: montáž zpět					
	VV		"VČ37" 12		12,000			
4	K	5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	189,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovacích, výměnu pražců, montáž upevňovacích a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	P		Poznámka k položce: dle montážního plánu Pražec=kus					
	VV		VČ30					
	VV		"05-01" 5		5,000			
	VV		"1-33" 33		33,000			
	VV		VČ31					
	VV		"03-01" 3		3,000			
	VV		"1-20" 20		20,000			
	VV		VČ32					
	VV		"04-01" 4		4,000			
	VV		"1-33" 33		33,000			
	VV		VČ34					
	VV		"1-33" 33		33,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		VČ35					
	VV		"04-01" 4		4,000			
	VV		"1-25" 25		25,000			
	VV		VČ37					
	VV		"04-01" 4		4,000			
	VV		"1-25" 25		25,000			
	VV		Součet		189,000			
5	K	5906035040	Souvislá výměna prážců současně s výměnou nebo čišťením KL prážce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	154,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna prážců současně s výměnou nebo čišťením KL prážce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu prážců, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prážců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití prážce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisků na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>					
	VV		VČ30					
	VV		"34-63" 30		30,000			
	VV		VČ31					
	VV		"21-38" 18		18,000			
	VV		VČ32					
	VV		"34-63" 30		30,000			
	VV		VČ34					
	VV		"34-63" 30		30,000			
	VV		VČ35					
	VV		"26-48" 23		23,000			
	VV		VČ37					
	VV		"26-48" 23		23,000			
	VV		Součet		154,000			
6	K	5906035050	Souvislá výměna prážců současně s výměnou nebo čišťením KL prážce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	68,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna prážců současně s výměnou nebo čišťením KL prážce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu prážců, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prážců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití prážce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisků na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>					
	VV		VČ30					
	VV		"64-70, 71-76 (dl. spol.)" 7+6		13,000			
	VV		VČ31					
	VV		"39-41, 42-46 (dl. spol.)" 3+5		8,000			
	VV		VČ32					
	VV		"64-70, 71-74 (dl. spol.)" 7+4		11,000			
	VV		VČ34					
	VV		"64-70, 71-75 (dl. spol.)" 7+5		12,000			
	VV		VČ35					
	VV		"49-55, 56-60 (dl. spol.)" 7+5		12,000			
	VV		VČ35					
	VV		"49-55, 56-60 (dl. spol.)" 7+5		12,000			
	VV		Součet		68,000			
7	K	5906035010	Souvislá výměna prážců současně s výměnou nebo čišťením KL prážce dřevěné příčné nevystrojené	kus	107,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna prážců současně s výměnou nebo čišťením KL prážce dřevěné příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu prážců, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prážců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití prážce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisků na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Pražec=kus</i>					
	VV		"KV30 (sp 30-13)" 19		19,000			
	VV		"KV30 (sp 30-25)" 21		21,000			
	VV		"ZV30 (sp 30-31)" 17		17,000			
	VV		"KV34 (sp 34-36)" 8		8,000			
	VV		"KV34 (sp 34-SK7a)" 11		11,000			
	VV		"KV35 (sp 35-3SK)" 9		9,000			
	VV		"KV35 (sp 35-37)" 14		14,000			
	VV		"KV37 (sp 37-25)" 8		8,000			
	VV		Součet		107,000			
8	K	5906120010	Zkrácení dřevěného prážce odřezáním	kus	60,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zkrácení dřevěného prážce odřezáním Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela prážce impregnačním prostředkem včetně impregnačního materiálu a osazení mřížky.					
	VV		"KV30 (sp 30-13)" 10		10,000			
	VV		"KV30 (sp 30-25)" 10		10,000			
	VV		"KV34 (sp 34-36)" 5		5,000			
	VV		"KV34 (sp 34-SK7a)" 9		9,000			
	VV		"KV35 (sp 35-3SK)" 9		9,000			
	VV		"KV35 (sp 35-37)" 10		10,000			
	VV		"KV37 (sp 37-25)" 7		7,000			
	VV		Součet		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čišněním KL pražce betonové příčné vystrojené	kus	620,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čišněním KL pražce betonové příčné vystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů, výměnu pražců, montáž upevňovačů a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Pražce betonové B91S vystrojené					
	VV		"KV30 (sp 30-13)" 300		300,000			
	VV		"KV35 (sp 35-3SK)" 28		28,000			
	VV		"KV37 (sp 37-25)" 292		292,000			
	VV		Součet		620,000			
10	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	332,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměna kompl. ŽS4 a pryž. podložky Pražec=kus					
	VV		"ve VČ30 + df. příč. pražce" 42+57		99,000			
	VV		"ve VČ31 + df. příč. pražce" 33		33,000			
	VV		"ve VČ32 + df. příč. pražce" 38		38,000			
	VV		"ve VČ34 + df. příč. pražce" 37+19		56,000			
	VV		"ve VČ35 + df. příč. pražce" 38+23		61,000			
	VV		"ve VČ37 + df. příč. pražce" 37+8		45,000			
	VV		Součet		332,000			
11	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	207,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměna kompl. V2T (sf. T10) Pražec=kus					
	VV		"VČ30" 44		44,000			
	VV		"VČ31" 19		19,000			
	VV		"VČ32" 44		44,000			
	VV		"VČ34" 43		43,000			
	VV		"VČ35" 28		28,000			
	VV		"VČ37" 29		29,000			
	VV		Součet		207,000			
12	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	354,225		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ30" (62,39+4+4)*3,2*0,35 - (9,047+1,025) "pražce"		68,765			
	VV		"V31" (37,83+3+3)*3,2*0,35 - (5,392+0,831) "pražce"		42,867			
	VV		"VČ32" (62,39+3+3)*3,2*0,35 - (9,047+0,676) "pražce"		66,874			
	VV		"VČ34" (62,39+3+3)*3,2*0,35 - (9,047+0,851) "pražce"		66,699			
	VV		"VČ35" (49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,168+0,874) "pražce"		54,510			
	VV		"VČ35" (49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,168+0,874) "pražce"		54,510			
	VV		Součet		354,225			
13	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	510,249		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výzisku na skládku a skládkovné.					
	VV		"KV30 (sp 30-13)" 13,0*3,5*0,35 - 1,919 "df. pr."		14,006			
	VV		"KV30 (sp 30-13)" 197,0*3,5*0,35 - 31,500 "B91S"		209,825			
	VV		"KV30 (sp 30-25)" 14,0*3,5*0,35 - 2,121 "df. pr."		15,029			
	VV		"ZV30 (sp 30-31)" 11,0*3,5*0,35 - 1,111 "df. pr."		12,364			
	VV		"KV34 (sp 34-36)" 5,0*3,5*0,35 - 0,808 "df. pr."		5,317			
	VV		"KV34 (sp 34-SK7a)" 7,0*3,5*0,35 - 1,111 "df. pr."		7,464			
	VV		"KV35 (sp 35-3SK)" 6,0*3,5*0,35 - 0,909 "df. pr."		6,441			
	VV		"KV35 (sp 35-3SK)" 19,0*3,5*0,35 - 2,940 "B91S"		20,335			
	VV		"KV35 (sp 35-37)" 9,0*3,5*0,35 - 1,414 "df. pr."		9,611			
	VV		"KV37 (sp 37-25)" 5,0*3,5*0,35 - 0,808 "df. pr."		5,317			
	VV		"KV37 (sp 37-25)" 192,0*3,5*0,35 - 30,660 "B91S"		204,540			
	VV		Součet		510,249			
15	K	5911059230	Opava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49	m	95,950		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Opava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním čelistovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačů a uvolnění spojů, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovačů, dotažení spojů, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> úprava polohy jazyka Délka jazyka=m					
	VV		"VČ30" 13,800*2		27,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"VČ31" 10,125*2		20,250			
			"VČ35" 12,025*2		24,050			
			"VČ37" 12,025*2		24,050			
			Součet		95,950			
16	K	5911059330	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49	m	55,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s dvěma čelistovými závěry soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílu, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> úprava polohy jazyka Délka jazyka=m					
	VV		"VČ32" 13,800*2		27,600			
	VV		"VČ34" 13,800*2		27,600			
	VV		Součet		55,200			
17	K	5911113020	Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49	t	5,679		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Hmotnost srdcovky=t					
	VV		"VČ31-JS49 1:7,5-190 P" 1,138		1,138			
	VV		"VČ32-ObI-o S49 1:12-500(2548/622) L" 1,558		1,558			
	VV		"VČ34-JS49 1:12-500 L" 1,655		1,655			
	VV		"VČ35-ObI-j 1:9-300(1350/245) P" 1,328		1,328			
	VV		Součet		5,679			
18	K	5911060030	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49	m	87,800		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=metr					
	VV		"VČ30 - L vnitřní" 19,1		19,100			
	VV		"VČ30 - P vnější" 19,1		19,100			
	VV		"VČ35 - L vnější" 12,7 "+ u přídržnice celk. 21,7"		12,700			
	VV		"VČ35 - P vnitřní" 11,7		11,700			
	VV		"VČ37 - L vnější" 13,0		13,000			
	VV		"VČ37 - P vnitřní" 12,2		12,200			
	VV		Součet		87,800			
19	K	5911060130	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49	m	88,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=metr					
	VV		"VČ30 - L vnější" 19,1		19,100			
	VV		"VČ30 - P vnitřní" 19,1		19,100			
	VV		"VČ34 - L vnější" 18,8		18,800			
	VV		"VČ34 - P vnitřní" 18,8		18,800			
	VV		"VČ35 - P vnější" 12,7 "+ u přídržnice celk. 19,1"		12,700			
	VV		Součet		88,500			
25	K	5911121030	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49	m	33,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=m; Metr přídržnice=m					
	VV		"VČ32 - P vnější" 14,8		14,800			
	VV		"VČ34 - P vnější" 9,7 "+posun P vnější"		9,700			
	VV		"VČ35 - L vnější" 9,0		9,000			
	VV		Součet		33,500			
26	K	5911121130	Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté soustavy S49	m	16,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, úpravu a vymezení šířky žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Délka kolejnice=m; Metr přídržnice=m					
	VV		"VČ32 - L vnější" 9,8		9,800			
	VV		"VČ35 - P vnější" 6,4		6,400			
	VV		Součet		16,200			
20	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	475,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvžení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.					
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>posuny + vložky</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
	VV		"sp 30-13 - Lp,Pp" 170*2		340,000			
	VV		"VČ31-L vnitřní" 9,7 "+ úprava jazyka - bez řezu, úprava se srdcovkou"		9,700			
	VV		"VČ31-P vnitřní" 9,7 "+ úprava jazyka - bez řezu, úprava se srdcovkou"		9,700			
	VV		"VČ34-L vnitřní" 17,4		17,400			
	VV		"VČ34-P vnější" 17,4 "+výměna u přídržnice"		17,400			
	VV		"sp 35-3SK - Lp,Pp" 13,0*2		26,000			
	VV		"VČ35-L vnitřní" 11,7 "+ úprava jazyka - bez řezu, úprava se srdcovkou"		11,700			
	VV		"VČ37-L vnitřní" 11,1 "+LIS"		11,100			
	VV		"VČ37-u přídržnice +Pp" 7,4+12,6 "+LIS"		20,000			
	VV		"VČ37-Lp" 12,6 "+LIS"		12,600			
	VV		Součet		475,600			
21	K	5907015016	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	63,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.					
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
	VV		"sp 30-13 - Lp,Pp" 7,0*2 "posuny+vložka"		14,000			
	VV		"sp 30-31 - Lp,Pp" 13,5*2		27,000			
	VV		"sp 35-3SK - Pp" 2,0 "posun+vložka"		2,000			
	VV		"sp 37-25 - Lp,Pp" 10,0*2 "posuny+vložka"		20,000			
	VV		Součet		63,000			
22	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	107,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Řez=kus</i>					
	VV		"VČ30" 44		44,000			
	VV		"VČ31" 4		4,000			
	VV		"VČ32" 8		8,000			
	VV		"VČ34" 14		14,000			
	VV		"VČ35" 19		19,000			
	VV		"VČ37" 18		18,000			
	VV		Součet		107,000			
24	K	5911117130	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49	m	16,500		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Délka přídržnice=m;</i> <i>Metr přídržnice=m</i>					
	VV		"VČ30" 5,5		5,500			
	VV		"VČ32" 5,5		5,500			
	VV		"VČ34" 5,5		5,500			
	VV		Součet		16,500			
27	K	5910105020	Navážení lokální vady opornice	cm2	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Navážení lokální vady opornice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na navážení dle schváleného postupu, broušení po navážení v rozsahu schváleného technologického postupu, vizuální prohlídka, PT nebo MT po vybroušení a navážení a kontrolu delohání jazyka na jazykové opěrky, kluzné stoličky a k opornici. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, seřízení závěru výhybky a kontrolu ultrazvukem.					
	PP							
	VV		"VČ34 - levá" (2*3)*2		12,000			
28	K	5907010035	Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1	m	25,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Výměna LISŮ tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, demontáž a zpětnou montáž lanového propojení, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž stvků.					
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Metr kolejnice=m</i>					
	VV		"KV30 (sp 30-25)" 4,5*2		9,000			
	VV		"KV35 (sp 35-37)" 2,7*2		5,400			
	VV		"VČ37-L vnitřní " 2,7		2,700			
	VV		"VČ37-P vnější " 2,7		2,700			
	VV		"KV37 (sp 37-35)- Lp,Pp" 2,7*2		5,400			
	VV		Součet		25,200			
29	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.					
	PP							
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Vrt=kus</i>					
	VV		vrtání kolejnic - propojky					
	VV		"VČ34 - kon. srdcovky" 6		6,000			
30	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	354,225		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
		PP						
		VV	ve výhybce + dl. spol. pražce					
		VV	"VČ30" (62,39+4+4)*3,2*0,35 - (9,047+1,025) "pražce"		68,765			
		VV	"V31" (37,83+3+3)*3,2*0,35 - (5,392+0,831) "pražce"		42,867			
		VV	"VČ32" (62,39+3+3)*3,2*0,35 - (9,047+0,676) "pražce"		66,874			
		VV	"VČ34" (62,39+3+3)*3,2*0,35 - (9,047+0,851) "pražce"		66,699			
		VV	"VČ35" (49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,168+0,874) "pražce"		54,510			
		VV	"VČ35" (49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,168+0,874) "pražce"		54,510			
		VV	Součet		354,225			
31	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	510,249		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
		PP	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
		VV	"KV30 (sp 30-13)" 13,0*3,5*0,35 - 1,919 "dř. pr."		14,006			
		VV	"KV30 (sp 30-13)" 197,0*3,5*0,35 - 31,500 "B91S"		209,825			
		VV	"KV30 (sp 30-25)" 14,0*3,5*0,35 - 2,121 "dř. pr."		15,029			
		VV	"ZV30 (sp 30-31)" 11,0*3,5*0,35 - 1,111 "dř. pr."		12,364			
		VV	"KV34 (sp 34-36)" 5,0*3,5*0,35 - 0,808 "dř. pr."		5,317			
		VV	"KV34 (sp 34-SK7a)" 7,0*3,5*0,35 - 1,111 "dř. pr."		7,464			
		VV	"KV35 (sp 35-3SK)" 6,0*3,5*0,35 - 0,909 "dř. pr."		6,441			
		VV	"KV35 (sp 35-3SK)" 19,0*3,5*0,35 - 2,940 "B91S"		20,335			
		VV	"KV35 (sp 35-37)" 9,0*3,5*0,35 - 1,414 "dř. pr."		9,611			
		VV	"KV37 (sp 37-25)" 5,0*3,5*0,35 - 0,808 "dř. pr."		5,317			
		VV	"KV37 (sp 37-25)" 192,0*3,5*0,35 - 30,660 "B91S"		204,540			
		VV	Součet		510,249			
32	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	840,700		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
		PP	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
		P	<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky</i>					
		VV	ve výhybce + dl. spol. pražce					
		VV	"VČ30" 62,39+4+4		70,390			
		VV	"V31" 37,83+3+3		43,830			
		VV	"VČ32" 62,39+3+3		68,390			
		VV	"VČ34" 62,39+3+3		68,390			
		VV	"VČ35" 49,85+3+3		55,850			
		VV	"VČ35" 49,85+3+3		55,850			
		VV	Mezisoučet		362,700			
		VV	"KV30 (sp 30-13)" 13,0		13,000			
		VV	"KV30 (sp 30-13)" 197,0		197,000			
		VV	"KV30 (sp 30-25)" 14,0		14,000			
		VV	"ZV30 (sp 30-31)" 11,0		11,000			
		VV	"KV34 (sp 34-36)" 5,0		5,000			
		VV	"KV34 (sp 34-SK7a)" 7,0		7,000			
		VV	"KV35 (sp 35-3SK)" 6,0		6,000			
		VV	"KV35 (sp 35-3SK)" 19,0		19,000			
		VV	"KV35 (sp 35-37)" 9,0		9,000			
		VV	"KV37 (sp 37-25)" 5,0		5,000			
		VV	"KV37 (sp 37-25)" 192,0		192,000			
		VV	Mezisoučet		478,000			
		VV	Součet		840,700			
34	K	5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	84,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
		PP	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výběr kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.					
		VV	"VČ30" 32		32,000			
		VV	"VČ31" 4		4,000			
		VV	"VČ32" 8		8,000			
		VV	"VČ34" 12		12,000			
		VV	"VČ35" 16		16,000			
		VV	"VČ37" 12		12,000			
		VV	Součet		84,000			
35	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	830,800		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
		PP	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
		P	<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
		VV	"VČ30" (5,0*2)+(170,0*2)+(13,5*2)		377,000			
		VV	"VČ35" (13,0*2)+(3,0*2)		32,000			
		VV	"VČ37" (198,3*2)+(12,6*2)		421,800			
		VV	Součet		830,800			
36	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace	m	362,700		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovadel výhybka I. generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ30" 62,39+4+4		70,390			
	VV		"V31" 37,83+3+3		43,830			
	VV		"VČ32" 62,39+3+3		68,390			
	VV		"VČ34" 62,39+3+3		68,390			
	VV		"VČ35" 49,85+3+3		55,850			
	VV		"VČ35" 49,85+3+3		55,850			
	VV		Součet		362,700			
37	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace	m	362,700		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovadel výhybka I. generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ30" 62,39+4+4		70,390			
	VV		"V31" 37,83+3+3		43,830			
	VV		"VČ32" 62,39+3+3		68,390			
	VV		"VČ34" 62,39+3+3		68,390			
	VV		"VČ35" 49,85+3+3		55,850			
	VV		"VČ35" 49,85+3+3		55,850			
	VV		Součet		362,700			
38	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ30"2		2,000			
	VV		"VČ31"2		2,000			
	VV		"VČ32"2		2,000			
	VV		"VČ34"2		2,000			
	VV		"VČ35"2		2,000			
	VV		"VČ37"2		2,000			
	VV		Součet		12,000			
55	K	5911231020	Výměna VP svorníku soustavy S49	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna VP svorníku soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Svorník=kus</i>					
	VV		"VČ37" 12		12,000			
39	K	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	1 556,053		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Poplatek za recyklaci kameniva Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučeny, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>mobilní recyklační linka - předpoklad 50% odpad</i>					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ30" ((62,39+4+4)*3,2*0,35 - (9,047+1,025) "pražce")*1,8		123,777			
	VV		"V31" ((37,83+3+3)*3,2*0,35 - (5,392+0,831) "pražce")*1,8		77,160			
	VV		"VČ32" ((62,39+3+3)*3,2*0,35 - (9,047+0,676) "pražce")*1,8		120,373			
	VV		"VČ34" ((62,39+3+3)*3,2*0,35 - (9,047+0,851) "pražce")*1,8		120,058			
	VV		"VČ35" ((49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,168+0,874) "pražce")*1,8		98,118			
	VV		"VČ35" ((49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,168+0,874) "pražce")*1,8		98,118			
	VV		Mezisoučet		637,604			
	VV		"KV30 (sp 30-13)" (13,0*3,5*0,35 - 1,919 "df. pr.")*1,8		25,211			
	VV		"KV30 (sp 30-13)" (197,0*3,5*0,35 - 31,500 "B91S")*1,8		377,685			
	VV		"KV30 (sp 30-25)" (14,0*3,5*0,35 - 2,121 "df. pr.")*1,8		27,052			
	VV		"ZV30 (sp 30-31)" (11,0*3,5*0,35 - 1,111 "df. pr.")*1,8		22,255			
	VV		"KV34 (sp 34-36)" (5,0*3,5*0,35 - 0,808 "df. pr.")*1,8		9,571			
	VV		"KV34 (sp 34-SK7a)" (7,0*3,5*0,35 - 1,111 "df. pr.")*1,8		13,435			
	VV		"KV35 (sp 35-3SK)" (6,0*3,5*0,35 - 0,909 "df. pr.")*1,8		11,594			
	VV		"KV35 (sp 35-3SK)" (19,0*3,5*0,35 - 2,940 "B91S")*1,8		36,603			
	VV		"KV35 (sp 35-37)" (9,0*3,5*0,35 - 1,414 "df. pr.")*1,8		17,300			
	VV		"KV37 (sp 37-25)" (5,0*3,5*0,35 - 0,808 "df. pr.")*1,8		9,571			
	VV		"KV37 (sp 37-25)" (192,0*3,5*0,35 - 30,660 "B91S")*1,8		368,172			
	VV		Mezisoučet		918,449			
	VV		Součet		1 556,053			
40	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	778,027		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučeny, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VV		předpoklad odpad 50%					
	VV		1556,053*0,5		778,027			
41	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,350		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučeny, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadu. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
42	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	1 513,180		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>					
	VV		předpoklad odpad 50% - skládka (zemní výzisk)					
	VV		1556,053*0,5		778,027			
	VV		plastové součásti - skládka					
	VV		0,35		0,350			
	VV		štěrk fr. 32/63					
	VV		(354,225*1,7)*0,5		301,091			
	VV		(510,249*1,7)*0,5		433,712			
	VV		Součet		1 513,180			
43	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	4 408,818		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>					
	VV		štěrk fr. 32/63					
	VV		((354,225*1,7)*0,5)*6		1 806,548			
	VV		((510,249*1,7)*0,5)*6		2 602,270			
	VV		Součet		4 408,818			
51	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	202,740		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>					
	VV		pražec betonový B91S/2					
	VV		620*0,327		202,740			
52	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	7 095,900		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.</i>					
	VV		pražec betonový B91S/2					
	VV		(620*0,327)*35		7 095,900			
65	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>					
	VV		"zádržné opěrky proti putování" 1		1,000			
	VV		"protištěpné destičky" 1		1,000			
	VV		"VP svorníky" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
66	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	55,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Měrnou jednotkou je kus stroje.</i>					
	VV		"zádržné opěrky proti putování" 1*35		35,000			
	VV		"protištěpné destičky" 1*10		10,000			
	VV		"VP svorníky" 1*10		10,000			
	VV		Součet		55,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. Poznámka k položce: MHS, ASPv, PUSL, mobilní recyklační linka	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
	P							
44	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI štěrku fr. 32/63 (354,225*1,7)*0,5 (510,249*1,7)*0,5 Součet	t	734,803	301,091 433,712 734,803	0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
45	M	5961170080	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R500 pro jazky ohnutý i přímý Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R500 pro jazky ohnutý i přímý "VČ30" 2 "VČ32" 2 "VČ34" 2 Součet	kus	6,000	2,000 2,000 2,000 6,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
46	M	5961170070	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 pro jazky ohnutý i přímý Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R300 pro jazky ohnutý i přímý "VČ35" 2 "VČ37" 2 Součet	kus	4,000	2,000 2,000 4,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
47	M	5961170060	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky ohnutý Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky ohnutý "VČ31" 1	kus	1,000	1,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
	VV							
48	M	5961170065	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky přímý Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazky přímý "VČ31" 1	kus	1,000	1,000	0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
	VV							
49	M	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210) Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	60,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
50	M	5956140030	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40 Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40	kus	620,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
56	M	5958110070	Vysokopevnostní svorník M24 x 290 mm Vysokopevnostní svorník M24 x 290 mm	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
57	M	5958110160	Vysokopevnostní svorník M24 x 470 mm Vysokopevnostní svorník M24 x 470 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
58	M	5958110175	Vysokopevnostní svorník M24 x 500 mm Vysokopevnostní svorník M24 x 500 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
59	M	5958113000	Součást svorníku výkovek kulové podložky Součást svorníku výkovek kulové podložky	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
60	M	5958113005	Součást svorníku výkovek kuželové pánve Součást svorníku výkovek kuželové pánve	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							
61	M	59581130R01	Podložka 1 S49 60x12x65 mm šikmá Podložka 1 S49 60x12x65 mm šikmá	kus	8,000		0,00	
	PP							
62	M	59581130R02	Podložka 2 S49 60x12x65 mm šikmá Podložka 2 S49 60x12x65 mm šikmá	kus	8,000		0,00	
	PP							
63	M	5958116000	Matice šestihřanné M24 Matice šestihřanné M24	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Soupis:

A.2.2 - Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT

KSO:

Místo: ŽST Cheb

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Soupis:

A.2.2 - Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT

Místo: ŽST Cheb

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Monika
Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Soupis:

A.2.2 - Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 2 2600x260x150 mm	kus	107,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 2 2600x260x150 mm					
2	M	5956122020	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150	kus	85,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150					
3	M	5956122025	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150	kus	42,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150					
4	M	5956122030	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150	kus	38,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150					
5	M	5956122035	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150					
6	M	5956122040	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150	kus	21,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150					
7	M	5956122045	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150	kus	17,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150					
8	M	5956122050	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150	kus	18,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150					
9	M	5956122055	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150					
10	M	5956122060	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150	kus	17,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150					
11	M	5956122065	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150					
12	M	5956122070	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150					
13	M	5956122075	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150					
14	M	5956122080	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150					
15	M	5956122085	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150					
16	M	5956122090	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150					
17	M	5956122095	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150					
18	M	5956122100	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150					
19	M	5956122105	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150					
20	M	5956122110	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150					
21	M	5956122115	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150					
22	M	5956122120	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4600x260x150					
41	M	5961148110	Srdcovka prodloužená JS49 1:7,5-190 pravá o 1200 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Srdcovka prodloužená JS49 1:7,5-190 pravá o 1200 mm					
	P		Poznámka k položce: Srdcovka-S49-1:7,5-190-ZP+2600 P (ŽST Cheb - VČ31)					
42	M	5961148155	Srdcovka prodloužená JS49 1:12-500 levá o 1400 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Srdcovka prodloužená JS49 1:12-500 levá o 1400 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Srdcovka-S49-1:12-500-ZP+2600 L (ŽST Cheb - VČ32)+transformace					
43	M	5961148155	Srdcovka prodloužená JS49 1:12-500 levá o 1400 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Srdcovka prodloužená JS49 1:12-500 levá o 1400 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Srdcovka-S49-1:12-500-ZP+2600 L (ŽST Cheb - VČ34)					
44	M	5961148130	Srdcovka prodloužená JS49 1:9-300 pravá o 1400 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Srdcovka prodloužená JS49 1:9-300 pravá o 1400 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Srdcovka-S49-1:9-300-ZP+1400 P (ŽST Cheb - VČ35) + transformace (1350/245) - (ŽST Cheb - VČ 35) + větší prodloužení, než je základní - začátek srdcovky - Lp-přímá (ŽST Cheb - VČ35) + vložen LIS - začátek srdcovky - Pp-odbočka střed LISu od důlčiku 4,5 m (ŽST Cheb - VČ35)□					
45	M	5961149065	Přidrznice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:12-500 5500 mm ohnutá	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Přidrznice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:12-500 5500 mm ohnutá					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ30, VČ32, VČ34					
29	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1 588,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)					
30	M	5958134035	Součásti upevňovací svěrka VT2	kus	641,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti upevňovací svěrka VT2					
31	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	6 509,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6					
32	M	5958134042	Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80)	kus	747,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80)					
33	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	747,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti upevňovací matice M24					
34	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	3 346,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti upevňovací vrtule R1(145)					
35	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	2 062,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti upevňovací vrtule R2 (160)					
36	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	1 024,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
37	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	972,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)					
38	M	5957131002	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 2,70 m	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 2,70 m					
46	M	5957131055	Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,50 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Lepený izolovaný styk tv. S49 (49E1) délky 4,50 m					
39	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	90,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Polyetylenové pásy v kotoučích					
40	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m	289,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Kolejnice užitě tv. S49					
47	M	5958110080	Vysokopevnostní svorník M24 x 310 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vysokopevnostní svorník M24 x 310 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
48	M	5958110090	Vysokopevnostní svorník M24 x 330 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vysokopevnostní svorník M24 x 330 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
49	M	5958110100	Vysokopevnostní svorník M24 x 350 mm	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vysokopevnostní svorník M24 x 350 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
50	M	5958110110	Vysokopevnostní svorník M24 x 370 mm	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vysokopevnostní svorník M24 x 370 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
51	M	5958110130	Vysokopevnostní svorník M24 x 410 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vysokopevnostní svorník M24 x 410 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
52	M	5958110140	Vysokopevnostní svorník M24 x 430 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vysokopevnostní svorník M24 x 430 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Soupis:

A.2.3 - Práce SSZT a SEE

KSO:

Místo: ŽST Cheb

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Soupis:

A.2.3 - Práce SSZT a SEE

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika
Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37

Soupis:

A.2.3 - Práce SSZT a SEE

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	7493371010	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190 - veškeré výstroje EOJ na výhybce, topných tyčí, přípojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ30, VČ31, VČ32, VČ34, VČ35, VČ37					
2	K	7493371012	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:12-500	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:12-500 - veškeré výstroje EOJ na výhybce, topných tyčí, přípojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ30, VČ31, VČ32, VČ34, VČ35, VČ37					
3	K	7493351022	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytěk hlavíc topných tyčí, pérových příchytěk vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ35, VČ37					
4	K	7493351024	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 500 m	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 500 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytěk hlavíc topných tyčí, pérových příchytěk vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ30, VČ32, VČ34					
15	K	7493351020	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 190 m	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 190 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytěk hlavíc topných tyčí, pérových příchytěk vlastních topných tyčí, přípojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, přípojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ31					
5	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ30, VČ31, VČ32, VČ34, VČ35, VČ37					
6	K	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ30, VČ31, VČ32, VČ34, VČ35, VČ37					
7	K	7591015030	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na pražci	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na pražci - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, opravný nátěr. Bez zemních prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ30, VČ31, VČ32, VČ34, VČ35, VČ37					
8	K	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Připojení elektromotorického přestavnicku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a seřízení přestavnickové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí <i>Poznámka k položce:</i> VČ30, VČ31, VČ32, VČ34, VČ35, VČ37					
9	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
10	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	10,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech					
11	K	7594107400	Demontáž propojky kolíkové	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž propojky kolíkové - demontáž matic a podložek, vyražení kolíků propojení ze stojiny kolejnice					
	VV		"VČ30" 7		7,000			
	VV		"VČ31" 6		6,000			
	VV		"VČ32" 6		6,000			
	VV		"VČ34" 7		7,000			
	VV		"VČ35" 7		7,000			
	VV		"VČ37" 7		7,000			
	VV		Součet		40,000			
16	K	7594105400	Montáž propojky kolíkové	kus	40,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž propojky kolíkové - naražení kolíků do dřev ve stojině kolejnice, nasazení podložky a dotažení matice					
	VV		"VČ30" 7		7,000			
	VV		"VČ31" 6		6,000			
	VV		"VČ32" 6		6,000			
	VV		"VČ34" 7		7,000			
	VV		"VČ35" 7		7,000			
	VV		"VČ37" 7		7,000			
	VV		Součet		40,000			
13	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1					
14	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení					
17	K	5911527030	Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a naložení na dopravní prostředek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
	VV		"VČ30" 1		1,000			
	VV		"VČ31" 1		1,000			
	VV		"VČ32" 2		2,000			
	VV		"VČ34" 2		2,000			
	VV		"VČ35" 1		1,000			
	VV		"VČ37" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
18	K	5911529030	Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ30" 1		1,000			
	VV		"VČ31" 1		1,000			
	VV		"VČ32" 2		2,000			
	VV		"VČ34" 2		2,000			
	VV		"VČ35" 1		1,000			
	VV		"VČ37" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			
19	K	5911531030	Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Seřízení čelistového závěru výhybky jednoduché bez žlabového pražce soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nastavení podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.					
	VV		"VČ30" 1		1,000			
	VV		"VČ31" 1		1,000			
	VV		"VČ32" 2		2,000			
	VV		"VČ34" 2		2,000			
	VV		"VČ35" 1		1,000			
	VV		"VČ37" 1		1,000			
	VV		Součet		8,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Soupis:

A.3.1 - Práce na ŽSv

KSO:

Místo: ŽST Cheb

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Soupis:

A.3.1 - Práce na ŽSv

Místo: ŽST Cheb

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Monika
Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Soupis:

A.3.1 - Práce na ŽSv

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	5911005110	Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ56" 4		4,000			
	VV		"VČ57" 4		4,000			
	VV		"VČ59" 4		4,000			
	VV		"VČ61" 4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
2	K	5911005210	Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ56" 4		4,000			
	VV		"VČ57" 4		4,000			
	VV		"VČ59" 4		4,000			
	VV		"VČ61" 4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
3	K	5911005310	Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s upevněním na patu kolejnice Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na provedení, nastavení funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	VV		"VČ56" 4		4,000			
	VV		"VČ57" 4		4,000			
	VV		"VČ59" 4		4,000			
	VV		"VČ61" 4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
4	K	5911309020	Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž závěru a naložení na dopravní prostředek.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
	VV		"VČ56" 1		1,000			
	VV		"VČ57" 1		1,000			
	VV		"VČ59" 1		1,000			
	VV		"VČ61" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
5	K	5911311020	Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a seřízení závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
	VV		"VČ56" 1		1,000			
	VV		"VČ57" 1		1,000			
	VV		"VČ59" 1		1,000			
	VV		"VČ61" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	5911313020	Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Seřízení hákového závěru výhybky jednoduché jednozávěrové soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž nebo montáž součástí, seřízení zdvíhu, rozveření a záklesu háku, mezery mezi jazykem a opomicí v místě první hákové stěžecky, oprava nebo výměna čepů a pouzder jazyků a vymezení vůlí závěru, seřízení výměnníku a závěru, seřízení a přezkoušení chodu závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. U kloubových jazyků vymezení vůle pouzder a čepů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Závěr=kus					
	VV		"VČ56" 1		1,000			
	VV		"VČ57" 1		1,000			
	VV		"VČ59" 1		1,000			
	VV		"VČ61" 1		1,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	5906035030	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	100,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce: dle montážního plánu Pražec=kus</i>					
	VV		VČ56					
	VV		"2-25" 24		24,000			
	VV		VČ57					
	VV		"2-25" 24		24,000			
	VV		VČ59					
	VV		"2-25" 24		24,000			
	VV		VČ61					
	VV		"04-01" 4		4,000			
	VV		"2-25" 24		24,000			
	VV		Součet		100,000			
8	K	5906035040	Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	92,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>					
	VV		VČ56					
	VV		"26-48" 23		23,000			
	VV		VČ57					
	VV		"26-48" 23		23,000			
	VV		VČ59					
	VV		"26-48" 23		23,000			
	VV		VČ61					
	VV		"26-48" 23		23,000			
	VV		Součet		92,000			
9	K	5906035050	Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	47,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>					
	VV		VČ56					
	VV		"1, 49-55, 56-59 (dl. spol.)" 1+7+4		12,000			
	VV		VČ57					
	VV		"1, 49-55, 56-58 (dl. spol.)" 1+7+3		11,000			
	VV		VČ59					
	VV		"1, 49-55, 56-59 (dl. spol.)" 1+7+4		12,000			
	VV		VČ61					
	VV		"1, 49-55, 56-59 (dl. spol.)" 1+7+4		12,000			
	VV		Součet		47,000			
10	K	5906035010	Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	155,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Souvislá výměna prachů současně s výměnou nebo čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovačel, výměnu prachů, montáž upevňovačel a ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových prachů dřevěných vrtání otvorů pro vrtule, impregnaci otvorů včetně impregnačního materiálu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce: Pražec=kus</i>					
	VV		"KV56 (sp 56-55)" 3		3,000			
	VV		"KV56 (sp 56-SK20)" 37		37,000			
	VV		"KV57 (sp 57-SK18)" 37		37,000			
	VV		"KV59 (sp 59-SK16)" 37		37,000			
	VV		"ZV61 (sp 61-65)" 2		2,000			
	VV		"KV61 (sp 61-SK14)" 39		39,000			
	VV		Součet		155,000			
11	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním	kus	42,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zkrácení dřevěného pražce odřezáním Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním prostředkem včetně impregnačního materiálu a osazení mřížky.					
	VV		"KV56 (sp 56-55)" 3		3,000			
	VV		"KV56 (sp 56-SK20)" 6		6,000			
	VV		"KV57 (sp 57-SK18)" 10		10,000			
	VV		"KV59 (sp 59-SK16)" 10		10,000			
	VV		"KV61 (sp 61-SK14)" 13		13,000			
	VV		Součet		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	278,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpór. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměna kompl. ŽS4 a pryž. podložky					
	VV		Pražec=kus					
	VV		"ve VČ56 + df. příč. pražce" 30+40		70,000			
	VV		"ve VČ57 + df. příč. pražce" 29+37		66,000			
	VV		"ve VČ59 + df. příč. pražce" 30+37		67,000			
	VV		"ve VČ61 + df. příč. pražce" 34+41		75,000			
	VV		Součet		278,000			
13	K	5906055010	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů	kus	128,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpór. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Výměna kompl. V2T (sf. T10)					
	VV		Pražec=kus					
	VV		"VČ56" 32		32,000			
	VV		"VČ57" 32		32,000			
	VV		"VČ59" 32		32,000			
	VV		"VČ61" 32		32,000			
	VV		Součet		128,000			
14	K	5905055020	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce	m3	217,714		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výtisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ56" (49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,611-0,695) "pražce"		55,636			
	VV		"VČ57" (49,85+2+2)*3,2*0,35 - (7,611-0,520) "pražce"		53,221			
	VV		"VČ59" (49,85+2+2)*3,2*0,35 - (7,611-0,520) "pražce"		53,221			
	VV		"VČ61" (49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,611-0,695) "pražce"		55,636			
	VV		Součet		217,714			
15	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	112,970		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výtisku na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu výtisku na skládku a skládkovné.					
	VV		"KV56 (sp 56-55)" 2,0*3,5*0,35 - 0,303 "df. pr."		2,147			
	VV		"KV56 (sp 56-SK20)" 25,0*3,5*0,35 - 3,737 "df. pr."		26,888			
	VV		"KV57 (sp 57-SK18)" 25,0*3,5*0,35 - 3,737 "df. pr."		26,888			
	VV		"KV59 (sp 59-SK16)" 25,0*3,5*0,35 - 3,737 "df. pr."		26,888			
	VV		"ZV61 (sp 61-65)" 2,0*3,5*0,35 - 0,202 "df. pr."		2,248			
	VV		"KV61 (sp 61-SK14)" 26,0*3,5*0,35 - 3,939 "df. pr."		27,911			
	VV		Součet		112,970			
16	K	5911011020	Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	25,632		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna jazyků a opornic výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž závěru a upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a styků.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - jazyky a opornice s prodloužením Délka jazyků + opornic=m					
	VV		"VČ56 - jazyk" 12,025		12,025			
	VV		"VČ56 - opornice" 13,607		13,607			
	VV		Součet		25,632			
17	K	5911059020	Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49	m	60,125		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Oprava sputovaného jazyka výhybky jednoduché s jedním hákovým závěrem soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a uvolnění spojek, přizdvížení a posunutí dílů, montáž upevňovadel, dotažení spojek, seřízení závěrů, ošetření součástí mazivem a provedení západkové zkoušky.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> úprava polohy jazyka Délka jazyka=m					
	VV		"VČ57" 12,025*2		24,050			
	VV		"VČ59 - L" 12,025		12,025			
	VV		"VČ61" 12,025*2		24,050			
	VV		Součet		60,125			
18	K	5911060030	Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49	m	36,700		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úprava dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Metr kolejnice=metr					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "VČ56 - P vnitřní" 13,0		13,000			
			VV "VČ57 - P vnitřní" 10,0		10,000			
			VV "VČ61 - P vnitřní" 13,7		13,700			
			VV Součet		36,700			
19	K	5911060130	Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49	m	38,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu dilatačních spár a pryžových podložek, montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a ošetření součástí mazivem.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=metr					
	VV		"VČ57 - L vnitřní" 10,0		10,000			
	VV		"VČ59 - L vnitřní" 14,7		14,700			
	VV		"VČ61 - L vnitřní" 13,7		13,700			
	VV		Součet		38,400			
20	K	5907040031	Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1	m	48,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Posun kolejnic před svařováním tvar kolejnic S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvížení a posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.					
	P		Poznámka k položce: posuny + vložky Metr kolejnice=m					
	VV		"sp 61-SK14 - Lp,Pp" 24,2*2		48,400			
	VV		Součet		48,400			
21	K	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	46,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.					
	P		Poznámka k položce: Metr kolejnice=m					
	VV		"sp 56-SK20 - Lp,Pp" 5,0*2		10,000			
	VV		"sp 57-SK18 - Lp,Pp" 5,0*2		10,000			
	VV		"sp 57-59 - Lp,Pp" 2,2*2		4,400			
	VV		"sp 59-SK16 - Lp,Pp" 5,0*2		10,000			
	VV		"sp 61-SK14 - Pp" 5,8*2 "posun+vložka"		11,600			
	VV		Součet		46,000			
22	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	34,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Řez=kus					
	VV		"VČ56" 8		8,000			
	VV		"VČ57 " 8		8,000			
	VV		"VČ59" 6		6,000			
	VV		"VČ61" 12		12,000			
	VV		Součet		34,000			
23	K	5911117130	Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49	m	9,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 ohnuté soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení šíře žlábků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.					
	P		Poznámka k položce: Délka přídržnice=m; Metr přídržnice=m					
	VV		"VČ56" 4,5		4,500			
	VV		"VČ59" 4,5		4,500			
	VV		Součet		9,000			
24	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.					
	P		Poznámka k položce: Vrt=kus					
	VV		vrtání kolejnic - propojky					
	VV		"VČ56-P vým. část" 2		2,000			
	VV		"VČ57-P,L vým. část" 4		4,000			
	VV		"VČ59-P,L vým. část" 4		4,000			
	VV		"VČ59-P,L srdcov. část" 6		6,000			
	VV		"VČ61-P,L vým. část" 4		4,000			
	VV		Součet		20,000			
25	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	217,714		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ56" (49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,611-0,695) "pražce"		55,636			
	VV		"VČ57" (49,85+2+2)*3,2*0,35 - (7,611-0,520) "pražce"		53,221			
	VV		"VČ59" (49,85+2+2)*3,2*0,35 - (7,611-0,520) "pražce"		53,221			
	VV		"VČ61" (49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,611-0,695) "pražce"		55,636			
	VV		Součet		217,714			
26	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	112,970		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.					
	VV		"KV56 (sp 56-55)" 2,0*3,5*0,35 - 0,303 "dř. pr."		2,147			
	VV		"KV56 (sp 56-SK20)" 25,0*3,5*0,35 - 3,737 "dř. pr."		26,888			
	VV		"KV57 (sp 57-SK18)" 25,0*3,5*0,35 - 3,737 "dř. pr."		26,888			
	VV		"KV59 (sp 59-SK16)" 25,0*3,5*0,35 - 3,737 "dř. pr."		26,888			
	VV		"ZV61 (sp 61-65)" 2,0*3,5*0,35 - 0,202 "dř. pr."		2,248			
	VV		"KV61 (sp 61-SK14)" 26,0*3,5*0,35 - 3,939 "dř. pr."		27,911			
	VV		Součet		112,970			
27	K	5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové	m	324,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu směrového a výškového uspořádání ASP metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky</i>					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ56" 49,85+3+3		55,850			
	VV		"VČ57" 49,85+2+2		53,850			
	VV		"VČ59" 49,85+2+2		53,850			
	VV		"VČ61" 49,85+3+3		55,850			
	VV		Mezisoučet		219,400			
	VV		"KV56 (sp 56-55)" 2,0		2,000			
	VV		"KV56 (sp 56-SK20)" 25,0		25,000			
	VV		"KV57 (sp 57-SK18)" 25,0		25,000			
	VV		"KV59 (sp 59-SK16)" 25,0		25,000			
	VV		"ZV61 (sp 61-65)" 2,0		2,000			
	VV		"KV61 (sp 61-SK14)" 26,0		26,000			
	VV		Mezisoučet		105,000			
	VV		Součet		324,400			
29	K	5910021020	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeheř standardní spára svar sériový tv. S49	svar	32,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Svařování kolejnic termitem zkrácený předeheř standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovačů, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovačů, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž stvku.					
	VV		"VČ56" 8		8,000			
	VV		"VČ57" 8		8,000			
	VV		"VČ59" 6		6,000			
	VV		"VČ61" 10		10,000			
	VV		Součet		32,000			
30	K	5910040215	Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek	m	82,800		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže nebo montáže upevňovačů s osazením a odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce: Metr kolejnice=m</i>					
	VV		"VČ56" 5,0*2		10,000			
	VV		"VČ57" 5,0*2		10,000			
	VV		"VČ59" (2,2*2)+(5,0*2)		14,400			
	VV		"VČ61" 24,2*2		48,400			
	VV		Součet		82,800			
31	K	5910050010	Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačů výhybka I. generace	m	219,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž upevňovačů výhybka I. generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ56" 49,85+3+3		55,850			
	VV		"VČ57" 49,85+2+2		53,850			
	VV		"VČ59" 49,85+2+2		53,850			
	VV		"VČ61" 49,85+3+3		55,850			
	VV		Součet		219,400			
32	K	5910050110	Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačů výhybka I. generace	m	219,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž upevňovačů výhybka I. generace Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž spojek.					
	P		<i>Poznámka k položce: Rozvinutá délka výhybky=m</i>					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ56" 49,85+3+3		55,850			
	VV		"VČ57" 49,85+2+2		53,850			
	VV		"VČ59" 49,85+2+2		53,850			
	VV		"VČ61" 49,85+3+3		55,850			
	VV		Součet		219,400			
33	K	5910132030	Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici	pár	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV "VČ56"2		2,000			
			VV "VČ57"2		2,000			
			VV "VČ59"2		2,000			
			VV "VČ61"2		2,000			
			VV Součet		8,000			
44	K	5911231020	Výměna VP svorníku soustavy S49	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Výměna VP svorníku soustavy S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálů.					
	P		Poznámka k položce: Svorník=kus					
	VV		"VČ61" 12		12,000			
43	K	591404502R01	Oprava dílů krytých odvodňovacích zařízení šachty travivodu	kpl	1,000		0,00	
	PP		Oprava dílů krytých odvodňovacích zařízení šachty travivodu					
	P		Poznámka k položce: u VČ 59 - rozbitá šachta travivodu → propadává štěrka - oprava (např. dobetonování)					
34	K	9909000700	Poplatek za recyklaci kameniva	t	595,231		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Poplatek za recyklaci kameniva Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučeny, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	P		Poznámka k položce: mobilní recyklační linka - předpoklad 50% odpad					
	VV		ve výhybce + dl. spol. pražce					
	VV		"VČ56" ((49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,611-0,695) "pražce")*1,8		100,145			
	VV		"VČ57"((49,85+2+2)*3,2*0,35 - (7,611-0,520) "pražce")*1,8		95,798			
	VV		"VČ59" ((49,85+2+2)*3,2*0,35 - (7,611-0,520) "pražce")*1,8		95,798			
	VV		"VČ61" ((49,85+3+3)*3,2*0,35 - (7,611-0,695) "pražce")*1,8		100,145			
	VV		Mezisoučet		391,886			
	VV		"KV56 (sp 56-55)" (2,0*3,5*0,35 - 0,303 "df. pr.")*1,8		3,865			
	VV		"KV56 (sp 56-SK20)" (25,0*3,5*0,35 - 3,737 "df. pr.")*1,8		48,398			
	VV		"KV57 (sp 57-SK18)" (25,0*3,5*0,35 - 3,737 "df. pr.")*1,8		48,398			
	VV		"KV59 (sp 59-SK16)" (25,0*3,5*0,35 - 3,737 "df. pr.")*1,8		48,398			
	VV		"ZV61 (sp 61-65)" (2,0*3,5*0,35 - 0,202 "df. pr.")*1,8		4,046			
	VV		"KV61 (sp 61-SK14)" (26,0*3,5*0,35 - 3,939 "df. pr.")*1,8		50,240			
	VV		Mezisoučet		203,345			
	VV		Součet		595,231			
35	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	297,616		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučeny, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
	VV		předpoklad odpad 50%					
	VV		595,231*0,5		297,616			
36	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,300		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučeny, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.					
37	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	578,998		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
	VV		předpoklad odpad 50% - skládka (zemní výzisk)					
	VV		595,231*0,5		297,616			
	VV		plastové součásti					
	VV		0,3		0,300			
	VV		štěrka fr. 31,5/63					
	VV		(217,714*1,7)*0,5 "výhybky"		185,057			
	VV		(112,970*1,7)*0,5 "koleje"		96,025			
	VV		Součet		578,998			
38	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	1 686,488		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		Poznámka k položce: Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.					
	VV		štěrka fr. 31,5/63					
	VV		((217,714*1,7)*0,5)*6 "výhybky"		1 110,341			
	VV		((112,970*1,7)*0,5)*6 "koleje"		576,147			
	VV		Součet		1 686,488			
54	K	9901000100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Měrnou jednotkou je kus stroje.					
	VV		"zádržná opěrka proti putování" 1		1,000			
	VV		"VP svorníky" 1		1,000			
	VV		"protištěpné destičky" 1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
55	K	9901009200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	55,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Doprava materiálu mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Měrnou jednotkou je kus stroje.					
	VV		"zádržná opěrka proti putování" 1*35		35,000			
	VV		"VP svorníky" 1*10		10,000			
	VV		"protištěpné destičky" 1*10		10,000			
	VV		Součet		55,000			
53	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	3,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> MHS, ASPV, mobilní recyklační linka					
39	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI	t	281,082		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI					
	VV		štěrku fr. 31,5/63					
	VV		(217,714*1,7)*0,5 "výhybky"		185,057			
	VV		(112,970*1,7)*0,5 "koleje"		96,025			
	VV		Součet		281,082			
41	M	5961170070	Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i oporníci) S49 R300 pro jazky ohnuté i přímé	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i oporníci) S49 R300 pro jazky ohnuté i přímé					
42	M	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	44,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)					
45	M	5958110070	Vysokopevnostní svorník M24 x 290 mm	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vysokopevnostní svorník M24 x 290 mm					
46	M	5958110160	Vysokopevnostní svorník M24 x 470 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Vysokopevnostní svorník M24 x 470 mm					
48	M	5958113000	Součást svorníku výkovek kulové podložky	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součást svorníku výkovek kulové podložky					
49	M	5958113005	Součást svorníku výkovek kuželové pánve	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součást svorníku výkovek kuželové pánve					
50	M	59581130R01	Podložka 1 S49 60x12x65 mm šikmá	kus	6,000		0,00	
	PP		Podložka 1 S49 60x12x65 mm šikmá					
51	M	59581130R02	Podložka 2 S49 60x12x65 mm šikmá	kus	6,000		0,00	
	PP		Podložka 2 S49 60x12x65 mm šikmá					
52	M	5958116000	Matice šestihřanné M24	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Matice šestihřanné M24					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Soupis:

A.3.2 - Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT

KSO:

Místo: ŽST Cheb

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Soupis:

A.3.2 - Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT

Místo: ŽST Cheb

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Monika
Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Soupis:

A.3.2 - Materiál zajištěný objednatelem - NEOCEŇOVAT

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	M	5956101005	Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 2 2600x260x150 mm	kus	155,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub skupina 2 2600x260x150 mm					
2	M	5956122020	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150	kus	36,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2600x260x150					
3	M	5956122025	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2700x260x150					
4	M	5956122030	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150	kus	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2800x260x150					
5	M	5956122035	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150	kus	16,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 2900x260x150					
6	M	5956122040	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3000x260x150					
7	M	5956122045	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3100x260x150					
8	M	5956122050	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3200x260x150					
9	M	5956122055	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3300x260x150					
10	M	5956122060	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3400x260x150					
11	M	5956122065	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3500x260x150					
12	M	5956122070	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3600x260x150					
13	M	5956122075	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3700x260x150					
14	M	5956122080	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3800x260x150					
15	M	5956122085	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 3900x260x150					
16	M	5956122090	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150	kus	12,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4000x260x150					
17	M	5956122095	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4100x260x150					
18	M	5956122100	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4200x260x150					
19	M	5956122105	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4300x260x150					
20	M	5956122110	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4400x260x150					
21	M	5956122115	Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150	kus	11,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Pražec dřevěný výhybkový dub skupina 4 4500x260x150					
41	M	5961146095	Jazyk JS49 1:9-300 levý ohnutý 12025 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Jazyk JS49 1:9-300 levý ohnutý 12025 mm					
42	M	5961147085	Opornice JS49 1:9-300 levá přímá 13607 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Opornice JS49 1:9-300 levá přímá 13607 mm					
28	M	5961149050	Přidrážnice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300 4500 mm ohnutá	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Přidrážnice Kn60 výhybky jednoduché JS49 1:9-300 4500 mm ohnutá					
	P		Poznámka k položce: uložena u TO Chodov					
29	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)	kus	1 502,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			PP Kompletly ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, dvojitý pružný kroužek Fe6, svěrka ŽS4)					
30	M	5958134035	Součásti upevňovací svěrka VT2	kus	426,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací svěrka VT2					
31	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	4 612,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6					
32	M	5958134042	Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80)	kus	452,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací šroub svěrkový T10 (M24x80)					
33	M	5958134115	Součásti upevňovací matice M24	kus	452,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací matice M24					
34	M	5958134075	Součásti upevňovací vrtule R1(145)	kus	2 864,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací vrtule R1(145)					
35	M	5958134080	Součásti upevňovací vrtule R2 (160)	kus	1 296,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Součásti upevňovací vrtule R2 (160)					
36	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	660,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6					
37	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	756,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)					
39	M	5958173000	Polyetylenové pásy v kotoučích	m2	60,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Polyetylenové pásy v kotoučích					
40	M	5957201010	Kolejnice užitě tv. S49	m	46,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Kolejnice užitě tv. S49					
43	M	759419001R01	Propojka kolejnicová LCI 1xFe 20/60 (HM0404223990180)	kus	8,000		0,00	
			PP Propojka kolejnicová LCI 1xFe 20/60 (HM0404223990180)					
44	M	759419001R02	Propojka kolejnicová LCI 1xFe 20/120 (HM0404223990179)	kus	3,000		0,00	
			PP Propojka kolejnicová LCI 1xFe 20/120 (HM0404223990179)					
45	M	759419001R03	Propojka kolejnicová LBI 1xFe 20/120 (HM0404223990420AV)	kus	3,000		0,00	
			PP Propojka kolejnicová LBI 1xFe 20/120 (HM0404223990420AV)					
46	M	5958110080	Vysokopevnostní svorník M24 x 310 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Vysokopevnostní svorník M24 x 310 mm Poznámka k položce: vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
47	M	5958110090	Vysokopevnostní svorník M24 x 330 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Vysokopevnostní svorník M24 x 330 mm Poznámka k položce: vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
48	M	5958110100	Vysokopevnostní svorník M24 x 350 mm	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Vysokopevnostní svorník M24 x 350 mm Poznámka k položce: vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
49	M	5958110110	Vysokopevnostní svorník M24 x 370 mm	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Vysokopevnostní svorník M24 x 370 mm Poznámka k položce: vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
50	M	5958110130	Vysokopevnostní svorník M24 x 410 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Vysokopevnostní svorník M24 x 410 mm Poznámka k položce: vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
51	M	5958110140	Vysokopevnostní svorník M24 x 430 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Vysokopevnostní svorník M24 x 430 mm Poznámka k položce: vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					
52	M	5958110175	Vysokopevnostní svorník M24 x 500 mm	kus	1,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
			PP Vysokopevnostní svorník M24 x 500 mm Poznámka k položce: vč. kuželové podložky, kuželové pánve, podložky šikmé a matice M24 x 2 (dvojitě)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Soupis:

A.3.3 - Práce SSZT a SEE

KSO:

Místo: ŽST Cheb

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Soupis:

A.3.3 - Práce SSZT a SEE

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika
Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61

Soupis:

A.3.3 - Práce SSZT a SEE

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	7493371010	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:7,5-190, 1:9-190 - veškeré výstroje EOv na výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ56, VČ57, VČ59, VČ61					
2	K	7493371012	Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:12-500	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek kompletní topné soupravy na výhybku tvaru 1:12-500 - veškeré výstroje EOv na výhybce, topných tyčí, připojovacích skříněk, napájecích kabelů, oddělovacích transformátorů					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ56, VČ57, VČ59, VČ61					
3	K	7493351022	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) kompletní topné soupravy na jednoduchou výhybku soustavy S49, R65 a UIC60 s poloměrem odbočení 300 m - včetně kompletního vybavení topných tyčí, příchytěk hlavíc topných tyčí, pérových příchytěk vlastních topných tyčí, připojovacích šňůr, chrániček pro tyto šňůry, připojovacích rozvodných skříněk vč. nosných konstrukcí těchto skříněk, dále topnice pro ohřev táhel všech přestavníků vč. sálavých desek a veškerého drobného spojovacího a upevňovacího materiálu					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ56, VČ57, VČ59, VČ61					
5	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ56, VČ57, VČ59, VČ61					
6	K	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ56, VČ57, VČ59, VČ61					
7	K	7591015030	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na pražci	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na pražci - přípevnění přestavníku pomocí přípevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, opravný nátěr. Bez zemních prací					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ56, VČ57, VČ59, VČ61					
8	K	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	4,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a seřízení přestavníkové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> VČ56, VČ57, VČ59, VČ61					
9	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami					
10	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	6,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech					
11	K	7594107400	Demontáž propojky kolíkové	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž propojky kolíkové - demontáž matic a podložek, vyrazení kolíků propojení ze stojiny kolejnice					
	VV		"VČ56" 6		6,000			
	VV		"VČ57" 6		6,000			
	VV		"VČ59" 6		6,000			
	VV		"VČ61" 6		6,000			
	VV		Součet		24,000			
12	K	7594105400	Montáž propojky kolíkové	kus	24,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž propojky kolíkové - naražení kolíků do dřev. ve stojině kolejnice, nasazení podložky a dotažení matice					
	VV		"VČ56" 6		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"VČ57" 6		6,000			
	VV		"VČ59" 6		6,000			
	VV		"VČ61" 6		6,000			
	VV		Součet		24,000			
14	K	7592007070	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Demontáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1					
15	K	7592005070	Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Montáž počítačícího bodu počítače náprav PZN 1 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.4 - VON

KSO:

Místo: ŽST Cheb

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel:

Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Monika Roztočilová, DiS.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.4 - VON

Místo: ŽST Cheb

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 12. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel: Ing. Monika
Roztočilová, DiS.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb

Objekt:

A.4 - VON

Místo: ŽST Cheb

Datum: 12. 1. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s.o.; OŘ UNL - ST K. Vary

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Monika Roztočilová, DiS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

1	K	031101041	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	%			0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč					
	P		<i>Poznámka k položce: ze ZRN</i>					
2	K	021211001	Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	8,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání zprávy o výsledku.					
3	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%			0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Geodetické práce Geodetické práce před opravou					
	P		<i>Poznámka k položce: A.1.1 - VČ5+výběhy přípravné geodetické práce - kontrola vytyčovací sítě</i>					
4	K	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	%			0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy					
	P		<i>Poznámka k položce: A.1.1 - VČ5+výběhy provizorní geodetické práce</i>					
5	K	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná	km	0,200		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.					
	P		<i>Poznámka k položce: A.1.1 - VČ5+výběhy Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.</i>					
	VV		0,200		0,200			
6	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	1 453,830		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění prací při zřizování a udržování bezstykové koleje podle př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti a řízení postupu prací, předání prací a dokladů objednateli.					
	VV		"A.1.1" 216,3+198,63		414,930			
	VV		"A.2.1" 415,4+362,7		778,100			
	VV		"A.3.1" 41,4+219,4		260,800			
	VV		Součet		1 453,830			
7	K	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	%			0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na vytyčení sítí ve správě provozovatele.					
	P		<i>Poznámka k položce: z prací dotčených - cizí subjekty (mimo zařízení ve správě a evidenci SEE a SSZT)</i>					

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2024											
					3. -1	4. 1	5. 2	6. 3	7. 4	8. 5	9. 6	10. 7	11. 8	12. 9	1. 10	
0	HMG Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb	263 dny	2.4. 24	20.12. 24												
1	Zahájení stavby / předání staveniště	0 dny	2.4. 24	2.4. 24												
2	Etapa 0 - Přípravné práce	6 dny	2.4. 24	7.4. 24												
3	zařízení staveniště	6 dny	2.4. 24	7.4. 24												
4	dovoz mechanizace	6 dny	2.4. 24	7.4. 24												
5	převzetí materiálu objednatele	4 dny	2.4. 24	5.4. 24												
6	přípravné práce neomezuující provoz dráhy	6 dny	2.4. 24	7.4. 24												
7	Etapa 1 - stavební část	115 dny	8.4. 24	31.7. 24												
8	stavební postup č.1 - TSO výhybek č. 5, 6, 8	15 dny	8.4. 24	22.4. 24												
9	demontáž vybavení výhybek a koleje	2 dny	8.4. 24	9.4. 24												
10	výměna pražců	11 dny	8.4. 24	18.4. 24												
11	odstranění kolejového lože do 0,20m pod ložnou plochu pra	11 dny	8.4. 24	18.4. 24												
12	výměna upevňovadel, pryžových a polyetylenových podložek	11 dny	8.4. 24	18.4. 24												
13	doplnění štěrku fr. 31,5/63	13 dny	8.4. 24	20.4. 24												
14	výměna výhybkových součástí	11 dny	8.4. 24	18.4. 24												
15	výměna LISŮ	1 den	16.4. 24	16.4. 24												
16	opravy ve výhybkách navařením	1 den	18.4. 24	18.4. 24												
17	výměna kolejnic a posuny kolejnic	11 dny	8.4. 24	18.4. 24												
18	úprava geometrických parametrů ve výhybkách, přípojných polích a výběžích (ASPv)	2 dny	18.4. 24	19.4. 24												
19	zhotovení svarů a zřízení bezstykové koleje	5 dny	18.4. 24	22.4. 24												
20	montáž vybavení výhybek a koleje	3 dny	20.4. 24	22.4. 24												
21	stavební postup č.2 - TSO výhybek č. 30, 31, 32, 34, 35, 37	30 dny	9.5. 24	7.6. 24												
22	demontáž vybavení výhybek a koleje	4 dny	9.5. 24	12.5. 24												
23	výměna pražců	24 dny	9.5. 24	1.6. 24												
24	odstranění kolejového lože do 0,20m pod ložnou plochu pra	24 dny	9.5. 24	1.6. 24												
25	výměna upevňovadel, pryžových a polyetylenových podložek	24 dny	9.5. 24	1.6. 24												
26	doplnění štěrku fr. 31,5/63	24 dny	11.5. 24	3.6. 24												
27	výměna výhybkových součástí	24 dny	9.5. 24	1.6. 24												
28	výměna LISŮ	4 dny	28.5. 24	31.5. 24												
29	opravy ve výhybkách navařením	1 den	1.6. 24	1.6. 24												
30	výměna kolejnic a posuny kolejnic	24 dny	9.5. 24	1.6. 24												
31	úprava geometrických parametrů ve výhybkách, přípojných polích a výběžích (ASPv)	3 dny	31.5. 24	2.6. 24												
32	zhotovení svarů a zřízení bezstykové koleje	7 dny	31.5. 24	6.6. 24												
33	montáž vybavení výhybek a koleje	6 dny	2.6. 24	7.6. 24												
34	stavební postup č.3 - TSO výhybek č. 56, 57, 59, 61	20 dny	12.7. 24	31.7. 24												
35	demontáž vybavení výhybek a koleje	2 dny	12.7. 24	13.7. 24												
36	výměna pražců	15 dny	12.7. 24	26.7. 24												
37	odstranění kolejového lože do 0,20m pod ložnou plochu pra	15 dny	12.7. 24	26.7. 24												
38	výměna upevňovadel, pryžových a polyetylenových podložek	15 dny	12.7. 24	26.7. 24												
39	doplnění štěrku fr. 31,5/63	17 dny	12.7. 24	28.7. 24												
40	výměna výhybkových součástí	15 dny	12.7. 24	26.7. 24												
41	oprava šachty trativodu	1 den	12.7. 24	12.7. 24												
42	výměna kolejnic a posuny kolejnic	15 dny	12.7. 24	26.7. 24												
43	úprava geometrických parametrů ve výhybkách, přípojných polích a výběžích (ASPv)	1 den	27.7. 24	27.7. 24												
44	zhotovení svarů a zřízení bezstykové koleje	3 dny	28.7. 24	30.7. 24												
45	montáž vybavení výhybek a koleje	4 dny	28.7. 24	31.7. 24												
46	Etapa 2 - Dokončovací práce	6 dny	1.8. 24	6.8. 24												
47	dokončovací práce neomezuující provoz dráhy	4 dny	1.8. 24	4.8. 24												
48	předání vyzískaného materiálu	2 dny	1.8. 24	2.8. 24												
49	odvoz mechanizace	6 dny	1.8. 24	6.8. 24												
50	odstranění zařízení staveniště	6 dny	1.8. 24	6.8. 24												
51	Etapa 3 - Dokladová část	263 dny	2.4. 24	20.12. 24												
52	příprava dokladů potřebných k ukončení výluky, stavebních prací a předání díla	263 dny	2.4. 24	20.12. 24												
53	Dokončení Díla / Předání díla	0 dny	20.12. 24	20.12. 24												

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Za Zhotovitele:**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

Autorizovaný/Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	XXX
Adresa	XXX
E-mail	XXX
Telefon	XXX

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 24 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 24 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
ATE, s.r.o., Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb, IČO: 483 60 473	A.1.3 – pol č. 1-14, A.2.3 – pol č. 1-19, A.3.3 – pol č. 1-15	10,18 %
FOXGeo s.r.o., Za tratí 928/6, Čakovice, 196 Praha 9, IČO: 050 90 709	A.4 – pol č. 3,4,5,6	1,00 %
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb IČO: 468 87 261	A.1.1 – pol. č.1-12	3,69 %

PŘÍLOHA Č. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená v souladu s ust. S 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v znění pozdějších předpisů v souvislosti s realizací stavby

„Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb“

vystupující dále pod názvem:
"Společnost Výhybky Cheb"

TSS GRADE, a.s.

se sídlem: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 35802723

DIČ: 2020281571

zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a
Ing. Markem Chomou, členem představenstva

zapsaná do: Obchodního rejstříku Městského soudu Bratislava III

podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky

TSS GRADE, a. s. pobočka Česká republika

se sídlem: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, česká republika

IČO: 02765055

DIČ: CZ02765055

bankovní spojení: XXX č. ú.: XXX

zapsaná do: Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 26126
dále jen jako „vedoucí společník“

N + N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, česká republika

IČO: 44564287

DIČ: CZ44564287

zastoupená: Ing. Tomáš Novák, jednatel

zapsána do: Obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1805 dále jen „druhý společník“

- Smlouva o společnosti, podepsaná ke dni 07. 03. 2024, osobami oprávněnými jednat za vedoucího a druhého společníka.

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

č. j.: [•]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	
Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]
Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/nееlektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]

Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení - specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu - budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:		xxx

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:

Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	

**Podpis vystavitele a datum vystavení
osvědčení:**

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně pole zůstane prázdné.

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatele: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „**Smlouva**“), uzavřené mezi Objednatelem Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „**Objednatel**“) a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno Klikněte sem a zadejte text.
Sídlo/místo podnikání Klikněte sem a zadejte text.
IČO Klikněte sem a zadejte text.
Právní forma Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupen Klikněte sem a zadejte text.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu.

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce¹

Jméno a příjmení	Datum narození	Zaměstnanec Zhotovitele / Poddodavatele	Datum prvního zapojení do realizace Díla	Datum ukončení zapojení do realizace Díla	Označení cílové skupiny zapojené osoby ² a doložení doklady	
					Cílová skupina	Příloha evidence
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	1
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	2
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	3

¹ Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla.

² Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 17.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací dokumentace.

Rekapitulace zapojení osob³

Jméno a příjmení	Datum narození	Kalendářní měsíc	Počet pracovních dnů zapojení	Počet hodin výkonu činnosti Díla	Stručný popis konkrétní vykonávané činnosti této osoby při realizaci Díla
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	mm.rrrr	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Fond pracovních úkolů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním měsíci:

Kalendářní měsíc ⁴	Počet pracovních dnů celkem	Počet pracovních dnů, které se nezohledňují ⁵	Důvod, pro něž se příslušné pracovní dny nezohledňují ⁶	Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“		„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Fond pracovních úkolů celkem⁷				„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový list, potvrzení o studiu ze dne ...]“

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele:

³ Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu).

⁴ Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba.

⁵ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

⁶ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

⁷ Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy).

V Klikněte sem a zadejte text.**dne** Klikněte sem a zadejte text.

.....

Klikněte sem a zadejte text.
