


ID		Režim úkolu	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
1			Bezpečnostní testy na IZ2024	9 dny	15.10. 24	25.10. 24		
2			Přechod na novou doménu identita.gov.cz	64 dny?	10.09. 24	06.12. 24		
3			Zadání RFC od zákazníka	1 den	10.09. 24	10.09. 24		
4			Příprava PNČ	22 dny	11.09. 24	10.10. 24	3	
5			Schválení PNČ	4 dny	11.10. 24	16.10. 24	4	
6			Kick-off	1 den?	18.10. 24	18.10. 24	5	
7			Změna textací v dokumentaci / notifikace / protál..	3 dny	18.10. 24	22.10. 24		
8			Kontrola textací na portálu + notifikace	3 dny	18.10. 24	22.10. 24		NAKIT
9			Dokumentace co dodává analýza	3 dny	18.10. 24	22.10. 24		NAKIT
10			Vývoj změn textace	3 dny	18.10. 24	22.10. 24		NAKIT
11			Úprava dokumentace - vývoj	3 dny	18.10. 24	22.10. 24		NAKIT
12			Příprava scénářů k testování úprav na TEST a PRO	3 dny	18.10. 24	22.10. 24		NAKIT
13			Bezpečnost úprava dokumentace	3 dny	18.10. 24	22.10. 24		NAKIT
14			Komunikační plán a informování SeP a IdP o plánovaných změnách. Dále ostatních 3. stran, jako SMS provider, ISZR, ISDS, Mobilní klíč, Mobilní aplikace.	5 dny	21.10. 24	25.10. 24	6	DIA
15			Banner na NIA o plánované změně pro občany	1 den	28.10. 24	28.10. 24	14	DIA
16			Příprava a změna portálu info.identitaobana.cz	4 dny	28.10. 24	31.10. 24	14	DIA
17			Žádost o certifikát *.identita.gov.cz	1 den	21.10. 24	21.10. 24	6	NDT
18			Žádost o certifikát *.servicesnia.net	1 den	21.10. 24	21.10. 24	6	NDT
19			Vydání certifikátů od CA	3 dny	22.10. 24	24.10. 24	17;18	DIA
20			Instalace vydaných certifikátů na AFD	1 den	25.10. 24	25.10. 24	19	NDT

Project: Přechod na novou dom
Date: 11.10. 24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID		Režim úkolu	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
21			Instalace certifikátů na GG-IIS	1 den	25.10. 24	25.10. 24	19	NAKIT
22			Instalace certifikátů na PORTAL	1 den	25.10. 24	25.10. 24	19	NAKIT
23			Instalace certifikátů na MWEOP	1 hodina	25.10. 24	25.10. 24	19	Monet +
24			Nastavení Bindings na všech IIS	1 den	28.10. 24	28.10. 24		
25			Nastavení na GG-IIS	1 den	28.10. 24	28.10. 24	1	NAKIT
26			nastavení na PORTAL	1 den	28.10. 24	28.10. 24	1	NAKIT
27			Nastavení na MWEOP	1 den	28.10. 24	28.10. 24	1	Monet +
28			Úpravy souborů web.config o novou doménu	2 dny	29.10. 24	30.10. 24	26	NAKIT
29			Vytvoření technických site na IIS	1 den	29.10. 24	29.10. 24	24	NDT;NAKIT
30			Aktualizace Trusted Relying parties TEST	1 den	29.10. 24	29.10. 24	24	NDT
31			Aktualizace Trusted Relying parties PROD	2 dny	30.10. 24	31.10. 24	30	NDT
32			Aktualizace HOSTS TEST	2 dny	30.10. 24	31.10. 24	30	NAKIT
33			Aktualizace HOSTS PROD	1 den	01.11. 24	01.11. 24	31	NAKIT
34			Konfigurace custom domains AFD	1 den	29.10. 24	29.10. 24	24	NDT
35			Konfigurace Group origins AFD	1 den	29.10. 24	29.10. 24	24	NDT
36			Konfigurace Routes AFD	1 den	29.10. 24	29.10. 24	24	NDT
37			Úprava záznamů DNS pro doménu *.identita.gov.cz	2 dny	30.10. 24	31.10. 24	34	NAKIT/CMS
38			Úprava záznamů DNS pro doménu *.servicesnia.net	2 dny	30.10. 24	31.10. 24	34	NDT
39			Testovací prostředí	23 dny	30.10. 24	29.11. 24		
40			Základní test komunikace přes doménu *.identita.gov.cz	1 den	01.11. 24	01.11. 24	38	NDT;NAKIT

Project: Přejít na novou dom
Date: 11.10. 24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			


ID		Režim úkolu	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
41			Úprava DNS záznamů pro t*.identitaobcana.cz	1 den	04.11. 24	04.11. 24	40	NAKIT/CMS
42			Úprava DNS záznamů pro t*.narodnibod.cz	1 den	04.11. 24	04.11. 24	40	NAKIT/CMS
43			Testování komunikace pro t*.identitaobcana.cz	5 dny	04.11. 24	08.11. 24	40	NDT;NAKIT
44			Odstávka a finální konfigurace NIA pro *.identita.gov.cz	1 den	16.11. 24	16.11. 24	43	NDT;NAKIT
45			Nasazení nízkého nálezu od Neurodou					
46			Změny všech textů, které odkazují na doménu *.identitaobcana.cz	1 den	16.11. 24	16.11. 24	7;43	NDT;NAKIT
47			Úpravy web.config a specifických souborů obsahující odkazy na *.identitaobcana.cz	1 den	16.11. 24	16.11. 24	43;7	NAKIT
48			Testování	1 den	16.11. 24	16.11. 24	43	NDT;NAKIT
49			Informování IdP o změně v testovacím prostředí	1 den	16.11. 24	16.11. 24	43	DIA
50			Ukončení odstávky	1 den	16.11. 24	16.11. 24		
51			Testování - testeři	5 dny	18.11. 24	22.11. 24		NAKIT
52			Produkční prostředí	10 dny?	25.11. 24	06.12. 24	51	
53			Základní test komunikace přes doménu *.identita.gov.cz	1 den?	25.11. 24	25.11. 24	51	NDT;NAKIT
54			Úprava DNS záznamů pro *.identitaobcana.cz	1 den	26.11. 24	26.11. 24	53	NAKIT/CMS
55			Úprava DNS záznamů pro *.narodnibod.cz	1 den	26.11. 24	26.11. 24	53	NAKIT/CMS
56			Testování komunikace pro *.identitaobcana.cz	1 den	26.11. 24	26.11. 24	53	NDT;NAKIT

Project: Přečhod na novou dom
Date: 11.10. 24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

ID		Režim úkolu	Task Name	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
57			Odstávka a finální konfigurace NIA pro *.identita.gov.cz	1 den	30.11. 24	30.11. 24	56	NDT;NAKIT
58			Nasazení nízkého nálezu od Neurodou					
59			Změny všech textů, které odkazují na doménu *.identitaobcana.cz	1 den	30.11. 24	30.11. 24	56	NDT;NAKIT
60			Úpravy web.config a specifických souborů obsahující odkazy na *.identitaobcana.cz	1 den	30.11. 24	30.11. 24	56	NAKIT
61			Testování	1 den	30.11. 24	30.11. 24		
62			Informování IdP o změně v produkčním prostředí	1 den	30.11. 24	30.11. 24	56	DIA
63			Ukončení odstávky	1 den	30.11. 24	30.11. 24	62	
64			Stabilizace / kontrola prostředí	5 dny	02.12. 24	06.12. 24	57	
65			Akceptace	6 dny	02.12. 24	09.12. 24		
66			Podpis akceptačních protokolů na straně zákazníka	4 dny	02.12. 24	05.12. 24	57	NAKIT/DIA
67			Podpis akceptačního protokolu na straně dodavatele	2 dny	06.12. 24	09.12. 24	66	NDT;NAKIT

Project: Přečod na novou dom
Date: 11.10. 24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

Text1		Text2		09.IX 24							16.IX 24							23.IX 24							30.IX 24							07.X 24							14.X 24						
				P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N

Součinnost

Součinnost

Součinnost

Součinnost

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline


Progress

Manual Progress


Project: Přechod na novou dom

Date: 11.10. 24

Page 5

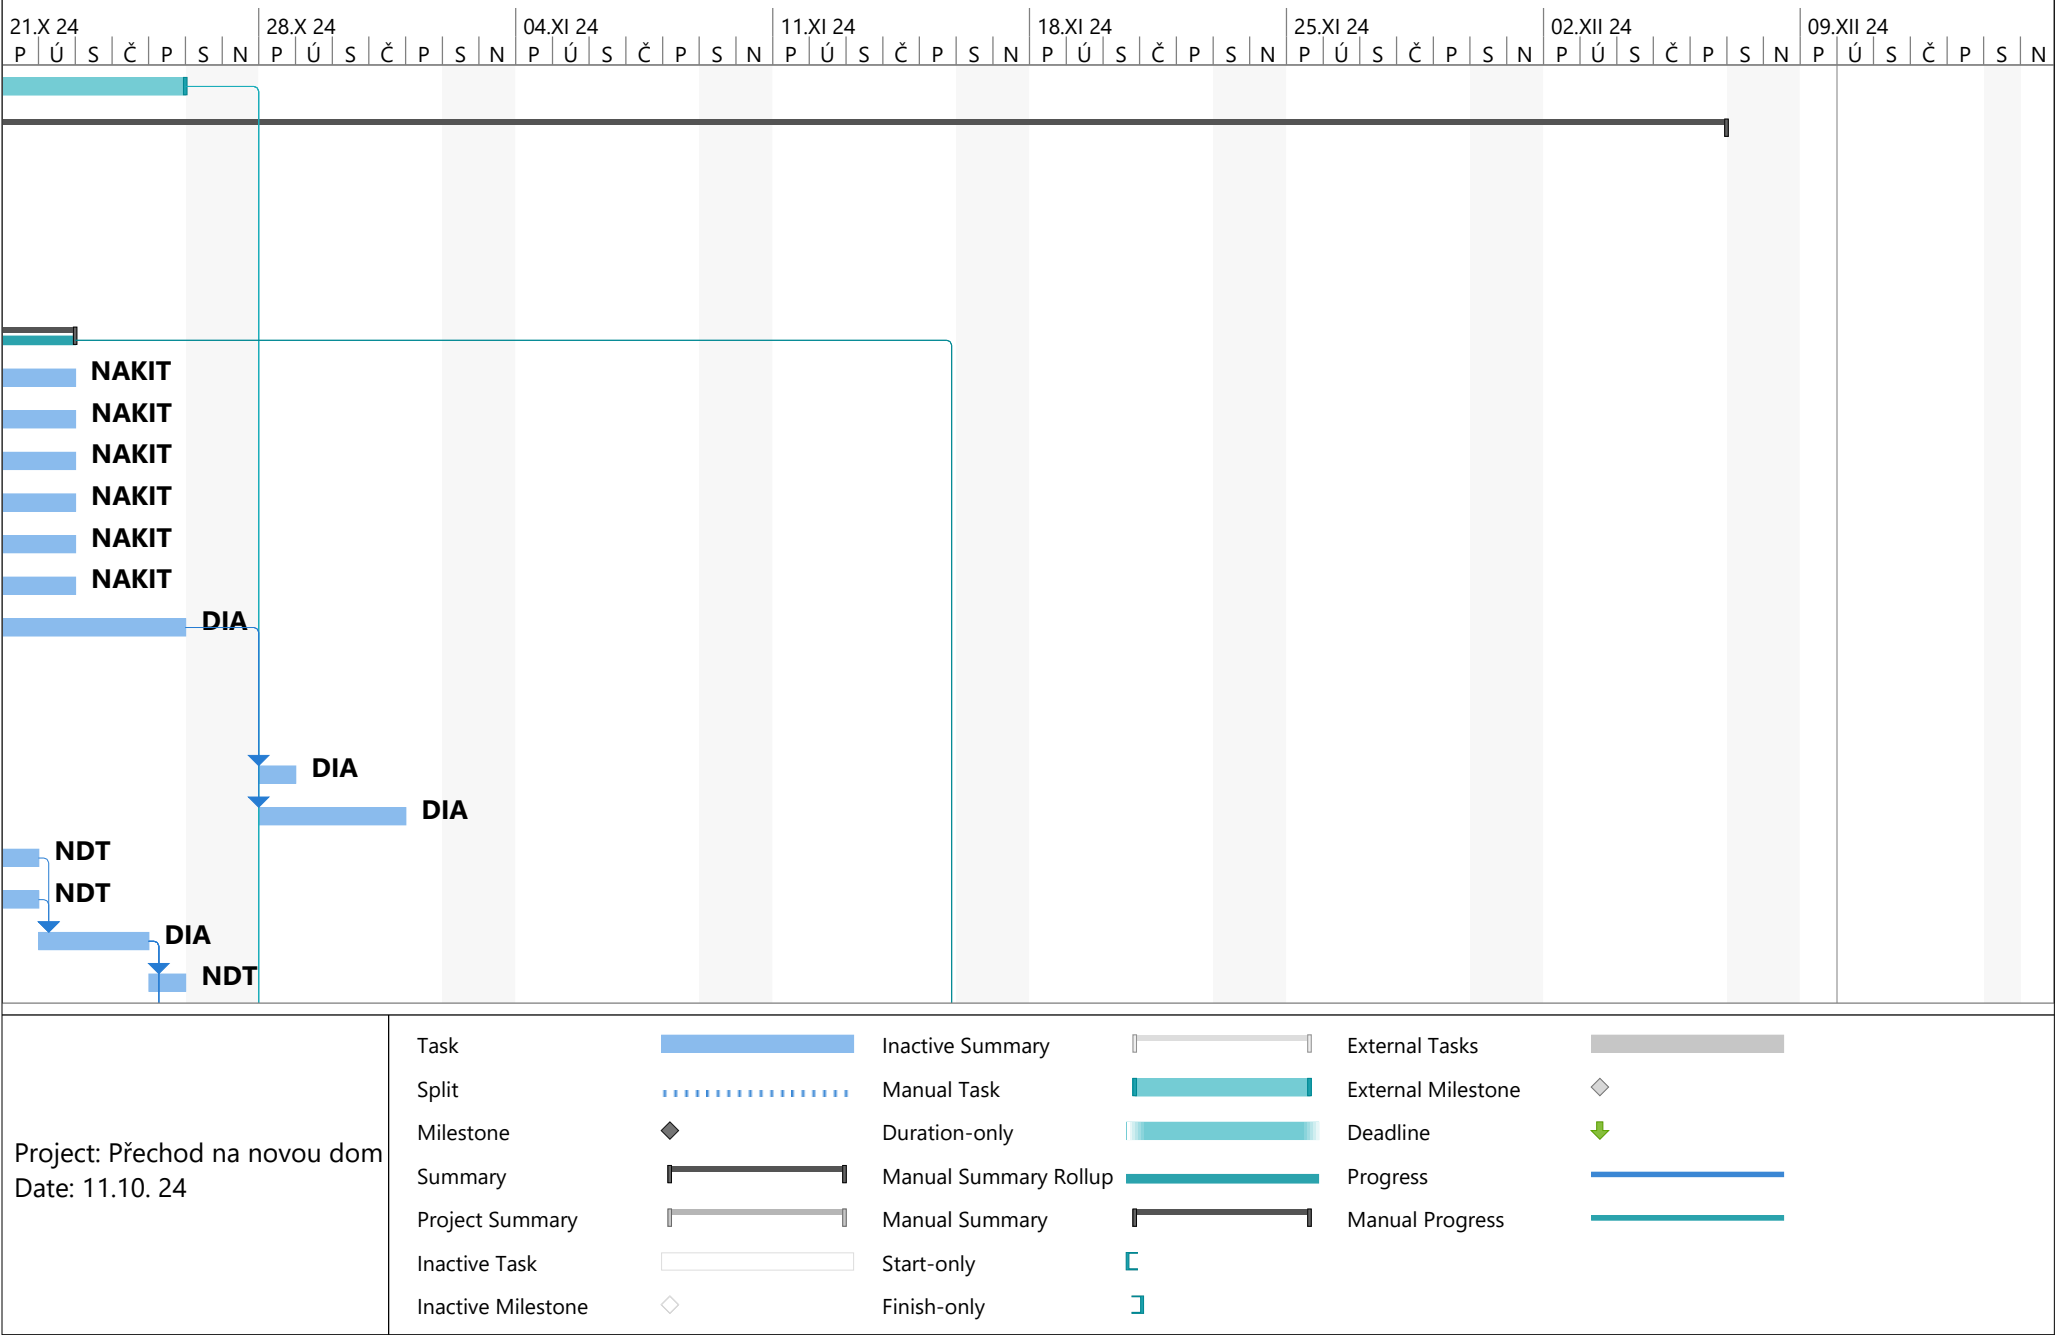


Project: Přechod na novou dom
Date: 11.10. 24

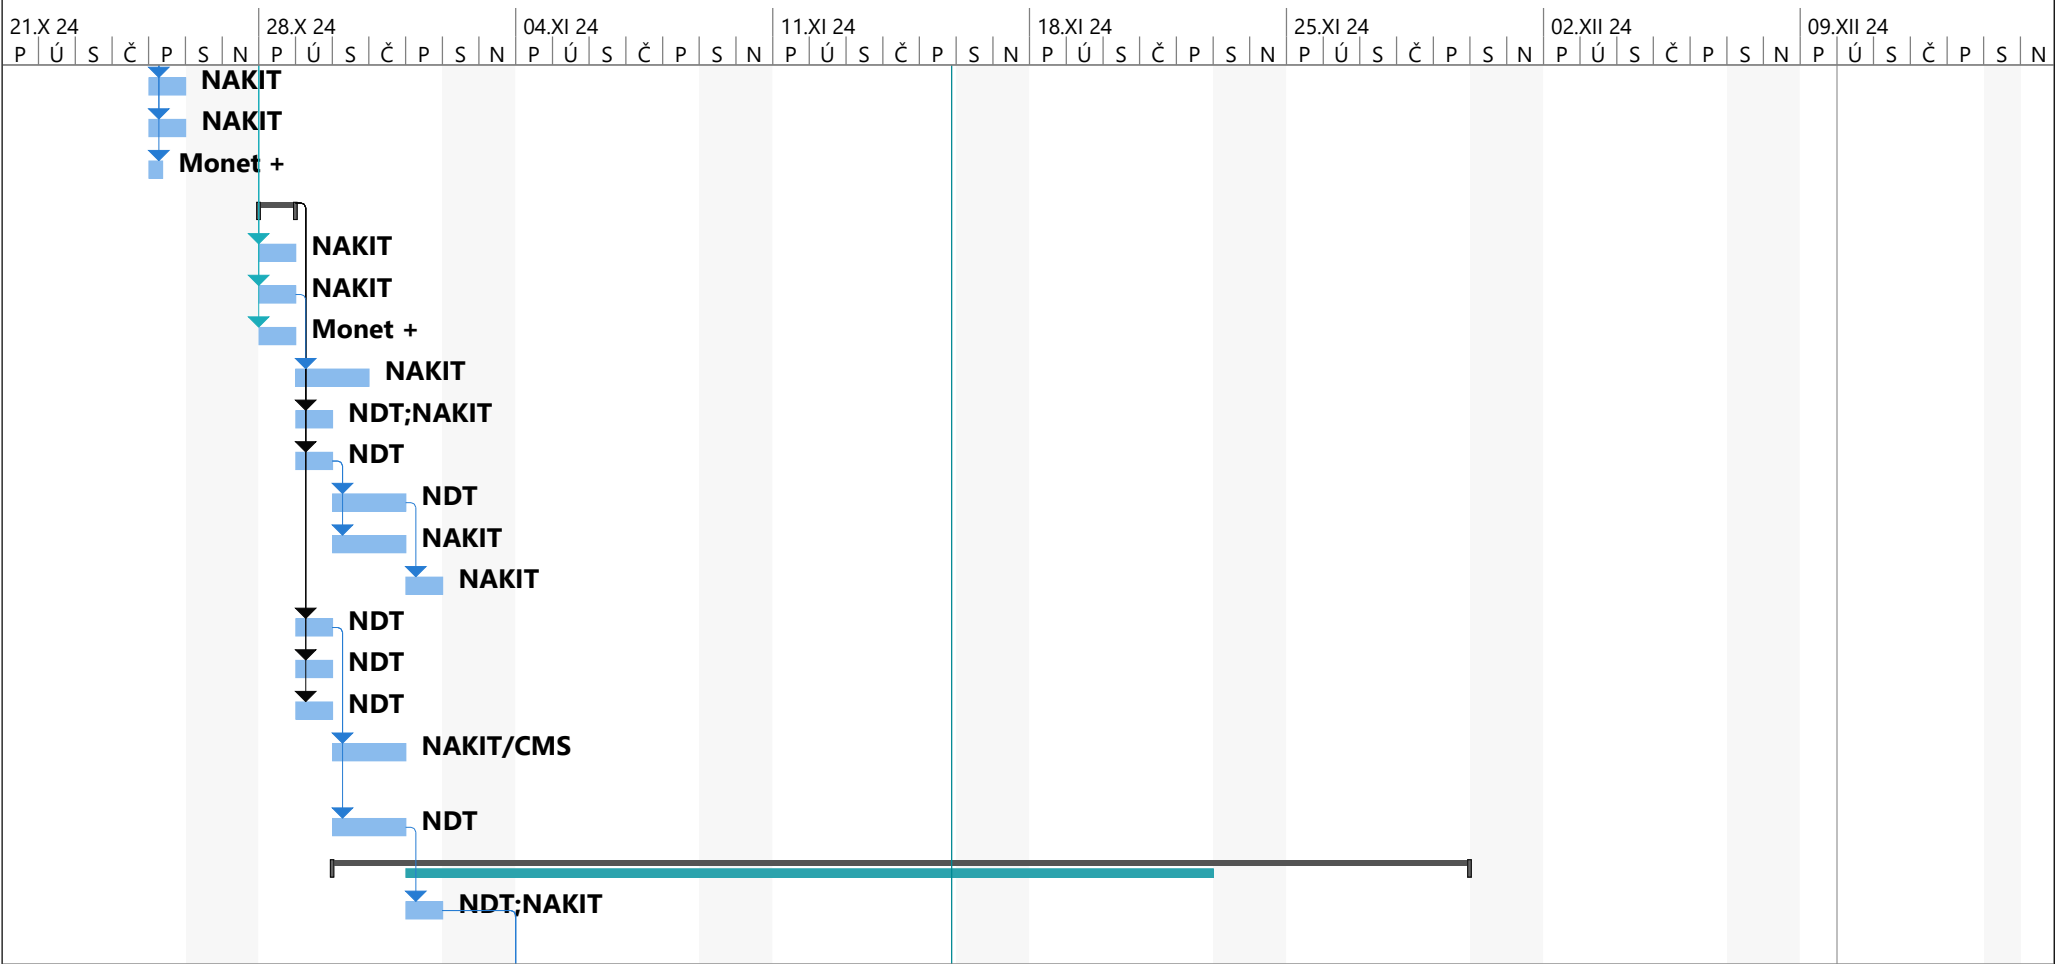


Project: Přechod na novou dom
Date: 11.10. 24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

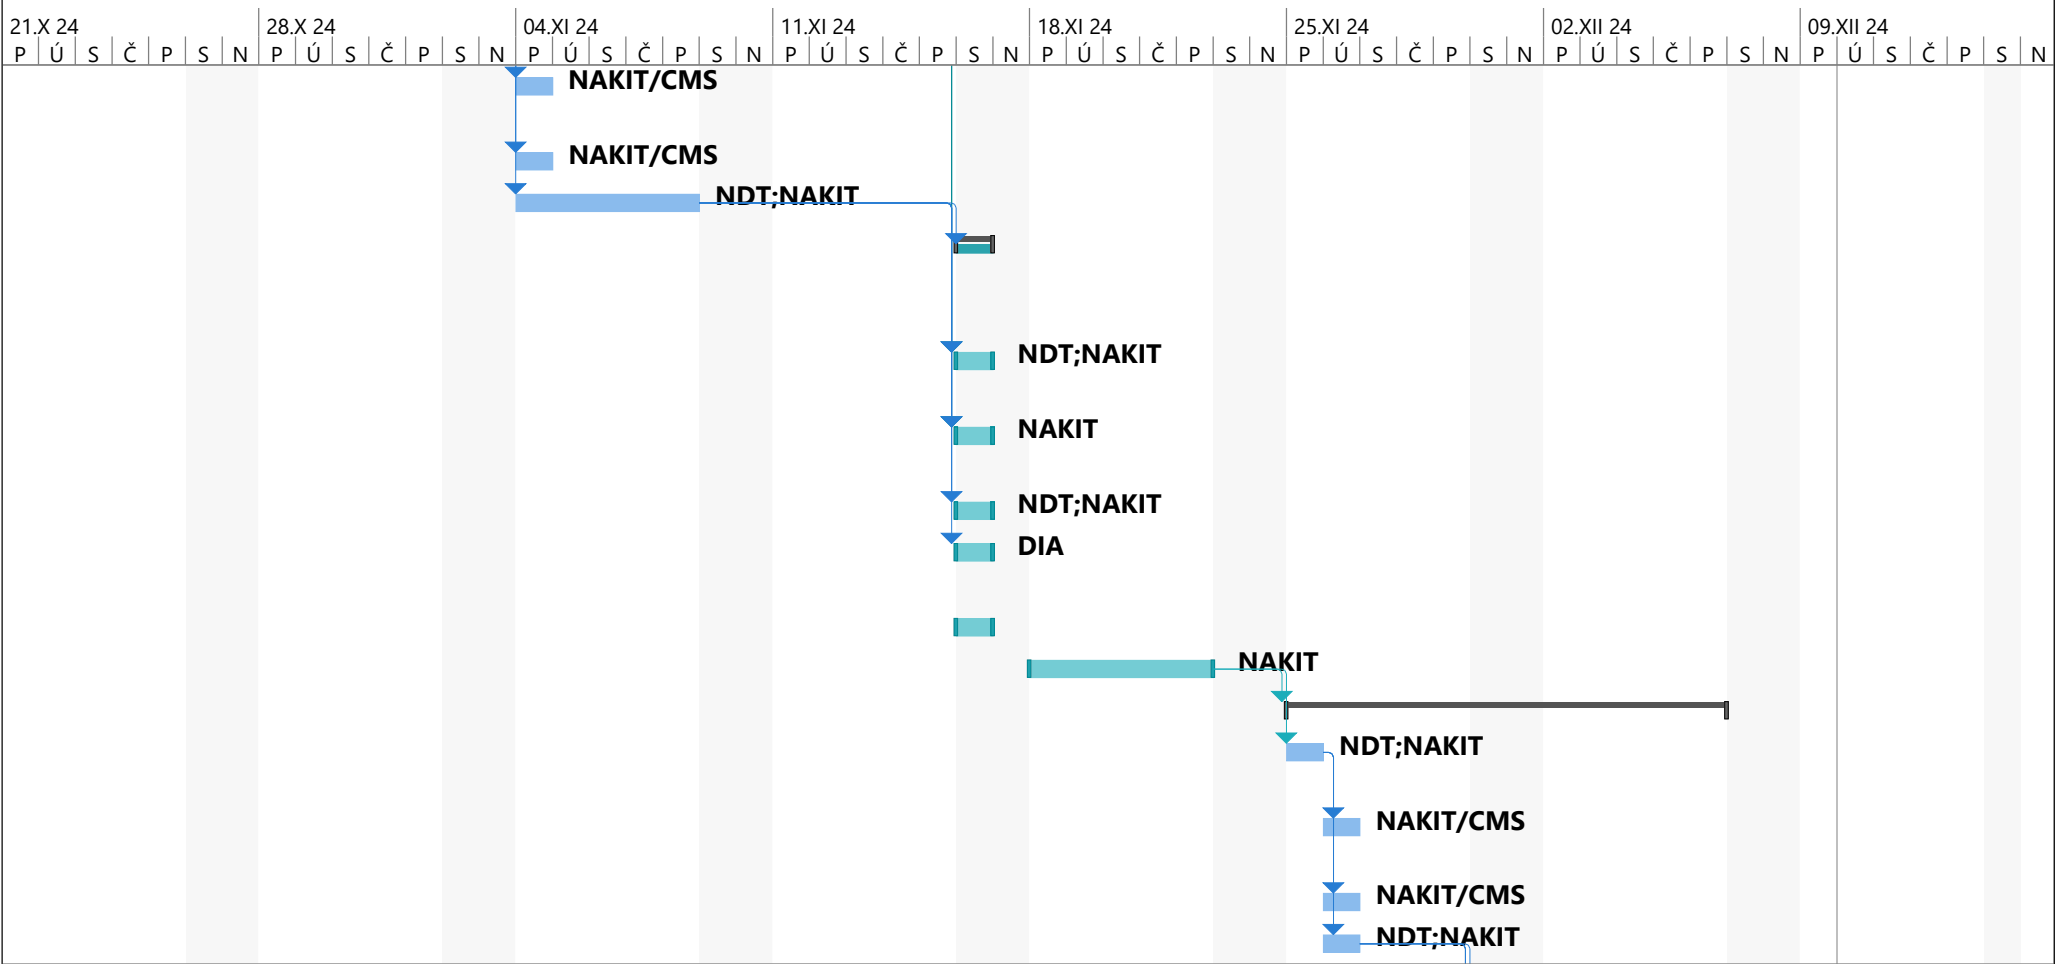

Project: Přechod na novou dom
Date: 11.10. 24

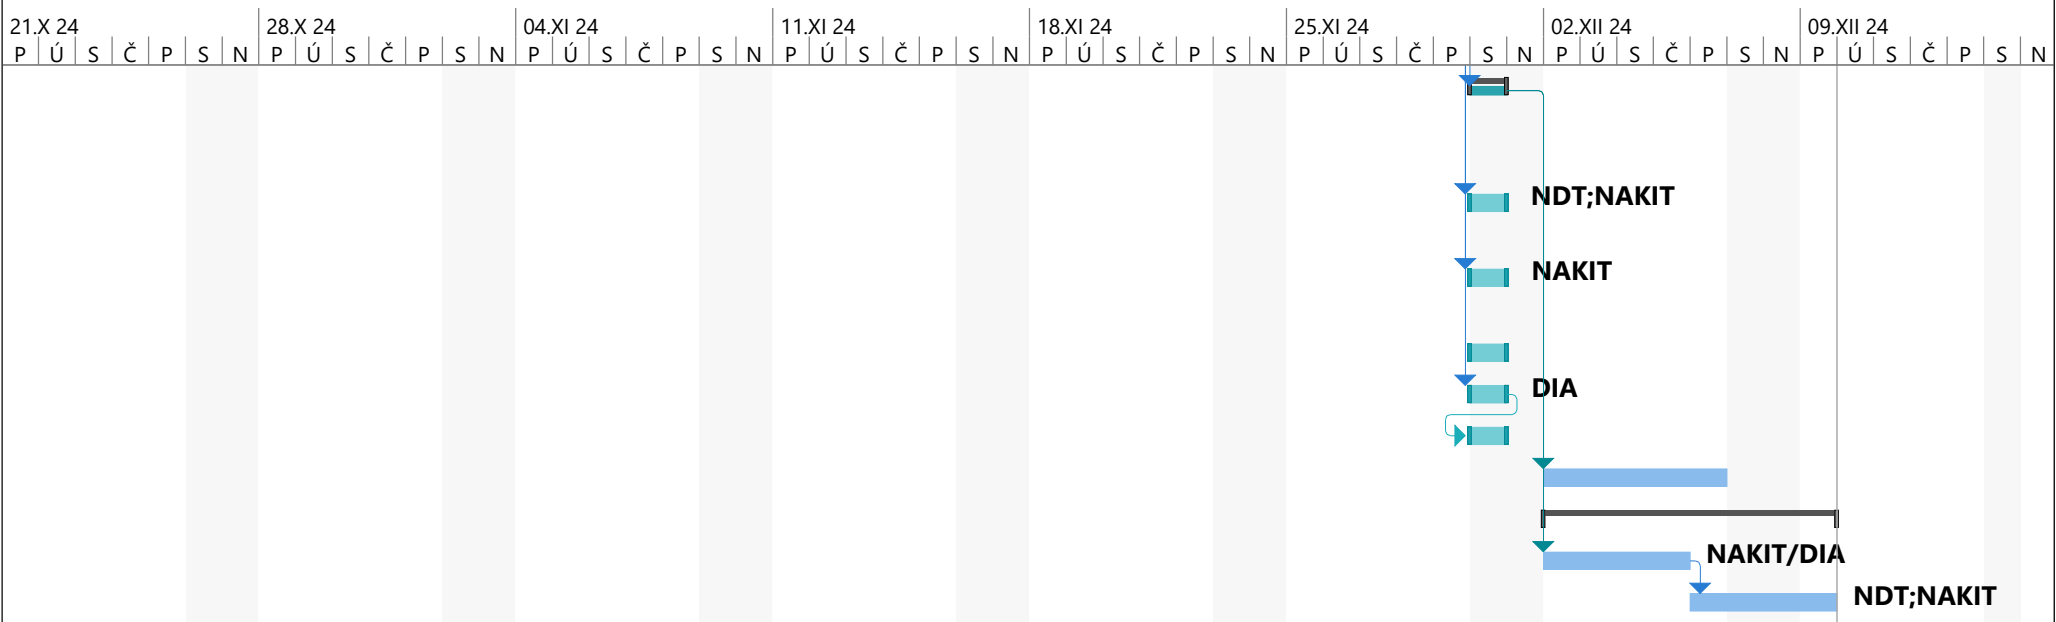

Project: Přechod na novou dom
Date: 11.10. 24

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			
