

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice,
se sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. účtu [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Jiří Svoboda – primátor statutárního města České Budějovice

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Nataša Bláhová, ved. odd. komunikací odboru správy veřejných statků tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen „objednatel“ a „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS, oddíl B; ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Pan Michal Altrichter ředitel oblasti Jih

tel. č. [REDACTED]

.....,

tel. č. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Miloš Pelant

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen: pan Oldřich Jakl

tel. č. [REDACTED]

e-mail: oldrich.jakl@colas.cz

Zástupce stavbyvedoucího pan Marian Balák

tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán

tel. č. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a „oprávnění zástupci zhotovitele“)
(společně též jako „smluvní strany“)

II. Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a dle projektové dokumentace, zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést dílo:

„Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. – Včelná, 2. etapa - Část 4 (v úseku od železniční vlečky po náměstí Jiřího z Poděbrad)“ (okr. ČB)

a objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3. Místo stavby: komunikace III/00354 v Českých Budějovicích (Lidická třída).
4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
5. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen „dílo“) provede podle platných českých technických norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy, podle platných TP, TKP a v souladu s touto smlouvou.
6. Součástí provedení díla je též:
 - a) zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých potřebných geodetických prací;
 - b) dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s Plánem BOZP, který je součástí projektové dokumentace k dílu;
 - c) likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele při provádění díla. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je zhotovitel povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního materiálu apod. výlučně na povolené skládky, případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.
 - d) zajištění konečného úklidu prostor staveniště dle požadavků objednatele
 - e) zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování a následné odstranění.
7. Zhotovitel je povinen dodat dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky projektové dokumentace a příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání díla správními orgány nebo provozovateli). V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými normami, platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v České republice v době jeho předání a převzetí, dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem stavebníka a objednatelem. Zhotovitel je povinen použít pro provedení díla materiály a zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost,

bezpečnost při užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení díla, vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá zhotovitel písemně objednatele o dodání takovéto dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení projektantovi i technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla.

8. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla (nebo při odstraňování jeho vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění díla taktéž povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.
9. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí díla), včetně nákladů na provoz a zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.
10. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí závazek z této smlouvy jako celek jinému subjektu, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny díla. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných poddodavatelů. Případnou změnu poddodavatelů musí na základě písemné žádosti zhotovitele odsouhlasit písemně oprávněná osoba objednatele.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: **dnem předání staveniště, tj. cca 12. července 2017** (se souhlasem obou stran je možné dohodnout jiný termín).
Výstavba bude dokončena: **do 60 dnů** ode dne předání staveniště.
2. Dokončením díla jako celku, dle čl. II. odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli samostatným předávacím protokolem.
3. Doba realizace díla uvedená v bodě 1. tohoto článku je podmíněna vydáním pravomocných stavebních povolení pro celou zakázku. Zhotovitel bere na vědomí, že termín realizace může být v této souvislosti posunut.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle položkového rozpočtu:

<u>Stavební objekt:</u>	<u>Cena:</u>
SO 001 - Smluvní požadavky	7,92 Kč
SO 002 - Požadavky objednatele	13 680,00 Kč
SO 113 Úprava obrubníků a chodníkových ploch – část 4	978 642,60 Kč
SO 406 Osvětlení přechodů pro chodce ulice Šumavská	177 115,36 Kč
<u>SO 903 - Dopravně inženýrská opatření – část 4</u>	<u>18 512,00 Kč</u>
Celkem bez DPH	1 187 957,88 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>249 471,16 Kč</u>
Cena celkem včetně DPH	1 437 429,04 Kč

2. Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných pro provedení díla. Cena díla je stanovena jako cena pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-li v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace.
3. Ke změně ceny díla může dojít pouze v případech, kdy
 - 3.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmět díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů a

jejich hodnota nepřekračuje limit stanovený zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

- 3.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí ZZVZ stanovený limit
 - 3.3. při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvními stranám známe a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla;
 - 3.4. při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)
4. Změny ceny díla
- 4.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.
 - 4.2. ustanovení bodu 4.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.
5. V případě změny ceny díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava (dále jen ceník).
- Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
 - b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
 - c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. Jakákoliv nepodstatná změna závazku z této smlouvy je možná jen na základě podmínek stanovených v ZZVZ.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami poddodavatelů či jinými doklady, pokud je objednatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí být doloženy k zaplacení zhotoviteli do podatelny Statutárního města České Budějovice nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny.
3. Stavební či montážní práce jsou prováděny **vylučně v rámci veřejnoprávní činnosti**. Dodavatel je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije

zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. [REDAKCE] s následující identifikací platby:

Variabilní symbol: [REDAKCE] (DIČ zhotovitele bez CZ)

Specifický symbol [REDAKCE] (DIČ objednatele bez CZ)

Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1

5. Splatnost daňového dokladu bude **do 30 kalendářních dnů** od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek TDS). Pozastávka bude činit u každé faktury **10 %** z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude uvolněna ve výši **5 %** po převzetí stavby a zbývajících **5 %** potom na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanovení čl. V., odst. 1., se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých **10 %** pozastávky.

VI. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon).
4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. Investor a technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemně

vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s třídním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této smlouvy.
13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů od data, kdy ji obdržel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele a to z důvodu koordinace dalších prací na místních komunikacích a s tím spojených nařízených objížděk a uzavírek.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.
3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho technického dozoru.
3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na věci.
4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které má dílo v době předání.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **36 měsíců** na obrusné vrstvy a **60 měsíců** na ostatní práce.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
6. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
9. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
 - Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný a podepsaný statutárním zástupcem.
3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
4. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.
7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne.
8. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.).
9. Poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 ZZVZ závazek z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení ust. § 222 ZZVZ.
2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a provedených dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
 - a. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v článku III. této smlouvy,
 - b. zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti stanovené ve smluvních dokumentech nebo závazných předpisech,
 - c. z nečinnosti zhotovitele je objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než objednatel od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupitZa podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení objednatele s úhradou ceny díla podle čl. V. této smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovolují
 - b. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení
 - c. zhotovitel vstoupí do likvidace.

5. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené v čl. XI. bod 4 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.
6. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy se oznamující strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbujuje svých závazků z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím vznikne, včetně nároku na odstoupení od této smlouvy.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
8. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
11. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody způsobené zhotovitelem nebo jeho zaměstnanci, objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 1 000 000,- Kč s tím, že podíl spoluúčasti zhotovitele na pojistném plnění nemůže činit více než 4 %. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práv a povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

XII. Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst. 1. smlouvy ve sjednané době, pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč**. Tato platba nezbujuje zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.
4. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a finanční vypořádání stavby jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **2.500,- Kč** (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní pokuta se neuplatní, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o



registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele.
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků schváleno usnesením Rady města České Budějovice ze dne 26. 6. 2017, č. 923/2017.
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Smlouva obsahuje 10 stran textu.

24 -07- 2017
V Českých Budějovicích dne

14.7. 2017
V Jihlavě dne

za objednatele:

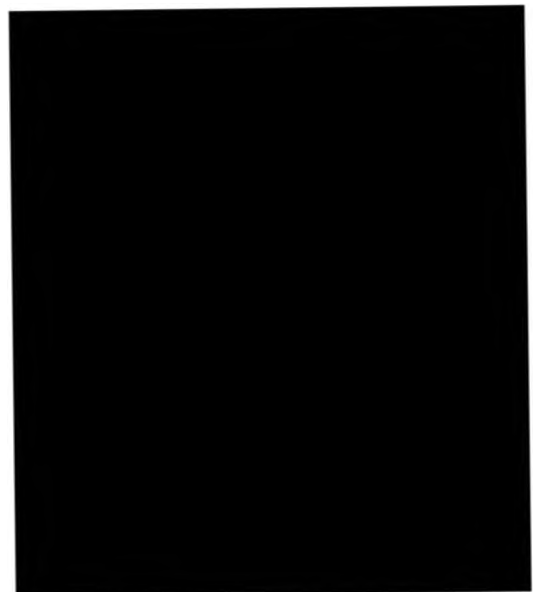

Položkový rozpočet

CENA CELKEM

Stavba:	Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4 (okr.ČB)
Investor:	Statutární město České Budějovice
Projektant:	AKIPROJEKT s.r.o., Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
Zhotovitel:	

CENA BEZ DPH	1 187 957,88
---------------------	---------------------

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21%	249 471,15
----------------------------------	-------------------

CENA VČETNĚ DPH	1 437 429,03
------------------------	---------------------

Vypracoval zadání: Datum zadání:	Vypracoval nabídku: Datum vypracování nabídky:
-------------------------------------	---

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: M10 - Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 1 187 957,88

OC+DPH: 1 437 429,04

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
001	Smluvní požadavky	7,92	1,66	9,58
002	Požadavky objednatele	13 680,00	2 872,80	16 552,80
S.O. 113	Úprava obrubníků a chodníkových ploch - část 4	978 642,60	205 514,95	1 184 157,55
S.O. 406	Osvětlení přechodů pro chodce ulice Šumavská	177 115,36	37 194,23	214 309,59
S.O. 903	Dopravně inženýrská opatření	18 512,00	3 887,52	22 399,52

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M10 Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
 číslo a název SO 001 Smluvní požadavky
 číslo a název rozpočtu: 001 Smluvní požadavky

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU S.O. 113 kámen (90*0,2*0,2)*2,2=7,920 [A]	T	7,920	1,00	7,92
		0	Všeobecné konstrukce a práce				7,92
			C e l k e m				7,92
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				7,92

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M10 Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
 číslo a název SO 002 Požadavky objednatele
 číslo a název rozpočtu: 002 Požadavky objednatele

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		02	Požadavky objednatele				
1	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENYRSKÝCH SÍTÍ vytyčení inženýrských sítí	KČ	1,000	13 680,00	13 680,00
		02	Požadavky objednatele				13 680,00
			Celkem				13 680,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0,00
			Celkem				0,00
			Celkem				13 680,00

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M10** **Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4**
 číslo a název SO **S.O. 113** **Úprava obrubníků a chodníkových ploch - část 4**
 číslo a název rozpočtu: **S.O. 113** **Úprava obrubníků a chodníkových ploch - část 4**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1			Zemní práce				
2	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM 40+30+20=90,000 [A]	M	90,000	116,00	10 440,00
3	11353B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA 5*(90*0,2*0,2)*2,2=39,600 [A]	tkm	39,600	6,00	237,60
4	125736		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM 138*0,2=27,600 [A]	M3	27,600	179,00	4 940,40
5	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHTNĚNÍM dosypání zeminou vhodnou do násypů v tl. 0,2 m 138*0,2=27,600 [A]	M3	27,600	846,00	23 349,60
6	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M včetně dopravy ze skládky Statutárního města České Budějovice	M2	138,000	128,00	17 664,00
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	138,000	17,00	2 346,00
1			Zemní práce				58 977,60
5			Komunikace				
8	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	141,000	171,00	24 111,00
9	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená dlažba	M2	141,000	422,00	59 502,00
10	582617		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	20,000	467,00	9 340,00
11	587206		PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM 228+447+360=1 035,000 [A]	M2	1 035,000	365,00	377 775,00
5			Komunikace				470 728,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
12	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	38,000	422,00	16 036,00
13	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	53,000	217,00	11 501,00
14	91725		NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ Kasselský obrubník 20=20,000 [A]	M	20,000	2 622,00	52 440,00
15	91782		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH 19+78+190+76+22+41+5+8+39+7+130+30+75+26=746,000 [A]	M	746,000	490,00	365 540,00
16	9371R		POSUN STÁVAJÍCÍ LAVIČKYKUS 1,000 200,00 200,00	KUS	1,000	3 420,00	3 420,00
9			Ostatní konstrukce a práce				448 937,00
Celkem							978 642,60

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce	
Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
Celkem	978 642,60

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **M10** **Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4**
 číslo a název SO **S.O. 406** **Osvětlení přechodů pro chodce ulice Šumavská**
 číslo a název rozpočtu: **S.O. 406** **Osvětlení přechodů pro chodce ulice Šumavská**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
02			Požadavky objednatele				
1	02	1	PPV 1%	KČ	1,000	2 280,00	2 280,00
2	02	2	PŘESUN 1%	KČ	1,000	2 280,00	2 280,00
3	02310		SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVA 3,6% DOPRAVA 3,6%	KČ	1,000	2 280,00	2 280,00
4	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, POMOČNÉ PRÁCE	KČ	1,000	11 400,00	11 400,00
5	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY VÝCHOZÍ REVIZE	KČ	1,000	5 700,00	5 700,00
6	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - 3,25%	KČ	1,000	2 280,00	2 280,00
02			Požadavky objednatele				26 220,00
1			Zemní práce				
7	460		ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 mm (tloušťka vrstvy 150mm) dle situace přílohy č. C.4.5 $65 \times 0,35 \times 0,15 = 3,41\text{m}^3 = 6,5\text{t}$	T	3,200	200,00	640,00
8	460	1	ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-8 mm (tloušťka vrstvy 40mm) dle situace přílohy č. C.4.5 $65 \times 0,35 \times 0,04 = 0,9\text{m}^3 = 1,7\text{t}$	T	1,700	257,00	436,90
9	460	2	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 300 mm dle situace přílohy č. C.4.5 4ks x 1,2m	M	4,800	151,00	724,80
10	460	3	PLASTOVÁ TRUBKA pr. 60 mm dle situace přílohy č. C.4.5 8ks x 0,7m	M	5,600	127,00	711,20
11	460	4	HUTNĚNÍ ZEMINY VE MĚSTĚ PO 20cm dle situace přílohy č. C.4.5 celková délka trasy výkopů - 65m; $65\text{m} \times 0,35\text{m} \times 0,4\text{m}$	M3	9,100	57,00	518,70
12	460 01-0021		vytýčení kabel. trasy dle situace přílohy č. C.4.5 celková délka výkopových prací - 65m	KM	0,070	5 700,00	399,00
13	460 07-0546		výkop pro základ - ručně dle situace přílohy č. C.4.5	KUS	4,000	741,00	2 964,00
14	460 08-0035		Základ pro stožár V.O. C25/30 XF2 dle situace přílohy č. C.4.5 a C.4.9 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m	M3	3,600	1 682,00	6 055,20

15	460 20-1603		výkop rýhy 350/400mm dle situace přílohy č. C.4.5 65m x 0,35m x 0,4m	M3	9,100	285,00	2 593,50
16	460 42-1101		ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ PÍSKU 2,24m3 (3,8t) dle situace přílohy č. C.4.5 65m x 0,35m x 0,2m = 4,55m3 = 7,7t	bm	65,000	86,00	5 590,00
17	460 49-0012		VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 dle situace přílohy č. C.4.5 celková délka trasy nových výkopů 65m + 5% proez + překryt	M	68,000	9,00	612,00
18	460 51-0055		KABELOVÝ PRŮCHOD DO 150mm dle situace přílohy č. C.4.5 7m	bm	7,000	570,00	3 990,00
19	460 56-1901		ZÁHOZ RÝHY 35x40 dle situace přílohy č. C.4.5 65m x 0,35m x 0,4m	M3	9,100	86,00	782,60
20	460 60-0021		NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY dle situace přílohy č. C.4.5 ze základu 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 65m x 0,35m x 0,2m	M3	8,150	29,00	236,35
21	460 60-0061		ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY DO 1km dle situace přílohy č. C.4.5 ze základu 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 65m x 0,35m x 0,2m	T	15,500	257,00	3 983,50
22	460 60-0071		ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM dle situace přílohy č. C.4.5 ze základu 4ks x 0,8m x 0,8m x 1,4m + místo pískového lože 65m x 0,35m x 0,2m = 8,15m3 / 13m3 (objem korby) = 1x odvoz na vzdálenost 22 km = celkem 22km	KM	22,000	3,00	66,00
23	460 62-0013		PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU dle situace přílohy č. C.4.5 celková délka trasy výkopů - 65m; 65m x 0,35m	M2	22,750	9,00	204,75
24	460 65-0051		ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/8 – 4cm dle situace přílohy č. C.4.5 pod zámkovou dlažbu – 65m; 65m x 0,35	M2	22,750	57,00	1 296,75
25	460 65-0053		ZŘÍZENÍ PODKLADNÍ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 0/32 – 15cm dle situace přílohy č. C.4.5 pod zámkovou dlažbu – 65m; 65m x 0,35	M2	22,750	57,00	1 296,75
		1	Zemní práce				33 102,00
		7	Přidružená stavební výroba				
26	210	1	PŘIPOJENÍ NOVÉHO ROZVODU VO DO STÁVAJÍCÍHO STOŽÁRU VO – PŘI ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH BUDE NUTNĚ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍVODNÍCH VEDENÍ, DEMONTÁŽ A OPŠTOVN dle situace přílohy č. C.4.5	KS	4,000	200,00	800,00
27	210	2	IZOLACE UZEMNĚNÍ dle situace přílohy č. C.4.5 4ks stožáru x 0,3m izolace/zařízení = 1,2m = 2,0m	M	2,000	29,00	58,00
28	210	3	PRONÁJEM MONTÁŽNÍ PLOŠINY		9,220	428,00	3 946,16

dle situace přílohy č. C.4.5
montáž 4ks svítidla x 0,738h + 4ks výložníku x 1,567h

29	210	4	PRONÁJEM JERÁBU	HOD	18,720	485,00	9 079,20
			dle situace přílohy č. C.4.5 montáž 4ks výložníku x 1,567h + montáž 4ks stožáru x 3,113				
30	210	5	PLUS 3% PODRUŽNÝ MATERIÁL	KČ	1,000	855,00	855,00
31	210 01-0253		VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.41/50	M	78,000	54,00	4 212,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
32	210 01-0256		VRAPOVANÁ CHRÁNIČKA pr.96/110	M	7,000	60,00	420,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
33	210 10-0151		UKONČENÍ KABELU 4x16mm2	KS	4,000	29,00	116,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
34	210 10-0173		UKONČENÍ KABELU 3x1,5mm2	KS	8,000	29,00	232,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
35	210 10-0251		UKONČENÍ KABELU 4x10mm2	KS	6,000	29,00	174,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
36	210 10-1233		ZEMNÍ SPOJKA SMRŠŤOVACÍ S LEPIDLEM, Cu 4x16mm2	KS	1,000	57,00	57,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
37	210 12-0001		POJISTKA KOMPLETNÍ 6A E27	KS	4,000	183,00	732,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
38	210 20-2013		MONTÁŽ PŘECHODOVÉHO SVÍTIDLA NA VÝLOŽNÍK	KS	4,000	371,00	1 484,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
39	210 20-4011	1	MONTÁŽ PŘECHODOVÉHO STOŽÁRU – 7,2/6,0/1,2m – průměr 133/108/89mm		1,000	285,00	285,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
40	210 20-4011	2	MONTÁŽ PŘECHODOVÉHO STOŽÁRU – 7,2/6,0/1,2m – průměr 133/89/76mm	KS	3,000	285,00	855,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
41	210 20-4100	1	MONTÁŽ PŘECHODOVÉHO VÝLOŽNÍKU DÉLKY 1,5m, NA PRŮMĚR 76mm	KS	3,000	285,00	855,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
42	210 20-4100	2	MONTÁŽ PŘECHODOVÉHO VÝLOŽNÍKU DÉLKY 2,5m, NA PRŮMĚR 89mm	KS	1,000	285,00	285,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
43	210 20-4201		MONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE 1 OKRUH	KS	4,000	285,00	1 140,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
44	210 22-0022		DRÁT FeZn 10	M	78,000	7,00	546,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
45	210 22-0301		SVORKA SP,SS	KS	12,000	36,00	432,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
46	210 81-0005		KABEL CYKY-J 3x1,5mm2	M	33,000	6,00	198,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
47	210 81-0013		KABEL CYKY-J 4x10mm2	M	71,000	6,00	426,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
48	210 81-0014		KABEL CYKY-J 4x16mm2		15,000	6,00	90,00
			dle situace přílohy č. C.4.5				
		7	Přidružená stavební výroba				27 277,36

M22

Dodávky VO

49	1		SVÍTIDLO PŘECHODOVÉ, specifikace viz. příloha 1., ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY	KS	4,000	5 130,00	20 520,00
50	2		STOŽÁR PŘECHODOVÝ 133/89/76 – 6 (7,2/6,0/1,2m), žár. Pozink	KS	3,000	11 400,00	34 200,00
51	3		STOŽÁR PŘECHODOVÝ 133/108/89 – 6 (7,2/6,0/1,2m), žár. Pozink	KS	1,000	11 400,00	11 400,00
52	4		VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ typový na stožár pr. 76m, délka 1,5m, žár. Pozink	KS	2,000	3 990,00	7 980,00
53	5		VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ atypický na stožár pr. 76m, délka 1,5m, žár. Pozink, viz. příloh C.4.8	KS	1,000	3 990,00	3 990,00
54	6		VÝLOŽNÍK PŘECHODOVÝ atypický na stožár pr. 89m, délka 2,5m, žár. Pozink viz. příloh C.4.8		1,000	3 990,00	3 990,00
55	7		STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE JEDNOOKRUHOVÁ	KS	4,000	1 368,00	5 472,00
56	8		KRYT STOŽÁROVÉ SVORKOVNICE	KS	4,000	741,00	2 964,00
		M22	Dodávky VO				90 516,00

Celkem

177 115,36

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem

0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem

0,00

Celkem

0,00

Celkem

177 115,36

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba M10 Modernizace silnice III/00354 Lidická tř. - Včelná, 2. etapa, Část 4
 číslo a název SO S.O. 903 Dopravně inženýrská opatření
 číslo a název rozpočtu: S.O. 903 Dopravně inženýrská opatření

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
9			Ostatní konstrukce a práce					
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM E13 8=8,000 [A]	KUS	8,000	114,00	912,00	
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	91,00	728,00	
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 56 dní 56*8=448,000 [C]	KSDEN	448,000	17,00	7 616,00	
4	916312		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	114,00	912,00	
5	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	91,00	728,00	
6	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ předpoklad nájmu 56 dní 56*8=448,000 [A]	KSDEN	448,000	17,00	7 616,00	
9			Ostatní konstrukce a práce				18 512,00	
C e l k e m								18 512,00
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce			Vícepráce					
Vícepráce celkem								0,00
			Méněpráce					
Méněpráce celkem								0,00
Celkem								0,00
Celkem								18 512,00
