

Nabídka na uzavření Dílčí smlouvy č. 37

č. smlouvy Objednatele: **MV- 58947/OFSP-2022**

č. smlouvy Poskytovatele: **2025/001 NAKIT**

**dle ust. odst. 3.3 a 4.1 a násl. Rámcové dohody o integrovaných investičních dodávkách v oblasti
informačních a komunikačních technologií,**

č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a

č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT

(dále jen „Rámcová Dohoda“)

Nabídka je předkládána:

Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322

zastoupenou: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a
informační technologie, s. p.

jako Poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“ nebo „NAKIT“)

pro:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupeno: Mgr. Romanem Novým, ředitelem projektu na základě pověření čj. MV-96316-
4/OFSP-2024 a ředitelem odboru komunikačních technologií sekce
informačních a komunikačních technologií

kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634, Praha 4 140 00

Jako Objednatelem (dále jen „Objednatel“ nebo „MV ČR“)

Poskytovatel a Objednatel společně jen „Smluvní strany“

Dále jen „Nabídka“

1. Předmět Nabídky

Nabídka je předkládána na základě požadavku vedeného v CA SD pod ID 678304

Předmětem Nabídky je návrh na uzavření dílčí smlouvy dle ust. odst. 3.3 a 4.1 Rámcové dohody na plnění spočívající ve:

- Vývoji a implementaci základních funkcionalit portálu dle specifikace uvedené v Příloze č. 1;
- Službách odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcionalit portálu;

pro realizaci projektu vedeného pod položkou 1.6.1. CMS – posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení v rámci NPO – výzva č.10.

Text dílčí smlouvy č. 37 tvoří přílohu a nedílnou součást této Nabídky.

Akceptací Nabídky dochází k uzavření dílčí smlouvy ve formě a rozsahu uvedené v příloze této Nabídky. Cena za plnění uvedena v dílčí smlouvě je maximální a nepřekročitelná. Na základě poskytnutého plnění a stanovení konečných cen za poskytnuté dodávky a služby bude Smluvními stranami uzavřen dodatek k dílčí smlouvě.

2. Platnost nabídky

Nabídka je platná po dobu 30 dní, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. Předkládá za Poskytovatele

V Praze dne dle el. podpisu

Jan
Řoubal
.....
Digitálně podepsal
Jan Řoubal
Datum: 2025.05.27
20:36:38 +02'00'

Mgr. Jan Řoubal, ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

4. Akceptace Nabídky ze strany Objednatele

V Praze dne dle el. podpisu

.....

Mgr. Roman Nový, ředitel projektu na základě pověření č. j. MV- 96316-4/OFSP a ředitel odboru komunikačních technologií sekce informačních a komunikačních technologií

Dílčí smlouva č. 37

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČO: 00007064

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 3605-881/0710

zastoupená: Mgr. Romanem Novým, ředitelem projektu na základě pověření čj. MV-96316-4/OFSP-2024 a ředitelem odboru komunikačních technologií sekce informačních a komunikačních technologií

*(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)*

a

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 04767543, DIČ: CZ04767543

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

pod spisovou značkou A 77322,

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: 117404973/0300

zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.

*(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)*

*(společně dále též „**Smluvní strany**“)*

Akceptací nabídky došlo k uzavření této dílčí smlouvy č. 37 a to v souladu s čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ DOHODY o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, č. smlouvy Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a č. smlouvy Poskytovatele: 2022/080 NAKIT (označené dále jen „Rámcová dohoda“).

Tato dílčí smlouva č. 37 bude označována dále jako „Dílčí smlouva“.

Preamble

V rámci dotačního projektu se Objednatel zavázal zajistit rozvoj technické infrastruktury veřejné správy, včetně zvýšení její přenosové kapacity a zavedení nových zákaznických služeb s vysokou kapacitou přenosu. Projekt je financován ze zdrojů NPO. Nezbytnou podmínkou pro splnění dotačního titulu je splnění milníku projektu ve lhůtě stanovené platným právním aktem. Doba realizace projektu je schválena do 31. 12. 2025. Splnění milníku projektu a zároveň dodržení termínu schválené realizace projektu je nezbytnou podmínkou pro úspěšné splnění podmínek dotačního titulu.

Objednatel a Poskytovatel se za účelem naplnění projektu CMS 2,5 a s ohledem na jeho technickou strukturu dohodli na jeho realizaci prostřednictvím na sebe navazujících Dílčích smluv, které ve svém komplexu a souvislostech naplní ucelený rámec tvořený pro celou dodávku CMS 2,5 Technickým projektem, který byl ze strany Objednatele akceptován. Tento postup umožní jak naplnění parametrů definovaných Technickým projektem jako celkovým rámcem dodávky plnění, tak dosažení podmínek dotačního titulu.

Tato Dílčí smlouva je v rozsahu tvořeném svým předmětem jedním z předpokladů pro dosažení výše uvedeného finálního stavu. Poskytovatel se k naplnění Technického projektu zavazuje realizovat předmět plnění v rozsahu této Dílčí smlouvy nezbytné k naplnění projektu a podmínek stanovených pro naplnění milníků NPO řádně, včas, za podmínek a v rozsahu dle této Dílčí smlouvy. K zajištění koherence projektu CMS 2,5 Poskytovatel a Objednatel společně prohlašují, že vyvinou veškerou maximální součinnost pro dosažení naplnění projektu CMS 2,5 a jeho podmínek i v rámci souvisejících Dílčích smluv.

1. Úvod a prohlášení Smluvních stran

1.1 Poskytovatel poskytne na základě této Dílčí smlouvy pro částečnou realizaci projektu CMS – posílení centrálních komponent v souvislosti se zavedením digitálního stavebního řízení Objednateli plnění spočívající v dodávce v rozsahu čl. 2 Dílčí smlouvy (dále jen „Plnění“).

1.2 Poskytovatel garantuje Objednateli, že si je vědom rozsahu a předmětu výše uvedeného projektu a garantuje Objednateli dosažení rozsahu plnění tak, aby ve lhůtě stanovené platným právním aktem byly dokončeny následující aktivity:

- Funkční služby: Připojení subjektu do CMS, Publikace systému v CMS, Konzumace systému v CMS, (dále jen "Základní služby"), kdy publikátorem i konzumentem je stejné OVM;
- Funkční portál pro Základní služby;
- Funkční nastavování Základních služeb pomocí automatizačních nástrojů;

Poskytovatel garantuje Objednateli, že do konce schválené realizace projektu zprovozní všechny služby, které budou využívány nebo budou připraveny k využití 6 000 úřady.

Poskytovatel garantuje Objednateli, že pro realizaci aktivit dle této Dílčí smlouvy bude výše uvedený projekt realizován v souladu s technickým projektem.

1.3 Objednatel prohlašuje, že Plnění dle této Dílčí smlouvy je nezbytným komponentem pro dosažení jeho závazku k rozvoji technické infrastruktury veřejné správy, včetně zvýšení její přenosové kapacity a zavedení nových zákaznických služeb s vysokou kapacitou přenosu, a proto se zavazuje toto Plnění od Dodavatele odebrat, a to bez ohledu na zajištění zdroje jeho financování.

1.4 Poskytovatel však současně bere na vědomí, že projekt je realizován z NPO, a že pro případ nenaplnění milníků projektu, které jsou Poskytovateli známy, Objednatel ke dni podpisu této smlouvy nedisponuje finančními prostředky ze státního rozpočtu a Poskytovatel bere na vědomí, že začátek běhu splatnosti jakéhokoliv finančního plnění od Objednatele Poskytovateli se přerušuje do zajištění náhradního zdroje financování.

1.5 Poskytovatel se zavazuje Objednatele neprodleně informovat o jakémkoliv změně či riziku nenaplnění milníků projektu, resp. riziku potřeby zajistit financování z jiných zdrojů než NPO.

2. Předmět Dílčí smlouvy

2.1. Předmětem Dílčí smlouvy je:

2.1.1. Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu dle specifikace uvedené v Příloze č. 1;

2.1.2. Poskytnutí služeb odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcionalit portálu;

(vše dohromady dále též jako „**Plnění**“).

Plnění je poskytováno po dílčích částech (dále jen „Dílčí část“), které jsou zároveň samostatnými fakturačními milníky a jsou uvedeny v tabulce v čl. 6 odst. 6.3 této Dílčí smlouvy.

- 2.2. *Objednatel bere na vědomí, že s udržitelností projektu souvisí Zajištění technické podpory od 1. 1. 2026 po dobu 5 let v rámci služby G5, tj. služby provozu sdílené infrastruktury CMS a dohledových center eGovernmentu dle NHS (jak je tento pojem definován v čl. 8 Dílčí smlouvy).*
- 2.3. *Kterákoliv ze Smluvních stran je v průběhu trvání této Dílčí smlouvy oprávněna písemně navrhnout nezbytné změny specifikace Plnění, které vzniknou v průběhu realizace jednotlivých částí tvořících Plnění. Poskytovatel je povinen vyhodnotit důsledky navržených změn specifikace Plnění, které budou zahrnovat vyhodnocení dopadů těchto změn na cenu a rozsah Plnění a dohodnuté termíny Plnění a předložit je k odsouhlasení Řídícímu výboru projektu. Takto navržené a vyhodnocené změny lze realizovat až po schválení Řídícím výborem projektu. Jakékoliv změny specifikace Plnění, které mají dopad na cenu Plnění a dohodnuté termíny Plnění musí být dohodnuty formou písemného dodatku k této Dílčí smlouvě.*

3. Způsob realizace Plnění

- 3.1. *Plnění bude realizováno vlastními zdroji NAKIT (Aktivity NAKIT) a prostřednictvím externích dodavatelů (Externí dodávky).*
- 3.2. *Aktivity NAKIT (A) spojené s realizací Plnění tvoří administrativní činnosti řízení a implementaci požadavku. Uvedené aktivity budou dodány v rámci tohoto maximálního rozsahu prací spojených s realizací Plnění:*

Role	Celkem ČH/role	Popis činností
Architekt senior	975,00	Spolupráce na Technické analýze, ověřování výstupů, integrace Portálu s okolím
Bezpečnostní manažer senior	37,50	Kontrola souladu se ZKB.
Konzultant ICT I	150,00	Konzultace k nastavení Služeb CMS, připomínkování Technických analýz.
Konzultant ICT III	750,00	Konzultace k nastavení Služeb CMS, připomínkování Technických analýz.
Projektový administrátor	77,50	Kompletace dokumentace, zpracování zápisů.
Projektový manažer senior	165,50	Koordinace prací a součinnost s externím dodavatelem, uživatelem a objednatelem.
Specialista OÚKS	225,00	Příprava textů pro Portál.
Specialista PAČ MV	187,50	Zpracování návrhů obrazovek, konzultace design gov
Specialista provozu senior	412,50	Nasazení portálu do prostředí CMS 2.5.

Role	Celkem ČH/role	Popis činností
Specialista zákaznických řešení	39,00	Sběr podkladů pro zpracování Nabídky, zpracování Nabídky, vypořádání připomínek k Nabídce
Tester	1687,50	Testování produkční i neprodukční verze Portálu.
Tester senior	1125,00	Konzultace při testování, testování.
Vývojář senior	525,00	Kontrola kódu.
Analytik senior	15,00	Konzultace technických analýz.
Specialista nákupu senior	30,00	Příprava zadávacího řízení.
Specialista legislativy	15,00	Zpracování návrhu smluv s externími dodavateli a oponentura Dílčí smlouvy RD.

3.3. Smluvní strany se dále shodují, že vzhledem k nezbytnosti zajištění realizace Plnění v rozsahu a účelu stanoveném touto Dílčí smlouvou je třeba adekvátně průběžně reagovat na nově vzniklé požadavky jak co do odborného rozsahu jednotlivých rolí zajišťujících Plnění Poskytovatelem, tak co do množství rozsahu při jejich poskytování. Poskytovatel tak je oprávněn měnit odborný a množství rozsah rolí za předpokladu, že maximální celková výše nákladů na tyto role nepřesáhne cenu za Aktivitu NAKIT uvedenou v tabulce v čl. 4 odst. 4.2 této Dílčí smlouvy.

3.4. Externí dodávku tvoří:

Část	Popis externí dodávky
B1	Low Level Design, Technické analýzy, Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu do testovacího prostředí
B2	Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu pro doložení splnění Milníku projektu
B3	Služby odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcionalit portálu
B4	SW licence (Rad Hat build of Keycloak, Strapi.io)
B5	Zbývající max. finanční plnění za Externí dodávky do konce realizace Plnění

4. Cena plnění dle Dílčí smlouvy

4.1. Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že cena Plnění dle Dílčí smlouvy, která Poskytovateli náleží za dodávku dle této Dílčí smlouvy, činí celkově maximálně **36 300 106,50 Kč bez DPH**, tj. **43 923 128,87 Kč s DPH**.

4.2. Celková cena plnění vychází z následujících částí:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
A	Aktivity NAKIT	8 929 652,50 Kč	1 875 227,03 Kč	10 804 879,53 Kč
B	Externí dodávka - celkem	27 370 454,00 Kč	5 747 795,34 Kč	33 118 249,34 Kč
Celková maximální cena plnění DS		36 300 106,50 Kč	7 623 022,37 Kč	43 923 128,87 Kč

Jednotlivé položky (A, B) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A) se skládají z:

Role	Cena role/MH bez DPH	Počet MH	Celková cena		
			Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
Architekt senior	1 700,00	975,00	1 657 500,00 Kč	348 075,00 Kč	2 005 575,00 Kč
Bezpečnostní manažer senior	1 445,00	37,50	54 187,50 Kč	11 379,38 Kč	65 566,88 Kč
Konzultant ICT I	1 503,00	150,00	225 450,00 Kč	47 344,50 Kč	272 794,50 Kč
Konzultant ICT III	1 758,00	750,00	1 318 500,00 Kč	276 885,00 Kč	1 595 385,00 Kč
Projektový administrátor	992,00	77,50	76 880,00 Kč	16 144,80 Kč	93 024,80 Kč
Projektový manažer senior	1 588,00	165,50	262 814,00 Kč	55 190,94 Kč	318 004,94 Kč
Specialista OÚKS	1 091,00	225,00	245 475,00 Kč	51 549,75 Kč	297 024,75 Kč
Specialista PAČ MV	1 380,00	187,50	258 750,00 Kč	54 337,50 Kč	313 087,50 Kč
Specialista provozu senior	1 333,00	412,50	549 862,50 Kč	115 471,13 Kč	665 333,63 Kč
Specialista zákaznických řešení	1 139,00	39,00	44 421,00 Kč	9 328,41 Kč	53 749,41 Kč
Tester	1 059,00	1687,50	1 787 062,50 Kč	375 283,12 Kč	2 162 345,62 Kč
Tester senior	1 381,00	1125,00	1 553 625,00 Kč	326 261,25 Kč	1 879 886,25 Kč
Vývojář senior	1 559,00	525,00	818 475,00 Kč	171 879,75 Kč	990 354,75 Kč
Analytik senior	1 267,00	15,00	19 005,00 Kč	3 991,05 Kč	22 996,05 Kč
Specialista nákupu senior	1 326,00	30,00	39 780,00 Kč	8 353,80 Kč	48 133,80 Kč
Specialista legislativy	1 191,00	15,00	17 865,00 Kč	3 751,65 Kč	21 616,65 Kč
Celkem			8 929 652,50 Kč	1 875 227,03 Kč	10 804 879,53 Kč

Externí dodávka (B) se skládá z:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
B1	Low Level Design, Technické analýzy, Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu do testovacího prostředí	10 746 437,50 Kč	2 256 751,88 Kč	13 003 189,38 Kč
B2	Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu pro doložení splnění Milníku projektu	4 387 412,50 Kč	921 356,63 Kč	5 308 769,13 Kč
B3	Služby odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcionalit portálu	5 850 450,00 Kč	1 228 594,50 Kč	7 079 044,50 Kč
B4	SW licence (Rad Hat build of Keycloak; Strapi.io)	936 000,00 Kč	196 560,00 Kč	1 132 560,00 Kč
B5	Zbývající max. finanční plnění za Externí dodávky do konce realizace Plnění*)	5 450 154,00 Kč	1 144 532,34 Kč	6 594 686,34 Kč
	Celkem	27 370 454,00 Kč	5 747 795,34 Kč	33 118 249,34 Kč

*) Finanční částka alokovaná na financování změnových požadavků pro realizaci Plnění této Dílčí smlouvy vzešlých ze vzájemných vazeb všech souvisejících smluv nezbytných k zajištění Plnění v průběhu další realizace. Změnové požadavky jsou realizovány až po schválení Řídícím výborem projektu.

4.3. Smluvní strany se zavazují upravit cenu Plnění dle čl. 4 odst. 4.2 tak, že:

- budou zohledněny skutečně vykonané činnosti ze strany NAKIT (položka „Aktivity NAKIT“),
- cena za „Externí dodávku“ bude odpovídat cenám uhrazeným Poskytovatelem externímu dodavateli/či dodavatelům.

4.4. Fakturace bude probíhat separátně pro každou Dílčí část plnění, a to na základě akceptace jednotlivých Dílčích částí. Po akceptaci příslušné Dílčí části bude Poskytovatelem vystavena faktura (daňový doklad), jejíž součástí bude Akceptační protokol podepsaný oprávněnými osobami obou Smluvních stran včetně, aktivity report prací Poskytovatele a faktury od externího dodavatele.

4.5. Platební podmínky včetně podmínek fakturace jsou uvedeny v Rámcové dohodě, a to zejm. v čl. 8. Odlišně se upřesňuje, že při doručení faktur v období od 10. 12. aktuálního roku do 28. 2. roku následujícího se doba splatnosti takovéto faktury prodlužuje na 60 (šedesát) dní ode dne doručení faktury na Ministerstvo vnitra. Toto ustanovení se uplatní i v případě hrazení smluvních pokut. Cena bude považována za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Poskytovatele.

5. Akceptace

- 5.1. Plnění je Objednatelem akceptováno na základě protokolu o akceptaci (dále jen „**Akceptační protokol**“). Akceptací se rozumí porovnání vlastností Dílčí části (ve smyslu specifikace Plnění dle přílohy č. 1 Dílčí smlouvy a milníků uvedených v harmonogramu Plnění v čl. 6 vůči poptávaným vlastnostem a oproti akceptačním kritériím).
- 5.2. O předání a převzetí Dílčí části do akceptačního řízení bude Poskytovatelem vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami (dále jen „**Předávací protokol**“). Objednatel je povinen do Akceptačního protokolu uvést všechny vady plnění, vč. jejich kategorizaci nebo příslušnou Dílčí část akceptovat nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu. Poskytovatel vypořádá Objednatelem vytknuté vady nejpozději do třiceti (30) pracovních dnů, pokud v Akceptačním protokolu není stanoveno jinak. Tento proces bude Smluvními stranami v případě potřeby opakován. Spočívá-li Dílčí plnění v provedení bezpečnostních testů, bude nedílnou součástí Akceptačního protokolu zpráva o závěrech testování, která bude zpracována v českém jazyce.
- 5.3. Kategorizaci vad provádí Vedoucí projektu Objednatele s následným potvrzením kontaktní osoby ve věcech projektových (čl. 11 této Dílčí smlouvy) s cílem dosáhnout shody v kategorizaci vad. V případě neshody Vedoucích projektu v kategorizaci vad toto musí být uvedeno v Akceptačním protokolu a je povinností Vedoucího projektu Poskytovatele svolat mimořádný Řídicí výbor tak, aby bylo Řídicím výborem rozhodnuto o kategorizaci vady, a to v co nejkratším termínu.
- 5.4. Výstupem akceptačního řízení bude Akceptační protokol obsahující výrok ve znění: „akceptováno“, „akceptováno s výhradou“ nebo Akceptační protokol s výrokem „neakceptováno“. Výsledek akceptačního řízení a podpis Akceptačního protokolu s výrokem „akceptováno“ nebo „akceptováno s výhradou“ se považuje za poskytnutí plnění a Poskytovatel je oprávněn vystavit za poskytnuté plnění fakturu (daňový doklad). Pro výrok:
- a) "akceptováno" je podmínkou výskyt maximálně 10 vad kategorie C;
 - b) „akceptováno s výhradou“ je podmínkou výskyt žádné vady kategorie A, maximálně dvou vad kategorie B, víc než 10 vad kategorie C; v takovém případě Smluvní strany zajistí opatření k odstranění vad Dílčího plnění, jejichž ověření následně provedeno v rámci akceptace daného fakturačního milníku.
 - c) „neakceptováno“ je podmínkou výskyt alespoň 1 vady kategorie A, 3 a více vad kategorie B (podpis Akceptačního protokolu Objednatelem s výrokem „neakceptováno“ se považuje za neposkytnutí plnění). Vedoucí projektu Objednatele a kontaktní osoba za Poskytovatele ve věcech projektových jsou povinni zajistit opakování této akceptace se zahájením v termínu daném Akceptačním protokolem. Je-li výsledkem opakované

akceptace „neakceptováno“ nestanovuje se termín odstranění vad, ale stav CMS 2.5 je eskalován na Řídící výbor, který rozhodne o dalším postupu.

AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Akceptační kritéria plnění Milníku I, II a III jsou uvedena v odst. 5.4 této Dílčí smlouvy.

Budou-li poskytovány služby odborných kapacit, Poskytovatel se zavazuje předložit Objednateli ke schválení výkaz práce o poskytnutých službách, který bude obsahovat popis konkrétní činnosti a počet člověkodnů (resp. člověkohodin). Objednatel rozsah poskytnutých služeb stvrdí svým podpisem na Akceptačním protokolu.

Vada představuje rozpor mezi vlastnostmi Plnění a vlastnostmi požadovanými Dílčí smlouvou. Vadou není zjištěný problém při akceptačním řízení, který je vadou jiného systému, který tímto problémem způsobil nefunkčnost Dílčí části nebo jeho částí. Vady se dle závažnosti dělí na kategorie následovně:

Vada kategorie A (kritická) - Vadou kategorie A je taková vada, která způsobí či způsobuje Objednateli velmi závažné problémy při užívání Dílčí části, např. dochází k zásadnímu omezení nebo zastavení nejdůležitějších obchodních procesů Objednatele nebo tím, že Dílčí část nebo jeho podstatná část je zcela nefunkční a Objednatel nemůže Dílčí část nebo jeho podstatnou část užívat. Za vadu kategorie A se považuje i vada s výše uvedenými dopady, které se projevují občas nebo náhodně.

Vada kategorie B (vážná) - Vadou kategorie B je taková vada, která způsobí či způsobuje Objednateli závažné problémy při užívání Dílčí části, např. užívání nebo funkčnost Dílčí části je vadou významně omezeno a dochází tak k významnému zpomalení obchodních procesů Objednatele. Mezi vady kategorie B patří i neschopnost Dílčí části pracovat na maximální provozní výkon. Vadou kategorie B je i vada s výše uvedenými dopady, které se projevují občas nebo náhodně.

Vada kategorie C (běžná): Vadou kategorie C jsou všechny ostatní vady než vady podřazené pod kategorii A nebo B a které nebrání užívání Dílčí části nebo mají zcela minimální vliv na řádné užívání nebo funkčnost Dílčí části ze strany Objednatele, mj. jde o vady v návodech (manuálech) k použití, dokladech a dokumentech.

6. Harmonogram plnění



6.2. Předpokládaný čas realizace Plnění je nejpozději do 31.12.2025, přičemž podrobný rozpad termínů Plnění je uvedený v odst. 6.3. Dílčí smlouvy.

6.3. Předpokládaný harmonogram je následující:

Harmonogram realizace:

T0	Podpis dílčí smlouvy
T1 = 31. května 2025	Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu
T2 = 31. května 2025	Akceptace milníku I (základní funkcionality portálu)
T3 = 31. května 2025	Integrace s okolními systémy
T4 = 31. května 2025	Předvedení funkčních částí komponent (Portál, CA SD, CMDb CA, automatizace, SW evidence sítě. Doložení splnění milníku projektu CMS DSŘ
T5 = 31. května 2025	Akceptace milníku II, fakturace
T3 = 1. prosinec 2025	Vývoj a implementace II. bloku funkcionalit v rámci roll-outu
T4 = 15. prosinec 2025	Akceptace milníku III, fakturace

6.4. Zásadní změny harmonogramu budou upraveny dodatkem k této Dílčí smlouvě.

7. Požadavky na součinnost Objednatele

7.1. Objednatel zajistí veškeré certifikáty pro jednotlivá prostředí Portálu CMS 2.5

7.2. Objednatel zajistí napojení agendového informačního systému CMS na CAAIS, včetně zajištění potřebných rolí pro CMS 2.5

8. Prohlášení Poskytovatele

8.1. Poskytovatel prohlašuje, že příslušné činnosti Poskytovatele (realizované prostřednictvím příslušných pracovních rolí) sloužící k realizaci Plnění dle této Dílčí smlouvy nejsou součástí paušálních plateb generálních ani zákaznických služeb dle čl. 3.2.1 a 3.2.2 Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, č.j. MV-126064 /SIK5-2018 (dále také „NHS“) ani nejsou v jejich rámci hrazeny. Poskytovatel zaznamená činnosti provedené Plnění dle této Dílčí smlouvy do příslušného interního systému na vykazování činností AVYK.

8.2. Realizace Předmětu Dílčí smlouvy nemá bezprostřední dopad do provozní činnosti Objednatele.

9. Úprava přechodu vlastnického práva


9.1. Od data převzetí každé Dílčí části na základě Akceptačního protokolu dochází k převodu vlastnického práva a postoupení oprávnění k výkonu práva užít Plnění na Objednatele.



9.2. Každá ze Smluvních stran nese své náklady spojené s přejímacím řízením sama.

10. Sankce a náhrada škody

- 10.1. *Sankce spojené s realizací Plnění jsou upraveny v čl. 16 Rámcové dohody.*
- 10.2. *Pro vyloučení pochybností (s ohledem na čl. 16.1 Rámcové dohody) se uvádí, že pokud je Poskytovatel v prodlení s poskytnutím jen části Plnění dle Dílčí smlouvy je Objednatel oprávněn po Prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny části Plnění dle Dílčí smlouvy, s jejíž dodáním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.*
- 10.3. *Pro vyloučení pochybností se dále uvádí, že uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku na náhradu škody. Současně se však Smluvní strany shodují, že nezajištění financování ze zdrojů NPO a jeho zajištění z rozpočtu Objednatele není považováno za škodu.*

11. Kontaktní osoby

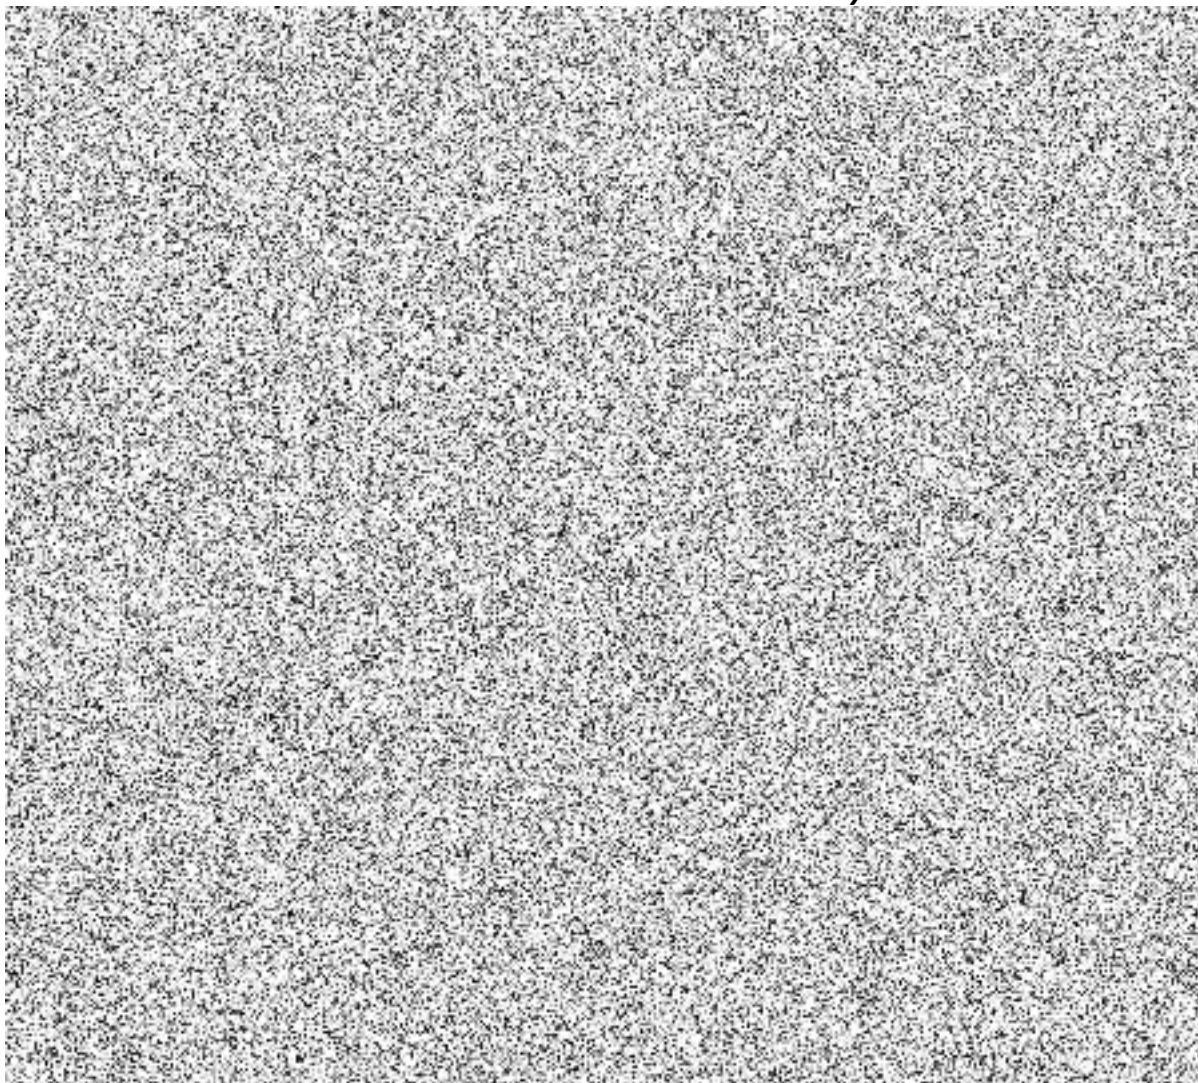

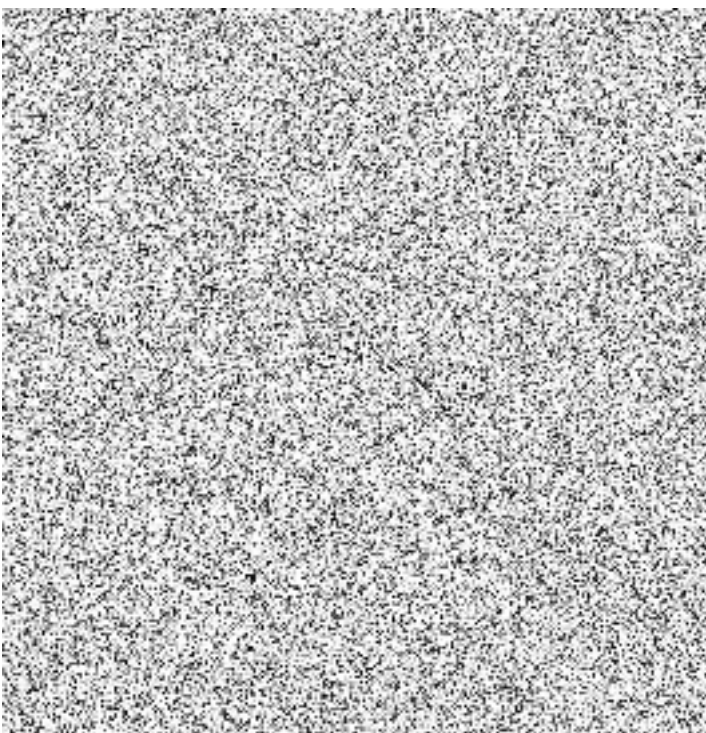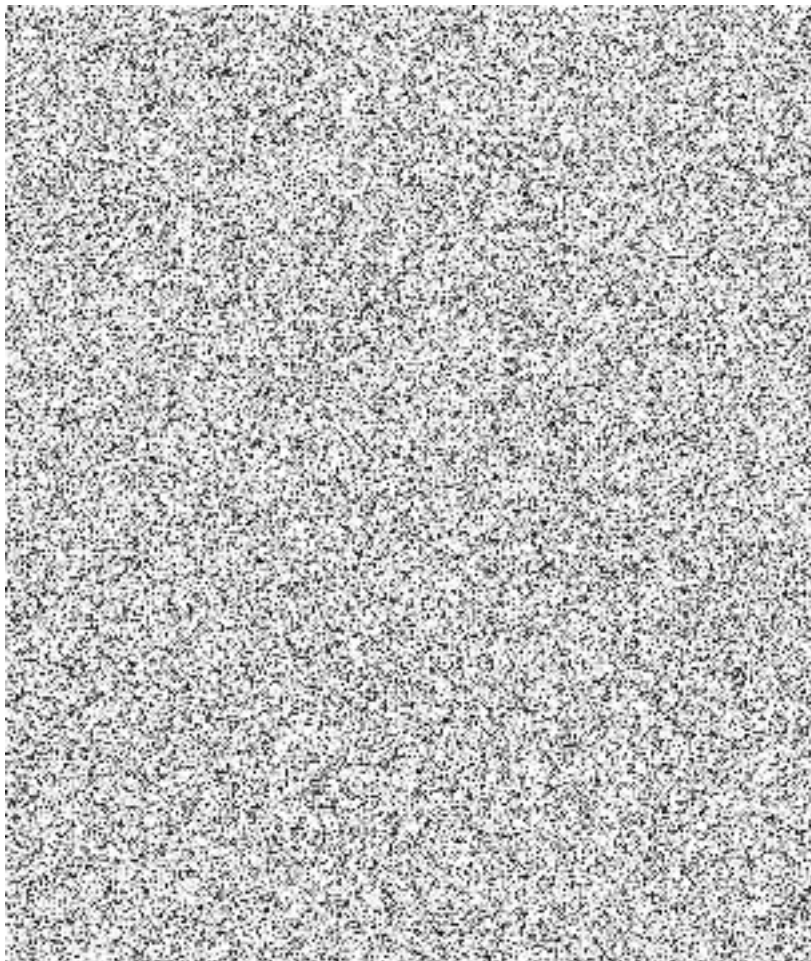

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. *Veškerá ujednání této Dílčí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a touto Rámcovou dohodou se řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v Dílčí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Dílčí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této dílčí smlouvě. V otázkách touto dílčí smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové dohody.*
- 12.2. *Objednatel a Poskytovatel se dohodli, že veškeré plnění související a poskytnuté v souladu s touto Dílčí smlouvou a Rámcovou dohodou do nabytí účinnosti této Dílčí smlouvy se považuje za Plnění poskytnuté v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými touto Dílčí smlouvou a Rámcovou dohodou a bude tak na něj nahlíženo.*
- 12.3. *Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.*
- 12.4. *Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.*
- 12.5. *Pokud v této Dílčí smlouvě není uvedeno jinak, platí ustanovení Rámcové dohody.*
- 12.6. *Nedílnou Součástí této Dílčí smlouvy je příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění*

Příloha č. 1 Dílčí smlouvy – Specifikace předmětu

Milník I: Vývoj, implementace a instalace základních funkcionalit portálu do testovacího prostředí

Dvě oddělené části Portálu - dva oddělené frontend pro Light a Full verzi

- Řešení portálu je rozděleno do dvou částí, každá z nich obsahuje jiný rozsah funkcionalit. Obě verze Portálu se dále dělí na veřejnou a neveřejnou část. Neveřejná část se zobrazí uživatelům po přihlášení.
- **Layout portálu podle designu GOV.CZ**
- **Přihlášení do systému**
 - Funkční přihlášení do systému pro uživatele s patřičnou rolí v CAAIS.
- **Katalog služeb**
 - Katalog služeb zobrazovaný podle zadané konfigurace zobrazující všechny služby, umožňující přechod na žádost o založení u implementovaných služeb.
 - *1.1 Připojení do CMS z NDC*
 - *1.2 Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)*
 - *1.4 Připojení do CMS přes IPSec*
 - *2.1.1 Publikace IS do CMS*
 - *2.2.0 Konzumace IS v CMS*
- **Zobrazení návodů a dalších textů dle nastavení editora**
 - Portál je plně integrovaný se samostatným systémem pro správu textů a umožňuje editorovi měnit návody a některé popisy v Portálu online.
 - Portál umožňuje vyhledávání ve statickém textu.
- **Zobrazení seznamu požadavků**
 - Portál načítá a zobrazuje aktuální požadavky pro daný subjekt a zobrazuje je ze statických dat, tzv. mock bez integrace na ControlDesk.
 - První verze neumožňuje filtraci a vyhledávání v požadavcích subjektu.
- **Zobrazení seznamu incidentů**
 - Portál načítá a zobrazuje aktuální incidenty pro daný subjekt ze statických dat, tzv. mock bez integrace na ControlDesk.
 - První verze neumožňuje filtraci a vyhledávání v incidentech subjektu.

- **Moje služby**

- Portál načítá a zobrazuje aktuální business instance služeb pro daný subjekt ze statických dat, tzv mock bez integrace na ControlDesk.
- Zobrazení detailu služby pro již implementované funkcionality ze statických dat, tzv. mock bez integrace na ControlDesk.

- **Založení služby**

- 1.1 Připojení do CMS z NDC
- 1.2 Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)
- 1.4 Připojení do CMS přes IPsec
- 2.1.1 Publikace IS do CMS
- 2.2.0 Konzumace IS v CMS

- **Technickou analýzu služeb**

- 2.0 Komunikace IS
- 3.0 Samospráva DNS
- 6.0 Aktualizační servery

Akceptační kritéria Portálu CMS 2.5 Milníku I.

- Reálné předvedení funkcí Portálu CMS 2.5 pomocí statických dat, tzv. mock
 - Přihlášení pomocí CAAIS do light verze Portálu
 - Vytvoření Požadavku na službu z kategorie 1.0 Připojení
 - Přihlášení pomocí CAAIS do full verze Portálu
 - Vytvoření Požadavku na službu Publikace IS do CMS
 - Zobrazení všech tiketů
 - Editace textu nápovědy na Portálu pomocí redakčního systému
- Dodání technických analýz a LLD pro základní funkcionality portálu.

Milník II: Vývoj, implementace a instalace základních funkcionalit portálu do prostředí CMS 2.5 pro doložení splnění Milníku projektu:

Dvě oddělené části Portálu - dva oddělené frontend pro Light a Full verzi

- Část funkcionalit musí být dostupná z internetu, část pouze z prostředí CMS. Proto je řešení portálu rozděleno do dvou částí. Část Light verze je dostupná z internetu s omezenou funkcionalitou a část Full verze je dostupná pouze z prostředí CMS. Obě verze Portálu se dále dělí na veřejnou a neveřejnou část. Neveřejná část se zobrazí uživatelům po přihlášení.
- **Katalog služeb**
 - Katalog služeb zobrazovaný podle zadané konfigurace zobrazující všechny služby, umožňující přechod na žádost o založení u implementovaných služeb včetně integrace na zdroj dat ControlDesk
 - *1.1 Připojení do CMS z NDC*
 - *1.2 Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)*
 - *1.4 Připojení do CMS přes IPSec*
 - *2.1.1 Publikace IS do CMS*
 - *2.2.0 Konzumace IS v CMS*
 - 6.1 Aktualizační servery Windows
- **Zobrazení seznamu požadavků**
 - Portál načítá a zobrazuje aktuální požadavky pro daný subjekt z dat poskytnutých ControlDeskem (integrace)
- **Zobrazení seznamu incidentů**
 - Portál načítá a zobrazuje aktuální incidenty pro daný subjekt z dat poskytnutých ControlDeskem (integrace) a umožňuje založení incidentu.
- **Moje služby**
 - Portál načítá a zobrazuje aktuální business instance služeb pro daný subjekt z dat poskytnutých ControlDeskem (integrace).
 - Zobrazení detailu služby, pro již implementované funkcionality z dat ControlDesku (integrace).

- **Založení služby**
 - 1.1 Připojení do CMS z NDC
 - 1.2 Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)
 - 1.4 Připojení do CMS přes IPsec
 - 2.1.1 Publikace IS do CMS
 - 2.2.0 Konzumace IS v CMS
 - 6.1 Aktualizační servery Windows
 -
- **Technickou analýzu služeb**
 - 7.0 Certifikační autorita CMS
- **Profil uživatele**
 - Zobrazení profilu uživatele - data o přihlášeném uživateli načtená z CAAIS.
- **Automatizované testy pro vyvinuté a implementované služby a funkcionality**

Akceptační kritéria Portálu CMS 2.5 Dílčí Plnění – do 15. 5. 2025 – Milník II

- Reálné předvedení funkcí Portálu CMS 2.5 za pomoci čerpání dat z ControlDesku (integrace) – doložení splnění Milníku projektu.
 - Přihlášení pomocí CAAIS do light verze Portálu z internetu
 - Vytvoření Požadavku na službu Připojení prostřednictvím vyhrazeného připojení (KIVS)
 - Přihlášení pomocí CAAIS do full verze Portálu pomocí již objednaného připojení KIVS
 - Vytvoření Požadavku na službu Publikace IS do CMS
 - Vytvoření Incidentu na existující služby
 - Zobrazení všech tiketů
- Dodání technické analýzy certifikační autority
- Dodání automatizovaných testovacích scénářů pro Portál

Milník III: Vývoj a implementace 2. bloku funkcí portálu v rámci roll-outu - Služby odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcí portálu;

- **Katalog služeb**
 - Komplexní katalog celého systému CMS 2.5, viz business analýza Portálu CMS 2.5
- **Kompletní práce s požadavky**
 - Portál načítá a zobrazuje aktuální požadavky pro daný subjekt a zobrazuje je.
 - Umožňuje filtraci a vyhledávání požadavků
- **Kompletní práce s incidenty**

- Portál načítá a zobrazuje aktuální incidenty pro daný subjekt a zobrazuje je.
- Umožňuje filtraci a vyhledávání incidentů
- **Moje služby**
 - Portál načítá a zobrazuje aktuální business instance služeb pro daný subjekt, včetně vazeb mezi sebou (vazby mezi instancemi služeb daného Subjektu)
 - Práce se šítky u objednaných služeb (vyhledávání, filtrace, přidělování, definice šítků)
 - Zobrazení detailu služby pro všechny implementované funkcionality.
- **Založení, modifikace a rušení služeb, viz kompletní katalog**
- **Technickou analýzu služeb**
 - 4.0 MTA
 - 7.0 Certifikační autorita
- **Implementace externích semaforů**
- **Dokumentace**
 - Skutečného provedení
 - Popis architektury a komponent
 - Implementace díla
 - Popis závislostí technologických komponent
 - Programátorská dokumentace
 - Dokumentovaný zdrojový kód uložený v CMS 2.5 GIT
 - Popis pipelines uložený v CMS 2.5 GIT
 - Administrátorská dokumentace
 - Popis rozhraní ve formátu OpenAPI


Akceptační kritéria Portálu CMS 2.5 Milníku III:

Reálné předvedení funkcí Portálu CMS 2.5 u všech služeb, viz business analýza

- Předání zdrojových kódů a artefaktů v GIT CMS 2.5
 - Předvedení build procesu na ne-produkčním prostředí
- Soulad dodané dokumentace s provozními standardy NAKIT

- Doložení výkonových testů, které splňují parametry uvedené v Technickém projektu I.
- Doložení penetračních testů, neobsahující kritické zranitelnosti v OWASP

Participace na celkovém ověření CMS 2.5.

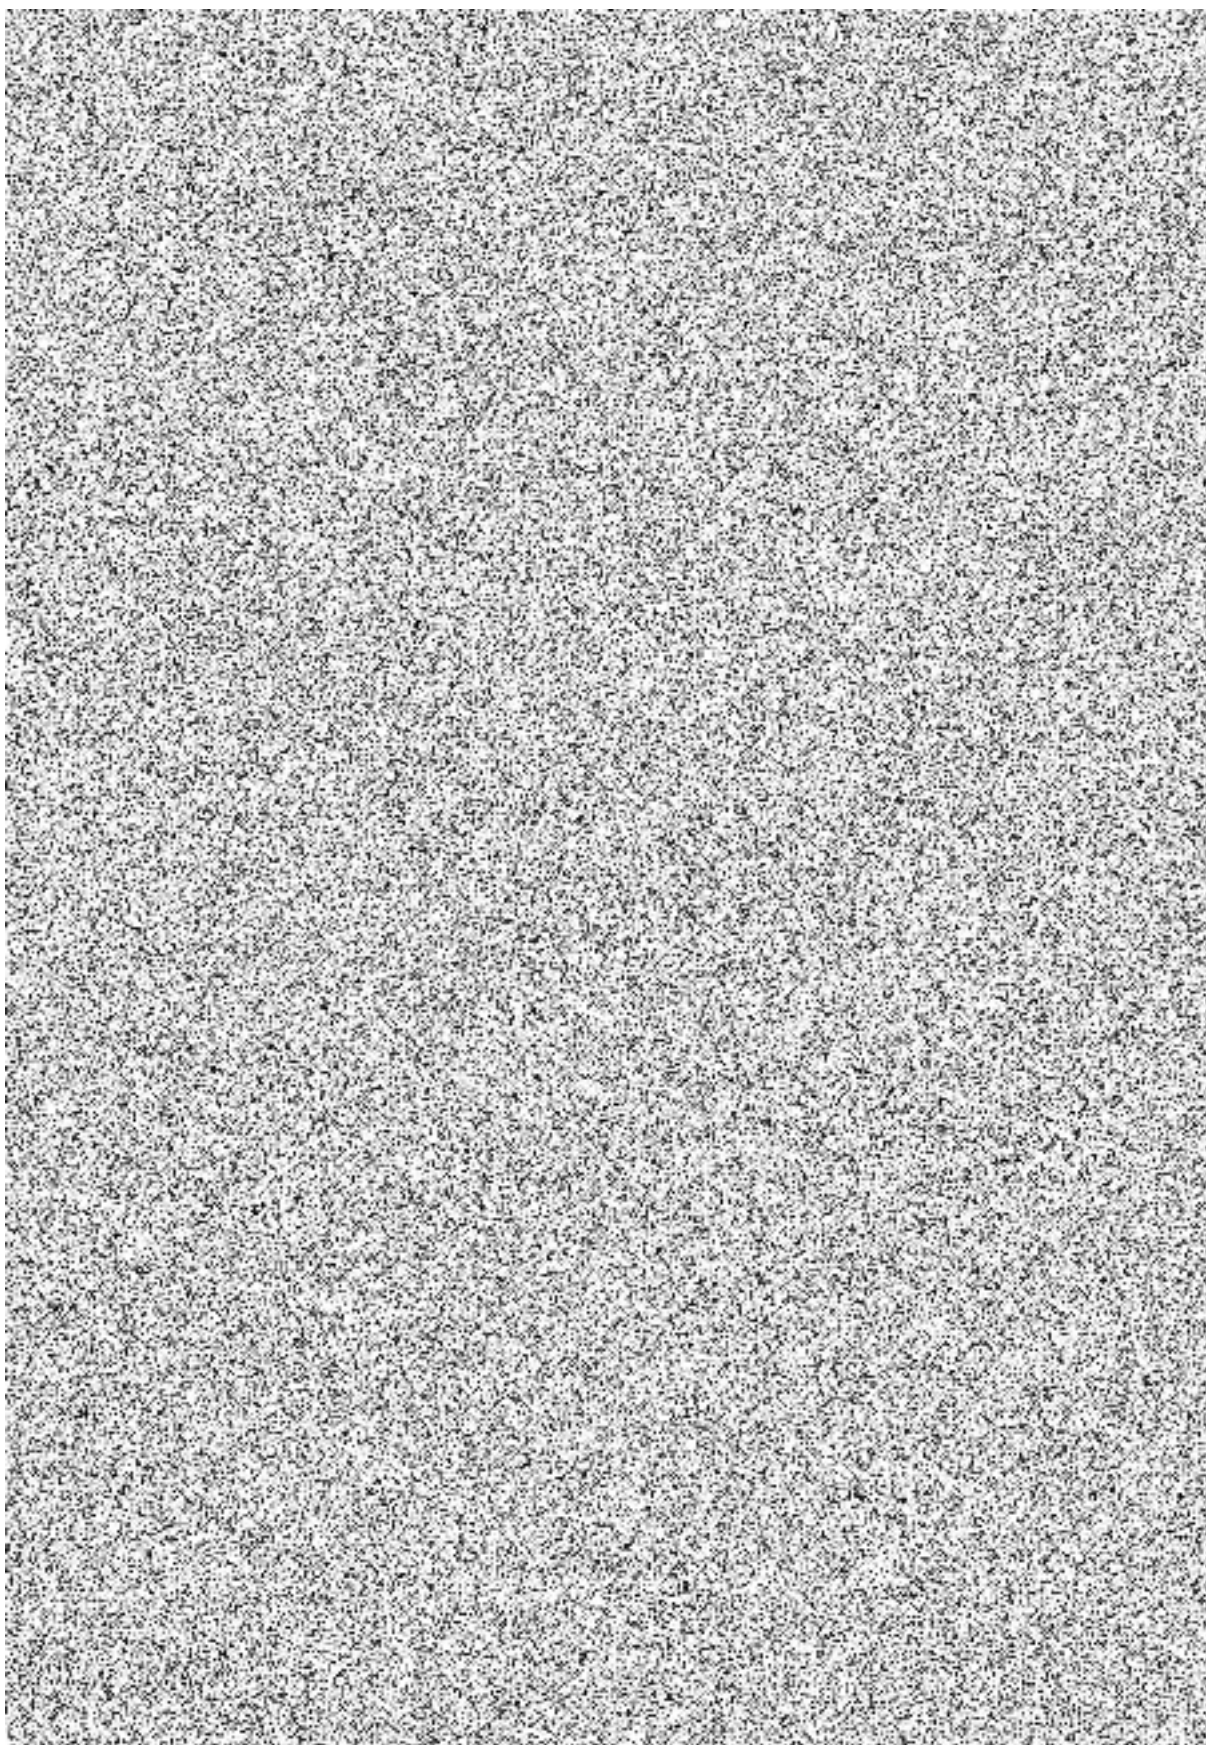

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 28.05.2025 20:46:18.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 28.05.2025 11:18:36. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016A8254, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jan Ďoubal, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 7506084C696B4977C1B2A0DCA5E12E82CF6141260BDCB68D4578F6D22C71ACA4

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 17034 Praha 7

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

28.5.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Vymětal Jan Mgr.
