

Nabídka
na realizaci požadavků na úpravu AIS SFŽP ČR
Nabídka č. 2 v roce 2025

určeno pro
SFŽP ČR



vypracovala společnost
ASD Software, s.r.o.

dokument ze dne 11. 7. 2025, verze 1.02

Úvod

Tento dokument obsahuje nabídku společnosti ASD Software, s.r.o. (dále jen Dodavatel) na realizaci požadavku uvedených v kapitole č. 1 tohoto dokumentu, které v rámci poptávky u Dodavatele definoval Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen Objednatel).

Dokument je členěn do následujících kapitol:

1. Seznam požadavku
2. Návrh řešení
3. Cena
4. Proces realizace a akceptace plnění
5. Závěr

1. Seznam požadavků

Níže je uveden seznam požadavků, které jsou Objednatelem poptávány:

Číslo požadavku	Název požadavku
AIS-5421	Tlačítko "Nové Rozhodnutí ministra" i ve stavu projektu "ukončený" - pro projekty financované na základě RM
AIS-5758	NPŽP NPO_Administrace test - Úprava algoritmu Energetické úspory 2024
AIS-6314	Nastavení účetních případů pro vratky záloh po ukončení projektu
AIS-6315	Záruky - nový zdroj financování a účetní případy
AIS-6316	Registrace cizinců v AIS
AIS-6317	NPO - Příprava dávek operací pro modul AIS MPO DU (červen 2025)
AIS-6323	Změna kontroly realizace
AIS-6330	Úprava algoritmu pro nové výzvy NZÚ 2025
AIS-6332	Změna aktivity ve stavu projektu "Probíhá realizace"
AIS-6354	Přidělení čísla nového dotačního titulu k žádostem v CEDR dávce
AIS-6359	Ne/blokace automatického ukončování

2. Návrh řešení

Tato kapitola obsahuje návrh řešení jednotlivých požadavků, které Objednatel definoval v kapitole č. 1.

2.1 AIS-5421 Tlačítko "Nové Rozhodnutí ministra" i ve stavu projektu "ukončený" - pro projekty financované na základě RM

Na základě požadavku AIS-4324 chybná výše dotace požadujeme pro PM zpřístupnit funkční tlačítko "Nové Rozhodnutí ministra" a to pro všechny projekty financované na základě RM i ve stavu "ukončený".

Popis návrhu řešení: Pro projekty financované na základě RM (tzn. na dílčí výzvě je na záložce "Administrace projektu" zaškrtnuto "Financování pouze na základě RM") ve stavu "Ukončený" bude na kartě "Rozhodnutí" u seznamu "Rozhodnutí ministra" zpřístupněno tlačítko "Nové Rozhodnutí ministra". Pro RM založené u ukončených projektů bude doplněn speciální interní příznak (nebude se zobrazovat), který umožní odlišit taková RM od RM u ukončených projektů, které nebyly dokončeny, např. z důvodu odstoupení od žádosti.

Příkladem může být např. RM č.j. SFZP 040880/2023

<https://ais.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=0473f95b-7996-4b9f-bb75-906a8bc35803&idForm=9ecdb55f-cb4e-4d77-b6a9-9d0419ee017f&idbo=b82a4baf-fde5-47b8-9f88-f46a7df11be0>

z ukončeného projektu 5214107209, u kterého žadatel odstoupil od žádosti. Bez doplnění uvedeného příznaku (a s ním související funkčnosti) by se toto RM začalo objevovat na seznamu "Rozhodnutí je schválení", což není žádoucí.

Podobně by se u projektu 5214125932 po spuštění události pro změnu stavu RM po podpisu změnil stav z "Předáno k elektronickému podpisu" do "Vydáno RM", protože dokument byl již podepsán (ale pak došlo k odstoupení od žádosti)

<https://ais.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2d10a400-d24f-4100-8fb7-79e5045233d2&idForm=9ecdb55f-cb4e-4d77-b6a9-9d0419ee017f&idbo=b82a4baf-fde5-47b8-9f88-f46a7df11be0>

Přiřazení č.j. k RM se provádí při prvním uložení RM - tato funkčnost zůstane zachována.

Pro zpřístupnění následného procesu vypořádání RM budou v menu "Smlouvy a rozhodnutí" upraveny podmínky na seznamech:

- Rozhodnutí ke schválení
- Rozhodnutí schválena ŘF
- Rozhodnutí k elektronickému podpisu
- Rozhodnutí k listinnému podpisu
- Rozhodnutí ke kontrole DM
- Rozhodnutí k vypravení

- Rozhodnutí k vypravení a vyplacení

Bude upravena automatická událost, která zajišťuje přechod "Elektronicky podepsat" ve WF rozhodnutí ministra po podpisu RM.

Na dashboardu se údaje ukončených projektů nezobrazují - to zůstane zachováno.

Pro ručně vytvářené RM se negenerují PP automaticky, což zůstane zachováno (tzn. založení PP bude nutné provést ručně; současné funkčnosti pro předávání PP do EKIS se nebudou měnit).

Dodatečný dotaz Objednatele:

Zda druhá odrážka z našeho vyjádření ze dne 13/6 je v pořádku a zda s tím počítáte, protože se neobjevila v textu požadavku v rámci předložené nabídky. Takže pokud žadatel odstoupí od žádosti v průběhu schvalování RM, tak se projekt ukončí a ze seznamu zmizí, tak aby až se udělá tato změna, tak aby se tam opět neobjevily. Je tomu tak

Reakce Dodavatele:

Domníváme se, že ano. V návrhu řešení je schvalování popsáno úpravami v paragrafu, který začíná slovy "Pro zpřístupnění následného procesu vypořádání RM ...". Chování dashboardu je uvedeno v posledním odstavci.

2.2 AIS-5758 NPŽP NPO_Administrace test - Úprava algoritmu Energetické úspory 2024

Při realizaci vyjdeme z existujícího algoritmu "AIS-5129 PodporaVerejnychBudov2024 úprava 8/2024", který je aktuálně umístěn na produkčním prostředí.

„Realizace bude provedena v souladu se zadáním, které definoval Objednatel viz soubor:

- Výpočet podpory Veřejné budovy 2024 v3_20250620

Obsah souboru je uveden níže:

Parametry nastavené na výzvě, kde žadatel vybere u každého jednu z odpovědí z rozbalovacího seznamu:

- 1) **Jedná se o památkově chráněnou budovu dle § 7 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů - výběr z rozbalovacího seznamu:**
 - a) ANO
 - b) NE

PamChr

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2b54e519-e6d0-4d9e-8a8e-9e1228e1dafa&idForm=2461d8f4-12ad-4ffd-bedb-05ba0a7298ba&idbo=baa253f7-b2a4-447e-92c3-bbf41aa1754e&IdChild=29d6ba25-bc4d-4241-82b8-c39ca6bd1765>

- 2) **Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů – výběr z rozbalovacího seznamu:**
 - a) $\geq 30 \%$
 - b) $\geq 40 \%$

UPrime

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2b54e519-e6d0-4d9e-8a8e-9e1228e1dafa&idForm=2461d8f4-12ad-4ffd-bedb-05ba0a7298ba&idbo=baa253f7-b2a4-447e-92c3-bbf41aa1754e&IdChild=00202d5c-e7a0-4067-92c0-77753f5532f5>

- 3) **Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro stav po realizaci navržených opatření -**
výběr z rozbalovacího seznamu:
- a) $\leq 0,85 \times$ reference pro renovace
 - b) $\leq 0,70 \times$ reference pro renovace
 - c) Irelevantní (pouze v případě památkově chráněných budov)

PrimeEPoReal

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2b54e519-e6d0-4d9e-8a8e-9e1228e1dafa&idForm=2461d8f4-12ad-4ffd-bedb-05ba0a7298ba&idbo=baa253f7-b2a4-447e-92c3-bbf41aa1754e&IdChild=87a98edd-3bf7-4362-8511-cb8a50ddc0a3>

- 4) **Průměrný součinitel prostupu tepla obálky (pokud jsou řešeny její tepelně – technické vlastnosti) budovy**
- výběr z rozbalovacího seznamu:
- a) $\leq 0,95 \times U_{em,R}$
 - b) $\leq 0,80 \times U_{em,R}$
 - c) Irelevantní (nejdou řešeny tepelně technické vlastnosti obálky, nebo se jedná o památkově chráněnou budovu)

Soucinitel

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2b54e519-e6d0-4d9e-8a8e-9e1228e1dafa&idForm=2461d8f4-12ad-4ffd-bedb-05ba0a7298ba&idbo=baa253f7-b2a4-447e-92c3-bbf41aa1754e&IdChild=f6f7c20f-1e60-4866-ad4c-ed7ffa848976>

- 5) **Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora - $\leq U_{Rj}$, dle**
odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
- a) Splněno
 - b) Irelevantní (dotčené stavební prvky nejsou řešeny, nebo se jedná o památkově chráněnou budovu)

SoucStavPrv

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2b54e519-e6d0-4d9e-8a8e-9e1228e1dafa&idForm=2461d8f4-12ad-4ffd-bedb-05ba0a7298ba&idbo=baa253f7-b2a4-447e-92c3-bbf41aa1754e&IdChild=816a714e-402e-4cf0-ba43-7c0fbf957baf>

- 6) **Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora - $\leq 0,60 \times U_{Rj}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky**
264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov
- a) Splněno
 - b) Irelevantní (výměna oken není řešena, nebo se jedná o památkově chráněnou budovu)

SoucOkna

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2b54e519-e6d0-4d9e-8a8e-9e1228e1dafa&idForm=2461d8f4-12ad-4ffd-bedb-05ba0a7298ba&idbo=baa253f7-b2a4-447e-92c3-bbf41aa1754e&IdChild=b06487af-fb6a-4fd8-b417-68d11b1276a2>

- 7) **Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období $\leq \Theta_{op,max,RQ}$**

- a) Splněno
- b) Irelevantní (pouze v případě památkově chráněných budov)

TeplotaLeto

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2b54e519-e6d0-4d9e-8a8e-9e1228e1dafa&idForm=2461d8f4-12ad-4ffd-bedb-05ba0a7298ba&idbo=baa253f7-b2a4-447e-92c3-bbf41aa1754e&idChild=f45d97ef-4255-4468-b27c-9754338763d0>

- 8) **Koncept větrání** - V bytových místnostech musí být trvale zajištěna koncentrace $\text{CO}_2 \leq 1500$ ppm
 - a) Splněno
 - b) Irelevantní (nejedná se o budovu sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v souladu s vyhláškou č.410/2005 Sb., nebo se jedná o památkově chráněnou budovu)

Vetrani

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=2b54e519-e6d0-4d9e-8a8e-9e1228e1dafa&idForm=2461d8f4-12ad-4ffd-bedb-05ba0a7298ba&idbo=baa253f7-b2a4-447e-92c3-bbf41aa1754e&idChild=89cf9ad4-96dc-4559-8bf8-022d4cbc26b2>

Výpočet dotace pro různé varianty:

Dotace Památky) - Pokud je 1a), pak (1 je číslo parametru, a) je odpověď):

Dotace je dána hodnotou v parametru 2), tedy

- 1) **Dotace památky A1)** Pokud je odpověď „a) ≥ 30 %“, pak je dotace $12\,000 \cdot \text{cílová hodnota indikátoru Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů}$.
- 2) **Dotace památky A2)** Pokud je odpověď „b) ≥ 40 %“, pak je dotace $15\,000 \cdot \text{cílová hodnota indikátoru Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů}$.

Hodnoty ostatní parametrů nemají vliv na výši podpory.

Dotace A1) – Pokud je vybráno 1b), a zároveň:

Pokud jsou hodnoty parametrů 2a), 3a) 4 a) nebo c), 5a) nebo b), 6a) nebo b), 7a) a 8a) nebo b), činí dotace $11\,000 \cdot \text{cílová hodnota indikátoru Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů}$.

Dotace A2) - Pokud je vybráno 1b), a zároveň:

Pokud jsou hodnoty parametrů 2b), 3b) 4 b) nebo c), 5a) nebo b), 6a) nebo b), 7a) a 8a) nebo b), činí dotace $13\,500 \cdot \text{cílová hodnota indikátoru Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů}$.

Z uvedeného tedy plyne, že o tom, zda bude výše dotace dle A2) nebo A1) rozhodují hodnoty parametrů 2 – 4. V případech, kdy budou u otázek 2 – 4 kombinace odpovědí (např. 2b), 3a) a 4b), tedy každá z jiné kategorie Dotace A1 a A2), bude poskytnuta nižší dotace, tedy dle A1.

Dotace příprava:

Rozpočet Snížení energetické náročnosti veřejných budov 2024

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=8a6e898d-f305-4c93-a952-fe93cfdac7b9&idForm=ce2ddcab-12de-472b-aaa9-ee82fb8daed5&idbo=7e4b5a01-5101-418f-b23c-e1f39dab05c9>

- a) Pokud jsou způsobilé výdaje v Rozpočtu na řádcích 1.1.1 + 1.2.1 do 3 mil. Kč (včetně), činí dotace 7 % z těchto výdajů. Zároveň nesmí překročit způsobilé výdaje z Rozpočtu na řádcích 1.1.2 + 1.2.2.
- b) Pokud jsou způsobilé výdaje v Rozpočtu na řádcích 1.1.1 + 1.2.1 nad 3 mil. Kč a do 10 mil. Kč (včetně), činí dotace 5 % z těchto výdajů. Zároveň nesmí překročit způsobilé výdaje z Rozpočtu na řádcích 1.1.2 + 1.2.2.

- c) Pokud jsou způsobilé výdaje v Rozpočtu na řádcích 1.1.1 + 1.2.1 nad 10 mil. Kč, činí dotace 3,5 % z těchto výdajů. Zároveň nesmí překročit způsobilé výdaje z Rozpočtu na řádcích 1.1.2 + 1.2.2.

Dotace celkem

Jedná se o součet Dotace Památky A1 nebo Dotace Památky A2 nebo Dotace A2 nebo Dotace A1 + Dotace příprava.

Pokud je dotace dle A1) (platí i pro dotaci památky A1), může Dotace celkem činit maximálně 50 % z celkových **způsobilých** výdajů projektu.

Pokud je dotace dle A2) (platí i pro dotaci památky A2), může Dotace celkem činit maximálně 60 % z celkových **způsobilých** výdajů projektu.

Tabulka s rozdělením parametrů (pro přehlednost). Možnosti irelevantní u některých parametrů jsou z důvodu výjimek, které nejsou v této tabulce uvedeny.

Rozsah renovace	A1-12000	A2-15000
2. Úspora primární energie z neobnovitelných zdrojů	$\geq 30 \%$	$\geq 40 \%$
3. Dosažená hodnota primární energie z neobnovitelných zdrojů pro stav po realizaci navržených opatření	$\leq 0,85 \times$ reference pro renovace	$\leq 0,70 \times$ reference pro renovace
4. Průměrný součinitel prostupu tepla obálky (pokud jsou řešeny její tepelně – technické vlastnosti) budovy	$\leq 0,95 \times U_{em,R}$	$\leq 0,80 \times U_{em,R}$
5. Součinitel prostupu tepla pro měněné stavební prvky vyjma oken, na něž se vztahuje podpora	$\leq U_{R,j}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov	
6. Součinitel prostupu tepla oken, na něž se vztahuje podpora	$\leq 0,60 \times U_{R,j}$ dle odst. 6, přílohy č. 1, vyhlášky 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov	
7. Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období	$\leq \Theta_{op,max,RQ}$	
8. Koncept větrání	V pobytových místnostech musí být trvale zajištěna koncentrace $CO_2 \leq$ 1500 ppm	

Doplnění 18. 10. 2024 a 20. 6. 2025

Po vypočtení podpory viz výše dojde v případě, že je u projektu vybrán jeden z typů veřejné podpory:

- Nařízení GBER 651/2014 Článek 38 a) - podpora energetické účinnosti v budovách
- Nařízení GBER 651/2014 Článek 38 a) - podpora energetické účinnosti v budovách - realizace pouze jednoho opatření
- Nařízení GBER 651/2014 Článek 38 a) - podpora energetické účinnosti v budovách – úspora min. 40 % energie
- Nařízení GBER 651/2014 Článek 41 - Investiční podpora energie z obnovitelných zdrojů (45 % Praha, 60 % regiony)

k porovnání, zda vypočtená podpora nepřekračuje Dotaci GBER, vypočtenou vzorcem Celkové způsobilé výdaje * procento dle tabulek níže

GBER 38 a)			
	Praha	Regiony a)	Regiony c)
Malý podnik	50	65	55
Střední podnik	40	55	45
Velký podnik	30	45	35

GBER 38 a) - proveden pouze 1 stavební prvek			
	Praha	Regiony a)	Regiony c)
Malý podnik	45	60	50
Střední podnik	35	50	40
Velký podnik	25	40	30

GBER 38 a) - úspora 40 %			
	Praha	Regiony a)	Regiony c)
Malý podnik	65	80	70
Střední podnik	55	70	60
Velký podnik	45	60	50

GBER článek 41 (výše písm. d))			
	Praha	Regiony a)	Regiony c)
Malý podnik	65	65	65
Střední podnik	55	55	55
Velký podnik	45	45	45

Červeně vyznačené jsou případy, kdy dochází/může dojít k překročení procenta podpory, které je již hlídáno v původní části algoritmu, tedy 50 nebo 60 %.

Velikost podniku – parametr na výzvě

Regiony

Praha = území hlavního města Prahy

Regiony a) = kraje Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský.

Regiony c) = kraje Středočeský, Plzeňský, Jihočeský, Vysočina a Jihomoravský

Pokud tedy bude u projektu nižší Dotace GBER, než dotace vypočtená v původní části algoritmu, bude projektu stanovena Dotace GBER jako Dotace projektu.

Obecně se jedná se o stejný princip, který jsme ji používali u předchozích výzev (algoritmů) RES+, HEAT nebo ENERG ETS.

Otázka: Na výzvě jsou již podané projekty, které nemají parametr velikost podniku. Předpokládáme, že pokud tyto projekty zároveň nemají vybránou žádnou veřejnou podporu (resp. podporu dle GBER viz výše uvedené typy), nebude ani do budoucna absence parametru vadit, jelikož se s ním v těchto případech vůbec nepočítá.

Reakce ASD:

Pokud nemají projekty nastavený parametr a nemají vybranou veřejnou podporu, tak to do budoucna nebude vadit. Pokud je vyplněná veřejná podpora (GBER), tak musí být vyplněný parametr velikost podniku. Pokud by byla dodatečně veřejná podpora doplněna, pak by bylo vyžadováno i doplnění parametru velikost podniku.

U projektů, které nemají veřejnou podporu a parametr velikost podniku vyplněné, tak změna algoritmu nebude mít žádný vliv.

U projektů, u kterých by veřejná podpora a parametr velikost podniku byly vyplněny, tak změna algoritmu může vést k tomu, že výše podpory bude mít jinou hodnotu.

2.3 AIS-6314 Nastavení účetních případů pro vratky záloh po ukončení projektu

S ohledem na značné množství projektů, kdy dochází k zadávání VRATEK ZÁLOH až po ukončení projektu, je potřeba doplnit do AIS účetní případy pro vratky záloh zadané do AIS a přenášené do JASU po PRVOTNÍM ukončení projektu (po prvotním z toho důvodu, že i kdyby došlo k navrácení stavu projektu ze stavu „Ukončený“ do nějakého aktivního stavu a následně znovu k ukončení, projekt už byl jednou ukončen a nutno tak na něj nahlížet).

Při prvotním ukončení projektu dochází k účetnímu vyrovnání projektu. Pokud však u takto ukončeného projektu dojde k dodatečnému zadání vratky zálohy, k nyní používanému účetnímu případu pro přenos takové vratky se v JASU přiřadí účetní předpis, který rozhodí již provedené účetní vyrovnání.

Z toho důvodu vyvstala potřeba odlišovat vratky záloh zadané před ukončením projektu a po ukončení projektu. Pro vratky záloh zadané do AIS po prvotním ukončení projektu je tedy potřeba v AIS nastavit nové účetní případy. Tyto účetní případy budou vycházet ze současných používaných účetních případů pro vratky záloh, odlišení bude provedeno na 7. pozici, na které v případě vratky zálohy přenášené do JASU po prvotním ukončení projektu bude uváděno písmeno L.

Takovýmto novým účetním případům bude v JASU přiřazen nový účetní předpis, který účetní vyrovnání projektu nenaruší a vratku zálohy k projektu správně účetně zaeviduje.

Na společném jednání s Dodavatelem dne 10.6.2025 Objednatel potvrdil, že jako vratku záloh označují to, co má jako druh vratky uvedeno "vratka záloh ..." (viz OBR 1-1). Současně Objednatel potvrdil, že se jedná o vratky u projektů, které někdy v historii prošly přes stav „Ukončený“.

3212300005 AIS320 KLASIK Marie Koudelková Přípraven pro RM

Odstranit (Vratka)

Předat vratku ke schválení vedoucím

Uložit

Dotace NPŽP
2022/DokASD/84632

Výše vratky *
4

Specifický symbol *
327 vratka zálohy akt. roku

Datum vypravení
8. 11. 2022

Stav
Požadavek na vratku

Řešitel
Vedoucí Tento

Důvod vratky
jiné

Důvod vratky - jiné
bb

Druh vratky *
vratka zálohy - odstoupení

vratka dotace
vratka půjčka
vratka zálohy - odstoupení
vratka zálohy v průběhu financování
vratka zálohy z vyúčtování

dopad na přenos do EKIS po ukončení projektu
☒

bez dopadu na výši čerpané dotace (pro CEDR)
☐

Uhradit místo EIS (ASD pro test)

OBR 1-1

2.4 AIS-6315 Záruky - nový zdroj financování a účetní případy

Realizace bude provedena v souladu se zadáním, které definoval Objednatel viz soubor:

- Přidání nového zdroje financování pro administraci projektů se zárukami v AIS (1).docx

Obsah souboru je uveden níže:

S ohledem na plánovanou administraci záruk v rámci Finančního nástroje OPŽP prosíme o **přidání nového zdroje financování „IFN – záruky/OPŽP – CF“**, a to:

- do výběru „Typ zdroje“ v rámci „Nastavení zdroje financování projektu pro výzvu“
- do výběru „Typy zdrojů financování“ v číselníku „Bankovní účet SFŽP“

(viz obrázky)

Nastavení zdroje financování projektu pro výzvu

Typ zdroje *

--- IFN - záruky/OPŽP - CF

Dotace NF

Dotace NPŽP

JTF

Modernizační Fond

NF - spolufinancování SFŽP

NPO

NZÚ Light/ModFond

NZÚ/ModFond

NZÚ/NPO

[HOME](#) > [Sfzp](#) > [Seznam bankovních účtů SFŽP](#) > Bankovní účet SFŽP

Bankovní účet SFŽP

Typy zdrojů financování

- ☐ Dotace NF
☐ JTF
☐ NF - spolufinancování SFŽP
☐ NZÚ Light/ModFond
☐ NZÚ/NPO
☒ Půjčka NZÚ/ModFond
- ☐ Dotace NPŽP
☐ Modernizační Fond
☐ NPO
☐ NZÚ/ModFond
☐ OPŽP21+
☒ IFN - záruky/OPŽP - CF

Nastavit, aby pro tento nový zdroj, při přenosu JASU byl zasílán zdroj 5 a nástroj 148 a následující účetní případy:

Smlouva	Platba	Vratka	ZVA
D	D	V	D
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	U/M/O	U/M/O	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	O	S
G	G	G	G

V rámci implementace požadavku budou provedeny následující úpravy :

- Úprava číselníku zdroje financování (doplnění záznamu do číselníku), současně bude provedena kontrola/doplnění u číselníku BU
- Doplnění příslušných pravidel pro nastavení nástroje, zdroje a účetních případu (PP, smlouvy, vratky, ZVA)

2.5 AIS-6316 Registrace cizinců v AIS

Vstupní informace:

NZÚ - "Ruční" registrace 2 cizinců (XXXXXXXX, XXXXXXXX).

1. pan XXXXX XXXXXXXX

Fyzická osoba: XXXXX XXXXXXXX

Právní forma: XXXXX XXXXXXXX

Adresa pobytu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: XXXXXXXXXX

Doručovací adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní e-mail: xxxxxxxxxxxx

Datum narození: XX. XX. XXXX

Národnost: XXXXXXXXXX

2. paní XXXXX XXXXXXXX

Fyzická osoba: XXXXX XXXXXXXX

Právní forma: XXXXX XXXXXXXX

Adresa pobytu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID datové schránky: XXXXXXXXXX

Doručovací adresa: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní e-mail: xxxxxxxxxxxx

Datum narození: XX. XX. XXXX

Národnost: XXXXXXXXXX

Postup řešení:

- v případě XXXXXXXX byl realizován pokus o vstup do systému => na základě tohoto pokusu má Dodavatel identifikátory, ke kterým je schopen ručně záznam doplnit tak, aby se mohla do systému připojit tou cestou, kterou se pokoušela do systému vstoupit.
- v případě XXXXXXXXXX žádný pokus o vstup do systému neproběhl => Objednatel musí zajistit, aby se alespoň pokusil (tou cestou, kterou bude chtít do systému přistupovat) a i když výsledkem bude nezdár, Dodavatel tím získá identifikátory, na které doplní potřebná data

2.6 AIS-6317 NPO - Příprava dávek operací pro modul AIS MPO DU (červen 2025)

Po dnešním jednání doplňujeme zadání požadavku od hlavní řešitelky pro aktuálně požadované zpracování xml dávek dle o operacích z cílů NPO 118, 322, 129:

Následně, po nacenění, dodáme finální podklady s daty k projektům. Nyní posíláme metodiku a základní zadání, které vychází z posledního zadání na přelomu r 2024/2025.

V podstatě se neliší od posledního požadavku, jen počty projektů jsou jiné.

118 4 680 operací – 5 xml dávek – upload ideálně do 17.7.2025

129 52 067 operací – 53 xml dávek – upload ideálně do 31.8.2025

322 2 222 operací – 3 xml dávky – upload ideálně do 17.7.2025

324 51 operací ([z komp. 7.3.4](#)) – 1 xml dávka – upload ideálně do 17.7.2025

Celkem tedy 62 dávek.

Finální počet projektů se může mírně lišit, některé projekty se realizují do 30.6.

Prosím o informaci, zda se povede zrealizovat a do kdy dodat přílohy k požadavku ve stejném rozsahu jako v minulém požadavku, konkrétně potom toto:

Přehled projektů

Seznam skutečných majitelů

Rozložení plateb dle opatření (pouze u 118 a 129)

Doplňující upřesnění (z 13.6.2025):

Jedná o úpravy, které Dodavatel prováděl již při posledním předání dávek (tzn. doplněná příjemce, číslo operace nastaveno na registrační číslo projektu apod.), včetně toho, že jsme od vás dostali soubor, kde byla uvedena část dotace, která příslušela dané komponentě a tuto částku jsme přenášeli do dávek.

Objednatel předloží stejné podklady jako posledně a tedy i postup generování bude obdobný s tím, že:

- Dva cíle (118 a 125) jsou z NZU, tedy postup bude stejný jako v předchozím období.
- U cíle 322 je situace jednodušší v tom, že nedochází k financování jednoho projektu z různých komponent. Obecně je potom také zjednodušením, že na těchto cílech nejsou na žádném z projektů VZ.

K řešení bude přistoupeno v souladu se zadáním a bude postupováno obdobně (odlišnosti viz výše uvedený text) jako v předchozím období.

2.7 AIS-6323 Změna kontroly realizace

U projektů výzvy 1/2021 a 2/2021 budeme požadovat u akceptovaných žádostí změnu úkonu „Kontrola realizace projektu před smlouvou“ ze stavu naplánovaná na probíhá. Znamená to tedy realizaci přenést ze strany žadatele na stranu SFŽP k 1.7.2025, tak abychom mohli vydat záporné RM vzhledem k povinnosti ukončit a vyhodnotit tento program. Žadatelům se posílá hromadný email a PM se také snaží, aby co nejvíce žádostí žadatelé zrušili sami, ale zbytek se bude muset přesunout. Žádostí bude řádově stovky až tisíce.

Popis navrhovaného řešení: Vytvořili bychom jednorázovou událost, která by se spustila 1.7.2025 v 00:00 na portálu.

Tato událost by v uvedený okamžik zjistila všechny projekty, u kterých by měla proběhnout změna a zapamatovala by si je (na základě tohoto seznamu vytvoříme po skončení akce report).

Následně by pak všechny projekty na tomto seznamu postupně procházela a změnu stavu doložení realizace (odebrání žadateli z portálu a předání do vnitřního prostředí na PM) a změnu stavu hodnocení "Kontrola realizace projektu před smlouvou" z Naplánována na Probíhá.

Vzhledem k odhadovanému počtu projektů, kterých se změna týká odhadujeme, že potřebný čas pro převedení všech dotčených projektů se může pohybovat v nižších desítkách hodin. Pokud by v tomto období žadatel podal doložení u některého z vybraných projektů, tak mu v tom nebudeme bránit, ale upozorníme na to v reportu, který dodáme po skončení celé akce.

Po skončení celé akce vytvoříme report se všemi projekty, u kterých měla být provedena změna (tzn. projekty vybrané k 1.7.2025 00:00) a výsledek akce u každého projektu (tzn. zda bylo doložení převzato, popř. zda se žadateli podařilo doložení podat během provádění akce). Tím bude zajištěno, že budete mít přehled o projektech, které v 1.7.2025 v 00:00 byly vybrány pro provedení akce. Umožní to také, aby PM ve vnitřním prostředí byl schopen odlišit dotčené projekty od projektů, u kterých žadatel doložení podal včas a žádná akce se neměla provádět.

Poznámka: V reportu bude u veden i čas tohoto přechodu.

Budou vybrány projekty splňující následující podmínky:

- projekt je k jedné z dílčích výzev: NZU-BD- novostavby, NZU-BD-rekonstrukce, NZU-RD- novostavby, NZU-RD-rekonstrukce
- projekt je ve stavu Akceptovaný
- u projektu existuje hodnocení "Kontrola realizace projektu před smlouvou" ve stavu 'Naplánovaná' nebo ve stavu 'Vráceno k doplnění' (pouze pokud hodnocení bylo žadateli vráceno do 31.5.2025 včetně)
- u projektu existuje doložení realizace ve stavu "Čeká se na podklady od žadatele"

Jako rozhodující datum pro vrácené projekty bychom brali datum, kdy došlo k přechodu hodnocení do stavu "Vráceno k doplnění" - pokud k tomu přechodu došlo před 31.5.2025 (včetně), tak by u projektu byly provedeny navrhované akce (ve výsledném reportu by bylo odlišeno, zda bylo doložení ve stavu Vráceno nebo Naplánováno).

Poznámka: Aktuálně splňuje podmínky cca 5000 nepodaných a cca 250 vrácených záznamů.

Dodatečný dotaz Objednatele:

Chtěli jsme se ujistit, že pozdější realizací bude jednak zajištěn požadovaný přesun projektů na stranu SFŽP, jak je uvedeno v zadání, a dále že na zmíněném reportu bude následně viditelná jednoznačná identifikace projektů (rozišitelné projekty vč. data před a po 1/7).

Reakce Dodavatele:

Událost bude možné spustit v okamžiku, kdy bude připravena (k 1.7.2025 to již bohužel není možné provést). Akce bude provedena nad projekty v daných stavech k okamžiku spuštění - to samé platí i pro report. Pokud tedy žadatel některou žádost podal mezi 1.7.2025 a okamžikem spuštění, tak nad takovou žádostí již akce spuštěna nebude a nebude ani v reportu.

2.8 AIS-6330 Úprava algoritmu pro nové výzvy NZÚ 2025

Algoritmus se bude týkat těchto dílčích výzev ve výzvě 1/2025:

1) NZU-ModFond-RD-Light-2025-2

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=c1f38a80-45ce-4a6f-9e54-a52dac125500&idForm=4368f528-5e76-4c13-850b-2e600504f23d&idbo=654dd5a6-4233-45c5-bc55-fabdfbb29a4>

2) NZU-ModFond-RD-ODPB-2025-2

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=54f5cdc4-348d-4928-b198-22ebdac8a2a1&idForm=4368f528-5e76-4c13-850b-2e600504f23d&idbo=654dd5a6-4233-45c5-bc55-fabdfbb29a4>

3) NZU-ModFond-RD-2025-2

<https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=be971a1c-171b-4e04-b45f-ddb01d642cb8&idForm=4368f528-5e76-4c13-850b-2e600504f23d&idbo=654dd5a6-4233-45c5-bc55-fabdfbb29a4>

Bude se vycházet ze stávajícího algoritmu

AIS-5955 NZU 2025 - ModFond - HOUSEnergy - RD - Dotace na komplexní i dílčí renovace,

1) Na dílčích výzvách je nastavena nová aktivita NZU-ModFond-C6-Baterie <https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=be971a1c-171b-4e04-b45f-ddb01d642cb8&idForm=c00db835-cd2a-45f1-a3da-f39a1d1aaa1e&idbo=654dd5a6-4233-45c5-bc55-fabdfbb29a4&idChild=85b87680-3781-4bd4-b4b3-f20d6373313a> závislá bude na parametru KapAku <https://ais-test.sfzp.cz/AIS/LW/Views/Core/Detail?action=get&id=8a0dd6df-c150-42a9-bd72-b92e79c595ce&idForm=2461d8f4-12ad-4ffd-bedb-05ba0a7298ba&idbo=baa253f7-b2a4-447e-92c3-bbf41aa1754e&idChild=53fc9f65-37de-4d87-9dd0-c1ed32831696>

2) Výpočet GBER:

Předpis/článek	Max VP v Praze	Max VP pro regiony dle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU	Max VP pro regiony dle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU
GBER 38 a)	30 % (SP + 10 %, MP + 20 %)	45 % (SP + 10 %, MP + 20 %)	35 % (SP + 10 %, MP + 20 %)
GBER 38 a) – realizováno pouze jedno opatření	25 % (SP + 10 %, MP + 20 %)	40 % (SP + 10 %, MP + 20 %)	30 % (SP + 10 %, MP + 20 %)
GBER 38 a) – úspora primární energie min. 40 %	45 % (SP + 10 %, MP + 20 %)	60 % (SP + 10 %, MP + 20 %)	50 % (SP + 10 %, MP + 20 %)

Regiony a) - NUTS II - CZ04 Severozápad, CZ05 Severovýchod, CZ07 Střední Morava, CZ08 Moravskoslezsko

Regiony c) - NUTS II - CZ02 Střední Čechy, CZ03 Jihozápad, CZ06 Jihoovýchod

Předpis/článek	Max VP v Praze	Max VP pro regiony dle čl. 107 odst. 3 písm. a) Smlouvy o fungování EU	Max VP pro regiony dle čl. 107 odst. 3 písm. c) Smlouvy o fungování EU
GBER 41 - OZE a KVET/CH z OZE	45 % (SP + 10 %, MP + 20 %)	45 % (SP + 10 %, MP + 20 %)	45 % (SP + 10 %, MP + 20 %)

Typy VP jsou na DV nastaveny zde :

Režimy veřejné podpory

Název	
Nariadení GBER 651/2014 Článek 38 a) - podpora energetické účinnosti v budovách	
Nariadení GBER 651/2014 Článek 38 a) - podpora energetické účinnosti v budovách - realizace pouze jednoho opatření	
Nariadení GBER 651/2014 Článek 38 a) - podpora energetické účinnosti v budovách – úspora min. 40 % energie	
Nariadení GBER 651/2014 Článek 41 - podpora obnovitelných zdrojů energie a zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla využívající OZE	
Podpora de minimis	

3) U výpočtu C3 nešlo zadat nižší parametr KapAku než VykonFVECelk

NZU-ModFeed-C1-TCV+	
NZU-ModFeed-C1-TCK	
NZU-ModFeed-C1-TCK+	
NZU-ModFeed-C1-CZI	

NZU-ModFeed-C2-SOL	
NZU-ModFeed-C2-SOL+	
NZU-ModFeed-C2-FV	Lze instalovat pouze jeden systém, parametr je výběr příslušné aktivity
NZU-ModFeed-C2-TČ-V	

NZU-ModFeed-C3-FVE	Parametr je výběr příslušné aktivity	1	- Kč
Fotovoltaické systémy pro výrobu el. Energie (Ano = 1)	VýkonFVEček	4,000	10 000 Kč 40 000,000 Kč
Celkový instalovaný výkon (počet kWp)	Kapaku	3	10 000 Kč nepřes 100kW
Celková instalovaná kapacita akumulátorů na bázi lithia (počet kWh)	DobijStanice		- Kč
Instalace pevně instalované dobíjecí stanice pro elektromobil (max. 1 ks)	SmartFVE		- Kč
FVE systém je vybaven "chytřím řízením" a je napojen do systému sdílení elektřiny (ANO = 1)	Ano		- Kč

NZU-ModFeed-C4-VET	Lze instalovat pouze jeden systém, parametr je výběr příslušné aktivity		- Kč
--------------------	---	--	------

Ano = 1

Nově již je ve vzorečku stejná hodnota:

Ano = 1					
Probu el. Energie (Ano = 1)	Parametr je výběr příslušné aktivity	1		60 000 Kč	
počet kWp)	VykonFVECelk	4,000	10 000 Kč	30 000,000 Kč	
a akumulátorů na bázi Lithia (počet kWh)	KapAku	3,000	10 000 Kč	30 000,000 Kč	
je dobijecí stanice pro elektromobil (max. 1 ks)	DobijStanice		10 000 Kč	- Kč	
ým řízením". Také je zapojen do systému sdílení elektřiny					
o zapojen prostřednictvím agregátora do					
= 1)	SmartFVE				
Ano = 1					

K řešení bude přistupováno dle zadání tak, aby chování algoritmu odpovídalo kalkulačce, která byla v rámci zadání požadavku předána Objednatelem ve formátu xls viz soubor:

- *nzu 2025 -modfond - rd - kalkulacka vyse podpory - vyzva housenerg - S VP 2025-06-18 final v1.1.xlsx*

2.9 AIS-6332 Změna aktivity ve stavu projektu "Probíhá realizace"

Tento požadavek bude realizován na základě dokumentu:

- *Zadání - Změna aktivity ve stavu žádosti - Probíhá realizace_ 20250618 .docx*

Obsah souboru je uveden níže:

Změna aktivity ve stavu žádosti „Probíhá realizace“

Zadání vychází z obdobného požadavku jako <https://jira.sfzp.cz/browse/AISI-1073> „NZU - změna aktivity žádosti po akceptaci“ (AIS-2972).

Principálně se jedná o stejnou funkci:

- PM ve stavu projektu „Probíhá realizace“ může žadateli vrátit žádost se změnou aktivity
- Žadatel změnu aktivity potvrdí v doložení realizace
- Dle vybrané aktivity se žadateli zobrazí parametry a upraví se veškeré finanční náležitosti projektu
- Dochází k přepočtu


Jediná změna, která zde nastává, je, že v případě ponížení dotace dochází po ukončení kontroly realizace projektu k automatickému vygenerování vratky – vratka zálohy z vyúčtování (Původ vratky - Rozdíl mezi zálohou a skutečností).

Je tedy ještě funkci rozšířit o:

- Automatické vygenerování vratky v případě ponížení dotace

Pro projekt ve stavu „Probíhá realizace“ platí:

- 1) Bude na formuláři doložení realizace doplněno tlačítko "Vrátit žadateli se změnou aktivit". PM tuto operaci může provést v případě, že doženi nebylo ještě podáno ze strany žadatele, ale i v případě, že již bylo doložení realizace bylo podáno.

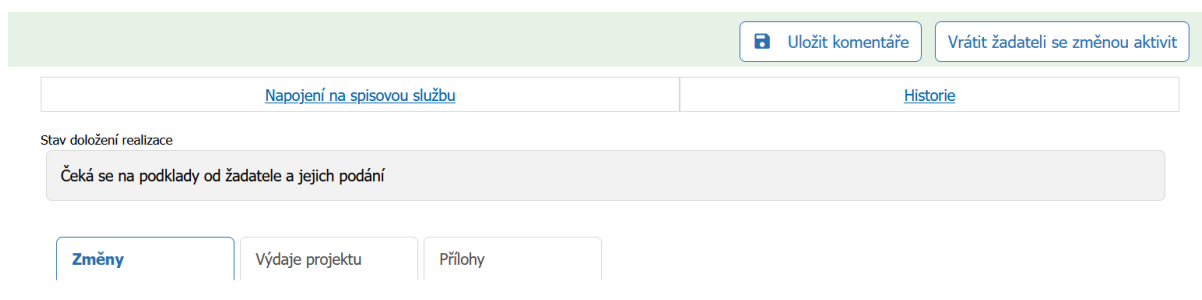

ASD 2025-06-18: V souladu s AIS-2972 je potřeba doplnit podmínky, za kterých může být akce provedena:

- projekt musí být ve stavu "Probíhá realizace"
- projekt má jedinou kontrolu realizace ve stavu 'Probíhá' nebo 'Naplánovaná'
- musí být vybrána alespoň jedna aktivita
- existuje doložení realizace a toto doložení realizace je u žadatele (tzn. čeká se na doplnění žadatelem) nebo bylo podáno, ale ještě nebylo předáno ke schválení

- 2) Tlačítko otevře pro PM nový formulář, který bude obsahovat aktuálně vybrané aktivity a umožní výběr aktivit (stejným způsobem jako na wizaru projektu na záložce s aktivitami vybírá žadatel) a samostatnou textovou položku pro komentář.

Vybrané aktivity

Fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie s efektivním využitím tepelného čerpadla




Systém pro využití akumulované dešťové vody pro závlivu zahrady



 Přidat další aktivitu

Komentář



ASD 2025-06-18: OK – jedná se o stejný postup jako pro projekty ve stavu „Akceptovaný“

- 3) PM na novém formuláři změny aktivity a (povinně) doplní komentář (komentář lze zapisovat standardně formou html) a zmáčkne tlačítko "Vrátit žadateli se změnou aktivit".

Vybrané aktivity

Fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie




Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku zahrady



[+ Přidat další aktivitu](#)

Komentář



ASD 2025-06-18: OK – jedná se o stejný postup jako pro projekty ve stavu „Akceptovaný“

- 4) Následně se provede:
- Uložení změněných aktivit k projektu. Informace o změnách aktivit zůstává v historii.
ASD 2025-06-18: OK – jedná se o stejný postup jako pro projekty ve stavu „Akceptovaný“
 - aktualizace rozpočtových položek a parametru, aktualizace stavu rozpočtu projektu a zdrojů financování projektu na projektu podle vybraných aktivit (a přepočet dotace) a aktualizace položek účetních dokladů, aktualizace záložky „Výdaje projektu“ ve wizardu, pokud je DV nastavena.
ASD 2025-06-18: OK – jedná se o stejný postup jako pro projekty ve stavu „Akceptovaný“
 - V rámci algoritmu výpočtu dotace se na doložení realizace zohledňuje, že částka nesmí překročit schválenou hodnotu v rozhodnutí ministra.
ASD 2025-06-18: Toto nelze v rámci uvedeného požadavku realizovat, protože algoritmus výpočtu je nezávislý. Pokud na dílčí výzvě bude vybrán algoritmus, který tuto funkčnost neobsahuje, tak ji tam nemáme jak vynutit.
 - Komentář PM se doplní na první záložku („Změny“) na doložení realizace a tudíž se propíše do notifikace žadateli o vrácení k doplnění.
ASD 2025-06-18: OK – jedná se o stejný postup jako pro projekty ve stavu „Akceptovaný“
 - Na portálu se žadateli takový projekt bude nabízet běžným způsobem v seznamu „Moje projekty“ a po otevření přes „Doložit realizaci“ by se detail doložení realizace otevřel na kroku s komentářem (tzn. „Změny“).

ASD 2025-06-18: OK – po změně aktivit se doložení vrátí žadateli k doplnění, stejným způsobem jako pro projekty ve stavu „Akceptovaný“

- Žadateli se zobrazí i komentáře na ostatních krocích, pokud tam byly doplněny.

ASD 2025-06-18: OK – jedná se o stejný postup jako pro projekty ve stavu „Akceptovaný“

- Při doložení realizace žadatelem dochází k veškeré aktualizaci žádosti včetně přepočtu.

ASD 2025-06-18: OK – jedná se o stejný postup jako pro projekty ve stavu „Akceptovaný“

5) Po schválení kontroly realizace:

- Dojde k automatickému vygenerování vratky zálohy z vyúčtování (Původ vratky - Rozdíl mezi zálohou a skutečností), pokud dochází k ponížení dotace. Administrace vratky probíhá klasickým, již nastaveným, způsobem, po uhrazení vratky se projekt automaticky ukončí.

ASD 2025-06-18: OK – případná vratka bude vytvořena až po ukončení kontroly doložení

- Se projekt automaticky ukončí, pokud nedochází k vratce.

ASD 2025-06-18: OK – pravidla pro ukončování projektů se nebudou měnit, tzn. pokud projekt splní podmínky pro ukončení, tak bude ukončen

2.10 AIS-6354 Přidělení čísla nového dotačního titulu k žádostem v CEDR dávce

Pro určení položky DotacniTitulKod byl předložen podklad: 202506-Přidělení čísla nového dotačního titulu k žádostem v CEDR dávce_v2.docx):

Obsah souboru

Přidělení čísla nového dotačního titulu k žádostem v CEDR dávce

Prosím dodavatele IS AIS o zohlednění dotačního programu Modernizační fond, NZÚ a Půjčky do CEDR-dávek. Nyní je uvedeno v CEDR-dávce takto, pro program NPŽP s kódem 5020000010.

```
<CleneniRokID>12315fc8-d42a-4969-affa-3c8d934f024a</CleneniRokID>  
<PlatnostDatum>2023-12-20</PlatnostDatum>  
<DotacniTitulKod>5020000010</DotacniTitulKod>  
<CastkaRozhodnutaCelkem>1714320.00</CastkaRozhodnutaCelkem>  
<CastkaSpotrebovanaCelkem>1714320.00</CastkaSpotrebovanaCelkem>
```

A) Modernizační Fond

Program Modernizační fond má v číselnících IS CEDR- resorty uvedeno číslo **5020000011** a je pod názvem dotačního titulu Modernizační fond.

Je potřeba upravit generování do CEDR-dávky v IS AIS u výzev **pod programem Modernizační fond**.

Pod kód 5020000011 budou zahrnuty žádosti dle níže definovaných podmínek:

- 1) Program z programové struktury „Modernizační fond“ (kód „ModF“)
 - všechny výzvy pod tímto programem mimo uvedené v dalších odrážkách
 - vyjma výzev, které **mají obsaženo** v čísle výzvy „**ModF HOUSEnerg**“ (např. ModF HOUSEnerg č. 1/2022, ...)
 - vyjma výzev, které **nemají** v čísle výzvy uvedeno **žádné písmeno** (např. 8/2023; 1/2024, ...)
 - vyjma výzev, které **mají** v čísle výzvy **obsaženo „půjčk“** (např. Půjčky HOUSEnerg č. 1/2024/FN)

V CEDR-dávce bude u těchto výzev, v **položce <DotacniTitulKod>**, uvedeno **5020000011**.

B) NZÚ

Do číselníků IS CEDR-resorty bude přidán další dotační titul - „NZÚ“, který bude mít číslo **5020000012**.

Pod kód 5020000012 budou zahrnuty všechny žádosti dle níže definovaných podmínek:

- 1) Program z programové struktury „Nová zelená úsporám“ (kód „NZÚ“)
 - všechny výzvy
 - vyjma výzev, které **mají** v čísle výzvy **obsaženo „půjčk“** (např. Půjčky HOUSEnerg č. 1/2024/FN)
- 2) Program z programové struktury „Modernizační fond“ (kód „ModF“)
 - **výzvy**, které **mají** v čísle výzvy **obsaženo „ ModF HOUSEnerg“** (např. ModF HOUSEnerg č. 1/2022,, ...)
 - **výzvy**, které **nemají** v čísle výzvy uvedeno **žádné písmeno** (např. 8/2023; 1/2024, ...)

U těchto žádostí bude v CEDR dávce, **položce <DotacniTitulKod>**, uvedeno **5020000012**.

C) Půjčky

Do číselníků IS CEDR-resorty bude přidán další dotační titul - „Půjčky“, který bude mít číslo **5020000013**.

Pod kód 5020000013 budou zahrnuty všechny žádosti dle níže definovaných podmínek:

- 1) Program z programové struktury – jakýkoliv program (Modernizační fond; CZ-ENVIRONMENT; Národní program Životní prostředí; Nová zelená úsporám; další nový)
 - **výzvy**, které **mají** v čísle výzvy **obsaženo „půjčk“** (např. Půjčky HOUSEnerg č. 1/2024/FN)

U těchto žádostí bude v CEDR dávce, **položce <DotacniTitulKod>**, uvedeno **5020000013**.

V případě potřeby jsme k dispozici pro upřesnění.

Pro určení položky DotacniTitulKod navrhujeme následující algoritmus:

1/ pokud jsou splněny podmínky bodu C) podkladu, tzn. v čísle výzvy projektu je uveden text 'půjčk', pak bude přidělen DotacniTitulKod 5020000013

2/ pokud nejsou splněny podmínky bodu C) podkladu

2.1/ pokud je výzva projektu z programu (z programové struktury) "Modernizační fond" (kód "ModF")

2.1.1/ pokud je splněna podmínka dle B2) podkladu, tzn. v čísle výzvy je uveden text "ModF HOUSEnerg" (např. ModF HOUSEnerg č. 1/2022, ...) nebo číslo výzvy nemá uvedeno žádné písmeno (tzn. v čísle výzvy jsou pouze číslice a znak "/", např. 8/2023; 1/2024, ...) pak bude přidělen DotacniTitulKod 5020000012

2.1.2/ pokud je splněna podmínka dle A) podkladu, tzn. není splněna podmínka 2.1.1 pak bude přidělen DotacniTitulKod 5020000011

2.2/ pokud je splněna podmínka dle B1) podkladu, tzn. je výzva projektu z programu (z programové struktury) "Nová zelená úsporám" (kód "NZÚ") pak bude přidělen DotacníTitulKod 5020000012

2.3/ v ostatních případech, tzn. pokud není splněna žádná z předchozích podmínek pak bude přidělen DotacníTitulKod 5020000010

2.11 AIS-6359 Ne/blokace automatického ukončování

Zadání předložené Objednatelům:

Automatické ukončení má proběhnout pouze tehdy, když částka platby se = částce RM. Pokud tomu tak není, pak k ukončení dojít nemá, ale reálně docházelo a tudíž jsme přistoupili k blokaci tím, že potřebné ÚP jsme nezadali do JASU a takové projekty ukončujeme ručně (jinak totiž docházelo k tomu, že do JASU docházelo k přenosu rozdílové částky RM vs. Platba k již účetně vyrovnanému projektu a způsobovalo nám to v účetnictví chyby).

Každopádně u projektů s proplacenou DOTACÍ (upozorňuji, toto se netýká záloh), kde RM je = platbě, není žádný důvod k přenosu, částka pro přenos je = 0 Kč, a 0 Kč nikdy nepřeneseme (viz AISI-666, kde je uvedeno: „V případě, že rozdílová částka by byla nulová, k přenosu nedojde.“) – tento princip byl do AIS zapracován již dávno a nic se na něm neměnilo; systém tedy v tomto případě vůbec nemá účetní případ dohlédávat, má se ukončit bez napojení na JASU.

a2) projekty s nenastaveným automatickým přechodem projektů do stavu „Ukončeno“ a bez automatických vrátek záloh (výzvy využívající wizard NZÚ/NPO)

- bude doplněna automatika pro přechod projektu do stavu „Ukončeno“ - **přechod je možné provést v okamžiku proplacení dotace ve výši smluvní částky dotace uvedené na RM** (smlouvě – pro bod b) níže), tj. v okamžiku, kdy PP přejde do stavu „uhrazený“ (respektive všechny PP u daného projektu např. v případě, kdy by u projektu byly dva PP, jeden **inv.** a druhý **neinv.**, nebo v případě **rozkladů**) **a celková suma částek na uhrazených PP bude rovna částce z RM;**

Jedná se tedy o částku z doložení realizace.

- **v těchto případech z logiky věci nebude docházet k žádnému přenosu ÚP pro ZVA do JASU, jelikož RM se do JASU nepřenáší a platba je vždy realizována ve výši RM, tudíž v JASU je k danému projektu účetně vše vyrovnáno;**
- důvody ukončení administrace v těchto případech mohou být „ukončeno financování“ (ve všech případech, kdy nedošlo k odstoupení) nebo „odstoupeno od RM“ (v případech, kdy došlo k odstoupení);
- pozn.: s tímto nastavením nemáme projekty se zálohami.

Návrh řešení:

Bude provedena úprava událostí, které provádí automatické ukončování projektů tak, aby v případě výskytu chyby jednoho z projektů nedošlo k přerušení akce, ale aby chybný projekt byl zařazen se seznam "odložených" projektů (zaznamenali bychom si kdy k tomu došlo a důvod, tzn. jaká chyba byla při ukončování zjištěna).

Pokud bude projekt na seznam "odložených" již déle než 24 hodin, tak nebude nadále považován za odložený, ale bude znovu zařazen mezi projekty, které mají být ukončené. Jestliže by se chyba vyskytla znovu, tak by se celé kolečko znovu opakovalo.

Tím by bylo zajištěno, že projekt, u kterého se skutečně vyskytuje nějaký problém by nebyl ukončen a systém by se jej pokoušel (opakovaně) každý den) ukončit a v důsledku výskytu chyby by byl (opakovaně) umístěn na seznam "odložených" projektů. Pokud by se projekt nepodařilo ukončit z jiných důvodů (např. problém v komunikaci s EKIS), tak by byl sice zařazen na seznam "odložených" projektů, ale po odstranění těch jiných důvodů (např. obnovení komunikace s EKIS) by byl projekt automaticky ukončen. Tento způsob by také zajišťoval, že případná chyba by neblokovala automatické ukončování dalších projektů.

Zařazení projektu na seznam "odložených" projektů bude mít vliv pouze na to, že projekt bude (dočasně) vyloučen z automatického ukončování, ale nebude mít vliv na ruční ukončování projektů.

Seznam "odložených" projektů bude v AIS zpřístupněn jako report (tedy formou sestavy přes Reporting Studio, nikoliv ve formě seznamu v AIS). To umožní zjistit projekty, u kterých nastal problém, popř. určit postup podle chyby zjištěné při ukončování projektu.

3. Cena

V kapitole č. 2 je popsán návrh řešení jednotlivých požadavků uvedených v kapitole č. 1, cena za realizaci je uvedena v Kč bez DPH.

Ceny jednotlivých požadavků jsou specifikovány v níže uvedené tabulce:

Požadavek		Cena
číslo	název	[Kč bez DPH]
AIS-5421	Tlačítko "Nové Rozhodnutí ministra" i ve stavu projektu "ukončený" - pro projekty financované na základě RM	123 200,-
AIS-5758	NPŽP NPO_Administrace test - Úprava algoritmu Energetické úspory 2024	72 000,-
AIS-6314	Nastavení účetních případů pro vratky záloh po ukončení projektu	52 800,-
AIS-6315	Záruky - nový zdroj financování a účetní případy	67 200,-
AIS-6316	Registrace cizinců v AIS	32 000,-
AIS-6317	NPO - Příprava dávek operací pro modul AIS MPO DU (červen 2025)	299 200,-
AIS-6323	Změna kontroly realizace	108 800,-
AIS-6330	Úprava algoritmu pro nové výzvy NZÚ 2025	62 400,-
AIS-6332	Změna aktivity ve stavu projektu "Probíhá realizace"	163 200,-
AIS-6354	Přidělení čísla nového dotačního titulu k žádostem v CEDR dávce	40 000,-
AIS-6359	Ne/blokace automatického ukončování	97 600,-
Celkem		1 118 400,-

4. Proces realizace a akceptace plnění

Požadavky uvedené v této nabídce budou realizovány v programovém vybavení AIS SFŽP ČR verze 4.15 (dále jen „Verze“). Verze a její akceptace proběhne dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této nabídky (dále jen „Harmonogram“).

Prvním krokem je vystavení objednávky Objednatelem v souladu s touto nabídkou, která bude přílohou objednávky. Následovat bude akceptace objednávky Dodavatelem. Neprodleně po akceptaci objednávky Dodavatelem zveřejní Objednatel objednávku v Registru smluv, čímž smlouva o dílo v rozsahu akceptované objednávky nabude účinnosti. Termín uveřejnění objednávky v Registru smluv, tzn. nabytí účinnosti objednávky je stanoven jako termín „T“ v Harmonogramu. Tento termín nesmí přesáhnout datum 17.7.2025. Dojde-li ke zveřejnění v Registru smluv po datu 17. 7. 2025, je Dodavatel oprávněn písemně odstoupit od takto uzavřené smlouvy.

Proces realizace činností obsažených v objednávce bude probíhat podle Harmonogramu. V průběhu realizace má Objednatel povinnosti poskytnout Dodavateli jím požadovanou součinnost.

Po dokončení realizace bod č. 2.1 Harmonogramu prokazatelně Dodavatel předá Verzi Objednateli k akceptaci nasazením Verze do testovacího prostředí a oznámením v komunikačním nástroji JIRA. Objednatel je povinen uvést veškeré zjištěné vady Verze do 10 dnů od předání k akceptaci prostřednictvím nástroje JIRA včetně uvedení kategorie vady dle kategorizace, uvedené v přílohovém vzorovém akceptačním protokolu. Neuvede-li Objednatel ve stanovené lhůtě žádné vady nebo Dodavateli sdělí, že Verzi akceptuje, považuje se Verze za akceptovanou. Dodavatel je povinen po uplynutí výše uvedené lhůty 10ti dní připravit akceptační protokol s uvedením vad uplatněných Objednatel a jejich kategorií, případně se závěrem, že žádné vady nebyly uplatněny.

Uvede-li Objednatel ve stanovené lhůtě zjištěné vady, zavazuje se Dodavatel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze vady) provést veškeré potřebné úpravy Verze k odstranění vad uvedených v akceptačním protokolu. Jednotlivé opravené vady předá Dodavatel Objednateli postupně opět k akceptaci prostřednictvím nástroje JIRA. Objednatel se zavazuje uvést prostřednictvím nástroje JIRA případné výhrady k opravě vady, a to nejpozději do 5ti dnů od předání opravy této vady. Nevznese-li Objednatel v této lhůtě žádné výhrady nebo Dodavateli sdělí, že opravu vady akceptuje, považuje se oprava vady za akceptovanou.

Po akceptaci opravy všech vad, uvedených v akceptačním protokolu v kategorii Zásadní, vystaví Dodavatel Konečný akceptační protokol, v němž uvede dosud nevyřešené vady ostatních kategorií a termín jejich opravy. Objednatel se zavazuje takto vystavený Konečný akceptační protokol podepsat do 5ti dnů od jeho doručení. V případě, že nedojde k podpisu Konečného akceptačního protokolu ze strany Objednatel v uvedené lhůtě, považuje se Konečný akceptační protokol za podepsaný okamžikem uplynutí této lhůty (fikce podpisu) a Verze je tím považována za akceptovanou.

Celková doba akceptace nesmí překročit termín uvedený v bodu 3.3. Harmonogramu. V rámci výše popsaného procesu akceptace jsou řešeny pouze vady, uvedené v akceptačním protokolu. Případné později uplatněné vady jsou předmětem standardního reklamačního procesu a nemají vliv na vystavení Konečného akceptačního protokolu, na fakturaci a na platbu ceny díla.

Je-li Verze považována za akceptovanou, je Dodavatel oprávněn fakturovat cenu díla a je povinen nasadit Verzi do produkčního prostředí. Přílohou faktury je Konečný akceptační protokol, podepsaný oběma stranami, nebo v případě fikce podpisu podepsaný Dodavatelem.

Objednatel není oprávněn jakkoliv využít Verzi (byť nasazenou do jiného než produkčního prostředí) předtím, než dojde k úplné akceptaci Verze podpisem Konečného akceptačního protokolu. Nedojde-li k zaplacení ceny díla nejpozději do 15ti dnů po splatnosti faktury, přestává být Objednatel oprávněn jakkoliv užít Verzi a je povinen provést její odinstalaci ze všech svých prostředí.

5. Závěr

Tato nabídka má platnost 15 kalendářních dnů od doručení Objednateli (s upozorněním na postup dle čl. 4 odst. druhý této nabídky). Realizaci výše uvedených požadavků jsme připraveni zahájit a realizovat v souladu s Harmonogramem.

Při realizaci požadavků uvedených v této nabídce Dodavatel garantuje jejich bezproblémový chod do hodnot parametrů definovaných v Zadávací dokumentaci (tj. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce

s názvem: „Agendový informační systém SFŽP ČR“ se systémovým číslem veřejné zakázky P17V00000925 a Č. j. SFŽP: SFZP 046532/2017 ze dne 1. 6. 2017).

Vypracoval: Martin Prem Dne: 11. 7. 2025

Příloha č. 1 Harmonogram

HARMONOGRAM REALIZACE verze 4.15.00 AIS SFŽP

ID	Činnost	Zahájení	Ukončení	Realizuje	Součinnost
1.	Nabytí účinnosti dodavatelem akceptované objednávky zveřejněním v Registru smluv	T* Nejpozději 17.7.		SFŽP	ASD
2.	Realizace				
2.1.	Úprava programového vybavení a interní funkční testování (včetně zpracování výsledků z testování)	T+1	12.9.	ASD	SFŽP
3.	Akceptace realizace (testovací prostředí SFŽP)				
3.1.	Zahájení akceptace (programového vybavení/analýz)	15.9.	---	SFŽP	ASD
3.2.	Akceptace, průběžné zapracovávání případných připomínek z akceptace (Může proběhnout více akceptačních kol. Každé kolo je ukončeno podpisem akceptačního protokolu.)	15.9.	Nejpozději do 15.10.	ASD	SFŽP
3.3.	Ukončení akceptace	---	Nejpozději do 15.10.	SFŽP	ASD
4.	Rutinní provoz (produkční prostředí)				
4.1.	Nasazení do produkčního prostředí a základní ověření dostupnosti a funkčnosti	Nejpozději do 16.10.	Nejpozději do 16.10.	ASD	SFŽP
4.2.	Zahájení rutinního provozu	Nejpozději do 16.10.	---	SFŽP	ASD

* Bodem T se rozumí den nabytí účinnosti dodavatelem akceptované objednávky zveřejněním v Registru smluv. Tento termín nesmí přesáhnout 17.7.2025. Pokud bude objednávka zveřejněna po tomto datu, platí postup dle bodu 4 odst. druhý této nabídky.

Termíny uvedené v harmonogramu jsou počítány v kalendářních dnech.

Příloha č. 2 Vzor akceptačního protokolu

Akceptační protokol

Číslo : ASD/SFŽP/AP/2025/0x

Dodavatel:

ASD Software, s.r.o.
Žerotínova 2981/55A
78701 Šumperk

Objednatel:

Státní fond životního prostředí České republiky
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 - Chodov

Předmět a rozsah akceptace:

Předmětem akceptace jsou požadavky zařazené do verze 4.15.00 AIS SFŽP ČR. Návrhy řešení požadavků byly zpracovány v Nabídce č. 2 2025, která byla ze strany Objednatele odsouhlasena. Programové vybavení verze 4.15.00 AIS SFŽP ČR, obsahující požadované úpravy, bylo předáno k akceptaci do testovacího prostředí Objednatele dne xx. x. 2025.

Protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, jeden je určen pro Dodavatele a jeden pro Objednatele.

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

☐ akceptováno	☐ akceptováno s výhradami*	☐ neakceptováno*
--------------------------------------	---	---

* popis výhrad a dohodnutý další postup jsou uvedeny v příloze tohoto protokolu.

Za Objednatele:**Za Dodavatele:**

Podpis:

Podpis:

Příloha protokolu č.: ASD/SFŽP/AP/2025/0x

Poř. č.	Popis vady	Kategorie*	Lhůta pro odstranění vady dodavatelem

*kategorie vad:

zásadní - vada brání užívání díla, nebo má podstatný dopad na užívání díla. V případě přítomnosti zásadních vad je výsledek akceptace: „neakceptováno“

nepodstatná - vada nebrání užívání díla nebo dílčího plnění díla a nic nebrání vytvoření dalších na něj navazujících plnění. V případě přítomnosti nepodstatných vad je výsledek akceptace: „akceptováno s výhradami“

formální - vada nemá vliv na obsah díla (např. jazykové chyby, estetické vady apod.). V případě přítomnosti pouze formálních vad je výsledek akceptace: „akceptováno“.
