



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru

(č. smlouvy objednatele: S-1777/DOP/2017, č. smlouvy zhotovitele: 17 256 200)

mezi

objednatel: **Středočeský kraj**
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: RNDr. Martinem Macháčkem, CSc., radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 4440009090/6000
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: RNDr. Martin Macháček, CSc., radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: společností „**SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ**“
se správcem Společnosti **SUDOP PRAHA a.s.** (též „Společník 1“),
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
zastoupená Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

a

PUDIS a.s. („Společník 2“)
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 10031
IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280
zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1458 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva, Ing. Janem Vlčkem, členem představenstva

a

DOPRAVOPROJEKT a.s. („Společník 3“)





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

se sídlem Kominárska 2,4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03

IČ: 31 322 000

zapsaná do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

zastoupená: Ing. Martinem Šutkou, členem představenstva, Ing. Igorem Jakubíkem,
místopředsedou představenstva

a

VPÚ DECO PRAHA a.s. („Společník 4“)

se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

IČ: 60193280, DIČ: CZ60193280

zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 2368 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupená: Ing. Liborem Hoďánkem, předsedou představenstva, Ing. Markétou Mikovou,
členem představenstva

a

METROPROJEKT PRAHA a.s. („Společník 5“)

se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná do obchodního rejstříku po sp.zn. B 1418 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování projektové dokumentace **II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic** v rozsahu zpracování:

- a) Technické studie dle požadavků uvedených v obchodních podmínkách Rámcové smlouvě
- b) Dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dokumentace EIA) v rozsahu Oznámení záměru a Dokumentace v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- c) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření, předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)
- d) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)





- e) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a dotačního programu IROP (viz čl. IV. Odst. 3 smlouvy)
- f) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy
- g) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

V rámci výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel u majetkoprávní přípravy staveb povinen využívat on-line aplikaci na sledování postupu majetkoprávní přípravy, která bude provázaná s katastrem nemovitostí v pravidelně aktualizovaném, resp. platném stavu a současně zajistí její provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně manuálu na její použití. Tato on-line aplikace umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům o stavu majetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace slouží ke komplexnímu aktuálnímu přehledu pozemků dotčených trvalým, resp. dočasným zábořem, resp. přehled služebností, které je nezbytné v rámci IČ zajistit pro možnost realizace stavby. Z on-line aplikace budou zřejmé jednotlivé procesní kroky majetkoprávní přípravy, tedy: vyhotovení (oddělovacích) geometrických plánů trvalých záborů, věcných břemen - služebností, zanesené geometrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam jejich majitelů dle KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (termíny), stav zpracování návrhu kupní smlouvy, termín jejího odeslání, informace o termínu (ne)doručení majiteli, informace o datu uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí majitele (majitelů) na návrh kupní smlouvy, po akceptaci kupní smlouvy termín podání návrhu na vklad kupní smlouvy do KN. Aplikace umožňuje evidenci komplikací a překážek na jednotlivých LV, zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV s možností filtrování dle důvodů nevypořádání jednotlivých LV.

Zhotovitel je povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s majetkoprávní přípravou a to v okamžiku jejich uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její použití předá objednatel nejpozději na prvním výrobním výboru týkající se výkonu IČ k SP.

- h) Technická pomoc objednateli v rozsahu:
 - Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
 - Technické pomoci objednateli při projednání stavby v rámci procesu EIA, tj. při veřejnoprávním projednání a při zpracování posudku EIA
 - Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací dokumentace stavby
 - Technické pomoci objednateli v rámci majetkoprávního projednání v rozsahu vedení aplikace pro majetkoprávní přípravu





Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu uvedeném v čl. I., odst. 1. Smlouvy

Technická studie

bez DPH: 342 000,-Kč

DPH: 71 820,-Kč

včetně DPH: 413 820,-Kč

- b. Dokumentace EIA

bez DPH: 390 000,-Kč

DPH: 81 900,-Kč

včetně DPH: 471 900,-Kč

- c. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 1 090 000,-Kč

DPH: 228 900,-Kč

včetně DPH: 1 318 900,-Kč

- d. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 1 645 000,-Kč

DPH: 345 450,-Kč





včetně DPH: 1 990 450,-Kč

e. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: 598 500,- Kč

DPH: 125 685,-Kč

včetně DPH: 724 185,-Kč

f. Výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 414 000,-Kč

DPH: 86 940,-Kč

včetně DPH: 500 940,-Kč

g. Výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH: 779 000,-Kč

DPH: 163 590,-Kč

včetně DPH: 942 590,-Kč

h. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 3 Smlouvy

bez DPH: 750,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 158,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 908,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Cena celkem 5 900 000,- Kč bez DPH

DPH 1 239 000,- Kč

Cena celkem 7 139 000,- Kč vč. DPH

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:





5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:

Technickoekonomická studie – do 5 měsíců od podpisu smlouvy

Dokumentace EIA – do 13 měsíců od schválení technické studie objednatelem

Koncept DUR – do tří měsíců od vydání stanoviska EIA

Čistopis DUR – do 2 týdnů od schválení konceptu DÚR objednatelem

Podání žádosti o vydání ÚR – do 5 měsíců od schválení konceptu DUR objednatelem

Koncept DSP – do tří měsíců od vydání pravomocného ÚR

Čistopis DSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem

Podání žádosti o vydání SP – do 3 měsíců od schválení konceptu DSP

PDPS – do 2 měsíce od vydání pravomocného SP

Technická pomoc – výkon AD – v průběhu stavby

Technická pomoc – ostatní – dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITI. Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného regionálního operačního programu, tak, aby byly ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na <http://www.dotaceEU.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy-v-IROP> byly v době před zahájením zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1 (vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.





Článek V. Další ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů (objednatel, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu této smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace;
 2. Podrobná specifikace ceny - Soupis služeb.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Praze dne 28-08-2017

PODEPSÁN

za objednatele: **Středočeský kraj**



RNDr. Martin Macháček, CSc.

radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

V Praze dne 31. 07. 2017

PODEPSÁN

za zhotovitele:



Ing. Tomáš Slaviček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn
podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě
Plné moci



Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn
podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS– PROJEKTY STČ“ na základě
Plné moci




Technická specifikace

Název akce: „II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic“ - PD

Místo realizace akce:

- řešení přeložky silnice II/106 od napojení na sjezdy z D3 u obce Hostěradice (D3 v km 13,500 – 14,000) – napojující se na silnici II/106 cca v km 10,800 a 8,900, mezi uzlovými body 1244B027 – 1244A002, okr. Kladno, středisko Zbraslav. **Délka přeložky silnice II/106 cca 2,100 km,**

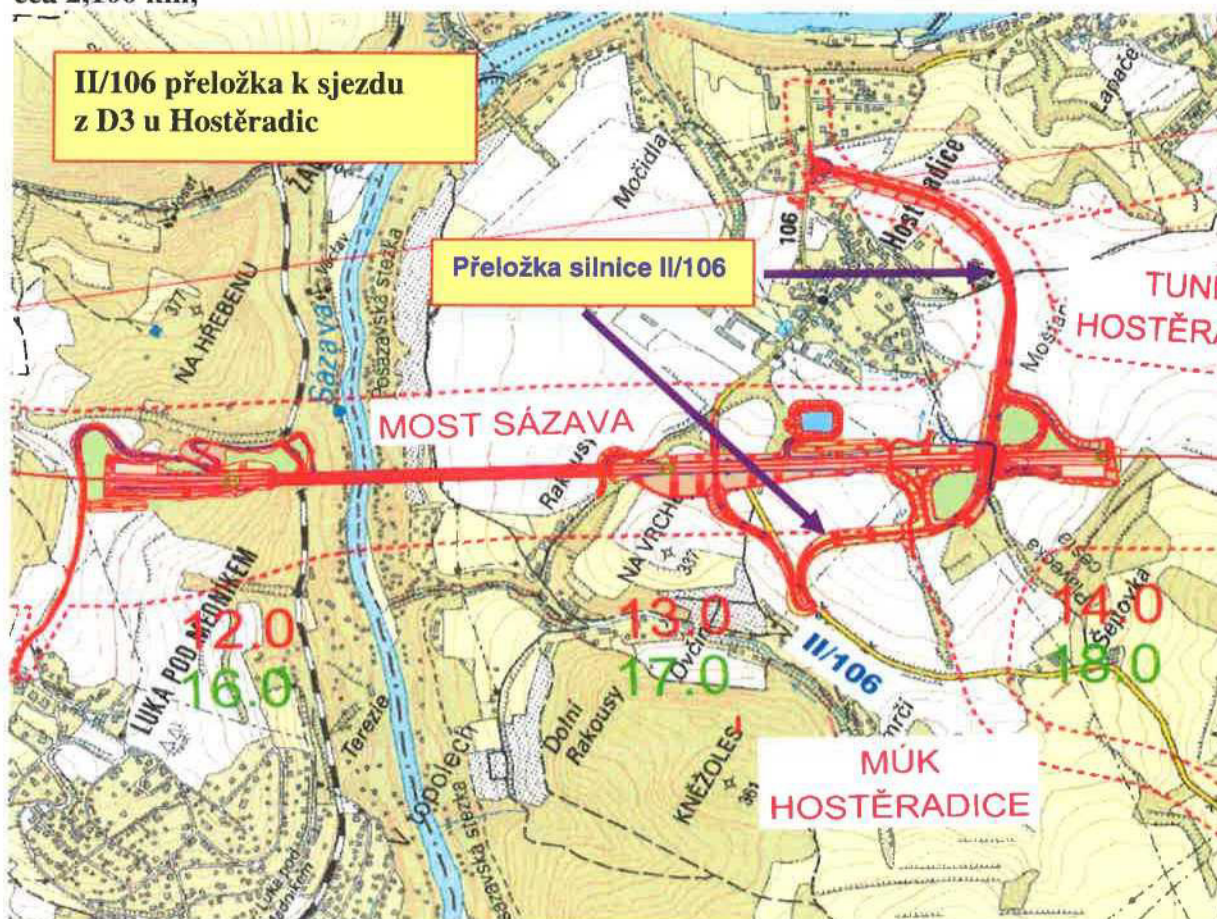

Základní popis akce:

Podrobný popis akce a podrobné vymezení předmětu plnění jednotlivých zakázek a veřejných zakázek včetně předpokládané doby jejich realizace (od-do):

Jedná se o zpracování PD na řešení přeložky silnice II/106 s napojením na D3, zpracování technickoekonomické studie, EIA a dokumentaci ve stupni DÚR (dokumentace k územnímu rozhodnutí), DSP (dokumentace pro stavební povolení), PDPS (dokumentace pro provedení stavby dle vyhlášky 230/2012 Sb., v platném znění) a souvisejícího výkonu IČ k ÚR a IČ ke SP včetně majetkoprávní přípravy stavby. Součástí prací je výkon autorského dozoru (AD) při dodržení platných norem (např. ČSN 736201, 736101) TKP a TP.

Technický popis stávajících objektů:

Jde se o novou silnici II. třídy řešící sjezd z dálnice D3 na kamenný Přívoz a Krňany. Nutné řešit napojení na D3 a přeložku II/106 vycházející ze zpracovávaných podkladů pro realizaci



stavby D3 sdružením PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD D3 0301-0303 Praha - Václavice.

PD na řešení přeložku silnice II/106 s napojením na D3, napojení na II/106 cca v km 10,800 a 8,900 v délce cca 2,1 km.

Záměr zadání PD je zpracování technickoekonomické studie na přeložku (na D3 je zpracovaná dokumentace DUR v 06/2016 sdružením PRAGOPROJEKT/AMBERG/MOTT MACDONALD D3 0301-0303 Praha - Václavice), zpracování EIA a dokumentace pro územní a stavební řízení včetně získání pravomocných rozhodnutí.

Projektová dokumentace bude obsahovat platná vyjádření dotčených orgánů státní správy. V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Bude řádně dokončena majetkoprávní příprava této akce, tj. budou smluvně oboustranně upraveny vztahy k pozemkům zabraným dočasně či trvale stavbou – uzavření Smluv o Smlouvách budoucích kupních či darovacích, Smlouvy nájemní či o výpůjčce. Budou oboustranně podepsány smlouvy o smlouvách budoucích na provedení přeložek inženýrských sítí a Smlouvy o smlouvách budoucích na věcná břemena.

Návrh řešení:

- Úsek – přeložka komunikace II/106 od km cca 8,900 za obcí Krňany s napojením na sjezdy D3 až na napojení na II/106 cca v km 10,800 za obcí Hostěradice, řešit jako novou komunikaci:
 - provést technickoekonomickou studii a EIA dle výsledků navrhnout odpovídající řešení pro trasování silnice a pro potřebnou hustotu a zatížení z provozu na této komunikaci

V rámci PD bude proveden geotechnický průzkum, dendrologický průzkum, hydrotechnické posouzení Q100 a geodetické zaměření.

Rekonstrukce bude prováděna za omezení dopravy, součástí plnění je DIO – dopravní opatření včetně jeho zajištění a provedení.

Kontakty:

Oblast Kladno

Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, [redacted]
Ing. Ladislav Bak, silniční technik, oblast Kladno, [redacted]

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

„II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic“ - PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Technická studie vč. Investičního záměru a ekonomického vyhodnocení*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD ZDS*)	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH****)
95 000 000	0,360%	0,470%	1,290%	0,520%	1,920%	0,820%	0,630%	750	
Předpokládaný celkový počet hod. technické pomoci	x	x	x	x	x	x	x	856	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky ***)	570 000	480 000	1 520 000	570 000	2 380 000	1 140 000	950 000	700 000	8 310 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	342 000	390 000	1 090 000	414 000	1 645 000	779 000	598 000	642 000	5 900 000
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	60,00%	81,25%	71,71%	72,63%	69,12%	68,33%	62,95%	91,71%	71,00%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit
*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část TES Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část EIA Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část IČ k SP Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok

V Praze dne 31. 07. 2017



Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci



Ing. Ivay Pomýkáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. - řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS – PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

SUDOP PRAHA
130 80 Praha 3, Ošánská 1a
IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349



„II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic“ - PD

Hutě oční uchazeč	
popis položky	Nabídková cena uchazeče v Kč
Technická studie (podklad pro EIA)	342 000,00
EIA	
Zpracování oznámení záměru EIA, včetně průzkumů	190 000,00
Zpracování dokumentace EIA	200 000,00
EIA celkem	390 000,00
Průzkumy a podklady - DUR	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa	130 000,00
Předběžný GTP dle TP 76	120 000,00
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační studie, Bilance zemin a omíčky, Dendrologický průzkum, apod.)	140 000,00
Průzkumy DUR celkem	390 000,00
DUR	
Průvodní zpráva	50 000,00
Výkresová část	610 000,00
Dokladová část	40 000,00
DUR celkem	700 000,00
DUR celkem včetně průzkumů	1 090 000,00
Průzkumy a podklady - DSP	
Zjištění průběhu a zakres IS, zaměření, záborový elaborát, digitální katastrální mapa - aktualizace	60 000,00
Podrobný GTP dle TP 76	270 000,00
Doplňující průzkumy a aktualizace průzkumů z DUR	60 000,00
Průzkumy DSP celkem	390 000,00
DSP	
Průvodní zpráva	50 000,00
Souhrnné technické řešení	230 000,00
Stavební část	820 000,00
DIO	40 000,00
ZÖV, havarijní a povod. plán a nakládání s odpady	90 000,00
BOZP	25 000,00
DSP celkem	1 265 000,00
DSP celkem včetně průzkumů	1 645 000,00
IC-zajištění vydání UR	
projednání dokumentace	130 000,00
majetkoprávní podklady	250 000,00
podání žádosti bez poplatků	34 000,00
IC celkem	414 000,00
IC-zajištění vydání SP	
projednání dokumentace	220 000,00
majetkoprávní podklady	525 000,00
podání žádosti bez poplatků	34 000,00
IC celkem	779 000,00
PDPS	
Technická zpráva	60 000,00
Výkresová část	300 000,00
ZTKP	90 000,00
Soupis prací a rozpočet	148 000,00
PDPS celkem	598 000,00
celkem bez DPH	5 258 000,00

V Praze dne 31. 07. 2017



Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci



Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

SUDOP PRAHA
130 80 Praha 3, Olšanská 1a
IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349



Technická pomoc objednatelů - Autorský dozor

„II/106 přeložka k sjezdu z D3 u Hostěradic“ - PD

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena Technická pomoc při projednání stavby v rámci procesu EIA	150	750	112 500
Cena Technická pomoc v rámci majetkoprávního projednání - vedení aplikace MPP	350	750	262 500
Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby	64	750	48 000
Cena AD celkem bez DPH	292	750	219 000
Celkem	856		642 000

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
činnost	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	35
Vyjadřování k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	42
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	40
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedenímu množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	35
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnů stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	110
celkem hodin	292
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	219 000

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 31. 07. 2017



Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci



Ing. Iván Pomykač, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. – řádně oprávněn podepsat nabídku jménem Společnosti „SUDOP GROUP RS- PROJEKTY STČ“ na základě Plné moci

SUDOP PRAHA
130 60 Praha 3, Olšanská 1a
IČ: 257 93 349, DIČ: CZ25793349



