

ke smlouvě č. 195110154 „T-72M4CZ – technické zhodnocení“

1. Česká republika – Ministerstvo obrany:

[illegible]


Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

а

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV vložka
č. 150

1

zastoupena: Ing. Vlastimilem Navrátillem, MBA, ředitelem
státního podniku a Jaromírem Kudelou, zástupcem
ředitele státního podniku
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
bankovní spojení běžný účet: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387421962/2700

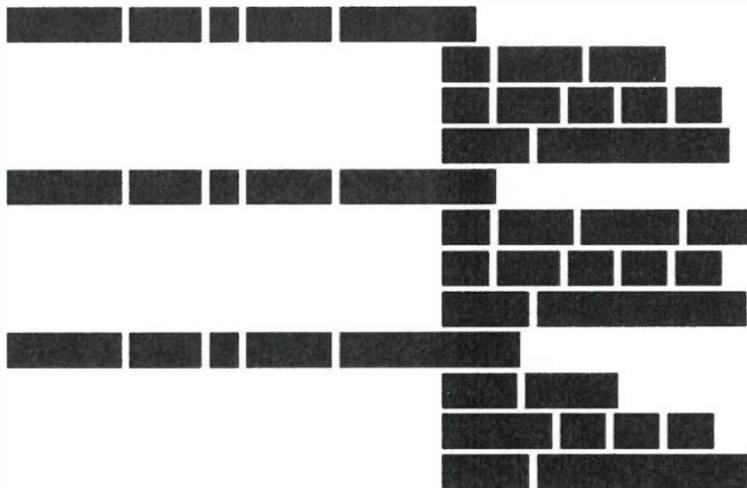

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Na základě jednání uskutečněných v průběhu roku 2025 mezi Smluvními stranami za účasti Armády České republiky (dále jen „AČR“) bylo konstatováno, že ve vztahu k realizaci projektu v rozsahu plnění Smlouvy č. 195110154, ze dne 14. září 2020, ve znění dodatku č. 1 - 4 (dále jen „Smlouva“), existují objektivní překážky bránící dokončení projektu v původně požadovaných ukazatelích, kdy mezi hlavní důvody patří nedostupnost některých klíčových komponent na globálním trhu a jejich náhrada zpětným inženýrstvím by byla krajně neefektivní z hlediska času i nákladů;
- (B) S ohledem na skutečnosti uvedené shora pod písm. (A) byl Zhotovitelem Objednateli předložen návrh na úpravu rozsahu plnění Smlouvy snížením počtu technicky zhodnocených tanků z 33 ks na 22 ks, přičemž zbylých 11 ks a k nim pořízených nových náhradních dílů (což představuje kategorie ND III., dále rozdělených na ND III.A a ND III.B) by bylo využito jako zdroj náhradních dílů (dále jen „ND“);
- (C) Na základě žádosti AČR o uzavření dodatku ke Smlouvě, ve které AČR konstatovala, že z důvodu ochrany podstatných bezpečnostních zájmů České republiky a s ohledem na aktuální stav projektu a nutnost hospodárneho využití veřejných prostředků, a taktéž s ohledem na operační potřebnost a účelnost náhradních dílů dále identifikovaných

v tomto dodatku č. 5 jako náhradní díly ND II. a ND III.A, doporučuje uzavřít tento dodatek č. 5 a požaduje po Objednateli zajištění jeho uzavření;

- (D) AČR zároveň ve své žádosti identifikovala část náhradních dílů označenou jako ND III.B (jak je definována dále v tomto dodatku č. 5), u níž AČR a Objednatel považují za vhodné zajistit provedení nezávislého auditu provedeného třetí osobou pověřenou Objednatelem, který by výlučně ve vztahu k části náhradních dílů označené jako ND III.B ověřil a zohlednil zejména:
- (i) výši účelně vynaložených nákladů Zhotovitele na část plnění Smlouvy označenou jako ND III.B,
 - (ii) cenu příslušné části předmětu plnění Smlouvy označenou jako ND III.B,
 - (iii) výši případných nároků Objednatele vůči Zhotoviteli ve vztahu k části předmětu plnění Smlouvy označené jako ND III.B,
 - (iv) výši případných nároků Zhotovitele vůči Objednateli ve vztahu k části předmětu plnění Smlouvy označené jako ND III.B, a
 - (v) výši potenciálních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli souvisejících s uplatněním smluvních sankcí spojených s potenciálním prodlením Zhotovitele s plněním závazků dle Smlouvy, a to s přihlédnutím k případným liberačním důvodům;
- (E) zároveň byla v průběhu plnění Smlouvy identifikována objektivní nemožnost splnění části Smlouvy, kdy podklady prokazující tuto objektivní nemožnost splnění Smlouvy jsou součástí tohoto dodatku č. 5 jako nová Příloha č. 13 Smlouvy;
- (F) Smluvní strany (i) mají zájem shora uvedené skutečnosti nastalé v průběhu plnění Smlouvy a nepředvídatelné při jejím uzavření reflektovat v příslušných ustanovení Smlouvy a zároveň (ii) mají s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem zájem stanovit termín splnění Smlouvy a jejího komplexního vypořádání;

uzavírají Smluvní strany s v souladu se zněním čl. XVII. odst. 3 Smlouvy tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 5**“).

Článek I. **Účel dodatku**

1. Účelem tohoto Dodatku č. 5 je prostřednictvím jeho uzavření upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran, a to (i) v souvislosti s požadavky Objednatele založenými potřebou AČR popsanou v preambuli tohoto Dodatku č. 5, a (ii) s ohledem na objektivní nemožnost splnění části Smlouvy, kdy důvody prokazující objektivní nemožnost splnění části Smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 13 Smlouvy.
2. Termín plnění předmětu Smlouvy (resp. jeho dílčích plnění) je nově definován v novém znění příslušných článků Smlouvy a jejích příloh uvedeném v Článku II. tohoto Dodatku č. 5. Pro úplnost Smluvní strany uvádějí, že ve vztahu k části plnění Smlouvy označené dále jako ND III.B a k části plnění Smlouvy popsané v Článku I. odst. 10 tohoto Dodatku

č. 5 nebude Zhotovitel v prodlení do doby, než Smluvní strany uzavřou separátní dohodu o narovnání, která zejména vypořádá vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ve vztahu k tématům uvedeným v Článku I. odst. 10 tohoto Dodatku č. 5 a v případě postupu dle Článku I. odst. 3.d.ii, resp. Článku I. odst. 7.a tohoto Dodatku č. 5 stanoví komplexní finanční vyrovnání ve vztahu k balíčku náhradních dílů ND III.B. Zhotovitel je nadále oprávněn předat a fakturovat Objednateli část plnění Smlouvy jakožto dílčí plnění, a to v termínech stanovených v příslušných ustanoveních Smlouvy a jejich příloh po implementaci změn ve smyslu Článku II. tohoto Dodatku č. 5 a ve smyslu Článku I. odst. 3 tohoto Dodatku č. 5.

3. Smluvní strany se v souvislosti s požadavky Objednatele založenými potřebou AČR popsanou v preambuli tohoto Dodatku č. 5 dohodly na úpravě předmětu plnění Smlouvy, jak je dále uveden v novém znění příslušných článků Smlouvy a jejich příloh uvedených v Článku II. tohoto Dodatku č. 5. Úpravy příslušných článků Smlouvy a jejich příloh uvedených v Článku II. tohoto Dodatku č. 5 ve vztahu k předmětu plnění Smlouvy jsou založeny na následující koncepci:
 - a. snížení počtu technicky zhodnocených tanků z 33 ks na 22 ks (17 ks tanků bojových, 2 ks tanků velitelských, 3 ks tanků vyprošťovacích; dále jen „**Technicky zhodnocené tanky**“), přičemž zbylých 11 ks tanků a k nim nově pořízené ND, bude využito jako zdroj náhradních dílů (dále jen „**Technicky nezhdnocené tanky**“), jejichž sady jsou uvedeny níže. Pro úplnost Smluvní strany potvrzují, že 22 ks (17 ks tanků bojových, 2 ks tanků velitelských, 3 ks tanků vyprošťovacích) tanků bylo Objednatelem v souladu se Smlouvou převzato jako dílčí plnění ve smyslu Článku V. odst. 4. Smlouvy;
 - b. dodání sady náhradních dílů označovaného jako „*ND (p. č. 1-14)*“ pro Technicky zhodnocené tanky. Pro úplnost Smluvní strany potvrzují, že sada náhradních dílů označovaná jako „*ND (p. č. 1-14)*“ pro Technicky zhodnocené tanky byla Objednatelem v souladu se Smlouvou převzata jako dílčí plnění ve smyslu Článku V. odst. 4. Smlouvy;
 - c. dodání sady náhradních dílů označované jako „*ND II – KIS (nepoužitý materiál)*“ pro Technicky zhodnocené tanky (dále také „**ND II.**“). Pro úplnost Smluvní strany uvádí, že sada náhradních dílů označovaná jako ND II. dosud nebyla Objednatelem převzata, nýbrž bude Zhotovitelem dodána a Objednatelem převzata v souladu se Smlouvou jako dílčí plnění ve smyslu Článku V. odst. 4. Smlouvy, a to za podmínek definovaných v novém znění příslušných článků Smlouvy a jejich příloh uvedených v Článku II. tohoto Dodatku č. 5, tj. nejpozději do 28. 2. 2026;
 - d. dodání sad náhradních dílů označovaného jako „*ND III (nepoužitý materiál)*“ pro Technicky zhodnocené tanky. Pro úplnost Smluvní strany uvádí, že sady náhradních dílů označované jako „*ND III (nepoužitý materiál)*“ pro Technicky zhodnocené tanky dosud nebyly Objednatelem převzaty. Na základě žádosti AČR, na něž je odkazováno v preambuli tohoto Dodatku č. 5 pod písm. (C) a (D) pak

Smluvní strany přistupují k rozdělení sad náhradních dílů označovaných jako „*ND III (nepoužitý materiál)*“ pro Technicky zhodnocené tanky následujícím způsobem:

- i. sady náhradních dílů označované jako „*ND III.A (kategorie ND – M4, KIS, BVIS)*“ pro Technicky zhodnocené tanky, budou Zhotovitelem dodány a Objednatelům převzaty v souladu se Smlouvou jako dílčí plnění ve smyslu Článku V. odst. 4. Smlouvy, a to za podmínek definovaných v novém znění příslušných článků Smlouvy a jejích příloh uvedených v Článku II. tohoto Dodatku č. 5, tj. nejpozději do 28. 2. 2026;
- ii. sady náhradních dílů označované jako „*ND III.B (nepoužitý materiál)*“ pro Technicky zhodnocené tanky (dále také „**ND III.B**“), budou posouzeny nezávislým auditorem ve smyslu Článku I. odst. 4 tohoto Dodatku č. 5, přičemž v případě, že:
 1. nezávislý audit potvrdí, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III. B má být stejné, jako to stanovené Smlouvou ve znění Dodatku č. 5 tak není mezi Smluvními stranami třeba dalších kroků a ND III.B budou převzaty do 30 kalendářních dnů od poskytnutí výsledků auditu oběma Smluvním stranám prostřednictvím datové schránky uvedené v rámci identifikace Smluvních stran v úvodu tohoto Dodatku č. 5 (případně aktualizovaných v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy). Lhůta dodání balíčku ND III.B je tímto Dodatkem č. 5 prostřednictvím nového znění příslušných článků Smlouvy a jejích příloh uvedeného v Článku II. tohoto Dodatku č. 5 definována jako nejpozději do 30. 6. 2026, může být však přiměřeně prodloužena v případě, že výsledek auditu bude poskytnut oběma Smluvním stranám později než 31. 5. 2026;
 2. nezávislý audit dojde k závěru, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III. B má být nižší, než to stanovené Smlouvou ve znění Dodatku č. 5, Smluvní strany ve vztahu k části předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B uzavřou dohodu o ukončení takové příslušné části Smlouvy a zároveň dohodu o narovnání, která na základě výsledků nezávislého auditu stanoví případnou výši finančního vypořádání příslušné části předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B a také stanoví, jak bude fyzicky naloženo s materiální součástí předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B (tj. zda jej či jeho část Objednatel převezme, či si jej či jeho část ponechá Zhotovitel, a to bez nároku na finanční vypořádání ze strany Objednatel);
 3. nezávislý audit dojde k závěru, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III. B má být vyšší, než to stanovené Smlouvou ve znění Dodatku č. 5 v položce 8.1 tabulky „*Seznam a cena náhradních dílů pro technicky nezhodnocené tanky – rozpad na 1 ks tanku (ND III.B)*“ přílohy č. 5

Smlouvy (ve znění tohoto Dodatku č. 5), a tudíž potvrdí, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III.B předvídané v položce 8.2 tabulky „*Seznam a cena náhradních dílů pro technicky nezhodnocené tanky – rozpad na 1 ks tanku (ND III.B)*“ přílohy č. 5 Smlouvy (ve znění tohoto Dodatku č. 5) se zcela nebo z části nezávislým auditem potvrdilo, Smluvní strany ve vztahu k části předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B uzavřou dohodu o narovnání, která na základě výsledků nezávislého auditu stanoví případnou výši finančního vypořádání příslušejícího k části předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B a také stanoví, jak bude fyzicky naloženo s materiální součástí předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B (tj. zda jej či jeho část Objednatel převezme, či si jej či jeho část ponechá Zhotovitel, a to bez nároku na finanční vypořádání ze strany Objednatele). Lhůta dodání balíčku ND III.B je tímto Dodatkem č. 5 prostřednictvím nového znění příslušných článků Smlouvy a jejích příloh uvedeného v Článku II. tohoto Dodatku č. 5 definována jako nejpozději do 30. 6. 2026, může být však přiměřeně prodloužena v případě, že nebude do uvedeného data uzavřena dohoda o narovnání.

4. Objednatel se do 31. 5. 2026 zavazuje zajistit provedení auditu provedeného nezávislou třetí osobou, a to výlučně ve vztahu k sadám náhradních dílů označovaným jako ND III.B, přičemž takový nezávislý audit ověří a zohlední zejména:
 - a. výši účelně vynaložených nákladů Zhotovitele na část plnění Smlouvy označenou jako ND III.B,
 - b. cenu příslušné části předmětu plnění Smlouvy označenou jako ND III.B,
 - c. výši případných nároků Objednatele vůči Zhotoviteli ve vztahu k části předmětu plnění Smlouvy označené jako ND III.B,
 - d. výši případných nároků Zhotovitele vůči Objednateli ve vztahu k části předmětu plnění Smlouvy označené jako ND III.B., a
 - e. výši potenciálních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli souvisejících s uplatněním smluvních sankcí spojených s potenciálním prodlením Zhotovitele s plněním závazků dle Smlouvy, a to s přihlédnutím k případným liberačním důvodům.
5. Smluvní strany se zavazují se dohodnout na specifikaci zadání pro nezávislého auditora ve smyslu předchozího odstavce nejpozději do 15. 2. 2026. V případě, že Smluvní strany nebudou moci dosáhnout dohody u některého z aspektu specifikace, rozhodne o tomto aspektu jednostranně Objednatel.
6. Smluvní strany se zavazují poskytovat si veškerou potřebnou součinnost při provedení auditu dle předchozích odstavců, zejména předat požadované doklady, podklady a další nezbytné informace. Smluvní strany pro úplnost v souvislosti s dostupnými podklady uvádí, že v souvislosti s plněním Smlouvy a ověřením ceny dílčích plnění Zhotovitele byl

jako základní podklad vyhotoven znalecký posudek znalce Ing. Tomáše Dvořáčka, č.: 061076/2025 ze dne 21.8.2025.

7. Smluvní strany pro úplnost a vyloučení pochybností uvádí (jak bylo uvedeno shora v Článku I. odst. 3.d.ii), že v případě, kdy:
- a. nezávislý audit potvrdí, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III. B má být stejné jako to stanovené Smlouvou ve znění Dodatku č. 5, tak není mezi Smluvními stranami třeba dalších kroků a ND III.B budou převzaty do 30 kalendářních dnů od poskytnutí výsledků auditu oběma Smluvním stranám prostřednictvím datové schránky uvedené v rámci identifikace Smluvních stran v úvodu tohoto Dodatku č. 5 (případně aktualizovaných v souladu s příslušným ustanovením Smlouvy). Lhůta dodání balíčku ND III.B je tímto Dodatkem č. 5 prostřednictvím nového znění příslušných článků Smlouvy a jejích příloh uvedeného v Článku II. tohoto Dodatku č. 5 definována jako nejpozději do 30. 6. 2026, může být však přiměřeně prodloužena v případě, že výsledek auditu bude poskytnut oběma Smluvním stranám později než 31. 5. 2026;
 - b. nezávislý audit dojde k závěru, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III. B má být nižší, než to stanovené Smlouvou ve znění Dodatku č. 5, Smluvní strany ve vztahu k části předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B uzavřou dohodu o ukončení takové příslušné části Smlouvy a zároveň dohodu o narovnání, která na základě výsledků nezávislého auditu stanoví výši případného finančního vypořádání příslušejícího k části předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B a také stanoví, jak bude fyzicky naloženo s materiální součástí předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B (tj. zda jej či jeho část Objednatel převezme, či si jej či jeho část ponechá Zhotovitel, a to bez nároku na finanční vypořádání ze strany Objednatele);
 - c. nezávislý audit dojde k závěru, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III. B má být vyšší, než to stanovené Smlouvou ve znění Dodatku č. 5 v položce 8.1 tabulky „*Seznam a cena náhradních dílů pro technicky nezhodnocené tanky – rozpad na 1 ks tanku (ND III.B)*“ přílohy č. 5 Smlouvy (ve znění tohoto Dodatku č. 5), a tudíž potvrdí, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III.B předvídané v položce 8.2 tabulky „*Seznam a cena náhradních dílů pro technicky nezhodnocené tanky – rozpad na 1 ks tanku (ND III.B)*“ přílohy č. 5 Smlouvy (ve znění tohoto Dodatku č. 5) se zcela nebo z části nezávislým auditem potvrdilo, Smluvní strany ve vztahu k části předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B uzavřou dohodu o narovnání, která na základě výsledků nezávislého auditu stanoví případnou výši finančního vypořádání příslušejícího k části předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B a také stanoví, jak bude fyzicky naloženo s materiální součástí předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B (tj. zda jej či jeho část Objednatel převezme, či si jej či jeho část ponechá Zhotovitel, a to bez nároku na finanční vypořádání ze strany Objednatele). Lhůta dodání balíčku ND III.B je tímto Dodatkem č. 5 prostřednictvím nového znění příslušných článků Smlouvy a jejích příloh uvedeného v Článku II. tohoto Dodatku č. 5 definována jako

nejpozději do 30. 6. 2026, může být však přiměřeně prodloužena v případě, že nebude do uvedeného data uzavřena dohoda o narovnání.

8. Smluvní strany se dále na základě požadavku AČR dohodly, že místem dodání částí předmětu plnění označených jako ND II., ND III.A a ND III.B (v případě jejich dodání) se stanoví na: provozovnu Zhotovitele, VOP CZ, s.p. Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Tato změna je reflektována v novém znění příslušných článků Smlouvy a jejich příloh uvedeném v Článku II. tohoto Dodatku č. 5.
9. Smluvní strany v souvislosti se skutečnostmi uvedenými v preambuli a Článku I. odst. 1 a odst. 2 tohoto Dodatku č. 5 prohlašují a potvrzují, že Zhotovitel zajistil provedení podnikových a kontrolních zkoušek Technicky zhodnocených tanků.
10. Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že s ohledem na časové hledisko uzavírání tohoto Dodatku č. 5 definovaly témata, jejichž řešení a/nebo vypořádání není v tomto Dodatku č. 5 obsaženo, zejména: náklady účtované Zhotovitelem na provedení zkoušek ve smyslu článku IX Smlouvy, které však provedeny nebyly, náklady účtované Zhotovitelem na provedení SOJ, které však provedeno nebylo, katalogizace, vrácení 33 ks tanků vč. nastavení procesu předání a převzetí, revize přílohy č. 8 Smlouvy, vrácení samostatných zaměřovačů (5 sad), které v sobě obsahují ND III.B, zohlednění rozdílu cen Dodatku č. 2 Smlouvy a cen ověřených znaleckým posudkem znalce Ing. Tomáše Dvořáčka, č.: 061076/2025 ze dne 21.8.2025, a zohlednění výsledků nezávislého auditu dle Článku I. odst. 4 tohoto Dodatku č. 5. Smluvní strany se v návaznost na uzavření tohoto Dodatku č. 5 zavazují v dobré víře jednat o tématech uvedených v předchozí větě tohoto odstavce a/nebo o jiných potenciálně nevypořádaných vzájemných právech a povinnostech vyplývajících ze Smlouvy. V případě identifikace takové potřeby se Smluvní strany ohledně takových potenciálně nevypořádaných vzájemných právech a povinnostech zavazují uzavřít dohodu o narovnání, jejímž obsahem bude vypořádání takových vzájemných práv a povinností dle tohoto odstavce, a v případě postupu dle Článku I. odst. 3.d.ii.2, resp. Článku I. odst. 7.a, nebo dle Článku I. odst. 3.d.ii.3, resp. Článku I. odst. 7.c3.d.ii.3 tohoto Dodatku č. 5, taková dohoda o narovnání stanoví taktéž komplexní finanční vyrovnání ve vztahu k sadám náhradních dílů ND III.B.
11. Smluvní strany ve vztahu k sadám náhradních dílů ND III.B uvádí, že cena položky 8.1 tabulky „*Seznam a cena náhradních dílů pro technicky nezhodnocené tanky – rozpad na 1 ks tanku (ND III.B)*“ přílohy č. 5 Smlouvy (ve znění tohoto Dodatku č. 5) týkající se „*Nákladů TZ spojených s modernizací 5 souprav zaměřovačů (zaměřovače z MOB. souprav – doplněk sestavy ND I)*“, a tudíž i celková cena ND III dle Článku IV odst. 1. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 5 byla pro účely tohoto Dodatku č. 5 (i) s ohledem na realizaci nezávislého auditu (dle Článku I. odst. 4 tohoto Dodatku č. 5) a (ii) s ohledem na maximální cenu předmětu plnění Smlouvy určenou jejím dodatkem č. 2, určena v nižší výši, než je tvrzena a dokládána ze strany Zhotovitele. Cena položky 8.1 tabulky „*Seznam a cena náhradních dílů pro technicky nezhodnocené tanky – rozpad na 1 ks tanku (ND III.B)*“ přílohy č. 5 Smlouvy (ve znění tohoto Dodatku č. 5) týkající se „*Nákladů TZ spojených s modernizací 5 souprav zaměřovačů (zaměřovače z MOB. souprav – doplněk sestavy ND I)*“ bude ověřena nezávislým auditem a v případě, že auditor dojde ke zjištění,

že dojde k závěru, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III. B má být vyšší, než to stanovené Smlouvou ve znění Dodatku č. 5 v položce 8.1 tabulky „*Seznam a cena náhradních dílů pro technicky nezhodnocené tanky – rozpad na 1 ks tanku (ND III.B)*“ přílohy č. 5 Smlouvy (ve znění tohoto Dodatku č. 5), a tudíž potvrdí, že finanční vypořádání ve vztahu k ND III.B předvídané v položce 8.2 tabulky „*Seznam a cena náhradních dílů pro technicky nezhodnocené tanky – rozpad na 1 ks tanku (ND III.B)*“ přílohy č. 5 Smlouvy (ve znění tohoto Dodatku č. 5) se zcela nebo z části nezávislým auditem potvrdilo, Smluvní strany ve vztahu k části předmětu plnění Smlouvy označovaného jako ND III.B uzavřou dohodu o narovnání ve smyslu Článku I. odst. 3.d.ii.3, resp. Článku I. odst. 7.c3.d.ii.3 tohoto Dodatku č. 5.

12. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli poskytnutou zálohu ve výši 38 038 800,45 Kč bez DPH, tj. 46 026 948,54 Kč s DPH, a to do 10 kalendářních dnů po úplném zaplacení všech pohledávek vzniklých za Objednatelem po dodání ND II. a ND III.A na účet Objednatele uvedený v této Smlouvě. Objednatel vystaví a odešle Zhotoviteli daňový doklad k přijaté platbě ve lhůtě stanovené zvláštním právním předpisem.

Článek II. Změny smlouvy

1. Článek III odst. 1 písm. a) a b) Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

- a) *provést technické zhodnocení 17 ks tanku bojového T-72M4CZ, 2 ks tanku velitelského T-72M4CZ VV a 3 ks tanku vyprošťovacího VT-72M4CZ (dále jen „Tanky“) v rozsahu, který je podrobně specifikován v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Technické zhodnocení“);*
- b) *dodat sady náhradních dílů dle Přílohy č. 5 této Smlouvy (dále jen „ND, ND II a ND III“);*

2. Článek III odst. 1 písm. d) Smlouvy se ruší.

3. Článek IV odst. 1. Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

1. *Cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů:*

Cena za 1 ks zhodnoceného tanku bojového T-72M4CZ:

bez DPH činí: 27 577 316,00 Kč

výše DPH (sazba 21 %) činí: 5 791 236,36 Kč

Celkem cena za 1 ks zhodnocený tank bojový T-72M4CZ, včetně DPH činí:

33 368 552,36 Kč

Cena za 17 ks zhodnocených tanků bojových T-72M4CZ, včetně DPH činí:

567 265 390,12 Kč

Cena za 1 ks zhodnoceného tanku velitelského T-72M4CZ W:

bez DPH činí: 28 634 914,00 Kč

výše DPH (sazba 21 %) činí: 6 013 331,94 Kč

*Celkem cena za 1 ks zhodnocený tank velitelský T-72M4CZ W, včetně DPH činí:
34 648 245,94 Kč*

*Cena za 2 ks zhodnocených tanků velitelských T-72M4CZ W, včetně DPH činí:
69 296 491,88 Kč*

Cena za 1 ks zhodnocený tank vyprošťovací VT-72M4CZ:

bez DPH činí: 8 999 704,00 Kč

výše DPH (sazba 21 %) činí: 1 889 937,84 Kč

*Celkem cena za 1 ks zhodnocený tank vyprošťovací VT-72M4CZ, včetně DPH činí:
10 889 641,84 Kč*

*Cena za 3 ks zhodnocených tanků vyprošťovacích VT-72M4CZ, včetně DPH činí:
32 668 925,52 Kč*

Celková cena za všechny zhodnocené tanky:

bez DPH činí: 553 083 312,00 Kč

výše DPH (sazba 21 %) činí: 116 147 495,52 Kč

Celková cena za všechny zhodnocené tanky včetně DPH činí:

669 230 807,52 Kč, (slovy: "šest set šedesát devět milionů dvě stě třicet tisíc osm set sedm korun českých padesát dva haléřů").

Cena za dodávku ND (p. č. 1-14) pro zhodnocené tanky

bez DPH činí: 51 973 090,00 Kč

výše DPH (sazba 21 %) činí: 10 914 348,90 Kč

Cena za dodávku ND II pro zhodnocené tanky

bez DPH činí: 26 004 534,84 Kč

výše DPH (sazba 21 %) činí: 5 460 952,32 Kč

Cena za dodávku ND III pro zhodnocené tanky

(tank - 10 ks verze bojové a 1 ks verze velitelské)

bez DPH činí: 278 898 539,16 Kč

výše DPH (sazba 21 %) činí: 58 568 693,22 Kč

***Celkem cena za dodávku ND kategorie p. č. 1-14, ND II a ND III včetně DPH
činí:***

431 820 158,44 Kč, (slovy: čtyři sta třicet jedna milionů osm set dvacet tisíc jedno sto padesát osm korun českých čtyřicet čtyři haléřů)

Cena za školení provedené v roce 2025:

bez DPH činí: 565 000,00 Kč

výše DPH (sazba 21 %) činí: 118 650,00 Kč

Celková cena za provedená školení včetně DPH činí: 683 650,00 Kč,

(slovy: šest set osmdesát tři tisíc šest set padesát korun českých).

Celková cena za všechny zhodnocené tanky, dodávku ND (p. č. 1-14), ND II a ND III a provedená školení:

bez DPH činí: 910 524 476,00 Kč

výše DPH (sazba 21 %) činí: 191 210 139,96 Kč

Celková cena za všechny zhodnocené tanky, kompletní dodávku ND a provedené školení včetně DPH činí: 1 101 734 615,96 Kč (slovy: „jedna miliarda jedno sto jedna milionů sedm set třicet čtyři tisíc šest set patnáct korun českých devadesát šest haléřů“).

4. Článek V odst. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

1. *Místem dodání Technicky zhodnocených tanků, ND, ND II, ND III a provedení školení je sídlo Zhotovitele a dále provozovna Zhotovitele Bludovice u Nového Jičína č.p. 141.*

5. Článek V odst. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

2. *Zhotovitel je povinen dodat Technicky zhodnocené tanky dle této Smlouvy:*
 - a) *do 15. prosince 2025 - 2 ks tank velitelský T-72M4CZ VV a 17 ks tank bojový T-72M4CZ a 3 ks tank vyprošťovací VT-72M4CZ a ND (p. č. 1-14),*
 - b) *do 28. února 2026 ND II a ND III.A dle Přílohy č.5 této Smlouvy,*
 - c) *do 30. června 2026 ND III.B dle Přílohy č.5 této Smlouvy.*

6. Článek V odst. 3 Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

3. *Zhotovitel je povinen začít plnit své závazky vyplývající z čl. III odst. 1 této Smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy a splnit je do 30. června 2026.*

7. V článku IX Smlouvy se nově vkládá odst. 24. ve znění:

24. *Smluvní strany se dohodly, že nad rámec již k 15.12.2025 vykonaných zkoušek nebudou další zkoušky prováděny.*

8. Článek XIII odst. 2 a odst. 10 Smlouvy se mění tak, že nově zní takto:

2. *Záruční podmínky a odpovědnost za vady v záruce se vztahují na všechny dodané Technicky zhodnocené tanky a ND s výjimkou baterií tabletů MilDef DE13 a notebooků*

MilDef RS13 (kdy záruka na tyto komponenty se ze strany Zhotovitele eliminuje z důvodu průběhu času od pořízení zboží a termínu vlastní realizace služby), ND II a ND III.

10. *Pro vyloučení případných pochybností se smluvní strany dohodly, že záruka se nevztahuje na:*

- *vady způsobené nedodržením pokynů a instrukcí uvedených v dokumentaci specifikované v Příloze č. 1 bod 4 DOKUMENTACE této Smlouvy, zejména pokud se týkají údržby, obsluhy, ošetřování, konzervace, skladování, provozu atd.;*
- *vady způsobené úpravami nebo opravami prováděnými v rozporu s provozní dokumentací;*
- *vady způsobené součástmi či systémy tanku, které nebyly předmětem Technického zhodnocení;*
- *baterie tabletů MilDef DE13 a notebooků MilDef RS13, na které se z důvodu doby jejich pořízení a celkového posunu realizace Technického zhodnocení, záruka nevztahuje.*

9. Přílohy Smlouvy se mění či ruší dle tohoto článku tohoto Dodatku č. 5, přičemž číslování příloh zůstává zachováno dle původního pořadí Smlouvy, případně následuje původní pořadí příloh Smlouvy (tzn. v případě, že je konkrétní příloha Smlouvy zrušena, její místo zůstává záměrně vynecháno, v případě, že je doplněna nová příloha, nezaplňuje místo zrušené přílohy, nýbrž následuje poslední nejvýše číslovanou přílohu):

- **Příloha č. 1 Smlouvy** se mění tak, že je nově nahrazena novou Přílohou č. 1, která je přílohou tohoto Dodatku č. 5 a tvoří jeho nedílnou součást.
- **Příloha č. 3 Smlouvy** se ruší bez náhrady.
- **Příloha č. 5 Smlouvy** se mění tak, že je nově nahrazena novou Přílohou č. 5, která je přílohou tohoto Dodatku č. 5 a tvoří jeho nedílnou součást.
- **Příloha č. 8 Smlouvy** se mění tak, že je nově nahrazena novou Přílohou č. 8, která je přílohou tohoto Dodatku č. 5 a tvoří jeho nedílnou součást.
- **Příloha č. 13 Smlouvy** - nově se vkládá Příloha č. 13 Smlouvy – Zdůvodnění objektivní nemožnosti splnění částí Smlouvy.

10. **V článku XVI Smlouvy se ruší text první věty a nahrazuje se následujícím zněním:**
Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah nebo jeho část zaniká:

11. **V článku XVI Smlouvy se doplňuje písm. d) následujícího znění:**

jednostranným odstoupením od části plnění ND III.B Smlouvy Objednatel v případě, že nedojde z důvodů na straně Zhotovitele k uzavření dohody o narovnání jejímž předmětem je tato část plnění. Ostatní části plnění a ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven v elektronické podobě o 13 stranách a 4 přílohách o 83 stranách a stává se nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejích příloh, neupravená tímto Dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účinnosti:
 - změny Článku III. Odst. 1 písm. a) Smlouvy (dle Článku II. odst. 1. tohoto Dodatku č. 5);
 - změny Článku V. odst. 2. písm. a) Smlouvy (dle Článku II. odst. 5 tohoto Dodatku č. 5),

jejichž účinnost je podmíněna změnou řídicí dokumentace ke Smlouvě vedené na Ministerstvu financí ve vztahu k snížení počtu Technicky zhodnocených tanků z 33 ks na 22 ks. Objednatel se zavazuje zajistit (přičemž pojmem zajistit se myslí stav, kdy skutečně nastane, co bylo ujednáno) příslušnou změnu řídicí dokumentace ke Smlouvě dle předchozí věty nejpozději do 31.5.2026. V případě, že nebude zajištěna změna řídicí dokumentace ke Smlouvě nejpozději do 31.5.2026, bude snížení počtu Technicky zhodnocených tanků 33 ks na 22 ks předmětem dohody o narovnání společně s dalšími tématy dle Článku I. odst. 10 tohoto Dodatku č. 5.

4. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Ing. Petr Záborec
vrchní ředitel
na základě příkazu k zastupování

podepsáno elektronicky

Ing. Vlastimil Navrátil, MBA

ředitel podniku
Ing. Vlastimil Navrátil, MBA



Digitální podpis: Ing. Vlastimil
Navrátil, MBA, 06.02.2026
14:00

podepsáno elektronicky

Jaromír Kudela
zástupce ředitele

Jaromír
Kudela

Digitální podpis:
Jaromír Kudela
Datum: 20.02.2026
13:54:30 +01'00'

podepsáno elektronicky
