

## SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 15PU-001227

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

### 2. název:

REPONT s.r.o.

se sídlem:

Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

IČO, DIČ:

26863057, CZ26863057

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba **Most ev.č. 55-030 přes řeku Dřevnici v Otrokovicích**, ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 10 809 179,47 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
<b>Most ev.č. 55-030 přes řeku Dřevnici v Otrokovicích</b>	10 809 179,47 Kč	2 269 927,69 Kč	13 079 107,16 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem **Most ev.č. 55-030 přes řeku Dřevnici v Otrokovicích**, číslo veřejné zakázky 15PU-001227.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)<sup>1</sup>
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky<sup>2</sup>
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky<sup>3</sup>
- f) Technická specifikace<sup>4</sup>
- g) Výkresy<sup>5</sup> a
- h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:  
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

<sup>1</sup> Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

<sup>2</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>3</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>4</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

<sup>5</sup> Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: ..... 19. 09. 2017

Datum 19. 09. 2017

PODEPSÁN .....

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele

**REPONT s.r.o.**

## ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„Most ev.č. 55-030 přes řeku Dřevnici v Otrokovicích“

číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0025465 (dále jen „Zakázka“), na základě ustanovení § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy

**REPONT s.r.o.**

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

**IČO: 26863057**

### O d ů v o d n ě n í:

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.

Ve Zlíně dne

28. 08. 2017

## PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **Most ev.č. 55-030 přes řeku Dřevnici v Otrokovicích**

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Príslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	REPONT s.r.o. Na Zelince 1167/19 751 31 Lipník nad Bečvou
Doba pro dokončení	1.1.9	<b>Do 8 měsíců od písemné nebo e-mailové výzvy objednatele bez zimní technologické přestávky</b>
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	<b>Do 8 měsíců od písemné nebo e-mailové výzvy objednatele bez zimní technologické přestávky</b>
Sekce	1.1.26	Není
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele (h) Výkaz výměr
Právo	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Není
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté ceny částka bez DPH
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Objekty řady SO 200
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Postupné závazné milníky	7.5	Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad	9.1	36 měsíců - vozovkové souvrství 60 měsíců - mostní objekt 84 měsíců - hydroizolace  VDZ 36 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);  30.000,- Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)  40.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
		8.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	12.5 d)	Nepoužije se
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasně užívání); 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 1500,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risks) - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném díle -výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH, min. 1% nabídkové ceny bez DPH
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Datum:

## PŘÍLOHA

### - POSTUP PŘI VARIACÍCI -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušování prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



## Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo Stavby: Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV: 2, 0, 2, 3, 4 a 5
---	----------------------------------	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplňte]

Přílohy Změnového listu:  Rozpis ocenění změn položek	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Paré č.</td> <td style="width: 90%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">[doplňte dle potřeby]</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize	[doplňte dle potřeby]	
Paré č.	Příjemce												
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)												
2	Zhotovitel												
3	Projektant												
4	Supervize												
[doplňte dle potřeby]													

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
		0,00

### Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV [doplňte dle potřeby]	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

## Rekapitulace úrovní členění stavby




## NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Ministerstvo dopravy

Smluvní podmínky pro  
**STAVBY MENŠÍHO  
ROZSAHU**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

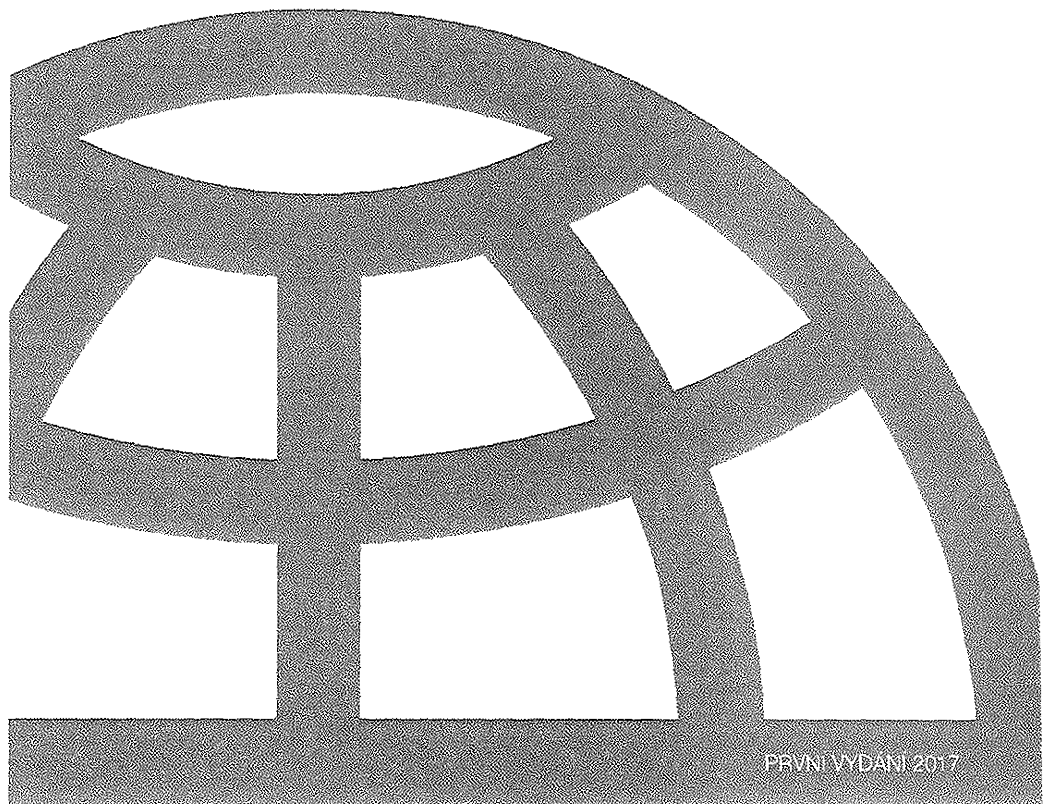

PRVNÍ VYDÁNÍ 2017



---

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

---

Smluvní podmínky pro  
STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU

První vydání 2017

# Zvláštní podmínky

## OBSAH

1	OBECNÁ USTANOVENÍ	5
1.1	Definice	5
1.2	Hierarchie smluvních dokumentů	6
1.4	Právo	6
2	OBJEDNATEL	7
2.1	Poskytnutí staveniště	7
4	ZHOTOVITEL	7
4.1	Obecné povinnosti	7
4.3	Subdodávky	9
4.4	Zajištění splnění smlouvy	9
4.5	Zajištění jakosti	10
4.6	Záruka za odstranění vad	10
4.7	Kontrolní prohlídky stavby	11
4.8	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	11
4.9	Výtěžní stavby	12
4.10	Archeologické nálezy	12
5	PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	12
6	RIZIKA OBJEDNATELE	13
6.1	Rizika Objednatel	13
7	DOBA PRO DOKONČENÍ	13
7.1	Doba pro dokončení	13
7.2	Harmonogram	13
7.3	Prodloužení doby	14
7.5	Postupně závazné milníky	14
7.6	Předčasné užívání	14
8	PŘEVZETÍ	15
8.1	Dokončení	15
8.2	Oznámení o převzetí	15
8.3	Převzetí části Díla	15
9	ODSTRANĚNÍ VAD	16
9.1	Odstranění vad	16
10	VARIACE A CLAIMY	16
10.1	Oprávnění k variaci	16
10.2	Oceňování variací	17

11	SMLUVNÍ CENA A PLATBA .....	17
11.1	Oceňování díla .....	17
11.2	Měsíční vůčtovění .....	17
11.3	Průběžné platby .....	18
11.4	Platba první poviny záložního .....	18
11.5	Platba druhé poviny záložního .....	18
11.6	Závěrečná platba .....	18
11.9	Zálohová platba .....	19
12	NEPLNĚNÍ .....	19
12.4	Platba po odstoupení .....	19
12.5	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu .....	19
13	RIZIKO A ODPOVĚDNOST .....	20
13.1	Péče zhotovitele o dílo .....	20
13.2	Vyšší moc .....	20
14	POJIŠTĚNÍ .....	20
14.1	Rozsah krytí .....	20
14.2	Obecné požadavky na pojištění .....	20
14.3	Nepojištění .....	21
15	ŘEŠENÍ SPORU .....	22
VARIANTA A		
15.2	Oznámení o nesouhlasu .....	24
15.3	Rozhodčí řízení .....	24
VARIANTA B		
15.1	Acquiescence .....	22
15.2	Oznámení o nesouhlasu .....	24
15.3	Rozhodčí řízení .....	24







Pod článok 4.3 se doplnje nasledujúcim textom:  
Pri posudzovaní splnení podmienok Zmlouvy súhlasí Obchodník s tým, že Zmlouva bude účinná iba vtedy, ak bude predložená k podpisu v súlade s podmienkami Zmlouvy.

Jasšie z obľahčenia účinnosti Zmlouvy, Zmlouva bude účinná iba vtedy, ak bude predložená k podpisu v súlade s podmienkami Zmlouvy. Zmlouva bude účinná iba vtedy, ak bude predložená k podpisu v súlade s podmienkami Zmlouvy.

Pod článok 4.4 je doplnen nasledujúcim textom:  
Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.

Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.

- (a) Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.
- (b) Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.
- (c) Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.
- (d) Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.



Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.

Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.

Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.

- (a) Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.
- (b) Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.
- (c) Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.
- (d) Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami. Zmlouva musí byť podpísaná a potvrzená oboma stranami.







- (b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje včetně nejvíce údajů určujících polohu dotazované pozemní Díla nebo Sekce a adresní ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání právočasného povolení k předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
- (c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným státním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce za strany Objednatel.

Jestliže Zhotovitel neodobří Dobu pro uvedení do provozu podle pododstavce 1.1.2.2. a to z jakýchkoli důvodů, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednatel za toto porušení své podmínky smluvní pokutu ve výši uvedeně v příloze.



**8.1**

**Dokončení**

Pod-článek 8.1 je odstráněn a nahrazen následujícími zněními:  
Zhotovitel může oznámením požádat Objednatel o vydání Povolení o převzetí ne dříve než 14 dní před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozloženo do Sekce může Zhotovitel požadovat oznámit o vydání Povolení o převzetí na každou Sekci.

**8.2**

**Oznámení o převzetí**

Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstráněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2 [Převzetí Díla a Sekce] následujícími zněními:

Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitelem:

- (a) vydá Zhotoviteli Povolení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou oprávněných neodokonalých prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu; řadu oprávněných vad pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny; nebo
- (b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifickým pracím, kterou má Zhotovitel provést, aby mohlo být vydáno Povolení o převzetí; Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit odeslání vycelím dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.

**8.3**

**Převzetí částí Díla**

Předává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]:  
Objednatel může podle vlastního uvážení převést jakoukoliv část Díla. Objednatel nesmí užívat jakoukoliv část Díla (kromě případů, že jde o občasné opatření podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání], nebo se na něm část Strany rozhodnou, pokud tato část Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoliv část Díla užívat před vydáním Povolení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání].



**9.1**


**Odstránění vad**

Pod-článek 9.1 je odstráněn a nahrazen následujícím zněním:  
Objednatel může kdykoliv před uplynutím příslušné Závazné doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokonalé práce. Zhotovitel musí:

- (a) dokončit jakoukoli práci neodokonalenou k datu stanovování v Povolení o převzetí před jejím úplným dokončením; nebo, která je určena povinným následným krokem;
- (b) provést veškeré práce související s odstráněním vad nebo pokračovat tak, že může být oznámení Objednatelům třetí strany, pracovníci nebo jiní pracovníci, aby mohli přistupovat k Závazné době a to bez nutnosti právního zákazu ze strany Objednatel v případě, že jakékoli vady související s těmito pracemi byly provedeny tak, jak je určeno v smlouvě. Materiály, technický a jiné zařízení nebo zařízení zůstávají v majetku Zhotovitele a Smlouva;
- (c) musí prostřednictvím příslušných výhledů uváděných v Povolení o převzetí.

Zhotovitel se zavazuje v případě objevení se jakékoli vad oznámených Zhotovitelem z důstojně zamyslet vady. Díla odstránit. Konkrétní způsob odstránění vad oznámí Objednatel, jeho souhlasem může Objednatel požadovat odstránění vad.

Ze odstránění vad v rámci povolení s Občasným a Závazným Povolením Objednatel smlouva pokračovat v uvedené v příloze.



**10.1**

**Opřevzetí k vadám**

Pod-článek 10.1 je odstráněn a nahrazen následujícími zněními:  
Strany smlouvy musí se svým způsobem zkontrolovat 10 dní před tím, než budou vyloučeny v případě vad a v souladu s tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou podporu, včetně ústřední, při odstraňování vad a provádění oprav, a postupovat dle podmínek uvedených v příloze. Opřevzetí se v případě, že to souvisí s 100% zárukou a zárukou při 100% záruce, pokud souvisí s vadami, které jsou zárukou záruky, a odstraňování vad souvisí s vadami, které nejsou zárukou záruky. Záruka se poskytuje pouze v případě vad, které jsou zárukou záruky.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou podporu, včetně ústřední, při odstraňování vad a provádění oprav, a postupovat dle podmínek uvedených v příloze. Opřevzetí se v případě, že to souvisí s 100% zárukou a zárukou při 100% záruce, pokud souvisí s vadami, které jsou zárukou záruky, a odstraňování vad souvisí s vadami, které nejsou zárukou záruky. Záruka se poskytuje pouze v případě vad, které jsou zárukou záruky.

Jestliže Zhotovitel varuje Zhotovitel o vadě, která je v rámci smlouvy součástí povolení o převzetí, musí být odstráněna. Pokud Zhotovitel Objednatel upozorní, že vady jsou odstráněny, musí být odstráněny.



spolu s účty Zhotovitel do 28 dní od obdržení závěrečné vyúčtování. V takovém případě se:

- (j) k závěrečnému vyúčtování nepřijíží a
- (k) Zhotovitel je povinen předložit Obchodatel bez zbytečného odkladu nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podléhajícími doklady, které bude v souladu s touto Smlouvou. Dříve uskutečněním zatížení účtu oběhří se rozumí den odsouhlasení závěrečné vyúčtování.

Jestliže však po dohodě mezi Obchodatelem a Zhotovitelem a jejichmi obchodními změnách návrh závěrečné vyúčtování výjde napravo, že existuje soubor musí Obchodatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dochůvaných částí návrhu závěrečné vyúčtování. Poté co je soubor konečným způsobem vyřešen podle Článku 15 (Řešení sporů), musí Zhotovitel předložit Obchodateli průběžně vyúčtování.

Datový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúčtování. Během 30 dní po předložení závěrečné faktury musí Obchodatel zaplatit částku nadejde Zhotoviteli."

11.9

Zálohová platba

Přidává se nový Pod-článek 11.9 (Zálohová platba):

„Zálohové platby se neposkytují.“

# Nepříjem

12.4

Platba po odstoupení

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

- (c) jestliže Obchodatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Obchodatel oprávněn získat od Zhotovitele náhradu za všechny záležitosti a škody, které vznikly Obchodateli a veškeré další náklady na cokromání Díla do zúčtování včetně číselů náležitých Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou;
- (d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněn k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 (Výši moci) a za účty risk nebo jinou ztrátu či škodu, která Zhotovitelé vznikly jako následek tohoto odstoupení."

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je řádku 28 dní nahrazena řádku 30 dní.

12.5

Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 12.5 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu): „Obchodatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

- (a) Zhotovitel nesdělí lhůty (a další časová úhrnná) stanovené jím v rozhodnutí příslušného veřejnéprávního orgánu; podle pod-odstavce 4.1.8. (Pod-článek 4.1 (Obecné povinnosti));
- (b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky);
- (c) Zhotovitel nedodrží dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
- (d) Zhotovitel nesplní postupný závazný vztah podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné mlčky) uvedený v Příloze;

13.1

Péče zhotovitele o dílo

Péče zhotovitele o dílo



(a) Zhotovitel nesdělí lhůty (a další časová úhrnná) stanovené jím v rozhodnutí příslušného veřejnéprávního orgánu; podle Pod-článku 4.1.8. (Pod-článek 4.1 (Obecné povinnosti));

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky);

(c) Zhotovitel nedodrží dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný vztah podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné mlčky) uvedený v Příloze;

Obchodatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nesdělí lhůty (a další časová úhrnná) stanovené jím v rozhodnutí příslušného veřejnéprávního orgánu; podle Pod-článku 4.1.8. (Pod-článek 4.1 (Obecné povinnosti));

# Riziko odpovědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo

Péče zhotovitele o dílo

13.2

Výši moci

Výši moci

# Pojistění

14.1

Foresh krytí

Foresh krytí

14.2

Obecné požadavky na pojistění

Obecné požadavky na pojistění

20





za kterou lze v daném místě a v daném čase vše stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc starou nebo novou, zejména chrunu a úleži (dále jen „Pojištění dítě“) s pojištěným přinejmenším ve výši stanovené v Příloze.

Režisér stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění dítě do konce z Účetního převzetí Dítě Objednatel. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost přinejmenším pojišťovny (viz výuky z Pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah odpovědnosti přinejmenším v případě neprovedení činnosti či rekonstrukce poistnou událostí poškozené části Dítě v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovědnosti výlukám standardně uplatňovaným veztváru k obdobněmu přednětu pojištění na trhu poskytování pojišťovacích služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojištěných smlouvách na Pojištění dítě budou po celou dobu trvání Pojištění dítě spíše veškeré podmínky dítě tohoto článku a

- (a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojištěného přinejmenším (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění dítě označen Objednatel, nebo
- (b) že pojištění přinejmenším, vztahující se k buďovnému dítě, bude ve všech Účetních nález vinkulováno.

Jinou osobu včetně sebeby oprávněného příjemce pojištění přinejmenším Zhotovitelé upravěné v pojištěných smlouvách označit jen po označení předchozím písemněho souhlasu Objednatel.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojištěných smlouvách uzavřených na Pojištění dítě bude stanoveno, že Pojištění přinejmenším Objednatel jakožto osoba oprávněná k přijetí pojištěného přinejmenším v rozsahu vyplývém ze žádosti Objednatel a až by byl vyzboven jakýkoliv souhlas Zhotovitelé nebo jiných osob. Počasí provedení: die tohoto odstavce se ovažuje za poostané porušení Smlouvy Zhotovitel.

Kořkovit: Objednatel bude požadovat, že Zhotovitelé povinen nčasit poskytnout své pojištění smlouvy Objednatelům a nebo pojišťovám makléřem určeným Objednatel. Zhotovitelé rovněž povinen Objednatel na jeho žádost dovažt žádné hranice pojištění: ho a přinejmenším dožít povinnosti Zhotovitelé z příslušných pojišťovacích smluv.

Zhotovitelé je dále povinen před zahájením Dítě uzavřít pojištění smlouvu, jejímž objednatel bude pojištění odpovědnosti Zhotovitelé za škodu, která vznikne Objednatel nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s provedením Dítě v důsledku činnosti Zhotovitelé. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost napravit škodu či újmu způsobenou vadným výkonem; nebo vadné vykonání prací a povinnosti napravit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nepoužijí uvedeny jiné částky, celkový limit pojištění přinejmenším tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnosti napravit škodu či újmu způsobenou vadnou realizací dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitelé za škody případně vzniklé dítě Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve sčtu uvedených rozsahu, po celou

dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení, která by omezila, včetně ostatních pojišťovacích úprav výuky z Pojištění s výjimkou výluk odpovědnosti v lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobněmu přednětu pojištění na trhu poskytování pojišťovacích služeb v České republice.

Stavovatelé Zhotovitelé budou v pojištěných smlouvách uzavřených v současnosti s touto Smlouvou uvedeni jako spolutvůrci. V případě, že spolutvůrci Smlouvy budou neobdobně, Zhotovitelé budou vřadovat, aby Spolutvůrci nebyli rovněž pojištěni zde uvedeně.

V pojistní smlouvě bude uvedeno vřadění, se zejména ovek pojištění v České republice

14.3 .....  
Nepojištění .....  
Pod boděm 14.3 se odstavě o bez náhrady.

## Řešení sporů

**ROZHODOVÁNÍ SPORŮ:** Zbožst rozhodování sporů podle věřaty A nebo B je odřadová v Příloze

### VARIANTA A

- 15.2 .....  
Oznámení o nesouhlasu .....  
V podělánku 15.2 a osesone sčtu, uvedeněm v Příloze, musí být uvedeno, že obě strany souhlasí s tímto rozhodnutím v České republice.
- 15.3 .....  
Rozhodčí řízení .....  
Pod boděm 15.3 se odstavě věřatě názvu a nřadění vřadění, jak je uvedeno v Příloze.

### VARIANTA B

- 15.1 .....  
Adjudikace .....  
Pod boděm 15.1 se odstavě věřatě názvu a nřadění, jak je uvedeno v Příloze.
- 15.2 .....  
Oznámení o nesouhlasu .....  
Pod boděm 15.2 se odstavě věřatě názvu a nřadění, jak je uvedeno v Příloze.
- 15.3 .....  
Rozhodčí řízení .....  
Pod boděm 15.3 se odstavě věřatě názvu a nřadění vřadění, jak je uvedeno v Příloze.


2017/02/20  
11:57:12

2017/02/20  
11:57:12



Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky  
náčt. L. Svoboda 1222/17  
110 15 Praha 1  
Tel.: 226 131 111  
Fax: 226 131 184  
E-mail: [posta@mdc.cz](mailto:posta@mdc.cz)  
<http://www.mdc.cz/>

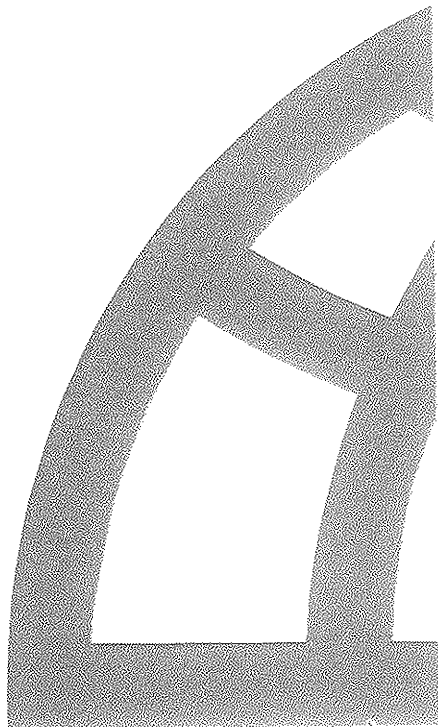

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5  
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

## Přehled jednotlivých kapitol TKP

### **Kapitola 1 TKP**

#### **Všeobecně**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1  
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007  
Praha, leden 2017

### **Kapitola 2 TKP**

#### **Příprava stavenišť**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK, č.j. 320/2016-120-TN/1  
ze dne 20.12.2016, s účinností od 1. ledna 2017  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1  
ze dne 20.4.2007  
Praha, prosinec 2016

### **Kapitola 3 TKP**

#### **Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1  
ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1  
ze dne 15.12.2003.  
Praha, prosinec 2008

### **Kapitola 4 TKP**

#### **Zemní práce**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1  
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1  
Praha, prosinec 2009

### **Kapitola 5 TKP**

#### **Podkladní vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,  
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008  
Praha, leden 2015

## **Kapitola 6 TKP** **Cementobetonový kryt**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3  
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.8.2006  
Praha, leden 2015

## **Kapitola 7 TKP** **Hutněné asfaltové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120  
ze dne 19.3.1999  
Praha, duben 2008

## **Kapitola 8 TKP** **Litý asfalt**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1  
ze dne 15.12.2003  
Praha, duben 2008

## **Kapitola 9 TKP** **Kryty z dlažeb a dílců**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1  
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, srpen 2010

## **Kapitola 10 TKP** **Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1  
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, srpen 2010

## **Kapitola 11**

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1  
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010  
se současným zrušením pátého znění této kapitoly  
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1  
ze dne 29.8.2005  
Praha, leden 2010

#### **Kapitola 12 TKP** **Trvalé oplocení**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1  
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120  
ze dne 21.2.2000  
Praha, březen 2008

#### **Kapitola 13 TKP** **Vegetační úpravy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1  
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120  
ze dne 27.10.1997  
Praha, srpen 2006

#### **Kapitola 14 TKP** **Dopravní značky a dopravní zařízení**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,  
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015  
Praha, březen 2015

#### **Kapitola 15 TKP** **Osvětlení pozemních komunikací**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor pozemních komunikací  
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,  
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1  
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013  
Praha, únor 2015

#### **Kapitola 16 TKP** **Piloty a podzemní stěny**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1  
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1  
ze dne 20.12.2002  
Praha, prosinec 2010

### **Kapitola 18 TKP** **Beton pro konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2  
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016.  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005  
Praha, leden 2016

### **Kapitola 19 TKP** **ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce** **ČÁST B - Profikoroze ochrana ocelových mostů a konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A  
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3  
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015.  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A  
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008  
Praha, duben 2015

ČÁST B  
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014, se současným  
zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12. 3. 2008  
Praha, prosinec 2013

### **Kapitola 20 TKP** **Pylony a mostní závěsy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120  
ze dne 21.2.2000  
Praha, duben 2008

### **Kapitola 21 TKP** **Izolace proti vodě**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1  
ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010  
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1  
ze dne 15.12.2003



Praha, leden 2010

## **Kapitola 22 TKP**

### **Mostní ložiska**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000.

Praha, duben 2007

## **Kapitola 23 TKP**

### **Mostní závěry**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1

ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000

Praha, květen 2007

## **Kapitola 24 TKP**

### **Tunely**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, prosinec 2006

## **Kapitola 25 TKP**

### **Protihlukové clony**

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, únor 2009

## **Kapitola 26 TKP**

### **Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek**

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

**Kapitola 27 TKP**  
**Emulzní kalové vrstvy**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OPK č.j. 291/2016-120-TN/9, ze dne 7.12.2016,  
s účinností od 10.12.2016 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP  
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015 s účinností od 15.2.2015  
Praha, prosinec 2016

**Kapitola 29 TKP**  
**Zvláštní zakládání**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1  
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1  
ze dne 15.12.2003  
Praha, prosinec 2010

**Kapitola 30 TKP**  
**Speciální zemní konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor silniční infrastruktury  
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1  
ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010  
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120  
Praha, prosinec 2009

**Kapitola 31 TKP**  
**Opravy betonových konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1  
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008  
Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP  
Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120  
Ze dne 19.3.1999  
Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz).

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

# ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Zvláštní technické kvalitatívni podmínky („ZTKP“)

## ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/

pro stavbu

„Most ev.č. 54-040 přes potok Okluky za obcí Slavkov“

Zvláštní technické kvalitatívni podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitatívni podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu.

### KAPITOLA 1 VŠEOBECNĚ

#### 1.8 STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí zhotovitel.

##### 1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél celé stavby.

##### 1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:

Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu - částečných uzavírek (provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

##### 1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště

čl. 8 se doplňuje:

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám stavebního povolení.

#### 1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

##### 1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

##### 1.10 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předmětem zakázky je oprava mostu ev.č. 55-030 v km 63,422 (střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče) dle projektové dokumentace zpracované firmou Viapont, s.r.o. Brno, PSČ 602 00, spočívající v odbourání mostního svršku, zesílení stávající desky z nosníků I, sanace povrchu nosné konstrukce a spodní stavby a výstavba nového mostního svršku a říms.

#### *Popis stávajícího stavu:*

Most byl postaven v roce 1953. Stávající nosnou konstrukci tvoří 16 ks prefabrikovaných předpjatých nosníků „T“ dl. 29,29 m konstantní výšky 1,45m v osové vzdálenosti 1,14 m. Na nosníky byl vybetonován vyrovnávací beton tl. cca 40-70 mm a položeny asfaltové vrstvy tl. cca 200 mm. Izolace mostovky je vanová. Ložiska mostu jsou ocelolitínová, na opěře 1 pevné uložení, na opěře 2 pohyblivé. Silnice na mostě i předmostí je šířky mezi obrubami 12 m, na mostě s oboustrannými veřejnými chodníky šířky cca 3 m. Most přemostuje řeku Dřevnici ve dně šířky cca 21 m. Spodní stavbu tvoří masivní monolitické betonové opěry s krátkými rovnoběžnými křídly.

Z důvodu nefunkční vanové izolace dochází k zatékání na úložné prahy, kde dochází ke korozi ložisek, odlupování povrchových vrstev úložného prahu. V úložném prahu a křídlech se nachází několik významnějších trhlin. Svody odvodňovače jsou zrezivělé. Betonové zábradlí má rozpadlé betonové sloupky s obnaženou korodující výztuží, ocelová madla jsou zrezivělá. Povrch chodníku je ve špatném stavu s množstvím prasklin.

Stav mostu je hodnocen následně:

Spodní stavba V – špatný

Nosná konstrukce V - špatný

#### **Vymezení plnění veřejné zakázky:**

Návrh technologic opravy je zřejmý z projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace, a je následující:

Bourací práce spočívají v odstranění stávajícího mostního svršku vč. spádového betonu až na povrch předpjatých nosníků, dále odbourání zábradlí, stávajících říms. Rovněž bude odbourána stávající přechodová oblast.

Předmětem zakázky je vybudování nové spřahující železobetonové desky, na ní bude provedena celoplošná izolace z NAIP na pečetící vrstvě, dále vybudování ochranné vrstvy izolace a konstrukční vrstvy vozovky. Dále budou provedeny nové ŽB římsy a montáž nového zábradlí. Nosná konstrukce bude sanována. Pro opravu mostu je vypracován projekt ve stupni PDPS, který tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace.

Výše uvedené práce bude nutno realizovat za veřejného provozu při zajištění nezbytné dostupnosti okolních objektů.

Oprava mostu bude probíhat po polovinách a je rozdělena celkem do IV. etap. Jako první se bude opravovat pravá polovina mostu. Stavba bude provedena za omezeného provozu, který bude spočívat v převedení dopravy na neopravovanou polovinu v jízdních pružích, které budou oproti stávajícímu stavu užší. Omezení se týká také pěší dopravy, která bude vedena v době opravy vždy pouze po neopravované straně.

**Etapa I:** Spočívá v přípravě levé poloviny pro vedení veřejné obousměrné dopravy po této polovině. Příprava bude provedena v rámci SO141 Provizorní rozšíření komunikace.

**Etapa II.** Oprava pravé poloviny mostu

**Etapa III.** Oprava levé poloviny mostu

**Etapa IV.** Uvedení do původního stavu.

#### Staniční místa:

50,855256 km – začátek úpravy úseku

50,863000 km – líc opěry O1 s osou komunikace

50,877194 km – střed mostu, křížení osy komunikace s osou vodoteče

50,891388 km – líc opěry O2 s osou komunikace

50,912258 km – konec úpravy úseku

Bližší informace k navržené technologii opravovaného mostu ev.č. 55-030 jsou zřejmé z příložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Součástí cenové nabídky uchazeče podrobný harmonogram prací, který zohlední výše popsaný stav tak, aby při provádění prací byly minimalizovány negativní dopady na bezpečnost a plynulost silničního provozu v dotčené lokalitě.

Zadavatel požaduje max. využití denní doby tak, aby dopad opravy předmětného mostu ev.č. 55-030 na bezpečnost a plynulost dopravy byl omezen na min. možnou míru. Za této situace bude součástí cenové nabídky uchazeče podrobný harmonogram prací, který zohlední výše popsaný stav tak, aby při provádění prací byly minimalizovány negativní dopady na bezpečnost a plynulost silničního provozu v dotčené lokalitě.

Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech pracovního klidu a v prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení a zajištění zvláštního užívání komunikace tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit stavbu s příslušnými doklady. Náklady, které zhotoviteli vzniknou přepravou vytěženého materiálu na skládku, si tento zhotovitel zohlední v jednotkových nabídkových cenách.

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP, TP a metodiky ŘSD ve spojení s dodržováním platných předpisů v oblasti BOZP.

Zadavatel požaduje dostatečné strojní vybavení k zajištění zakázky tak, aby veškeré činnosti na sebe navazovaly a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám mezi jednotlivými fázemi zakázky.

#### **1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ** se doplňuje:

Zhotovitel zpracuje havarijný plán pro případný únik závadných látek do toku nebo kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.

#### **1.11.5 Ochrana povrchových a podzemních vod**

I. věta se upřesňuje:

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

#### **1.11.6.4 Zařazení odpadů** se doplňuje:

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

## **KAPITOLA 2 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ**

### **2.10. EKOLOGIE**

#### **2.10.2 Skládky, mezideponie** se doplňuje:

Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

IČO: 26863057

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Most ev.č. 55-030 přes řeku Dřevnici v Otrokovicích“, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 15PU-001227 (dále jen „účastník“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
vybouraná asfaltová směs v rozsahu zhruba	281.98 tun	
Ocelové zábradlí, sloupky a stojky DZ z ocelových trubek – za cenu šrotu	doložit vážními listky (předpoklad 4,0 tun)	cena v místě a čase obvyklá (cena za výkup železného šrotu)
Dlažební kostky	12.11 tun	
Chodníkové obrubníky – kamenné	84,0 m	
Chodníkové obrubníky – betonové (nepoškozené) - předpoklad	79,0 m	
Betonová dlažba zámková (nepoškozená) - předpoklad	43.63 m <sup>2</sup>	

Účastník se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Účastník se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Účastník se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Účastník tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Účastník dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Účastník, resp. jeho poddodavatelé. Účastník se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Hrachovci dne
