

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy: 18ZA-002298

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Reditelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na
Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 IČO, DIČ:
65993390, CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, č.
ú. [REDACTED]

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
úseku kontaktní osoba ve věcech
technických:

(dále jen „objednatel”)

2. (dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)

[REDACTED], generální ředitel

[REDACTED], ředitel provozního

[REDACTED] vedoucí ssÚm Bernartice

a

1. název:
se sídlem:
IČO / DIČ:
bankovní spojení:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
62242105 / CZ 62242105

Komerční banka a.s./ Raiffeisenbank a.s. /Česká spořitelna a.s.

zastoupen:

[REDACTED], předsedou představenstva

[REDACTED], místopředsedou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

představenstva

[REDACTED] — předseda

představenstva [REDACTED] —

místopředseda představenstva

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED], ředitel oblasti STŘED

(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1 Oprava kanalizace-km 56-75 PP+LP*,
ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění
všech vad na ní za cenu ve výši 3 519 999,27 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Název stavby	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč	DPH	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč
	(a)	(b) DPH z částky (a)	
DI Oprava kanalizace- km 56-75 PP+LP -	3 519 999,27	739 199,85	4 259 199,11

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim při zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce s názvem DI Oprava kanalizace km 56-75 PP+LP -, číslo veřejné zakázky 18ZA-002298.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 1
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky²
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace
- g) Výkresy⁵

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o smlouvě“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeně strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny údaje, které jsou podle zákona o registru smluv považovány za obchodní tajemství.

¹ Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

³ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁴ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

⁵ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

informace stanovené v ust. 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum:

Datum: 22. I L 2017

PODEPSÁN

PODEPSÁ

Jméno: Jméno: [REDACTED] Funkce: Účinný: předseda představenstva za objednatele za
odavatele/zhotovitele
S NICE GROUP a.s.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Naše zn.: IUA-002298 číslo zakázky: 18ZA-002298

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Vyřizuje

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„DI Oprava kanalizace-km 56-75 PP+LP'G

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116, 110 00 Praha 1 IČO: 622 42 105

Odůvodnění:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Bernarticích dne 7.11.2017

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: DI Oprava kanalizace-km 56-75 PP+LP

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.I.4	RSD CR, SSUD2 Bernartice Bernartice 7, 257 65 Čechtice

Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	SILNICE GROUP a.s. Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 OO Praha 1
Doba pro dokončení	1.1.9	31.5.2018
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužito
Sekce	1.1.26	Nepoužito
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkresy (g) Nabídková projektová Zhotovitele (h) Výkaz výměr dokumentace
	1.4	právo České republiky
Komunikace	1.5	Ceština
Poskytnutí staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Podčlánku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████, vedoucí SSUD2 Bernartice
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužito
Jmenování podzhotovitelé		Nepoužito
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužito
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužito
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužito
Harmonogram	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužito

Název článku Smluvních podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
Odstranění vad	9.1	Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 36 měsíců
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby
Měna	11.7	koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení
	12.5 b)	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky) 9.300 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	12.5 c)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 1.860 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

Název článku podmínek	Číslo článku Smluvních podmínek	Příslušné údaje
	12.5 d)	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 1.860 Kč za každý za očet ' den rodlení
	12.5 e)	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);3.720 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	12.5 f)	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1. 372 Kč za každý započatý den rodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše pojistného plnění	14.2	1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního pojištění	14.2.	- Nepoužito
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

SILNICE GROUP a.s. [redacted] předseda představenstva

PŘÍLOHA

POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list (součást Přílohy)

Název a evidenční číslo	Číslo SO/PS / číslo Změny	číslo ZBV: 2,
Stavby:	SO/PS:	3, 4a 5
Název stavebního objektu/provozního		

přisouboru SO/PS :

10 Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne

(dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel:

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v Intranet ŘSD CR)
elektronické verzi na	2	Zhotovitel
	3	Projektant
		Supervize

Iniciátor změny:
Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena

do

	Cena navrhovaných	Cena navrhovaných Změn	navrhovaných Změn záporných
kladných Změn			
Změn záporných			
kladných			
			celkem
			0,00

jméno

líhoSprávce stavby

jméno

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s S 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a mto Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu

nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek- Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem

nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své

podpisy. a.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele jméno datum podpis dle S 24 Směrnice č. 18/2017)

istu iteli It

S.

Podpis vyjadřuje

souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Funkce zaměstnance RSD CR

em)

oho

určeného v rámci organizační jméno datum podpis

struktury Věcně příslušného

útvary k vyjádření k ZBV

dle

Supervize

datum

podpis

Zhotovitel jméno datum podpis číslo paré:

OPRAVA

Místo: DI

Datum: 1.11.2017

Objednatel:

Reditelství silnic a dálnic ČR

DIČ:

Zhotovitel:

62242105

Kód:

Sta Silnice Group a.s.

DIČ: CZ62242105

JKSO

459/2017

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: DI KANALIZACE

JKSO:

cc-cz:

Projektant:

DOSA PLUS spol. s r.o.

DIČ:

Zpracovatel:

č:

DÍČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			3 519 999,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			3 519 999,27

DPH základní snížená	ze	3 519 999,27	739 199,85
	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	CZK	4 259 199,12
-------------------	------------	---------------------

DI OPRAVA

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód	Objekt	Cena bez DPH	Cena s DPH
)	Náklady z rozpočtů	519 999,27	259 199,12
459/201	DI OPRAVA KANALIZACE	519 999,27	259 199,11
7			
0, 0, 0, 0,	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	519 999,27	259 199,12
Kód:	459/2017		

Stavba: DI OPRAVA KANALIZACE

Místo: DI

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel: Silnice Group a.s.

Datum:

Projektant: DOSA PLUS spol. s
r.o.

Zpracovatel:

Ostatní náklady	0,00
Vyplň vlastní	0,00
Vyplň vlastní	0,00
Vyplň vlastní	0,00

DI OPRAVA

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

KANALIZACE

JKSO: cc.cz: Místo: DI Datum: 01.11 .2017

Objednatel:

Reditelství silnic a dálnic ČR

DIČ:

Zhotovitel:

Silnice Group a.s.

62242105

DIČ: CZ62242105

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel

Razítko

Zhotovitel

Řázítko

DI OPRAVA

Projektant: Datum a podpis:

DOSA PLUS spol. s r.o.

Datum a podpis:

DIČ:

Zpracovatel:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 264 999,27
Ostatní náklady	255 000,00

Cena bez DPH	3 519 999,27
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 519 999,27	739 199,85
snížená		ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 259 199,12
-------------------	--------------	---------------------

DI OPRAVA

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

KANALIZACE

Místo:

DI

Datum:

01.11.2017

DI OPRAVA

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: Silnice Group a.s.

Projektant: DOSA PLUS spol. s r.o.
Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem (CZK)
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	
4 - Vodorovné konstrukce	
8 - Trubní vedení	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 519 999,27

ROZPOČET

Stavba: KANALIZACE

Místo: DI Datum: 01 .1 1 .2017
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: DOSA PLUS spol. s r.o.
Zhotovitel: Silnice Group a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem LCZKJ
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 264 999,27

HSV Práce a dodávky HSV

3 264 999,27

1 - Zemní práce

1 494 655,59

1	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU					
---	---	--------	---------------------	--	--	--	--	--

nánosy

(0,25*0,25*3,14*9,5+0,4*0,4*3,14*94)*0,6"čištění

29,454 potrubí - předpoklad zanešení 60%"

306,655 "v místě dluždených koryt"

1835*0,6 "v místě příkopových žlabů"

Součet

2	K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP s-10 (INERTN ODPAD					
---	---	--------	--	--	--	--	--	--

betonový odpad

91 , 75*0,15 "poškození příkopové tvárnice

3 "poškozená vrchní část šachty

(20*0,6+349*0,1)*0,15*0,5 "50% plochyl -úsek

dl.

lom. kámen"

(749,7*0,1)*0,15*0,5 "50% plochy

2.úsek dl.

lom. kámen"

(451*0,1+196*0,1+424*0,1)*0,15*0,5 "50% plochy

3.úsek dl. lom. kámen"

Součet

3	K	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO SKM					
---	---	--------	------------------------------------	--	--	--	--	--

- v rozsahu dle situace včetně následné likvidace

1288*0,1+1416*0,1+424*0,1+180*0,2+451*0,1

349*0,1 "úsek 1"

"úsek 3"

(1404+706+1111+728)*0,1+751*0,1 "úsek 2"

Součet

4	K	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS				
---	---	-------	--	-----	--	--	--	--

6 ' 1 . úsek"

42 "2. úsek"

37 z. úsek"

Součet

5	K	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS				
---	---	-------	-----------------------------	-----	--	--	--	--

3 ' 1 . úsek"

12 "2. úsek"

14 "3.úsek"

Součet

6	K	11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS				
---	---	-------	-----------------------------	-----	--	--	--	--

2 úsek"

DÍ OPRAVA

7	K	122734	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM				
---	---	--------	---	--	--	--	--

12 "oprava šachty na úseku 2"

8 'Oprava čela na úseku 3"

91,75*0,5*0,2 "při výměně příkopových tvárnic"

Součet

			VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I				
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem CCZKJ
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------------

29,175 "zpětný zásyp"

9	K	12933	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M			
---	---	-------	---	---	--	--	--

stávající žlabovky

385+298+186+208 "úsek 2 - pák. tvárnice"

356+402 "úsek 3 přík.tvárnice"

Součet

10	K	12960	ČIŠT N VODOTE A MELIORA KAN LU OD NÁNOSŮ				
----	---	-------	--	--	--	--	--

Odstranění splaveného nánosů do koryta v místě stavby

349*0,1+749,7*0,15+451*0,1 +196*0,15+424*0,2

"dlažba z lom. kamene x tloušťka"

11	K	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM				
12	K	12996	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM	M			

15+23+56 "na úseku 2"

13	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO N yPŮ A NASK DKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
----	---	-------	---	--	--	--	--

29,175+1437,1 "uložení na mezideponii + uložení na skládku"

14	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM				
----	---	-------	--------------------------------------	--	--	--	--

12+8 "zásyp čela propustku a opravované šacht

15	K	18223	ROZPROSTŘEN ORNICE VE SVAHU V TL DO 0 20M				
----	---	-------	---	--	--	--	--

včetně dodání ornice

91,75*0,5 m na každou stranu u nově osazen 'ch žlabovek"

16	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
----	---	-------	----------------------------------	--	--	--	--

1288+1416 "úsek 3"

1404+706+1111+728 "úsek 2"

Součet

4 - Vodorovné konstrukce

17	K	451314	PODKLADN A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROST HO BETONU C25/30				
----	---	--------	---	--	--	--	--

C 20/25 nXF3

(20*0,6+349*0,15)*0,3 "1.úsek dl. lom. kámen"

(749,7*0,15)*0,3 "2.úsek dl. tom. kámen"

(451*0,15+196*0,15+424*0,15)*0,3 z. úsek dl.

lom. kámen"

(749,7*0,2)*0,3 "2.úsek - 30%

(451*0,2+196*0,2+424*0,2)*0,3

91,75*0,7*0,1 "úsek 2 a 3 přík. tvárnice"

Součet

18	K	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE				
----	---	-------	-----------------------------	--	--	--	--

16 "Sanace vymletého svahu na úseku 2"

19	K	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
----	---	--------	--------------------------------	--	--	--	--

z plochy'

(20*0,6+349*0,2)*0,3 "1. úsek -

z plochy"

plochy"

"3.úsek - z

Součet

20	K	62845	sp ROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU				
----	---	-------	--	--	--	--	--

(385*0,6+298*0,6+186*0,6+208*0,6)*0,6 "úsek 2 -

387,720 přík.tvárnice - 60%"

(356*0,6+402*0,6)*0,6 "úsek 3 přík.tvárnice -

60%"

20*0,6+349+749,7+451+196+424

Součet

8 - Trubní vedení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

oprava stávající šachty

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22	K	91816	CELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM	KUS			
----	---	-------	---	-----	--	--	--

úsek 2 v místě vyústění kanalizace do koryta

23	K	935212	PRIKOPOVE ZLABY Z BETON TV RNlc ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL IO0MM	M			
----	---	--------	---	---	--	--	--

385*0,05+298*0,05+186*0,05+208*0,05 'úsek 2 -

53,850

5% nových tvárnic"

PČ	Typ		356*0,05+402*0,05 'úsek 3 - 5% nových tvárnic"				
----	-----	--	--	--	--	--	--

Součet

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

24	K	03100	ZAŘÍZEN STAVENIŠTĚ - ZŘ ZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KČ			
----	---	-------	--	----	--	--	--

včetně vnitrostaveništní dopravních cest dle potřeb zhotovitele

25	K	03440	STAVEBNÍ VYBAVENÍ STABILNÍ PRO ČERPÁNÍ VODY	KČ			
----	---	-------	---	----	--	--	--

především je třeba zohlednit při realizaci 1. úseku

26	K	03770	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚ NEBO zŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ			
----	---	-------	--	----	--	--	--

zřízení hrázek a jámek pro čerpání včetně dalšího potřebného vybavení především je třeba zohlednit při realizaci 1. úseku

27	K	17780	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
----	---	-------	---------------------------------------	--	--	--	--

pro zajištění suchého prostředí zemní hrázky provede zhotovitel dle svých zkušeností spárování koryta"
(např. písek v 10 "2.úsek - při obnově a spárování koryta"
pytlích)
Součástí položky je i následná likvidace hrázek, přesuny hmot a případně i poplatek za skládku

85 "1. úsek - při obnově a

7 "1. úsek - při obnově a spárování koryta"

VP - Vícepráce

0,00

0 (0 ㄱ
(方罟 o 窓

(0)章

UVNÍ PODMÍNKY
STAVBY
ŠÍHO ROZSAHU

Smluvní podmínky pro
**STAVBY MENŠÍHO
ROZSAHU**

OBEČNÉ PODMÍNKY

대규모重

보통



대규모重



FIRST EDITION 1999



Tento dokument je obsahově identický s oficiální sítňrou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument není určen k dalšímu šíření a nahrazuje oficiální sítňrou verzí Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v Českém překladu Českou asociací konzultantů inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na adrese České asociace konzultantů inženýrů (CACE, Havelovo náměstí 36, 702 00 Olbrámo, www.cace.cz).



Obecné podmínky

1 Obecná ustanovení

1.1

Definice

Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný význam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva

1.1.1 „Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatelů ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, její náskok, a jakákoliv variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelům tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoliv variace takových výkresů.

Osoby

1.1.4 „Objednatel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby

1.1.7 „Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den“ je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.

Peníze a platby

1.1.10 „Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Stavěním nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice

1.1.11 „Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Materiálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země“ je země, ve které se nachází Stavěniště.

1.1.13 „Rizika objednatelů“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost, kterou smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana úměrně vynout nebo ji přetáhnout a kterou nelze v podstatě měně přičíst druhé Straně.

Prostředím k dispozici je dostupná kopie souboru s názvem "Dokumentace k projektu" (DOK), která obsahuje informace o všech částech a přílohách a dalších souborech. Dokumentace je dostupná na adrese www.mps.gov.cz a lze ji také získat na požádání.

- 2.3 **Pokyny objednatelů**
Zhotovitel musí plynule a včas vykonávat všechny práce, které jsou uvedeny v Dle, a musí zajistit, aby všechny práce byly provedeny v souladu s Dle.
- 2.4 **Schválení**
Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatel nebo zástupce Objednatel nemá vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

3 Zástupci objednatelů

- 3.1 **Pověřená osoba**
Jedna osoba z personálu Objednatel musí být pověřena jednat za Objednatel. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatel Zhotovitel.
- 3.2 **Zástupce objednatelů**
Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých povinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatel Zhotovitel. Objednatel musí Zhotovitel oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatel delegoval.

4 Zhotovitel

- 4.1 **Obecné povinnosti**
Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré dozоровání, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Staveništi jsou majetkem Objednatel.
- 4.2 **Zástupce zhotovitele**
Zhotovitel musí Objednatel za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrobné informace osoby, která je pověřena přijímat pokyny jménem Zhotovitele.
- 4.3 **Subdodávky**
Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatel.
- 4.4 **Zajištění splnění smlouvy**
Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednatel do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválí Objednatel, a od třetí strany, kterou schválí Objednatel.

Projektování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace zhotovitelem

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu podle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí uchytnout předložit. Objednatel veškerou projektovou dokumentaci, kterou připraví. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, pokud není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoliv prvku jím projektované stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku. Objednatel nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být uchytně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znovu s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

5.2

Odpovědnost za projektovou dokumentaci

Zhotovitel je odpovědný za svou základní projektovou dokumentaci a za projektovou dokumentaci podle tohoto článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Technickou specifikaci a Výkresy.

Rizika objednatele

5.1

Rizika objednatele

V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

- a) válka, nepřátelské akce jak už válka je, nebo není vyhlášená, invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
- b) rebelle, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
- c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměstnanci,
- d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoliv jaderného paliva nebo jakéhokoliv jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxické výbuštiny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoliv výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoliv radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
- e) takové viny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzduchu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- f) užívání nebo zabírání jakékoliv části Díla Objednatelem mimo případů specificko- vaných ve Smlouvě,
- g) projektování jakékoliv části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
- h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření.
- i) Vyšší moc.

0 0

0 N-o 0 o

0 0

0 0

a.)

-y

x-

o O

6

O o

a.)

O

O

-o

-Ω

τ-

∞

-o

-o

-o

α-

-o

0 0

0 0

η-

α-

θ)

O o

'N

N

L-

O o NO

O o

Q)

O o

o o

a)

α

-O

oo

-o

-3

Po

o a)

α

O α-

OC_YTE —2

α-

2

-b

-o

-Ω

NO

O -c o o

O

O
ω

O >

O ω N

-Y

> o

OO

N>O

O o

_Ω

τσ

Ⓛ

-E


O o



International Federation of Consulting Engineers (FIDIC)
World Trade Center 1
PO Box 311
1215 GENEVA, 15
Switzerland
Telephone: +41 22 799 48 00
Fax: +41 22 799 48 01
E-mail: fidic@fidic.org
www.fidic.org

Smluvní podmínky pro **STAVBY MENŠÍHO ROZSAHU**

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

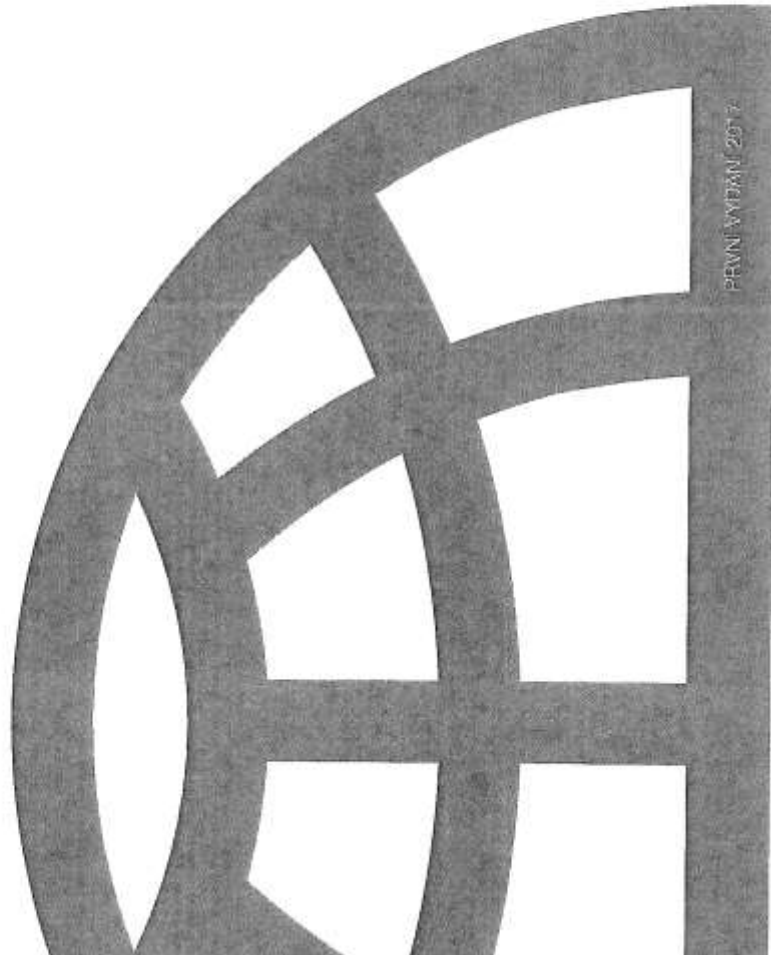

PRVNÍ VYDÁNÍ 2017

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních říbených (CAKCE) jako první vydání v roce 2016, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních říbených (CAKCE, Havlíčkovo náměstí 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, obce@cake.cz, www.cakce.cz/fidc-bu@cake.itp konkrétně <http://naa.cz/orole-forms-green.itp>.



STAV 田代 聖一 108025 1111

P. n (1/1) n 1 7

Zvláštní podmínky

OBSAH

1	OBECNÁ USTANOVENÍ	5
1.1	Definice.....	5
1.3	Hierarchie smluvních dokumentů.....	6
1.4	Právo.....	6
2	OBJEDNATEL	7
2.1	Poskytnutí staveniště.....	7
4	ZHOTOVITEL	7
4.1	Obecné povinnosti.....	7
4.3	Subdodávky.....	9
4.4	Zajištění splnění smlouvy.....	9
4.5	Zajištění jakosti.....	10
4.6	Záruka za odstranění vad.....	10
4.7	Kontrolní prohlídky stavby.....	11
4.8	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.....	11
4.9	Vybíjení stavby.....	12
4.10	Archeologické nálezy.....	12
5	PROJEKTOVÁNÍ ZHOTOVITELEM	12
6	RIZIKA OBJEDNATELE	13
6.1	Rizika Objednatelce.....	13
7	DOBA PRO DOKONČENÍ	13
7.1	Doba pro dokončení.....	13
7.2	Harmonogram.....	13
7.3	Prodloužení doby.....	14
7.5	Postupně závazné mílniky.....	14
7.6	Předčasné užívání.....	14
8	PŘEVZETÍ	15
8.1	Dokončení.....	15
8.2	Oznámení o převzetí.....	16
8.3	Převzetí částí Díla.....	15
9	ODSTRANĚNÍ VAD	15
9.1	Odstranění vad.....	15
10	VARIACE A CLAIMY	16
10.1	Obraňování k variaci.....	16
10.2	Oceňování variací.....	16
11	SMLUVNÍ CENA A PLATBA	17
11.1	Oceňování díla.....	17
11.2	Měsíční vyúčtování.....	17
11.3	Průběžné platby.....	17
11.4	Platba první poloviny zádržného.....	18
11.5	Platba druhé poloviny zádržného.....	18
11.6	Závěrečná platba.....	18
11.9	Zálohová platba.....	19
12	NEPLNĚNÍ	19
12.4	Platba po odstoupení.....	19
12.5	Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu.....	19
13	RIZIKO A ODPOVĚDNOST	20
13.1	Péče zhotovitele o dílo.....	20
14	POJIŠTĚNÍ	20
14.1	Rozsah krytí.....	20
14.2	Obecné požadavky na pojištění.....	20
14.3	Nepojištění.....	21
15	ŘEŠENÍ SPORŮ	22
VARIANTA A		
15.2	Oznámení o nesouhlasu.....	22
15.3	Rozhodčí řízení.....	22
VARIANTA B		
15.1	Adjudikace.....	22
15.2	Oznámení o nesouhlasu.....	22
15.3	Rozhodčí řízení.....	22

Zvláštní podmínky



Oboční ustanovení

1.1

Definice

- 1.1.21 „Příloha“ znamená vyplněné stránky napsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.
- 1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 (Prostředkový doby), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.
- 1.1.23 „Předčasná užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatel jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona, Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 7.6 (Předčasná užívání).
- 1.1.24 „Starobní deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.
- 1.1.25 „Základní datum“ je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky.
- 1.1.26 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).
- 1.1.27 „Podzhotovitel“ je totžný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvných formách a podobách.
- 1.1.28 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.
- 1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 (Záruka za odstranění vad).
- 1.1.30 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 (Převzetí).
- 1.1.31 „Přijata smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.*

1.3

Hierarchie smluvních dokumentů

Pod-článek 1.3 zní:

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vlnat jako vzájemně se vylučující. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejistota nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotovitel vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“

1.4

Právo

Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:

„Řídit se Smlouvou právním Česká republika, než se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena oodchylně.“



Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
 „Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li požadavky Objednatel ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
 „Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek ve všech mluvnických formách a podobných.“

Pod-článek 1.1.5 zní:
 „Zhotovitel“ je totožný termín, jako „obdávatel“ ve smyslu zákona o veřejných zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvládla (ly) v zadávacím řízení a které Objednatelí popíšeme Smlouvou o dílo pověřit realizací díla.“

Pod-článek 1.1.10 zní:
 „Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účinné, hospodárné a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

Pod-článek 1.1.14 zní:
 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost, kterou Smluvní Strana nemůže ovládat; proti které tato Smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla tato Smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji přehodnotit, a kterou nelze v podstatě mít přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- (a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí;
- (b) rebelle, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- (c) výžňost, vzpoura, nepokoj, stávka nebo výuka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jím zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
- (d) válečná munice, výbuštiny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbuštinou, ionizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel;
- (e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zaměťření, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivity.“

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
 „Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oborového třířádku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.

0 >
0

0
-0

-0

Φ 0 0
0 0
0 0
0 0

5
Ω 0
0 0
9 0

0 0

0

No

No 2

0

-0

0 0

0 m

0

-0

-0

O>

as

Ω-

> O N
> o

E o

O o

1.11

™

Ω

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitky či omezení podmínek právníké osoby, která záruku vydala.

V případě nevymanatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje napro-
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obsazení Záruky za odstranění vad ve prospěch
Objednatelě, jež hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví-
dat podmínkám uvedeným výše.

pr

9/11/2017

Objednatel musí Zhotovitel vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení
dala její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po-
složití Protokol o ukončení Záruční klauzury.

7

kontrolní prohlídka stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídka stavby]:

„Zhotovitel je povinen nepozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra-
ci odpovídajících fází výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění
kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatel
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné postupy a spolupráci a těchto kontrolních



- (3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavou kontrol na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemně jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatel.
- (4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatel a naopak.
- (5) V případě pracovního úrazu zaměstnanec Zhotovitel musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitel ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatel a Zhotovitel následně spíší veškeré povinnosti v souladu se zákonem práce a s příslušnými dalšími právními před-

000

2 / 15 stránek

000

8

4.8

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci]:
„Zhotovitel musí:

8

7.3

Prodloužení doby



Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

Podle Pod-článku 10.3 [vášně upravená] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného závazného mílníku, jestliže je neto bude zrozdán jakýmkoli rizikem Objednatel. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitel Objednatel musí zvažít veškeré potřebné podrobnosti poskytnutás Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení Doby pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného mílníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a Doby pro splnění postupného závazného mílníku se posuzují samostatně.

7.5

Postupné závazné mílníky

Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné mílníky]:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné mílníky provádění Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému mílníku dokončeny, bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný mílník. Doba pro splnění postupného závazného mílníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].“

O splnění každého postupného závazného mílníku bude Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného mílníku nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno úplně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provádět Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný mílník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému mílníku dokončeny, je povinen Objednatel zaplatit amiluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“

7.6

Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- (a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dodatky o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména $\text{\textcircled{R}}$ souhlas Zhotovitele s předčasným užíváním a $\text{\textcircled{R}}$ použítváš podmínek Předčasného užívání, a to nepozději 1 měsíc před uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;
- (b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu dešťového bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jnych obsahových náležitostí žádosti o předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
- (c) vykonávat své práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatel.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a to z jakéhokoli důvodu, který je vyloučen na straně Zhotovitele, zaplatí Objednatel za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme přiměřenky Objednatelé v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do harmonogramu postupu prací.

Rizika Objednatele

6.1 Rizika Objednatele

V pod-odstavci (c) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavce (p) se vkládá nový pod-odstavec (f):

„f) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Přechodného užívání podle Pod-článku 7.6 (Přechodné užívání).“

7 Doba pro dokončení

7.1

Doba pro dokončení

Na konci Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedený Pod-článek 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně i též na tyto Sekce.“

7.2

Harmonogram

Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat:

- časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaký) a provedení prací s vyznačením Pochzhotovitelů,
- odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Pokynzení o převzetí,
- posouprnost a načasování kontrol a zkoušek specifickových ve Smlouvě, průvodní zprávu obsahující:
- (i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
- (ii) odchod počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, pokud ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo podmínkami Zhotovitele. Nesporné povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelém je důvodem pro zastáření části plateb podle Pod-článku 11.3 (Průběžné platby).

Převzetí

8.1

Dokončení

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatela o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozloženo do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“

8.2

Oznámení o převzetí

Pod-článek 8.2 (Oznámení o převzetí) je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 8.2 (Převzetí (Dla a Sekci) následujícího znění).



(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve chvíli objektivně co nejkvalitněji po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezodkladně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“

10 Variace a claimy

P

esitka Zhotovitelů vznikne
šitím součástími (něm)

2

Řešování variací

Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy, která je předmětem Variace, musí být měřena, není-li Strah určení ceny Variace. Vzhledem cenou pro jakoukoli novou položku, která je následujícími ~~z~~ náší nročit

10

0 | n n | č

OST n | VSB | e

< | OK

Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitelem

0-

0 α

> 0

0

-Ω

Ω-

-0

o O

-Ω

ω

-0
α

(5)

0 α-

-8

0

0

0

Ω-

-c

-Y

1

o o

> 0

o

o

0

o

Y-

ZZ

13 8



Kapitola 1 TKP

E. R.

Ze

Odbor pozemních komunikací
 Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1
 ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,
 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TK
 schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6.
 Praha, leden 2017

Kap
Podíl

MINISTERSTVO DOPRAVY
 Odbor pozemních komunikací
 Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
 ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TK
 schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
 ze dne 12.3.2008
 Praha, leden 2015

Křivý

Zdíl 8 60P 5
 Odbor pozemních komunikací

Specifikace díla

1. Jedná se o údržbu stávajících stavu. Údržba spočívá ve vykácení krovů, nánosů a patřezů, čištění přespárování stávající dlažby Stavba je rozdělena na tři části

3



VOVAPROF s.r.o. | Hrnčářská 1108 | 142 00 Praha 4
KONTAKT: 225 311 111 | WWW.VOVAPROF.CZ

19 opp+ |

