

FORMULÁŘ 1.6 HARMONOGRAM

Společnost Frýdek – Místek, obchvat

Vedoucí společník **SILNICE GROUP a.s.**

se sídlem **Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika**

IČ: **622 42 105**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

a

Společník **VÁHOSTAV - SK, a.s.,**

se sídlem: **Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika**

IČ: **31 356 648**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresného soudu Bratislava I Slovenská republika, oddíl Sa, vložka 5996/B

a

Společník **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o.**

se sídlem: **ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki**

IČ: **710251913**

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „**D48 Frýdek-Místek, obchvat – II. etapa**“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek **644740** (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

Při provádění díla bude postupováno podle všech v současné době platných zákonů, předpisů, ČSN a technických předpisů, pracovních postupů a zadávací dokumentace, ze které vyplývají další závazky (např. pracovní doba, harmonogram technologických přestávek aj.).

Práce budou probíhat v souladu s přiloženým harmonogramem postupu prací obsahujícím termíny zahájení a dokončení celé stavby. Použití mechanizace, dopravy a pracovníků bude přiměřené postupu prací.

2. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný Harmonogramem, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností. Harmonogram bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách.
3. realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: **Pokládka**

cementobetonového krytu a pokládka asfaltových hutných vrstev vozovky hlavní trasy dálnice včetně větví křižovatek.


V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddávky z nabídkové ceny stavby	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily) [uchazeč uvede pouze informativně, nejedná se o prokázání kvalifikace. Uchazeč v případě neuvedení nebude ze zadávacího řízení vyloučen]
PHS	MMCITĚ+, a.s.; Bílovice 519, 687 12 Bílovice	3,30%	Považská Teplá / protihluková stěna
Oplocení	Betafence s.r.o.; Holandská 2, 639 02 Brno - Štýřice	0,50%	Mezinárodní letiště Vilnius - Vilnius (Litva) - Fortinet Super, sloupky Bekacip Dálnice a silnice - Dubaj - Decofor Wave
Přeložky vodovodů a potoků	HYDROSPOR, Úprkova 3, 702 00 Ostrava - Přívoz	1,54%	Vodohospodářské stavby pro OVAK a.s. a Statutární město Ostrava
Odvodnění komunikace	VODOSTAV OSTRAVA, spol. s.r.o., Gorkého 28, 702 00, Moravská Ostrava	3,43%	Odkanalizování obcí Lichnov a Bordovice
Přeložky elektro, VO, NN, DOK	ELSPOL - Gattnar s.r.o.,	2,09%	Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Břustkova, Šefíkova Rekonstrukce VO dálnice D1 km 188,800-191,000 včetně MÚK
Přeložka plynu FM I	GLUMBÍK s.r.o., Novoveská 1261/5, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory	1,10%	montáže a demontáže plynovodů výstavba NTL, STL a VTL plynovodu přeložky plynovodu opravy a rekonstrukce plynovodů
Dopravní značení	SEKNE spol.s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc	0,07%	při opravě silnice I/56 Ostrava – Frýdek Místek při stavbě rychlostní silnice R 3510, R 3611, R 3509
Vegetační výsadba, příprava území	Vykrut zahradní služby a.s., Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh	0,52%	Revitalizace zeleně v lázeňském areálu Luhačovic Regenerace zeleně, regenerace alejí, břehových porostů a solitérních stromů
Geodetické práce	Ing. Martin Šmíd, Obeciny XVII 4152, 760 01 Zlín	0,50 %	geodetické práce v katastru nemovitostí, práce ve výstavbě a inženýrské geodézii a aké provádíme poradenství v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí.
Projekční práce	KAP ATELIER s.r.o. Praha 4, Lhota, Novodvorská 1010/14	0,80%	Kompletní návrh, Vyprty Okružní křižovatka, Most přeložky a komunikace, ul. Jarní, Olomouc - projektové práce
CELKEM %		13,35%	

Datum: 20. 10. 2017

- na základě dohody o plné moci
Společnost Frýdek – Místek, obchvat

Příloha: Harmonogram dle Smluvních podmínek

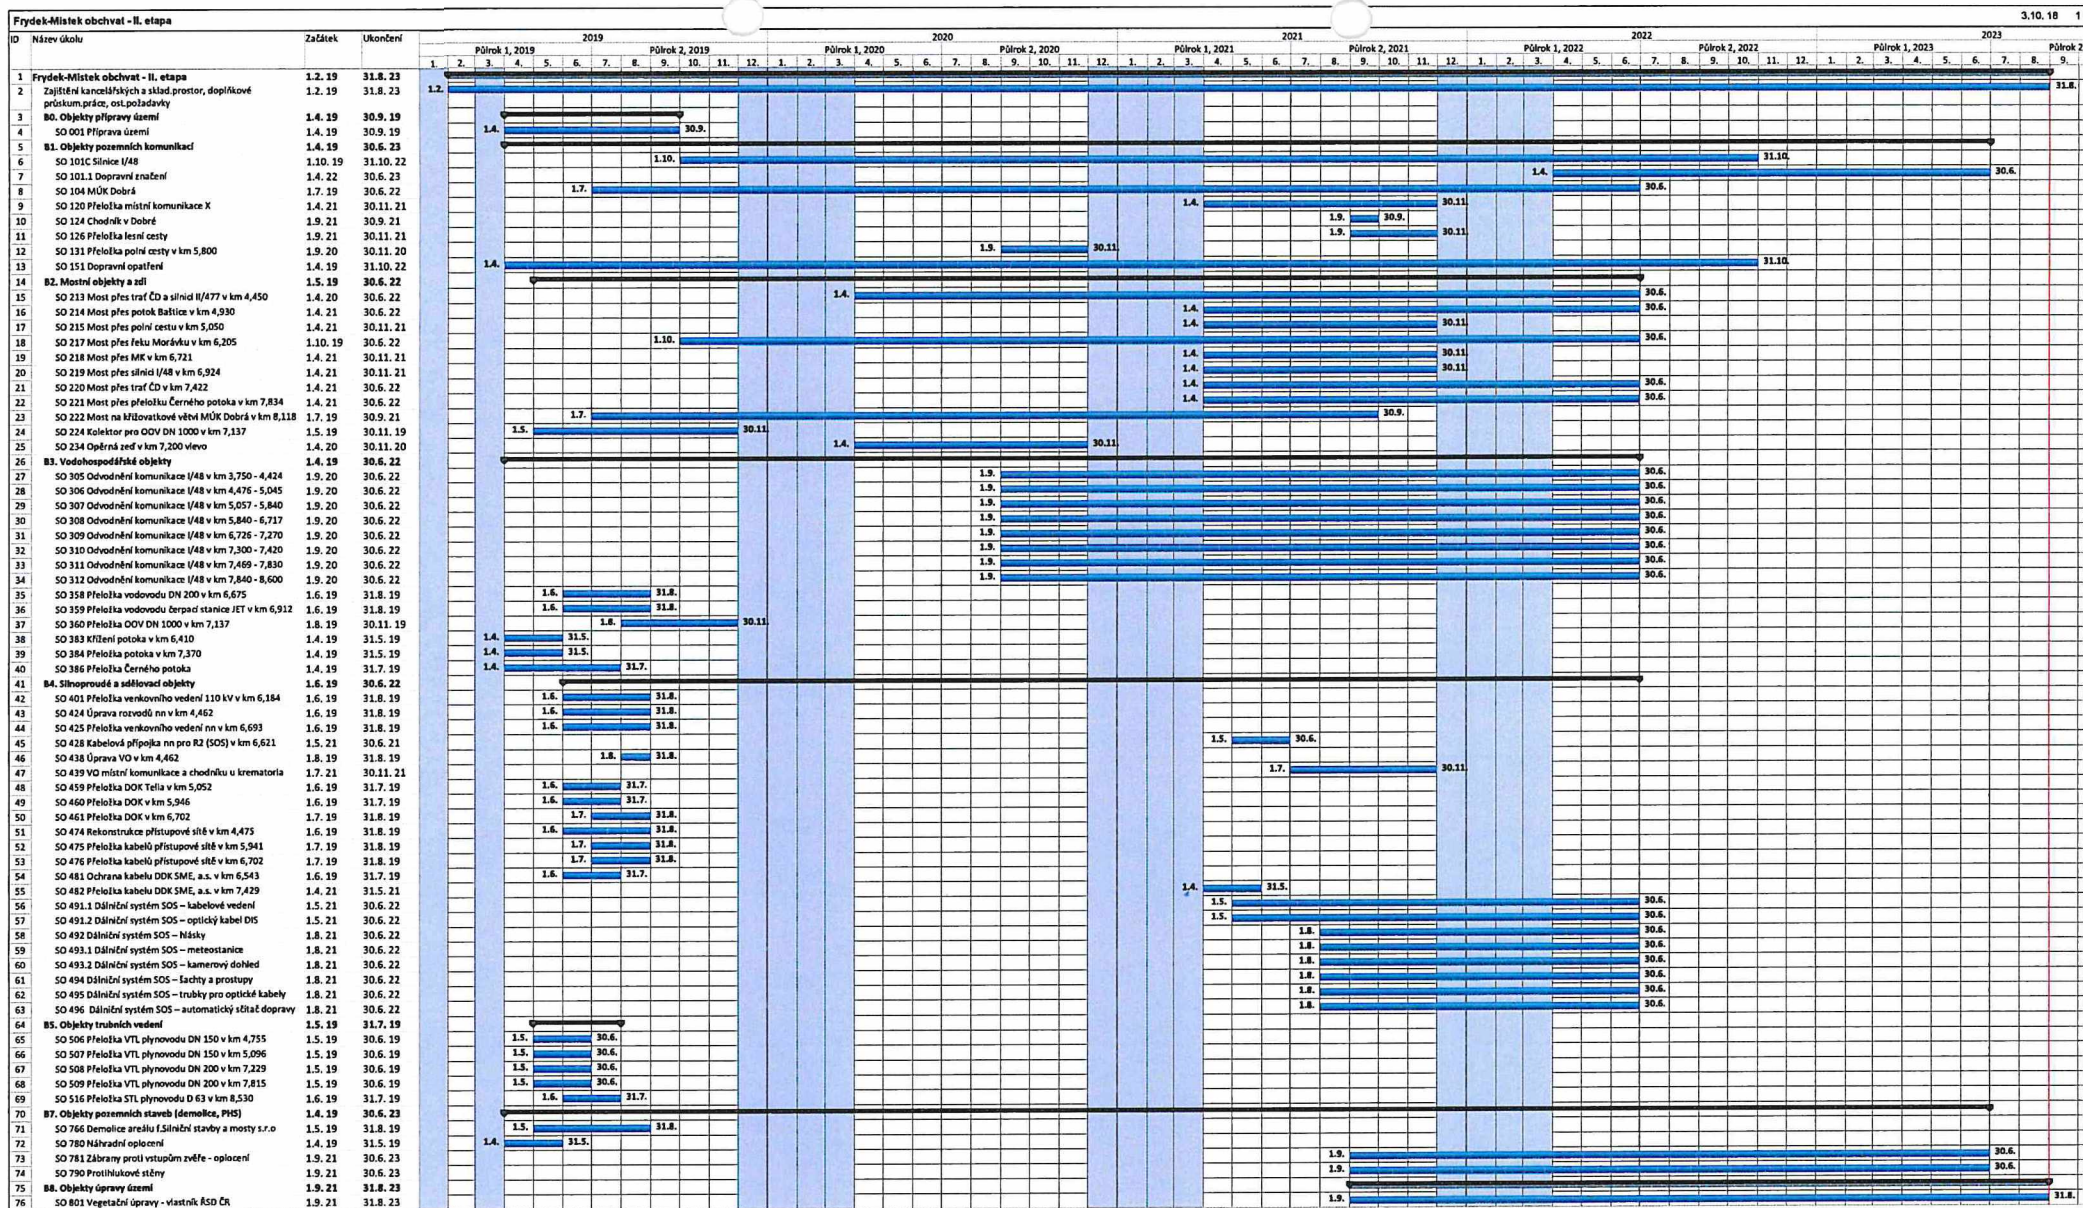

Frydek-Místek obchvat - II. etapa

Finanční harmonogram

Rok	2019												Finanční plnění roční	Milník č.1 18 měsíců	Milník č.2 30 měsíců
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Finanční plnění měsíčně	0,00	113 303,91	453 215,65	903 123,31	6 790 182,08	8 944 522,57	5 605 977,80	5 306 062,25	1 464 443,50	20 674 901,55	20 007 969,23	0,00	70 263 701,83	70 263 701,83	70 263 701,83
Rok	2020												Finanční plnění roční	Milník č.1 18 měsíců	Milník č.2 30 měsíců
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Finanční plnění měsíčně	0,00	0,00	0,00	23 994 272,20	24 794 081,28	23 994 272,20	27 010 658,85	27 010 658,85	28 154 026,42	26 204 008,93	25 358 718,32	0,00	206 520 697,05	99 793 284,53	206 520 697,05
Rok	2021												Finanční plnění roční		Milník č.2 30 měsíců
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Finanční plnění měsíčně	0,00	0,00	0,00	76 507 360,02	71 710 674,90	71 604 874,01	74 123 385,84	90 122 179,74	97 592 800,61	97 311 717,28	94 172 629,63	0,00	673 145 622,03		293 946 294,77
Rok	2022												Finanční plnění roční		
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Finanční plnění měsíčně	0,00	0,00	0,00	88 805 059,12	91 765 228,52	88 805 059,12	37 780 111,70	787 487,96	778 637,62	804 592,22	778 637,62	0,00	310 304 813,88		
Rok	2023												Finanční plnění roční		
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Finanční plnění měsíčně	0,00	0,00	0,00	13 620 875,46	14 755 948,41	16 458 557,85	17 026 094,32	17 593 630,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79 455 106,84		
Odbytová cena Frydek-Místek obchvat - II. etapa													1 339 689 941,64		
Milník č.1: min. 12% z Přijaté smluvní částky bez DPH za práce provedené dle platného harm.do 18 měsíců od zahájení prací													160 762 793,00	170 056 986,36	
Milník č.2: min. 40% z Přijaté smluvní částky bez DPH za práce provedené dle platného harm.do 30 měsíců od zahájení prací													535 875 976,66		570 730 693,66
