

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTEMU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – „IS ZAMĚSTNANOST“ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Jiřím Károlym,

ředitelem odboru rozvoje a bezpečnosti ICT

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha,

č. účtu: 1001885001/2700 (IBAN: CZ462700000001001885001)

zastoupená: Martinem Sůrou, jednatelem

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Poskytovatele: D5645SD1189

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 22. 12. 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 22. prosince 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS ZAMĚSTNANOST“, ev. č. zakázky 498309, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS ZAMĚSTNANOST“ a poskytování souvisejících služeb, která byla následně změněna dodatkem č. 1 ze dne 22. dubna 2016, dodatkem č. 2 ze dne 11. května 2016, dodatkem č. 3 ze dne 19. srpna 2016 a dodatkem č. 4 ze dne 25. ledna 2017 (dále jen „Smlouva“). Zmíněné dodatky upravily mj. též Harmonogram milníků plnění Smlouvy obsažený v Příloze č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy.
- 1.2 Od podpisu Dodatku č. 4 Smlouvy nastaly v průběhu realizace projektu IS ZAMĚSTNANOST zejména následující skutečnosti s dopadem na termín dodání - Posuny integračních milníků souvisejícího projektu IPPD, zejména integrační testy Pohledávek, Dohod APZ, Exekucí a Kontrol, Rozhodnutí zadavatele o posunu nasazení Ekonomického systému Úřadu práce z 1. 7. 2018 na 1. 1. 2019 bez transakčního rozhraní pro IS ZAM, které bude do produkčního provozu uvolněno nejpozději 31.7.2019, pozastavení migračního projektu LIS v období od 20. 2. 2018 do 1.9.2018, pozastavení realizace přípravy povinných statistik Zaměstnanosti v SAP BW, jakož i zjištění nekonzistence ekonomických a agendových dat ve zdrojových systémech Objednatele. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem smluvní strany potvrzují, že je nutné upravit harmonogram plnění vyplývající ze Smlouvy, a to na základě potvrzených termínů integračního harmonogramu Programu JISPSV (příloha č. 2 Dodatku) tak, aby reflektoval uvedené změny termínů a aby mohlo dojít k nasazení IS ZAMĚSTNANOST do produktivního provozu nejpozději k 31. červenci 2019, a to za podmínek smluvními stranami definovanými ve Změnových požadavcích: ZP38 - Evidence případů, ZP46 - Změny legislativy s účinností 2018, ZP50 - Dynamická organizační struktura, ZP53 - SEV 3.0, ZP55 - Cizinci, ZP56 - Cizinci II, ZP57 – Integrace na POVEZ II, ZP59 - Integrace na nový Portál a prvotní naplnění dat portálu, ZP64 - Změna integrace EXI a ZP65 – Součinnosti pro vytvoření GAP analýzy a Metodiky migrace (tyto podmínky reflektují aktuální stav projektu IS ZAMĚSTNANOST k datu uzavření tohoto Dodatku č. 5). Smluvní strany se dohodly na pevných termínech zahájení, resp. dokončení příslušných fází projektu IS ZAMĚSTNANOST, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Vzhledem k tomu, že tyto termíny jsou přímo závislé na včasném poskytnutí součinnosti okolních projektů, činí smluvní strany nesporným, že v případě prodloužení s poskytnutím součinnosti, se tyto pevné termíny automaticky prodlužují o příslušný počet dnů daného prodloužení. Potvrzené termíny součinnosti okolních projektů definují maximální délku realizace projektu IS ZAMĚSTNANOST a plánovaný termín uvolnění do produkčního provozu. V případě posunutí realizace IS ZAMĚSTNANOST za tento termín z důvodu nesplnění termínů součinnosti má Poskytovatel právo na úhradu prokázaných vícenákladů projektu, za podmínek uvedených v Příloze č. 3 tohoto Dodatku, a to za předpokladu naplnění podmínek podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Pro hlavní požadované součinnosti z okolních projektů je v příloze č. 3 Dodatku uvedena doba realizace dodávky v IS ZAMĚSTNANOST. Potvrzené termíny součinnosti budou převzaty z integračního harmonogramu programu JISPSV. Smluvní strany dále

souhlasily s ustanovením IS ZAMĚSTNANOST jako ústředního cíle nasazení v rámci programu JISPSV a přizpůsobení ostatních prvků JISPSV tomuto cíli.

- 1.3 Poskytovatel dále požaduje provedení změny Oprávněné osoby ve věcech smluvních na straně Poskytovatele. Objednatel také požaduje provedení změny Oprávněné osoby ve věcech smluvních na straně Objednatele. Tyto změny jsou tímto Dodatkem promítnuty do Smlouvy.
- 1.4 Z výše uvedených důvodů a z důvodu, že uzavřením tohoto Dodatku č. 5 nedochází k podstatné změně závazku ve smyslu § 222 ZZVZ, smluvní strany přijaly tento Dodatek č. 5 k původní Smlouvě, jehož předmětem je provedení shora uvedeného záměru Smluvních stran.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 1 Dodatku č. 4 Smlouvy se v části „Harmonogram plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravuje Milník pro činnost *Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci* z T3 na T3.1, a doplňují dílčí akceptační milníky $T3.2=T3.1+14,5$ a $T3.3=T3.2+8$. Upravuje se Milník pro činnost *Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat* z T4 na T4.1, a doplňují se dílčí akceptační milníky $T4.2=T3.2+1$ a $T4.3=T3.3+2$ navázané na aktuální příslušnou verzi Návrhu realizace, dále se doplňuje dílčí akceptační milník $T4.4 = T4.3+1,25$, navázaný na poskytnutí migrovaných dat. Upravuje se milník *T5.2 Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku* $T5.2=T4.4+2$. V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace těchto Milníků.
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že na základě zadání Objednatele upravují stávající rozsah realizace, který je mimo jiné definován aktuálním Návrhem realizace verze 2.5.2 tak, že Poskytovatel připraví Návrh realizace verze 2.6.x na základě schválených Změnových požadavků ZP38 - Evidence případů, ZP46 - Změny legislativy s účinností 2018, ZP50 - Dynamická organizační struktura, ZP53 - SEV 3.0, ZP55 - Cizinci, ZP56 - Cizinci II, ZP57 – Integrace na POVEZ II, ZP59 -Integrace na nový Portál a prvotní naplnění dat portálu, ZP64 - Změna integrace EXI a ZP65 - Součinnosti pro vytvoření GAP analýzy a Metodiky migrace a předloží tento Návrh realizace k oponentnímu řízení nejpozději do 30 pracovních dnů od podpisu tohoto Dodatku. Akceptace realizace IS ZAMĚSTNANOST dle tohoto návrhu bude provedena v rámci dílčí akceptace Etapy 4 definované milníkem T4.3, případně v termínu akceptace v předmětném ZP, pokud je v něm uveden. Obsah, rozsah, termíny a podmínky realizace předmětných Změnových požadavků jsou uvedeny zvlášť v příslušném dokumentu Změnového požadavku.
- 2.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně Oprávněné osoby na straně Poskytovatele ve věcech smluvních, a to tak, že namísto pana Emila Fitoše je novou Oprávněnou osobou pan Martin Šůra. Vzhledem k tomu se příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech smluvních na straně Poskytovatele se nahrazuje následující tabulkou:

Jméno a příjmení	Martin Sůra
Adresa	Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4
E-mail	
Telefon	
Fax	

- 2.4 Smluvní strany se dále dohodly na změně Oprávněné osoby na straně Objednatele ve věcech smluvních, a to tak, že namísto pana Roberta Baxy je novou Oprávněnou osobou Mgr. Jiří Károly. Vzhledem k tomu se příloha č. 4 Smlouvy mění tak, že tabulka s údaji o Oprávněné osobě ve věcech smluvních na straně Objednatele se nahrazuje následující tabulkou:

Jméno a příjmení	Mgr. Jiří Károly
Adresa	Na Poříčnickém právu 1/376, 128 01 Praha 2
E-mail	
Telefon	
Fax	

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3.2 Pokud není v tomto Dodatku uvedena výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.
- 3.3 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.4 Tento Dodatek je uzavřen v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a Poskytovatel 2 (dva) stejnopisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram Milníků.

Příloha č. 2: Integrovaný harmonogram Programu JISPSV.

Příloha č. 3: Doba realizace dodávky IS ZAMĚSTNANOST a termíny pro hlavní poskytované součinnosti z okolních projektů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Poskytovatel

V Praze dne _____

V Praze dne _____

.....
**Česká republika – Ministerstvo práce a
sociálních věcí**

Mgr. Jiří Károly,

ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT

.....
Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Martin Sůra, jednatel


Příloha č. 1
Harmonogram Milníků

Činnost	Milník (měsíce)	Začátek	Konec
Start projektu	T	22. 12. 2015	
Vytvoření Návrhu realizace	T1=T+6		21. 6. 2016
Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu	T2=T1+3		21. 9. 2016
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, v rozsahu definovaném ZD a aktualizovaným Návrhem realizace verze 2.4.2 o ZP schválené do 31. 12. 2016	T3.1=(T1+2)+7,25		31. 3. 2017
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, v rozsahu definovaném ZD a aktualizovaným Návrhem realizace verze 2.5.2 o ZP schválené v období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2017	T3.2=T3.1+14,5		19. 6. 2018
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace úvodní migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci, v rozsahu definovaném ZD a aktualizovaným Návrhem realizace verze 2.6.2 o ZP schválené v období 1. 1. 2018 až 30. 9. 2018	T3.3=T3.2+8		19. 2. 2019
Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat v rozsahu ZD a Návrhu realizace verze 2.4.2	T4.1=T3.1+2	1. 4. 2017	30. 5. 2017
Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace vč. migrace dat v rozsahu ZD a Návrhu realizace verze 2.5.2	T4.2=T3.2+1	1. 6. 2018	30. 6. 2018

Ukončení akceptace Implementace a Dokumentace v rozsahu ZD a Návrhu realizace verze 2.6.x	T4.3=T3.3+2	20. 2. 2019	18. 4. 2019
Ukončení akceptace migrace dat v rozsahu ZD a Návrhu realizace verze 2.6.x	T4.4=T4.3+1,25	23.4.2019	31.5.2019
Ověřovací provoz integračních vazeb na související systémy a systémy třetích stran	T5.1=T3.1 + 3	15. 4. 2017	1. 7. 2017
Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku	T5.2=T4.4+2	1. 6. 2019	31. 7. 2019
Zahájení poskytování Služeb podpory provozu	T6=T5.2+1 den	1. 8. 2019	

Příloha č. 2

Integrační harmonogram Programu JISPSV

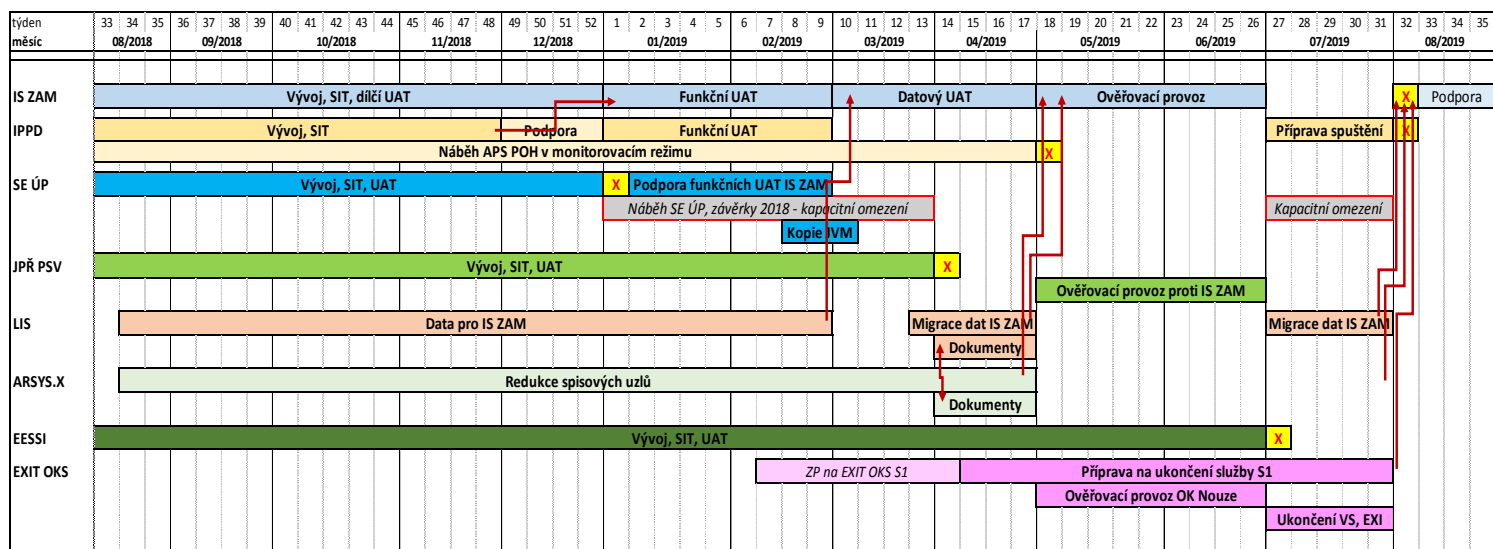

Legenda: X spuštění produkce

Příloha č. 3

Doba realizace dodávky IS ZAMĚSTNANOST a termíny pro hlavní poskytované součinnosti z okolních projektů; vyčíslení vícenákladů

Migrace dat – zajištění potřebných dat

Začátek fáze akceptace migrace dat v rozsahu ZD a Návrhu realizace verze 2.6.x (T4.4) je nejdříve T+30 pracovních dní. T je datum úplného vystavení potřebných dat pro IS ZAMĚSTNANOST pro Uživatelské Akceptační Testy migrace, k čemuž musí dojít nejpozději k 11. 3. 2019. Zejména se jedná o tyto oblasti dat:

- Výstupy projektu LIS
- Číselníky organizační struktury
- Data Agentur práce z klientského portálu ÚP

Provedení a dokončení SIT/DFT testů s ekonomickými systémy mimo exekučních srážek

Dokončení fáze Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele (T3.3) je závislé na dokončení SIT/DFT testů s ekonomickými systémy a proběhne do T+40 pracovních dní. T je datum dokončení SIT/DFT testů s ekonomickými systémy, k čemuž musí dojít nejpozději k 19. 12. 2018.

Provedení a dokončení SIT/DFT testů s ekonomickými systémy pro exekuční srážky

Dokončení fáze Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele (T3.3) je závislé na dokončení SIT/DFT testů s ekonomickými systémy pro exekuční srážky a proběhne do T+10 pracovních dní. T je datum dokončení SIT/DFT testů s ekonomickými systémy pro exekuční srážky, k čemuž musí dojít nejpozději k 5. 2. 2019

Redukce spisových uzlů – výstup projektu ESS

Provedení redukce pro vybrané kraje je předpokladem pro zahájení fáze Ověřovacího provozu Systému v prostředí Objednatele (T5.2), a musí k němu dojít nejpozději k 1. 6. 2019.

Nový portál JPŘ PSV – dokončení SIT testů s Portálem

Dokončení fáze Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele (T3.3) je závislé na dokončení SIT testů s JPŘ PSV a proběhne do T+5 pracovních dní. T je datum dokončení SIT testů s JPŘ PSV a zároveň je rozhodným datem pro stanovení způsobu provedení UAT (T4.3) v oblasti agend navazujících na JPŘ PSV, k čemuž musí dojít nejpozději k 11.2.2019.

Realizace povinných statistik

Provedení realizace a zahájení poskytování povinných statistik na základě dat připravených v exportní databázi systému IS ZAMĚSTNANOST je předpokladem pro zahájení fáze Ověřovacího provozu Systému v prostředí Objednatele (T5.2), a musí k němu ze strany Objednatele dojít nejpozději k 1.6.2019

Vícenáklady realizace projektu po 31. 7. 2019 z důvodu neposkytnutí součinnosti

V případě, že dojde k posunutí realizace a nasazení IS ZAMĚSTNANOST do produkčního provozu za termín 31. 7. 2019 z důvodu nesplnění potvrzených termínů okolních systémů a termínů Objednatele uvedených v harmonogramu Programu JISPSV a zejména termínů výše uvedené součinnosti, a pokud nedojde k písemnému pokynu Objednatele k zastavení prací na IS ZAMĚSTNANOST a akceptaci v tu dobu existující funkcionality IS ZAMĚSTNANOST, znamená takové prodloužení možnost vzniku vícenákladů projektu IS ZAM až do výše 5 470 920 Kč bez DPH za každý měsíc prodloužení. Tyto vícenáklady budou účtovány Objednateli v prokázané a adekvátní výši odpovídající počtu dnů, o které byla realizace projektu IS ZAMĚSTNANOST prodloužena.
