

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: 16PU-002087/16

č. dodavatele/zhotovitele: 030222M0056/1847.8063MMA.01

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED]

oprávněn jednat ve věci této zakázky [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických této zakázky: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupeným [REDACTED]

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047, ISPROFOND** [REDACTED] byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **14 715 280,58** v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047	14 715 280,58	3 090 208,92	17 805 489,50

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630467 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)¹
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)²
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 12, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 1.3.2016

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

¹ Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.


² Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy o dílo předložit na elektronickém datovém nosiči.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.


Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 14 -07- 2016

Datum: 14.7.2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR



V Ostravě dne: 23 -06- 2016

Číslo zakázky: 16PU-002087 Nejvh.nab.4

Vyřizuje: [redacted]

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10

110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO

kontaktní adresa:

odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava

Vratimovská 658/77

718 00 OSTRAVA - KUNČICKY

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047“

zadávací řízení zahájeno dne 25. 02. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 630467 / ISPROFIN / ISPROFOND: [redacted] (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 10 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 5, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

EUROVIA CS, a.s., sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, právní forma: akciová společnost, IČ: 45274924.

Celková nabídková cena uchazeče: 14 715 280,58 Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

MAKOS a.s., sídlo: Sirotčí 1170/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice, právní forma: akciová společnost, IČ: 25825071.

Celková nabídková cena uchazeče: 16 313 028,55 Kč (bez DPH)

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 8, podaná uchazečem

IDS-Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, právní forma: akciová společnost, IČ: 25869523.

Celková nabídková cena uchazeče: 16 354 319,39 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem

ALPINE Bau CZ a.s., sídlo: Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, právní forma: akciová společnost, IČ: 02604795.

Celková nabídková cena uchazeče: 18 140 088,59 Kč (bez DPH)

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 10, podaná uchazečem

Porr, a.s., sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice, právní forma: akciová společnost, IČ: 43005560.

Celková nabídková cena uchazeče: 18 501 842,88 Kč (bez DPH)

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

SDS EXMOST spol. s r.o., sídlo: Údolní 413/66, 602 00 Brno - Veverí, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 49454501.

Celková nabídková cena uchazeče: 18 698 000,00 Kč (bez DPH)

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 11, podaná uchazečem

COLAS CZ, a.s., sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, právní forma: akciová společnost, IČ: 26177005.

Celková nabídková cena uchazeče: 19 353 896,31 Kč (bez DPH)

9. Jako osmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 7, podaná uchazečem

SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 48035599.

Celková nabídková cena uchazeče: 20 370 294,01 Kč (bez DPH)

10. Jako devátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 9, podaná uchazečem

Metrostav a.s., sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, právní forma: akciová společnost, IČ: 00014915.

Celková nabídková cena uchazeče: 21 220 750,57 Kč (bez DPH)

11. Jako desátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

REPONT s.r.o., sídlo: Na Zelině 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou, právní forma: společnost s ručením omezeným, IČ: 26863057.

Celková nabídková cena uchazeče: 23 849 974,50 Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem EUROVIA CS, a.s. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

V Ostravě dne 23-06-2016



Vaše zn.:

Naše zn. 16PU-002087 DOD INF 1

V Ostravě dne 10-03-2016

Věc: Dodatečné informace č. 1 k veřejné zakázce:

„I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047“, číslo zakázky: 16PU-002087, Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 630467 (dále jen „Zakázka“).

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a ustanovením čl. 9 a 10 zadávací dokumentace Zakázky Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné Zakázky:

Číslo dotazu	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele			
1.	Dotaz: SO 430 Veřejné osvětlení je v soupisu prací v aspe pouze 1 položkou s odkazem na příloženou specifikaci, která je v pdf. Můžete upřesnit, jak odevzdat nabídkový rozpočet? Dodatečná informace Uchazeči nacení položku dle příloženého rozpočtu v dílu 5 zadávací dokumentace zakázky část C – STAVEBNÍ ČÁST - SO 430 – Veřejné osvětlení - ROZPOČET - VO - FRÝDEK MÍSTEK - MOST ev.č.48-047.pdf. Pro zjednodušení výpočtu zadavatel přikládá pro uchazeče na profil zadavatele tento rozpočet ve formátu *.excel. V soupisu prací ve formátu XC4 vyplní uchazeči jedinou položku č. 74599 ÚPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SO 430) cenou vypočtenou z pomocného rozpočtu z příložené specifikace (kterou zadavatel přikládá ve formátu excel viz. výše). <u>Zadavatel dále požaduje, aby uchazeči tento vyplněný rozpočet ve formátu excel doložili do nabídky, jako součást soupisu prací.</u> Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.			
2.	Bez předchozí žádosti Dodatečná informace Zadavatel mění obsah řádku s číslem Pod-článek 5.1 Přílohy k nabídce z dílu 1, části 2 zadávací dokumentace zakázky z původního „Nepoužije se“ na níže uvedené: <table border="1"><tr><td>Definice „Jmenovaného podzhotovitele“</td><td>5.1</td><td>Jmenovaným podzhotovitelem položky č. 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (SO 201) je objednatelem určená spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)</td></tr></table>	Definice „Jmenovaného podzhotovitele“	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem položky č. 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (SO 201) je objednatelem určená spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
Definice „Jmenovaného podzhotovitele“	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem položky č. 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZENÍ OCHRANY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (SO 201) je objednatelem určená spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)		

	Vzhledem k výše uvedenému doplňuje zadavatel Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) díl 3, část 2 zadávací dokumentace zakázky takto: čl. 1.3.1. Právní předpisy se doplňuje: Dodavatel musí respektovat smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací, jež je přiložena v zadávací dokumentaci (na zhotovitele přechází povinnost ze smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací). Smlouva bude uzavřena na základě výzvy zhotovitele stavby Zadavatel přikládá Smlouvu s CETIN jako digitální přílohu ZTKP. Tato příloha (Smlouva s CETIN FM most ev 48-04.docx) je uveřejněna na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd Dále v souvislosti s jmenovaným podzhotovitelem se položka soupisu prací č. 03730 POMOC PRÁCE ZAJISTÍ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ze SO 201 oceňuje pevnou neměnnou cenou 51.622,- Kč bez DPH. V důsledku výše uvedených změn se navýšila předpokládaná cena uvedená v Oznámení o zakázce na Věstníku veřejných zakázek z 29.777.428,- Kč bez DPH na 29.779.050,- Kč bez DPH. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.
3.	Dotaz: V příloženém výkazu výměr ve formátu .xml je pouze odkaz na přílohu SO 430 – Veřejné osvětlení. Příloha s výkazem výměr pro tento objekt je v PD ale pouze ve formátu .pdf. Prosím tedy o zaslání výkazu výměr v editovatelné podobě (.xls) Dodatečná informace Odpověď viz: dotaz č.1


Přílohou těchto dodatečných informací je Soupis prací obsahující všechny změny, doplnění v rámci Dodatečných informací č. 1 ve formátu XC4, který bude zveřejněn na profilu zadavatele.

Zadavatel vzhledem ke změně zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek je nově stanovena na **29. 03. 2016, 09:00 hod**

Ve smyslu výše uvedeného se mění články 6.1 a 8.1 dílu 0 zadávací dokumentace předmětné zakázky

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd>, ID: 9590).



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Vaše zn.:

Naše zn.: 16PU-002087 DOD-INF.3

V Ostravě dne:

24-03-2016

Věc: Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce:

„I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047“, číslo zakázky: 16PU-002087, Oznámení o zakázce zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 630467 (dále jen „Zakázka“).

V souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a ustanovením čl. 9 a 10 zadávací dokumentace Zakázky Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné Zakázky.

Číslo dotazu	Přesné znění dotazu/žádosti dodavatele
6.	Dotaz: V poskytnutém výkazu výměr je množství položky č. 38 – 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU a měrnou jednotkou M3 pravděpodobně stanoveno jako celkový objem všech kanálků předpinací výztuže na mostě. Při vědomí, že více než polovinu objemu kanálků vyplňuje předpinací výztuž a že možnost proinjektovat kanálky se určitě neblíží 100 % zbytku objemu kanálků, je velmi pravděpodobné, že při fakturaci dojde k čerpání pouze zlomku předpokládaného množství položky. Velkou část ceny ovšem tvoří fixní náklady závislé především na počtu kotev, který bude neměnný. Mohl by zadavatel změnit u této položky výpočet množství na reálnější hodnotu nebo měrnou jednotku, aby bylo možné řádně ocenit provedení těchto prací? Dodatečná informace Zadavatel upravil měrnou jednotku a množství položky č. 38 – 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU v soupisu prací SO 201 na 270 kusů a přidal do soupisu prací odpovídající popisek. V důsledku výše uvedených změn se změnila předpokládaná cena uvedená v Oznámení o zakázce na Věstníku veřejných zakázek z 29.779.050,- Kč bez DPH na 29.817.711,- Kč bez DPH. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.
7.	Dotaz: V popisu položky č. 42 – 289368 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU ZE STARŠÍ SÍTI je uvedeno, že se jedná o síť d=2mm, oko 400/400mm. Domníváme se správně, že obsahem této položky je síť z nerezových drátů s oky 40/40mm zmíněnou v Technické zprávě v článku 4.2.5.2 na str. 8? Dodatečná informace Ano, uchazeč se domnívá správně. V soupisu prací došlo k přepisu. V popisu položky č. 42 – 289368 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU ZE STARŠÍ SÍTI má být uvedeno: síť d=2mm, oko 40/40mm nerezová. Tato dodatečná informace představuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace předmětné zakázky.
8.	Dotaz: U mostu SO 201 je pol.č. 60 - 45747 - VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ

	(PLASTMALTA) = 58,045 M3. Není omylem uvedena špatná výměra, nemá být 5,8 M3? Můžete upřesnit?
	Dodatečná informace Výměra u položky u SO 201 č. 60 - 45747 - VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) je uvedena správně. Je to rezerva pro případ, že spádová vrstva po zaměření skutečného stavu nosné konstrukce vyjde v menších tloušťkách, než dovoluje provedení vrstvy ze železobetonu (< 50mm). Zhotovitel proplatí skutečně použitou výměru železobetonu nebo plastbetonu při opravě.

Přílohou těchto dodatečných informací je Soupis prací obsahující všechny změny, doplnění v rámci Dodatečných informací č. 1-3 ve formátu XC4, který bude zveřejněn na profilu zadavatele.

Zadavatel vzhledem ke změně zadávací dokumentace v dodatečných informacích k zadávacím podmínkám zakázky rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek je nově stanovena na **05. 04. 2016, 09:00** hod.

Ve smyslu výše uvedeného se mění články 6.1 a 8.1 dílu 0 zadávací dokumentace předmětné zakázky.

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRsd>, ID: 9590).

S pozdravem

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy o dílo, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047	14 715 280,58	3 090 208,92	17 805 489,50

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
- (c) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (d) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (g) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

- Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy o dílo, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: [REDACTED]

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem ČR v zastoupení: EUROVIA CS, a.s.

Adresa: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Datum: 1.4.2016

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 Korespondenční adresa a adresa pro písemný styk: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava- Kunčičky
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	[REDACTED] Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	6 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Doba pro uvedení do provozu	1.1.3.10	6 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců pro mosty a 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt jinak. Celková záruční doba na následující technologie či objekty bude činit: (a) hydroizolace mostů 84 měsíců
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se
Dílo	1.1.5.8	I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3% Přijaté smluvní částky
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 73.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> 15.400,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním postupného závazného milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a), b), c) v Příloze k nabídce
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 30.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec</i> 140.000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 14.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení do provozu</i> 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
	4.29	Nepoužije se
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Jmenovaným podzhotovitelem položky č.03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝTSKÝCH SÍTÍ (SO 201) je objednatelem určená spol. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN)
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	<i>Použije se pod-článek 13.8.1</i>
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržovaných plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 1.4.2016



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

DÍL 3, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název veřejné zakázky: I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047

Číslo veřejné zakázky: 16PU-002087

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP

Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007,

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998

a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120

ze dne 21.2.2000.

Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120

ze dne 30.6.1998

Praha 2006

Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP

Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047
Stavební práce v otevřeném řízení

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2,
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1
ze dne 12.3.2008
Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP

Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3
ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 19811/99-120
ze dne 19.3.1999
Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP

Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/1
ze dne 15.12.2003
Praha, duben 2008

Kapitola 9 TKP **Kryty z dlažeb a dílců**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP **Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/1
ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1
ze dne 20.12.2002
Praha, srpen 2010

Kapitola 11 **Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1
ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010
se současným zrušením pátého znění této kapitoly
TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/1
ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP **Trvalé oplocení**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, březen 2008

Kapitola 13 TKP **Vegetační úpravy**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/1
ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120
ze dne 27.10.1997
Praha, srpen 2006

Kapitola 14 TKP **Dopravní značky a dopravní zařízení**

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015,
s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015
Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP **Osvětlení pozemních komunikací**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,
s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1
schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013
Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP **Piloty a podzemní stěny**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1
ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011
se současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP **Beton pro konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29.8.2005
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP **ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce** **ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3
ze dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015,
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008
Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/1 ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014,
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-
IPK/1 ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP **Pylony a mostní závěsy**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK, č.j. 17236/00-120
ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

Kapitola 21 TKP

Izolace proti vodě

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/1

ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP

Mostní ložiska

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD - OI, č.j. 653/07-910-IPK/1

ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000.

Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/1

ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007.

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120

ze dne 21. 2. 2000

Praha, květen 2007

Kapitola 24 TKP

Tunely

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/1

ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007.

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120

ze dne 19.3.1999

Praha, prosinec 2006

Kapitola 25 TKP

Protihlukové clony

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009, s účinností od 1.4.2009

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/1

ze dne 20.12.2002

Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP

Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015,

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

Kapitola 27 TKP

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015,

s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP

schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění

kapitoly 28 TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/1 ze dne 12.3.2008

Praha, únor 2015

Kapitola 29 TKP

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/1

ze dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/1

ze dne 15.12.2003

Praha, prosinec 2010

Kapitola 30 TKP **Speciální zemní konstrukce**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1

ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010

se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP

schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120

Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP **Opravy betonových konstrukcí**

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/1

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP

Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120

Ze dne 19.3.1999

Praha, květen 2009

Při stavbě bude aplikováno nejnovější vydání TKP s datem účinnosti k Základnímu datu podle VOP ve znění ZOP.

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 3, ČÁST 2 **ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ** **PODMÍNKY**

Název veřejné zakázky: I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047

Číslo veřejné zakázky: 16PU-002087

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP“)

pro stavbu

„I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047“

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňují a doplňují jejich obecná ustanovení. Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu.

KAPITOLA 1

VŠEOBECNĚ

1.8 STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí zhotovitel. Zhotovitel zajistí fotografickou dokumentaci staveniště před zahájením stavebních prací.

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:

Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél celé stavby.

1.8.6 Inženýrské sítě se doplňuje:

Zhotovitel je povinen zajistit vytýčení inženýrských sítí, dotčených stavbou jejich správci s dostatečným předstihem před zahájením stavebních prací podle podmínek stanovených ve vyjádřeních jednotlivých správců a stavebního povolení.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:

Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává během stavby majetkem zhotovitele.

1.8.10 Základní podmínky pro užívání staveniště

čl. 8 se doplňuje:

Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám stavebního povolení.

1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat ochranná pásma inženýrských sítí.

1.11 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:

Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek a po odsouhlasení příslušným orgánem státní správy před zahájením stavebních prací jej předá objednateli.

1.11.5 Ochrana povrchových a podzemních vod

1. věta se upřesňuje:

V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod.

1.11.6 Odpady

Podmínkou je, že vyzískanou vyfrézovanou dřev zhotovitel odkoupí – min. 117 Kč/t a kovový šrot za 5.000 Kč/t. Pro odkoupení drtě bude uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

1.11.6.4 Zařazení odpadů se doplňuje:

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

KAPITOLA 2

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

2.10 EKOLOGIE

2.10.2 Skládky, mezideponie se doplňuje:

Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.

Zimní technoplogická přestávka

Správce stavby si pro zimní období vyhrazuje právo z důvodu dodržení technologických lhůt vydat pokyn k přerušení prací. Toto přerušení staví lhůtu pro dokončení prací uvedenou v příloze k nabídce bez jakýchkoliv nároků zhotovitele vůči objednateli. Toto případné přerušení prací nebude mít vliv na cenu prací, ani na uložení případných sankcí zhotoviteli.

DÍL 1, ČÁST 4

FORMULÁŘ 4.4.2

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: EUROVIA CS, a.s. IČ 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630467 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo

s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

- **Podvodné jednání (Fraudulent practice)** znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel (Employer)** je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel (Public official)** je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky (Prohibited practice)** znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Ostravě dne 24.3.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.5
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha I,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630467 (dále jen „uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Vyfrézovaná obalovaná směs	158 t	117,- Kč/t bez DPH
Kovový šrot	7,5 t	5.000,- Kč/t bez DPH

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V Ostravě dne 24.3.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.6
HARMONOGRAM, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630467 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí, že

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu,

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích:

Provedení prací postupně pro první a druhou polovinu mostu:

- provizorní dopravní značení
- odstranění mostního svršku a vybavení,
- odstranění závěrných zídek a části přechodových desek,
- zvedání NK
- spřažení, betonáž
- úložné prahy, osazení ložisek,
- spuštění NK
- osazení mostních závěrů
- izolace mostovky,
- římsy,
- vozovka,
- izolace mostovky,
- římsy,
- vozovka,
- svodidla a zábradlí,
- sanace spodní stavby

DZN

Dlažby pod mostem a dokončující práce

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, jehož součástí je rovněž harmonogram odevzdání jednotlivých částí RDS a harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:


Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
sanace	DUPIC s.r.o. K Šatlavě 2186/2, 741 01 Nový Jičín	19,0 %	Trojanovice Most ev. č. 4866-1 přes řeku Lubínu / Životice u Nového Jičína rek. mostu ev. č. 4832-7
systém výstupní kontroly RDS	PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Brno	0,1 %	Silnice I/42 Brno, Žabovřesky, mosty ev. č. 42-002.1,2 a 52-002A.1,2 / Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B.
dopravní značení	Bur&Ann.CZ,s.r.o.. Ostrava-Vítkovice, Štramberská 1245/23, PSČ 703 00	0,8 %	- Přeč.na sil.I/56 ve městě Kravaře 09/2012/ 183 tis. - Terminál Hranečnick /2015-16/ Ostrava/ 112 tis.
štětovnice	Geostav spol.s r.o. Objízdna 1897, 765 02 Otrokovice	0,7 %	Uzel Pízeň-přestavba Pražského zhlaví Nový žel.most přes Váh
mostní izolace	IZOMEX, s.r.o. Soběšická 962/88, 614 00 Brno-Sever, Husovice	5,6 %	- R6 Nové Sedlo-Sololov, most SO 202, 2011 - Trinec-Baliny, izolace mostů, 2009
CELKEM %		26,2 %	


Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Ostravě dne 24.3.2016

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.) a harmonogram předání RDS.



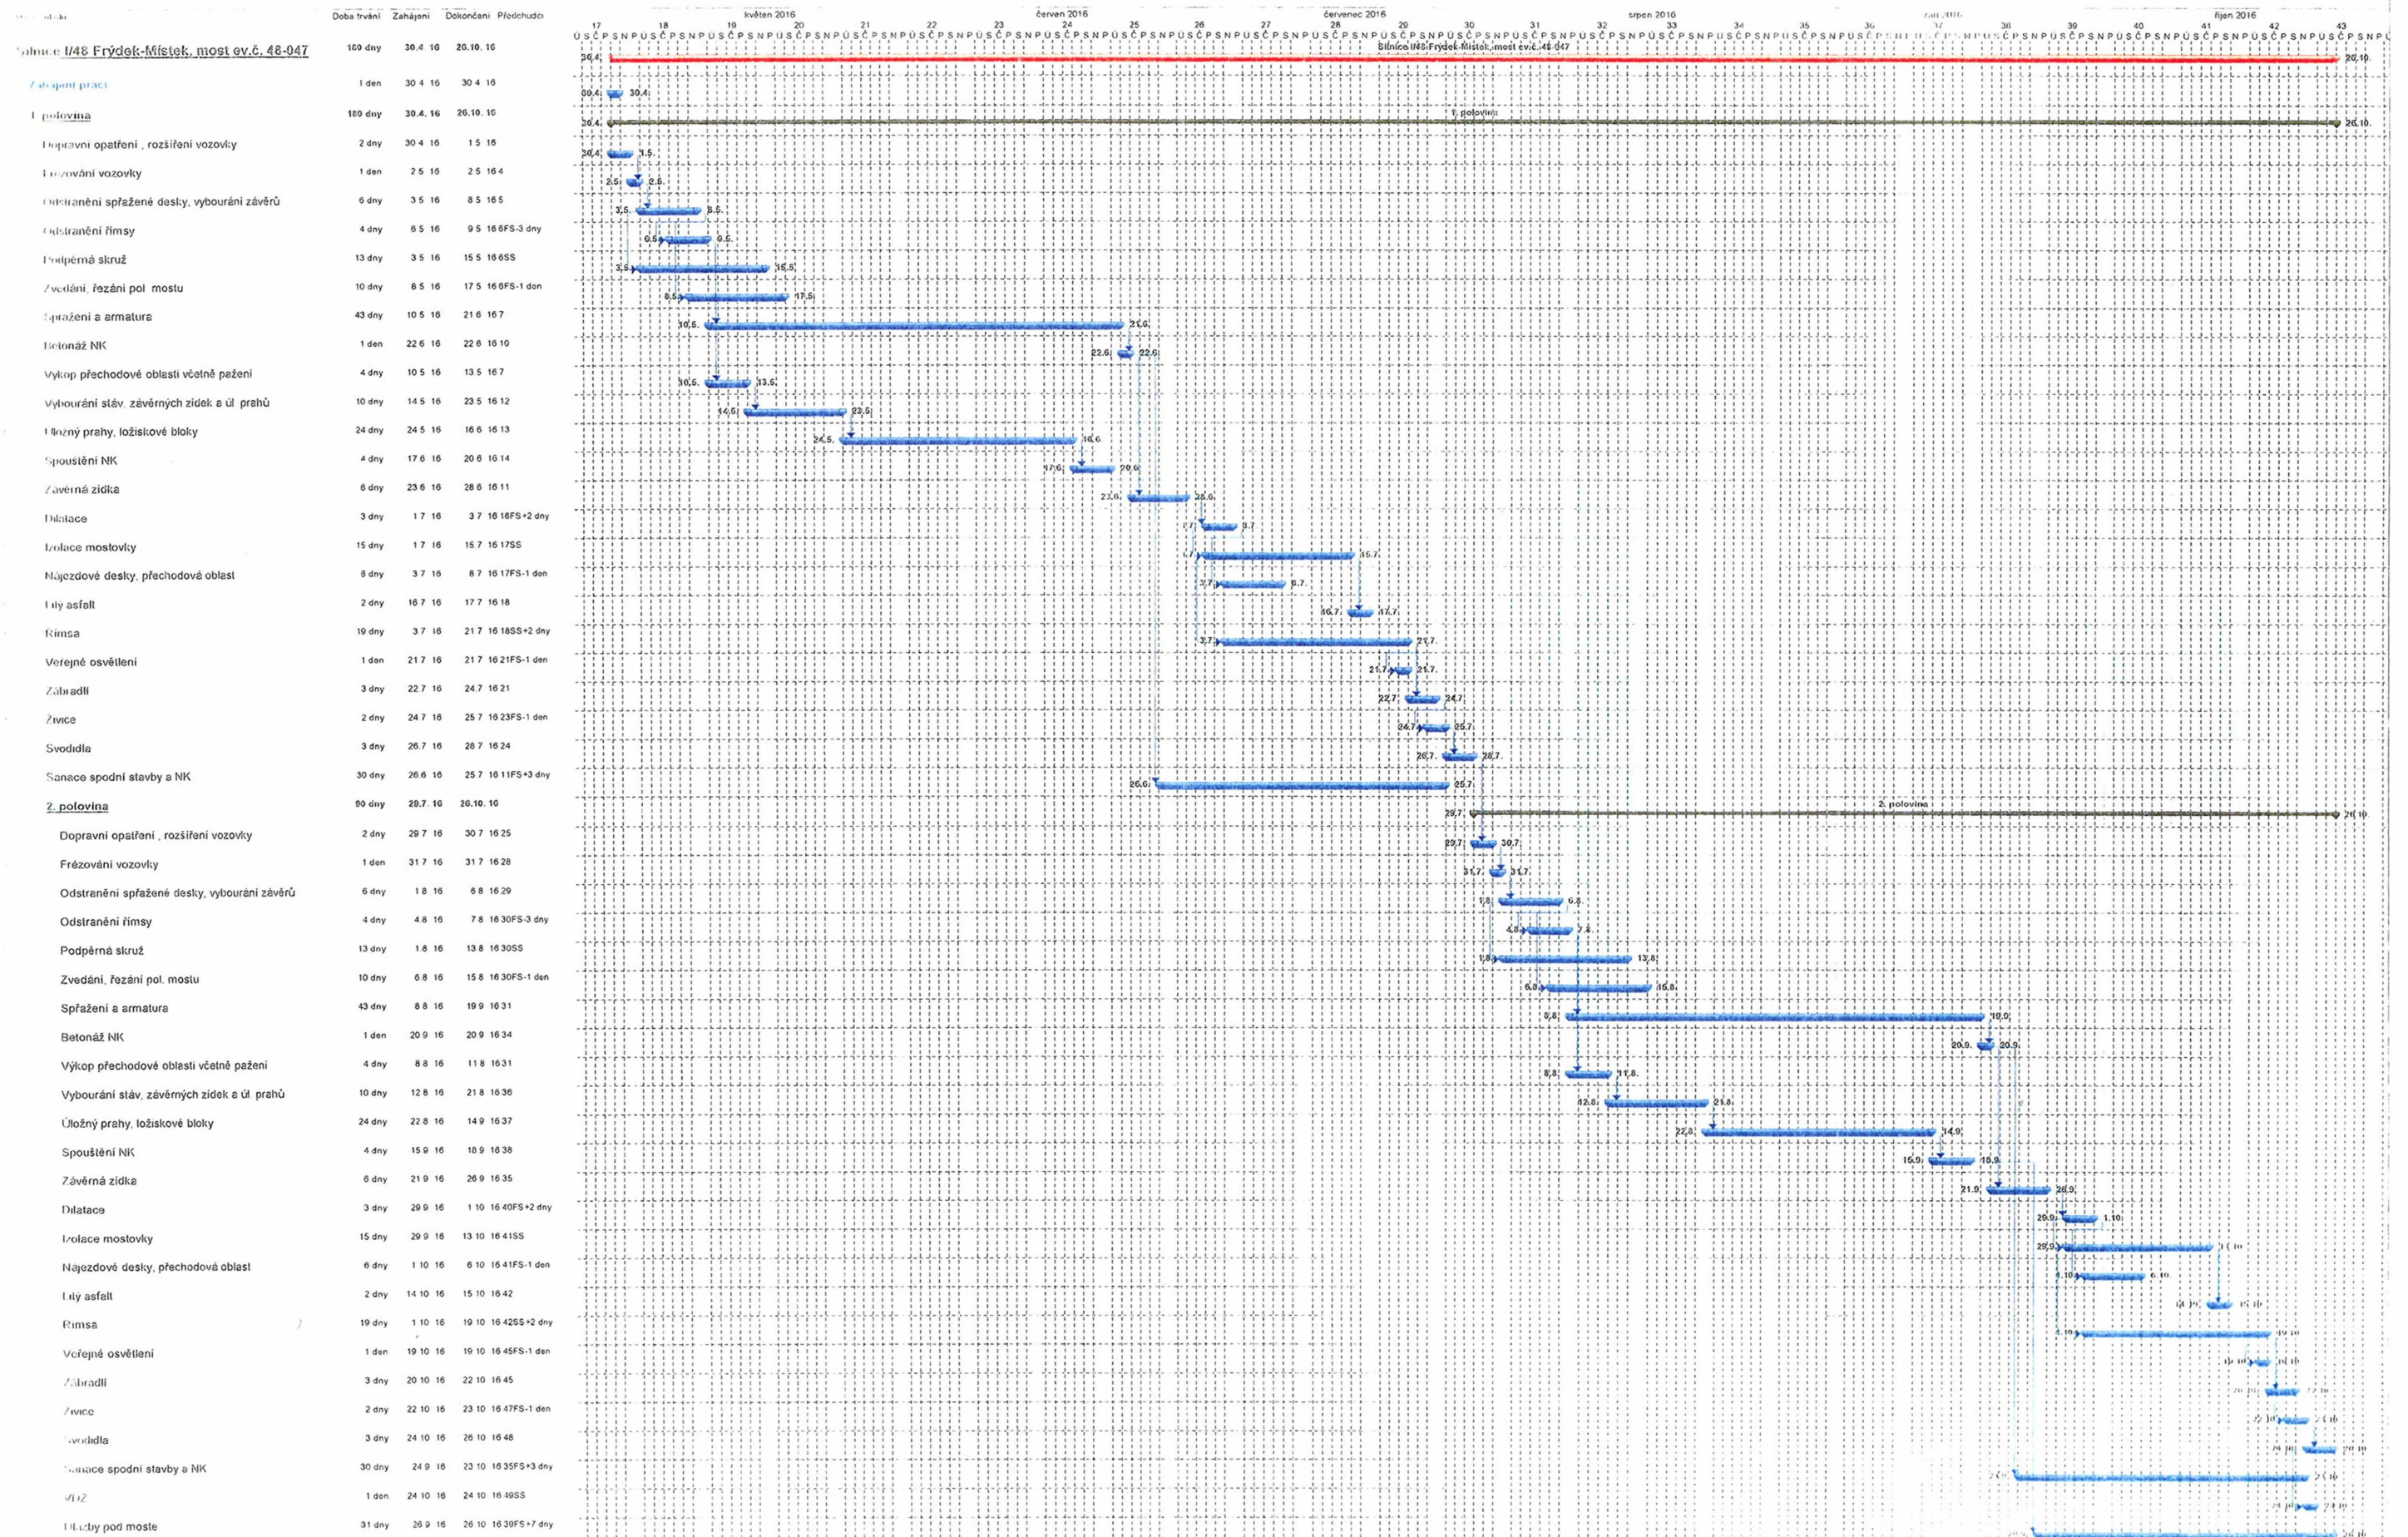

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.7
SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY RDS

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630467 (dále jen „uchazeč“), tímto s ohledem na povinnost zhotovitele zajistit účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) projektantem zejména z hlediska její věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a Smlouvou o dílo (včetně zejména technických podmínek), uvádí, že na výstupní kontrole realizační dokumentace stavby (RDS) se bude podílet následující osoba:

Název / jméno	IČ / datum narození	Sídlo / bydliště
PK OSSENDORF s.r.o.	255 64 901	Tomešova 503/1 602 00 Brno

Přílohou tohoto dokumentu je systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby (RDS) uchazeče, podle kterého bude kontrola výše uvedenou osobou prováděna.

V Ostravě dne 24.3.2016

I/48 Frýdek-Místek, most ev.č. 48-047

Systém výstupní kontroly realizační dokumentace stavby

Dodavatel zajistí účinnou a kvalifikovanou výstupní technickou kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) z hlediska její kompletnosti, věcné správnosti a souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a smlouvou o dílo (včetně ZTKP), prostřednictvím firmy projektanta **PK OSSENDORF s.r.o.**, IČ 25564901 se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-

Výstupní technická kontrola realizační dokumentace stavby (RDS) bude prováděna kvalifikovaným projektantem, který v žádném časovém okamžiku pro zadavatele nezpracovával ani nebude zpracovávat projektovou dokumentaci pro provedení stavby nebo vykonávat autorský dozor nebo technický dozor investora ve vztahu k této stavbě.

Kontrolu realizační dokumentace stavby (RDS) bude provádět subdodavatel nebo dodavatel, resp. právnická či fyzická osoba s autorizací v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb (dle toho, co příslušné osoby provádí za kontrolu).

Výstupní kontrolou RDS se rozumí prověření věcné správnosti, souladu s platnými a účinnými právními předpisy, technickými normami a zejména technickými podmínkami investora.

Kontrola bude prováděna prostřednictvím autorizovaných osob dle odbornosti jednotlivých stavebních objektů.

Kontrola realizační dokumentace stavby (RDS) bude probíhat následovně:

- účastí na jednáních v průběhu projekčních prací,
- kontrola KONCEPTU realizační dokumentace,
- kontrola ČISTOPISU realizační dokumentace,
- kontrola dokumentace změn během výstavby (v rozsahu RDS).

Kontrola KONCEPTU i ČISTOPISU RDS bude zahrnovat:

- ověření plnění požadavků zadávací dokumentace zakázky a smlouvy o dílo,
- ověření technické a věcné správnosti návrhů a výpočtů,
- ověření koordinace jednotlivých částí a objektů stavby,
- ověření souladu obsahu a rozsahu dokumentace s požadavky technických norem a resortních předpisů.

Výstupem kontroly bude:

- připomínky a doporučení jako součást zápisů z výrobních výborů,
- protokol o připomínkách ke konceptu PD,
- protokol o kontrole zpracování připomínek čistopisu PD,
- protokol o připomínkách k dokumentaci změn během výstavby.

V Ostravě dne 24.3.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A
PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630467 (dále jen „uchazeč“), tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) patentu či užitného vzoru	Popis zařízení či technologického procesu, který je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k patentu či užitnému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky
1.	Netýká se.			
2.				

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č.	Název a identifikace (zejm. číslo, datum udělení, resp. registrace do příslušného rejstříku) průmyslového vzoru	Popis věci, výrobku či zařízení, které je předmětem ochrany	Právní titul uchazeče k nakládání s právy k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných ustanoveních Smlouvy o dílo	Termín expirace právní ochrany průmyslového vzoru na území České republiky
1.	Netýká se.			
2.				

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Ostravě dne 24.3.2016

DÍL 1, ČÁST 4
FORMULÁŘ 4.4.12
SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost EUROVIA CS, a.s.,
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/48 Frýdek-Místek, most ev. č. 48-047,
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 630467 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky
uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 %

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavateli uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]

alternativa A

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři.

V Ostravě dne 24.3.2016

Vyplněný formulář bude přílohou Smlouvy o dílo.
