Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ ***"Pošta a Depo Frýdek-Místek 1 a 70, Sadová - rekonstrukce kanalizace a dvora"***

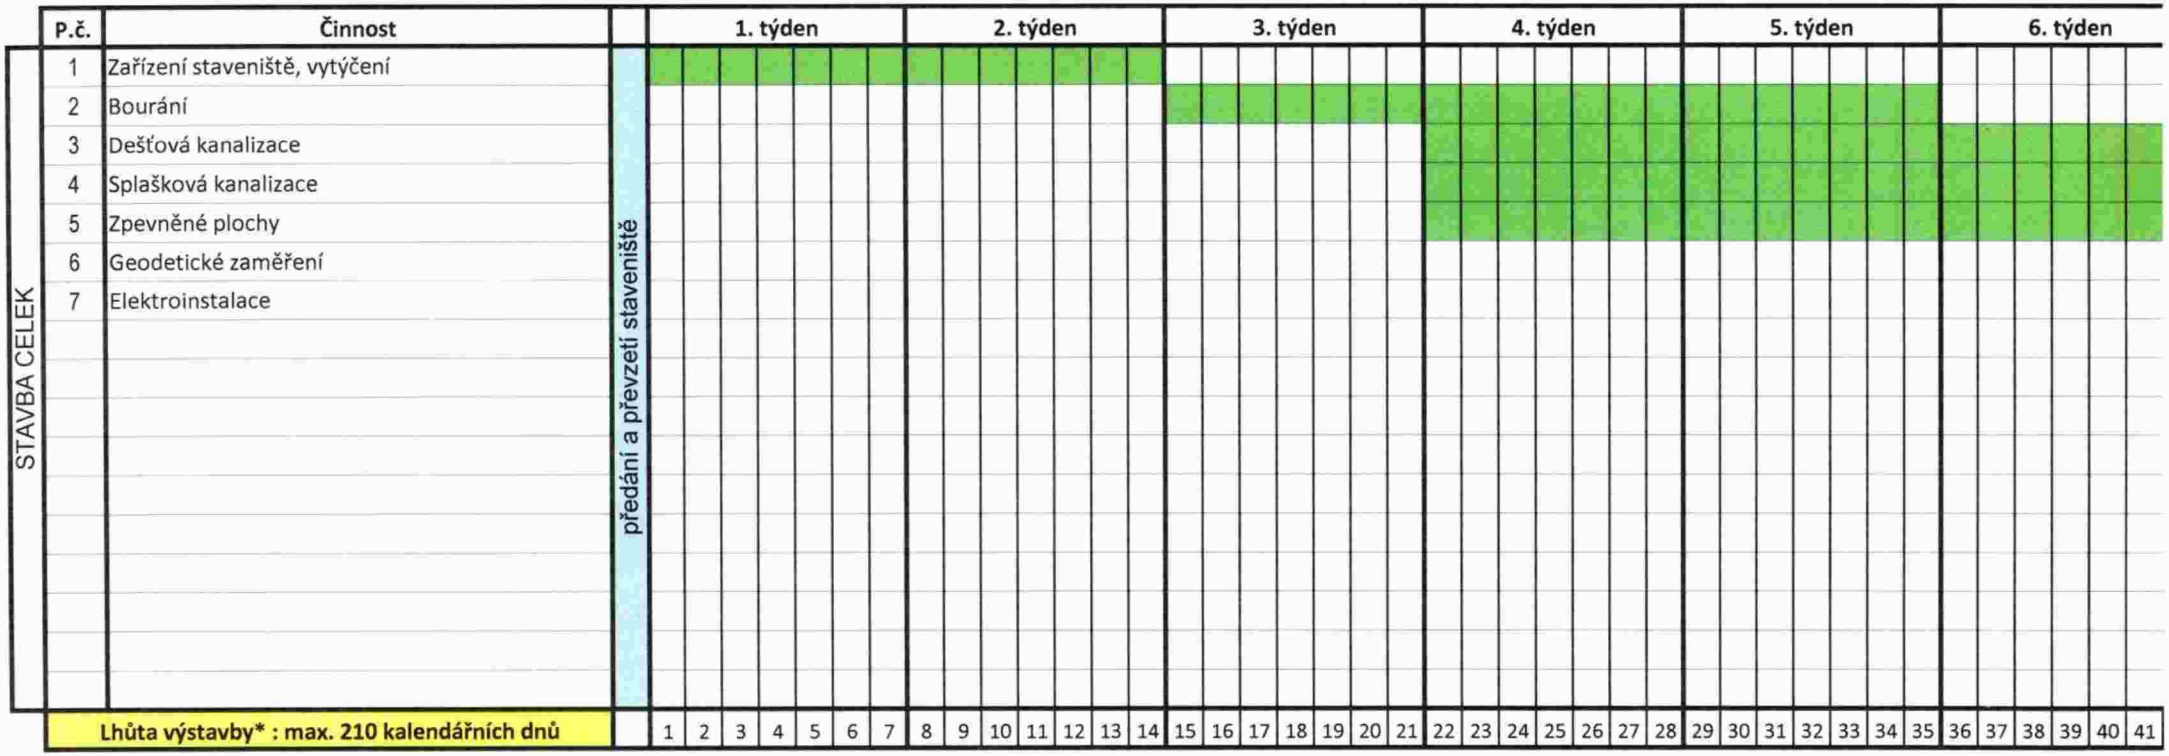

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.

14.12.2018

[redacted]

RIE
stavebn
738 01

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ

	P.č.	Činnost		7. týden							8. týden							9. týden						
STAVBA CELEK	1	Zařízení staveniště, vytýčení																						
	2	Bourání																						
	3	Dešťová kanalizace																						
	4	Splašková kanalizace																						
	5	Zpevněné plochy																						
	6	Geodetické zaměření																						
	7	Elektroinstalace																						
		Lhůta výstavby* : max. 210 kalendářních dnů	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ

	P.č.	Činnost	10. týden							11. týden							12. týden							13. týden							14. týden							15. týden					
STAVBA CELEK	1	Zařízení staveniště, vytýčení																																									
	2	Bourání																																									
	3	Dešťová kanalizace																																									
	4	Splašková kanalizace																																									
	5	Zpevněné plochy																																									
	6	Geodetické zaměření																																									
	7	Elektroinstalace																																									
		Lhůta výstavby* : max. 210 kalendářních dnů	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ

	P.č.	Činnost			16. týden							17. týden						
STAVBA CELEK	1	Zařízení staveniště, vytýčení																
	2	Bourání																
	3	Dešťová kanalizace																
	4	Splašková kanalizace																
	5	Zpevněné plochy																
	6	Geodetické zaměření																
	7	Elektroinstalace																
		Lhůta výstavby* : max. 210 kalendářních dnů	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ

	P.č.	Činnost	18. týden							19. týden							20. týden							21. týden						
STAVBA CELEK	1	Zařízení staveniště, vytýčení																												
	2	Bourání																												
	3	Dešťová kanalizace																												
	4	Splašková kanalizace																												
	5	Zpevněné plochy																												
	6	Geodetické zaměření																												
	7	Elektroinstalace																												
Lhůta výstavby* : max. 210 kalendářních dnů			120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ

	P.č.	Činnost	22. týden							23. týden							24. týden							25. týden						
STAVBA CELEK	1	Zařízení staveniště, vytýčení																												
	2	Bourání																												
	3	Dešťová kanalizace																												
	4	Splašková kanalizace																												
	5	Zpevněné plochy																												
	6	Geodetické zaměření																												
	7	Elektroinstalace																												
		Lhůta výstavby* : max. 210 kalendářních dnů	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175

* Lhůta výstavby je počítána ode dne na

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ

	P.č.	Činnost	26. týden							27. týden							28. týden							29. týden						
STAVBA CELEK	1	Zařízení staveniště, vytýčení																												
	2	Bourání																												
	3	Dešťová kanalizace																												
	4	Splašková kanalizace																												
	5	Zpevněné plochy																												
	6	Geodetické zaměření																												
	7	Elektroinstalace																												
	Lhůta výstavby* : max. 210 kalendářních dnů		176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram k VZ

	P.č.	Činnost	30. týden						
STAVBA CELEK	1	Zařízení staveniště, vytýčení							předání díla
	2	Bourání							
	3	Dešťová kanalizace							
	4	Splašková kanalizace							
	5	Zpevněné plochy							
	6	Geodetické zaměření							
	7	Elektroinstalace							
Lhůta výstavby* : max. 210 kalendářních dnů			204	205	206	207	208	209	210

* Lhůta výstavby je počítána ode dne ná
