Časový harmonogram realizace zakázky "Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o."

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Časový harmonogram realizace zakázky "Tělocvična u ZŠ a MŠ G. Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, p. o."**	343 dny	09.05. 18	16.04. 19
2	**předmět díla**	343 dny	09.05. 18	16.04. 19
3	Předání a převzetí staveniště, zahájení provádění díla	1 den	09.05. 18	09.05. 18
4	Milník 1 - Předání a převzetí staveniště, zahájení provádění díla	0 dny	09.05. 18	09.05. 18
5	zajištění všech nezbytných průkazů	20 dny	10.05. 18	29.05. 18
6	pasport (foto) dotčených stavebních objektů a komunikací	20 dny	10.05. 18	29.05. 18
7	geodetické vytýčení a zaměření, aktualizace IG, vytýčení sítí, mapy jaká (inženýr. hlasy), harmonogram, dopracování PD, provizorní komunikace, ostatní přípravné práce	30 dny	10.05. 18	08.06. 18
8	dopravně inženýrské opatření	200 dny	10.05. 18	13.02. 19
9	zřízení staveniště, ochranné, zábranné zeminy	6 dny	10.05. 18	15.05. 18
10	propagace (veřejnosti/ pane)	3 dny	10.05. 18	21.05. 18
11	Milník 2 - Ukončení přípravné fáze, zahájení stavebních prací	0 dny	08.06. 18	08.06. 18
12	**Stavební práce**	311 dny?	09.06. 18	15.04. 19
13	**SO 01 - Tělocvična**	311 dny	09.06. 18	15.04. 19
14	1 - Zemní práce	30 dny	09.06. 18	20.08. 18
15	2 - Základání	31 dny	29.06. 18	18.08. 18
16	3 - Svislé a kompletní konstrukce	75 dny	03.09. 18	16.11. 18
17	4 - Vodorovné konstrukce	90 dny	19.08. 18	16.11. 18
18	6 - Úpravy povrchů, podlahy a obklad výplní	130 dny	02.11. 18	11.03. 19
19	8 - Trubní vedení	7 dny	19.08. 18	25.08. 18
20	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	180 dny	09.06. 18	13.04. 19
21	997 - Přesun suti	5 dny	27.09. 18	01.10. 18
22	998 - Přesun hmot	155 dny	29.06. 18	30.11. 18
23	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	15 dny	09.08. 18	23.08. 18
24	712 - Povlakové krytiny	56 dny	02.11. 18	31.12. 18
25	713 - Izolace tepelné	100 dny	07.11. 18	28.02. 19
26	**721 - Zdravotní technika**	145 dny	03.08. 19	25.01. 19
27	Zdravotní technika	110 dny	08.10. 18	25.01. 19
28	Dešťová kanalizace	15 dny	03.08. 18	19.11. 18
29	Splašková kanalizace	15 dny	03.08. 18	19.11. 18
30	725 - Zdravotní technika - zařizovací předměty	54 dny	16.02. 19	10.04. 19
31	**731 - Ústřední vytápění**	146 dny	18.11. 18	10.04. 19
32	Ústřední topení	110 dny	16.11. 18	10.04. 19
33	Měření a regulace	30 dny	12.03. 19	10.04. 19
34	**741 - Elektroinstalace - silnoproud**	153 dny	08.11. 18	10.04. 19
35	Elektroinstalace silnoproud	40 dny	08.11. 18	10.04. 19
36	**742 - Elektroinstalace - slaboproud**	71 dny	30.01. 19	10.04. 19
37	Elektronické technologie	20 dny	30.01. 19	10.04. 19
38	Generální MŘ	5 dny	06.04. 19	10.04. 19
39	**751 - Vzduchotechnika**	161 dny	01.11. 18	10.04. 19
40	Vzduchotechnika	40 dny	18.01. 19	10.04. 19
41	Zařízení pro ohřev tepla a kouře	103 dny	01.11. 18	26.03. 19
42	Ostatní	10 dny	17.03. 19	26.03. 19
43	761 - Konstrukce prosklívací	10 dny	01.02. 19	15.02. 19
44	762 - Konstrukce tesařské	15 dny	04.12. 18	31.12. 18
45	763 - Konstrukce suché výstavby	80 dny	22.11. 18	06.03. 19
46	764 - Konstrukce klempířské	50 dny	17.11. 18	05.01. 19
47	765 - Krytina skládaná	5 dny	17.11. 18	21.11. 18
48	766 - Konstrukce truhlářské	70 dny	18.12. 18	10.04. 19
49	767 - Konstrukce zámečnické	90 dny	12.08. 18	18.03. 19
50	771 - Podlahy z dlaždic	30 dny	25.02. 19	24.03. 19
51	775 - Podlahy skládané	15 dny	05.03. 19	19.03. 19
52	776 - Podlahy povlakové	10 dny	23.02. 19	05.03. 19
53	781 - Dokončovací práce - obklady	70 dny	17.12. 18	24.02. 19
54	783 - Nátěry	24 dny	19.03. 19	11.04. 19
55	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 dny	25.02. 19	20.03. 19
56	787 - Sportovní vybavení	12 dny	04.04. 19	15.04. 19
57	**SO 02 - Spojovací zvětšení - zrušeno dodatkem č. 1**	1 den?	01.10. 18	01.10. 18
58	Milník 3 - Dokončení zemních a vodorovných konstrukcí na objektech SO 01,02	0 dny	30.11. 18	30.11. 18
59	**SO 03 - Zpevněné plochy**	312 dny	09.06. 18	14.04. 19
60	1 - Zemní práce (mimo sadovým úpravy)	140 dny	09.06. 18	14.04. 19
61	2 - Základání	46 dny	16.11. 18	31.12. 18
62	3 - Svislé a kompletní konstrukce	45 dny	21.11. 18	04.01. 19
63	5 - Komunikace pozemní	80 dny	26.11. 18	13.03. 19
64	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 dny	06.12. 18	12.01. 19
65	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	66 dny	09.06. 18	28.01. 19
66	998 - Přesun hmot	85 dny	16.11. 18	08.02. 19
67	767 - Konstrukce zámečnické	38 dny	11.12. 18	17.01. 19
68	Milník 4 - Ukončení prací na komunikacích	0 dny	13.02. 19	13.02. 19
69	**SO 04 - Dešťová kanalizace**	156 dny	29.06. 18	01.12. 18
70	1 - Zemní práce	20 dny	29.06. 18	18.07. 18
71	21 - Úprava podloží a základ.spáry	15 dny	04.07. 18	18.07. 18
72	4 - Vodorovné konstrukce	15 dny	04.07. 18	18.07. 18
73	5 - Komunikace	20 dny	18.07. 18	01.12. 18
74	8 - Trubní vedení	15 dny	04.07. 18	18.07. 18
75	91 - Doplňující práce na komunikaci	3 dny	29.06. 18	01.07. 18
76	96 - Bourání konstrukcí	15 dny	04.07. 18	18.07. 18
77	99 - Staveništní přesun hmot	20 dny	04.07. 18	23.07. 18
78	721 - Vnitřní kanalizace	10 dny	06.11. 18	15.11. 18
79	D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	5 dny	19.07. 18	23.07. 18
80	**SO 05 - Splaškové kanalizace**	20 dny	29.06. 18	18.07. 18
81	1 - Zemní práce	20 dny	29.06. 18	18.07. 18
82	21 - Úprava podloží a základ.spáry	15 dny	04.07. 18	18.07. 18
83	4 - Vodorovné konstrukce	15 dny	04.07. 18	18.07. 18
84	8 - Trubní vedení	15 dny	04.07. 18	18.07. 18
85	96 - Bourání konstrukcí	3 dny	29.06. 18	01.07. 18
86	99 - Staveništní přesun hmot	20 dny	29.06. 18	18.07. 18
87	D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot	5 dny	02.07. 18	06.07. 18
88	**SO 06 - Úprava vodoměrné šachty**	18 dny	06.11. 18	23.11. 18
89	1 - Zemní práce	15 dny	06.11. 18	20.11. 18
90	2 - Základy a zvláštní zakládání	1 den	09.11. 18	09.11. 18
91	3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 dny	09.11. 18	10.11. 18
92	62 - Úpravy povrchů vnější	4 dny	09.11. 18	12.11. 18
93	8 - Trubní vedení	15 dny	09.11. 18	23.11. 18
94	93 - Dokončovací práce inženýrských staveb	2 dny	09.11. 18	10.11. 18
95	96 - Bourání konstrukcí	5 dny	06.11. 18	13.11. 18
96	97 - Prorážení otvorů	2 dny	09.11. 18	10.11. 18
97	99 - Staveništní přesun hmot	15 dny	09.11. 18	23.11. 18
98	711 - Izolace proti vodě	6 dny	12.11. 18	17.11. 18
99	713 - Izolace tepelné	2 dny	12.11. 18	13.11. 18
100	722 - Vnitřní vodovod	8 dny	12.11. 18	19.11. 18
101	783 - Nátěry	3 dny	12.11. 18	14.11. 18
102	Milník 5 - Ukončení prací na objektech SO 04, 05,06	0 dny	01.12. 18	01.12. 18
103	**SO 07 - Oplocení**	30 dny	26.11. 18	25.12. 18
104	1 - Zemní práce	10 dny	06.12. 18	15.12. 18
105	2 - Základání	10 dny	11.12. 18	20.12. 18
106	3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 dny	14.12. 18	25.12. 18
107	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 dny	26.11. 18	05.12. 18
108	997 - Přesun suti	2 dny	06.12. 18	07.12. 18
109	998 - Přesun hmot	15 dny	11.12. 18	25.12. 18
110	**pokoltyř - Tělocvična - dopíšení položky**	230 dny	09.06. 18	24.01. 19
111	1 - Zemní práce	10 dny	09.06. 18	18.06. 18
112	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 dny	09.06. 18	18.06. 18
113	997 - Přesun suti	2 dny	19.06. 18	20.06. 18
114	713 - Izolace tepelné	10 dny	09.06. 18	18.06. 18
115	733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	10 dny	09.06. 18	18.06. 18
116	767 - Konstrukce zámečnické	10 dny	15.01. 19	24.01. 19
117	Milník 6 - Ukončení veškerých stavebních prací	0 dny	15.04. 19	15.04. 19
118	ostatní dokončovací práce	25 dny	10.03. 19	04.04. 19
119	geodetické zaměření, geometrický plán	20 dny	26.02. 19	18.03. 19
120	zpracování dokumentace skutečného provedení	30 dny	05.03. 19	04.04. 19
121	zajištění a předání všech dokumentů a dokladů pro kolaudaci díla	20 dny	17.03. 19	05.04. 19
122	Milník 7 - Předání všech dokumentů a dokladů pro kolaudaci díla	0 dny	05.04. 19	05.04. 19
123	přejímací (zkušební provoz)	2 dny	31.03. 19	02.04. 19
124	časový plán převzetí a převzetí díla	2 dny	24.03. 19	26.03. 19
125	písemné oznámení o přejímacím řízení	1 den	27.03. 19	28.03. 19
126	odstranění a úklid staveniště	5 dny	11.04. 19	15.04. 19
127	**předání a převzetí díla**	10 dny	07.04. 19	16.04. 19
128	Milník 8 - Dokončení díla a jeho předání objednateli	0 dny	16.04. 19	16.04. 19
129				
130				
131	Poznámka:	0 dny	16.04. 19	16.04. 19
132	Harmonogram výstavby je zpracován zcela v souladu s požadavky zadávací dokumentace	0 dny	16.04. 19	16.04. 19
133	Zhotovitel je připraven, na základě požadavku objednatele – jeho technického zástupce apod., vypracovat podrobnější harmonogram prací, včetně přesné aktualizace harmonogramu prací.	0 dny	16.04. 19	16.04. 19
134	Nedílnou součástí harmonogramu prací je "Definovaný postup realizace zakázky"	0 dny	16.04. 19	16.04. 19

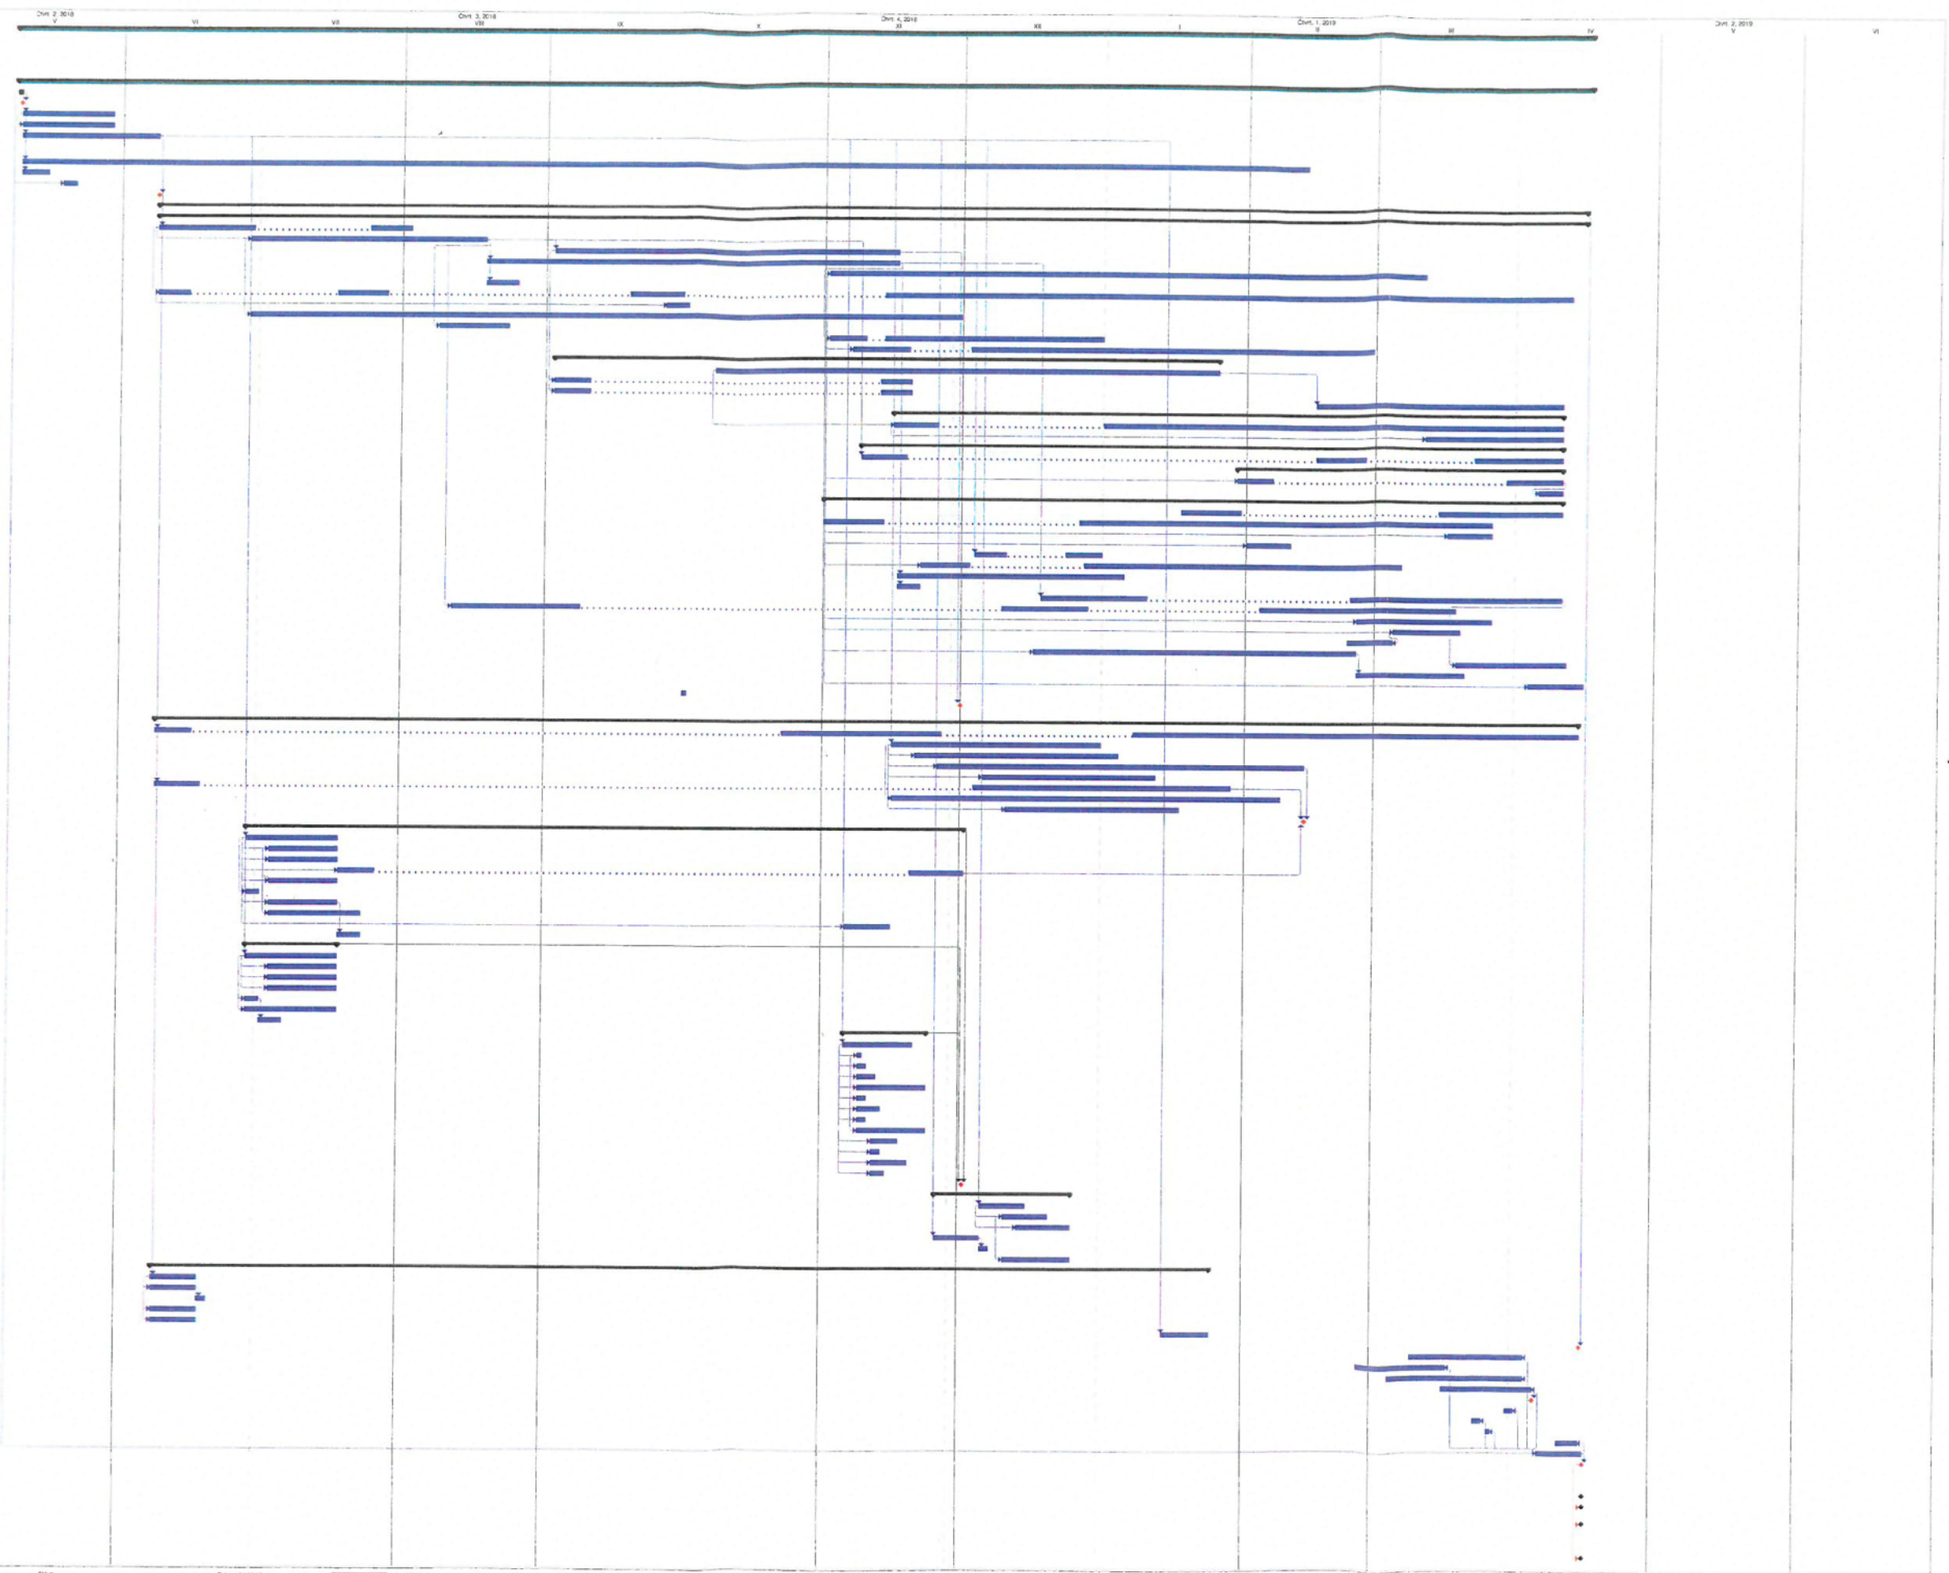

Projekt: Projekt1
Datum: 29.11. 18

Kritický | Rozdělení | Skluz | Zahrnutý kritický | Vnější mílník | Ruční úkol | Ruční souhrn | Vnější úkoly | Karoteční termín
Kritické rozdělení | Milník | Souhrnný | Zahrnutý kritický | Neaktivní mílník | Pouze s dobou trvání | Pouze zahájení | Vnější mílník
Úkol | Cílová rozsah | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Neaktivní souhrn | Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu | Pouze s datem dokončení | Průběh
