ZŠ Fr.Plamínkové - výměna oken II.

Harmonogram prací
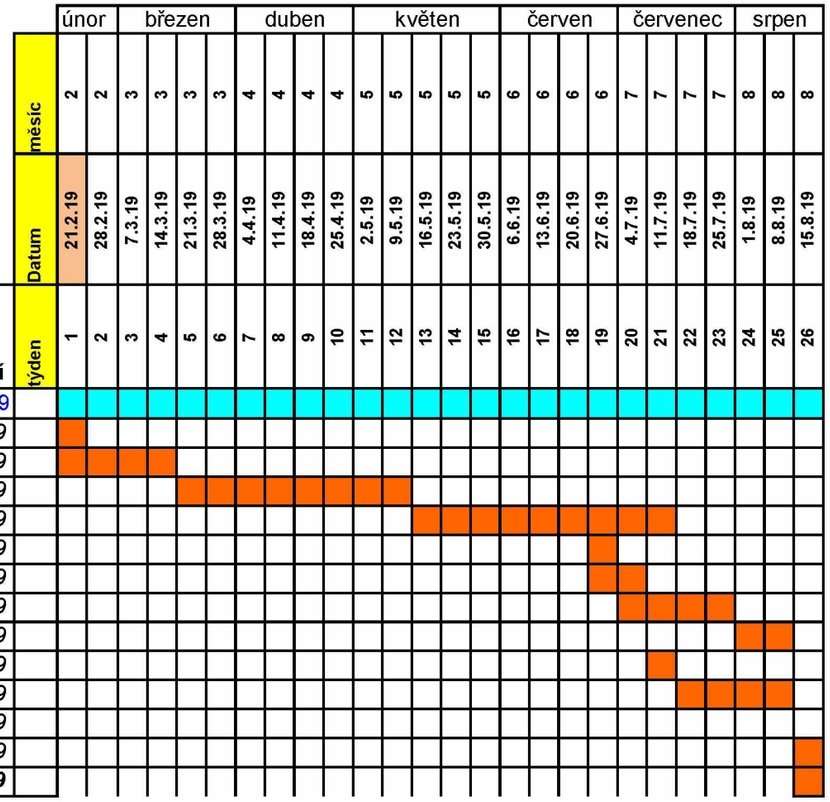
číslo	technologcký postup prací		dny	zahájení	ukončení
	doba výstavby		179	18.2.19	15.8.19
1	**Podpis Sod**		1	*18.2.19*	*18.2.19*
2	Zajištění dílenské dokumentace		26	*18.2.19*	*15.3.19*
3	Zajištění závazného stanoviska NPÚ, předání zadavateli		59	*18.3.19*	*15.5.19*
4	Zaměření a výroba oken		58	*16.5.19*	*12.7.19*
5	**Předání staveniště**		1	*28.6.19*	*28.6.19*
6	Přesuny a zakrývání zařízení v 1PP		8	*28.6.19*	*5.7.19*
7	Výměna oken v 1PP včetně parapetů a začištění		27	*5.7.19*	*31.7.19*
8	Odstranění ochranných opatření a úklid 1PP		9	*1.8.19*	*9.8.19*
9	Přesuny a zakrývání zařízení v 1NP		5	*11.7.19*	*15.7.19*
10	Výměna oken v 1NP včetně parapetů a začištění		29	*15.7.19*	*12.8.19*
11	Odstranění ochranných opatření a úklid zařízení 1NP		3	*12.8.19*	*14.8.19*
12	Dokončovací práce, závěrečný čistý úklid stavby		2	*14.8.19*	*15.8.19*
13	**PŘEDÁNÍ ZADAVATELI**		1	***15.8.19***	***15.8.19***
