ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**Botanická zahrada - areál západ, dostavba**	**527 dny?**	**25.03. 19**	**22.09. 20**
2	*Zahájení - předání a převzetí staveniště 1. etapy*	*0 dny*	*25.03. 19*	*25.03. 19*
3	ZS	5 dny	25.03. 19	29.03. 19
4	Připojení ZS na sítě	3 dny	30.03. 19	01.04. 19
5	**1. etapa**	**182 dny**	**30.03. 19**	**01.10. 19**
6	HSV	101 dny	30.03. 19	12.07. 19
7	PSV	80 dny	13.07. 19	30.09. 19
8	Technologie	60 dny	02.08. 19	30.09. 19
9	Sadové úpravy a komunikace	21 dny	11.09. 19	01.10. 19
10	*Předání a převzetí 1. etapy*	*0 dny*	*01.10. 19*	*01.10. 19*
11	**2. etapa**	**159 dny**	**02.10. 19**	**21.03. 20**
12	HSV	72 dny	02.10. 19	12.12. 19
13	PSV	86 dny	13.12. 19	20.03. 20
14	Technologie	66 dny	13.12. 19	29.02. 20
15	Sadové úpravy a komunikace	21 dny	01.03. 20	21.03. 20
16	*Předání a převzetí 2. etapy*	*0 dny*	*21.03. 20*	*21.03. 20*
17	**3. etapa**	**181 dny**	**22.03. 20**	**22.09. 20**
18	HSV	139 dny	22.03. 20	11.08. 20
19	PSV	72 dny	12.07. 20	21.09. 20
20	Technologie	72 dny	12.07. 20	21.09. 20
21	Sadové úpravy a komunikace	40 dny	14.08. 20	22.09. 20
22	*Předání a převzetí 3. etapy*	*0 dny*	*22.09. 20*	*22.09. 20*
23				
24	Poznámka:			
25	1) Zahájení dne 25.3.2019 je bráno jako předpokládané			
26	2) HMG respektuje rozdělení etap dle ZOV, které je součástí PD			
27	3) Počítáno s víkendy jako s pracovními dny			

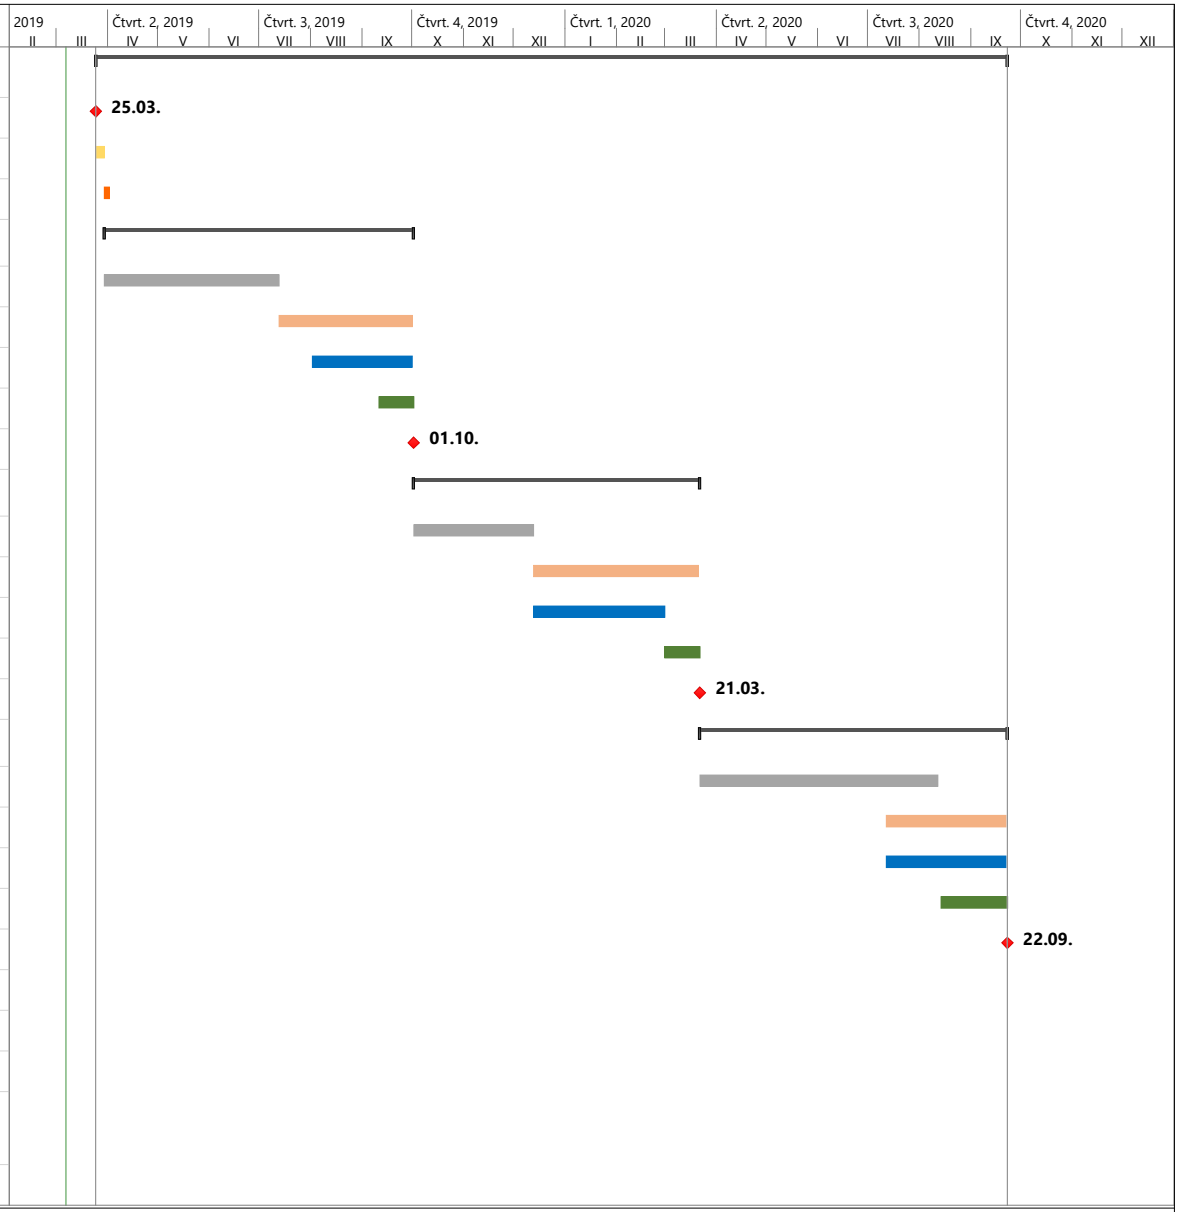

Projekt: Botanická zahrada - areál západ, dostavba
Datum: 07.03. 19

Úkol	Neaktivní úkol	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Vnější milník
Rozdělení	Neaktivní milník	Ruční souhrn	Konečný termín
Milník	Neaktivní souhrn	Pouze zahájení	Průběh
Souhrnný	Ruční úkol	Pouze s datem dokončení	Průběh ručně zadaného úkolu
Souhrn projektu	Pouze s dobou trvání	Vnější úkoly	
