Harmonogram prací - Stavební úpravy - Statek Milíkov, Krajského muzea Karlovarského kraje. p.o.

Název kapitoly/ měsíc (týden)	kapitola celkem bez DPH (Kč)	září 2018					říjen 2018				listopad 2018					prosinec 2018				leden 2019				únor 2019				březen 2019					duben 2019				květen 2019					červen 2019				červenec 2019				srpen 2019					září 2019				říjen 2019					listopad 2019				prosinec 2019				
		35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
SO 01 - Dům																																																																									
Zemní práce	134 657,45 Kč																																																																								
Zemní práce - povrchové úpravy terénu	888,30 Kč																																																																								
Zakládání	749 313,60 Kč																																																																								
Svislé a kompletní konstrukce	138 203,96 Kč																																																																								
Vodorovné konstrukce	42 659,67 Kč																																																																								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	216 539,81 Kč																																																																								
Trubní vedení	75 900,00 Kč																																																																								
Ostatní konstrukce a práce - bourání	1 783 437,55 Kč																																																																								
Přesun sutě	275 786,58 Kč																																																																								
Přesun hmot	67 210,02 Kč																																																																								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 349,76 Kč																																																																								
Izolace tepelné	5 419,51 Kč																																																																								
Akustická a protiotřesová opatření	8 864,61 Kč																																																																								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 495,28 Kč																																																																								
Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 647,14 Kč																																																																								
Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 626,73 Kč																																																																								
Konstrukce tesařské	4 101 803,00 Kč																																																																								
Konstrukce klempířské	89 358,92 Kč																																																																								
Konstrukce pokrývačské	163 039,44 Kč																																																																								
Konstrukce truhlářské	229 843,37 Kč																																																																								
Konstrukce zámečnické	72 714,03 Kč																																																																								
Podlahy povlakové	2 025,00 Kč																																																																								
Dokončovací práce - obklady keramické	1 755,20 Kč																																																																								
Dokončovací práce - nátěry	384 018,48 Kč																																																																								
Dokončovací práce - malby a tapety	10 974,36 Kč																																																																								
Hodinové zúčtovací sazby	38 406,83 Kč																																																																								
Vedlejší rozpočtové náklady	18 826,10 Kč																																																																								
Součet SO 01 - Dům	**8 630 764,70 Kč**																																																																								
SO 03 - VZT	**61 813,00 Kč**																																																																								
SO 04 - Domek																																																																									
Svislé a kompletní konstrukce	11 573,72 Kč																																																																								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 491,39 Kč																																																																								
Ostatní konstrukce a práce - bourání	33 673,33 Kč																																																																								
Přesun sutě	19 536,89 Kč																																																																								
Přesun hmot	4 128,98 Kč																																																																								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 038,86 Kč																																																																								
Izolace tepelné	24 379,82 Kč																																																																								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 821,63 Kč																																																																								
Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 642,97 Kč																																																																								
Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 727,88 Kč																																																																								
Konstrukce tesařské	33 415,46 Kč																																																																								
Konstrukce klempířské	32 263,17 Kč																																																																								
Konstrukce pokrývačské	47 185,23 Kč																																																																								
Konstrukce truhlářské	56 664,56 Kč																																																																								
Podlahy z dlaždic	63 942,19 Kč																																																																								
Dokončovací práce - obklady keramické	1 449,44 Kč																																																																								
Dokončovací práce - nátěry	11 258,19 Kč																																																																								
Dokončovací práce - malby a tapety	2 177,71 Kč																																																																								
Hodinové zúčtovací sazby	2 566,20 Kč																																																																								
Vedlejší rozpočtové náklady	14 016,38 Kč																																																																								
Součet SO 04 - Domek	**421 954,00 Kč**																																																																								
SO 05 - WC																																																																									
Zemní práce	16 732,88 Kč																																																																								
Zakládání	37 898,49 Kč																																																																								
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 942,35 Kč																																																																								
Ostatní konstrukce a práce - bourání	19 334,67 Kč																																																																								
Přesun hmot	9 194,54 Kč																																																																								
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 081,24 Kč																																																																								
Izolace tepelné	70 096,36 Kč																																																																								
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 210,43 Kč																																																																								
Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 331,20 Kč																																																																								
Zdravotechnika - zařizovací předměty	81 782,35 Kč																																																																								
Konstrukce tesařské	709 962,86 Kč																																																																								
Konstrukce suché výstavby	122 631,54 Kč																																																																								
Konstrukce klempířské	30 083,46 Kč																																																																								
Konstrukce pokrývačské	41 698,31 Kč																																																																								
Konstrukce truhlářské	225 610,40 Kč																																																																								
Podlahy z dlaždic	23 127,58 Kč																																																																								
Dokončovací práce - obklady keramické	54 672,26 Kč																																																																								
Dokončovací práce - nátěry	46 719,75 Kč																																																																								

Harmonogram prací - Stavební úpravy - Statek Milíkov, Krajského muzea Karlovarského kraje. p.o.

| Název kapitoly/ měsíc (týden) | kapitola celkem bez DPH (Kč) | září 2018 | | | | | říjen 2018 | | | | | listopad 2018 | | | | | prosinec 2018 | | | | | leden 2019 | | | | | únor 2019 | | | | | březen 2019 | | | | | duben 2019 | | | | | květen 2019 | | | | | červen 2019 | | | | | červenec 2019 | | | | | srpen 2019 | | | | | září 2019 | | | | | říjen 2019 | | | | | listopad 2019 | | | | | prosinec 2019 | | | | |
|---|---|---

Harmonogram prací - Stavební úpravy - Statek

Harmonogram prací - Stavební úpravy - Statek Milíkov, Krajského muzea Karlovarského kraje. p.o.

Název kapitoly/ měsíc (týden)	kapitola celkem bez DPH (Kč)
SO 01 - Dům	
Zemní práce	134 657,45 Kč
Zemní práce - povrchové úpravy terénu	888,30 Kč
Zakládání	749 313,60 Kč
Svislé a kompletní konstrukce	138 203,96 Kč
Vodorovné konstrukce	42 659,67 Kč
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	216 539,81 Kč
Trubní vedení	75 900,00 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání	1 783 437,55 Kč
Přesun sutě	275 786,58 Kč
Přesun hmot	67 210,02 Kč
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 349,76 Kč
Izolace tepelné	5 419,51 Kč
Akustická a protiotřesová opatření	8 864,61 Kč
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	4 495,28 Kč
Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 647,14 Kč
Zdravotechnika - zařizovací předměty	10 626,73 Kč
Konstrukce tesařské	4 101 803,00 Kč
Konstrukce klempířské	89 358,92 Kč
Konstrukce pokrývačské	163 039,44 Kč
Konstrukce truhlářské	229 843,37 Kč
Konstrukce zámečnické	72 714,03 Kč
Podlahy povlakové	2 025,00 Kč
Dokončovací práce - obklady keramické	1 755,20 Kč
Dokončovací práce - nátěry	384 018,48 Kč
Dokončovací práce - malby a tapety	10 974,36 Kč
Hodinové zúčtovací sazby	38 406,83 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	18 826,10 Kč
Součet SO 01 - Dům	**8 630 764,70 Kč**
SO 03 - VZT	**61 813,00 Kč**
SO 04 - Domek	
Svislé a kompletní konstrukce	11 573,72 Kč
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	35 491,39 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání	33 673,33 Kč
Přesun sutě	19 536,89 Kč
Přesun hmot	4 128,98 Kč
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	8 038,86 Kč
Izolace tepelné	24 379,82 Kč
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 821,63 Kč
Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 642,97 Kč
Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 727,88 Kč
Konstrukce tesařské	33 415,46 Kč
Konstrukce klempířské	32 263,17 Kč
Konstrukce pokrývačské	47 185,23 Kč
Konstrukce truhlářské	56 664,56 Kč
Podlahy z dlaždic	63 942,19 Kč
Dokončovací práce - obklady keramické	1 449,44 Kč
Dokončovací práce - nátěry	11 258,19 Kč
Dokončovací práce - malby a tapety	2 177,71 Kč
Hodinové zúčtovací sazby	2 566,20 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	14 016,38 Kč
Součet SO 04 - Domek	**421 954,00 Kč**
SO 05 - WC	
Zemní práce	16 732,88 Kč
Zakládání	37 898,49 Kč
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 942,35 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání	19 334,67 Kč
Přesun hmot	9 194,54 Kč
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	9 081,24 Kč
Izolace tepelné	70 096,36 Kč
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	21 210,43 Kč
Zdravotechnika - vnitřní vodovod	16 331,20 Kč
Zdravotechnika - zařizovací předměty	81 782,35 Kč
Konstrukce tesařské	709 962,86 Kč
Konstrukce suché výstavby	122 631,54 Kč
Konstrukce klempířské	30 083,46 Kč
Konstrukce pokrývačské	41 698,31 Kč
Konstrukce truhlářské	225 610,40 Kč
Podlahy z dlaždic	23 127,58 Kč
Dokončovací práce - obklady keramické	54 672,26 Kč
Dokončovací práce - nátěry	46 719,75 Kč
Dokončovací práce - malby a tapety	997,33 Kč
Součet SO 05 - WC	**1 550 108,00 Kč**
SO 06 - Venkovní plochy	
Soupis rostlin	72 210,54 Kč
Vegetační úpravy	345 232,02 Kč
Zemní práce	240 296,25 Kč
Zemní práce - povrchové úpravy terénu	10 902,35 Kč

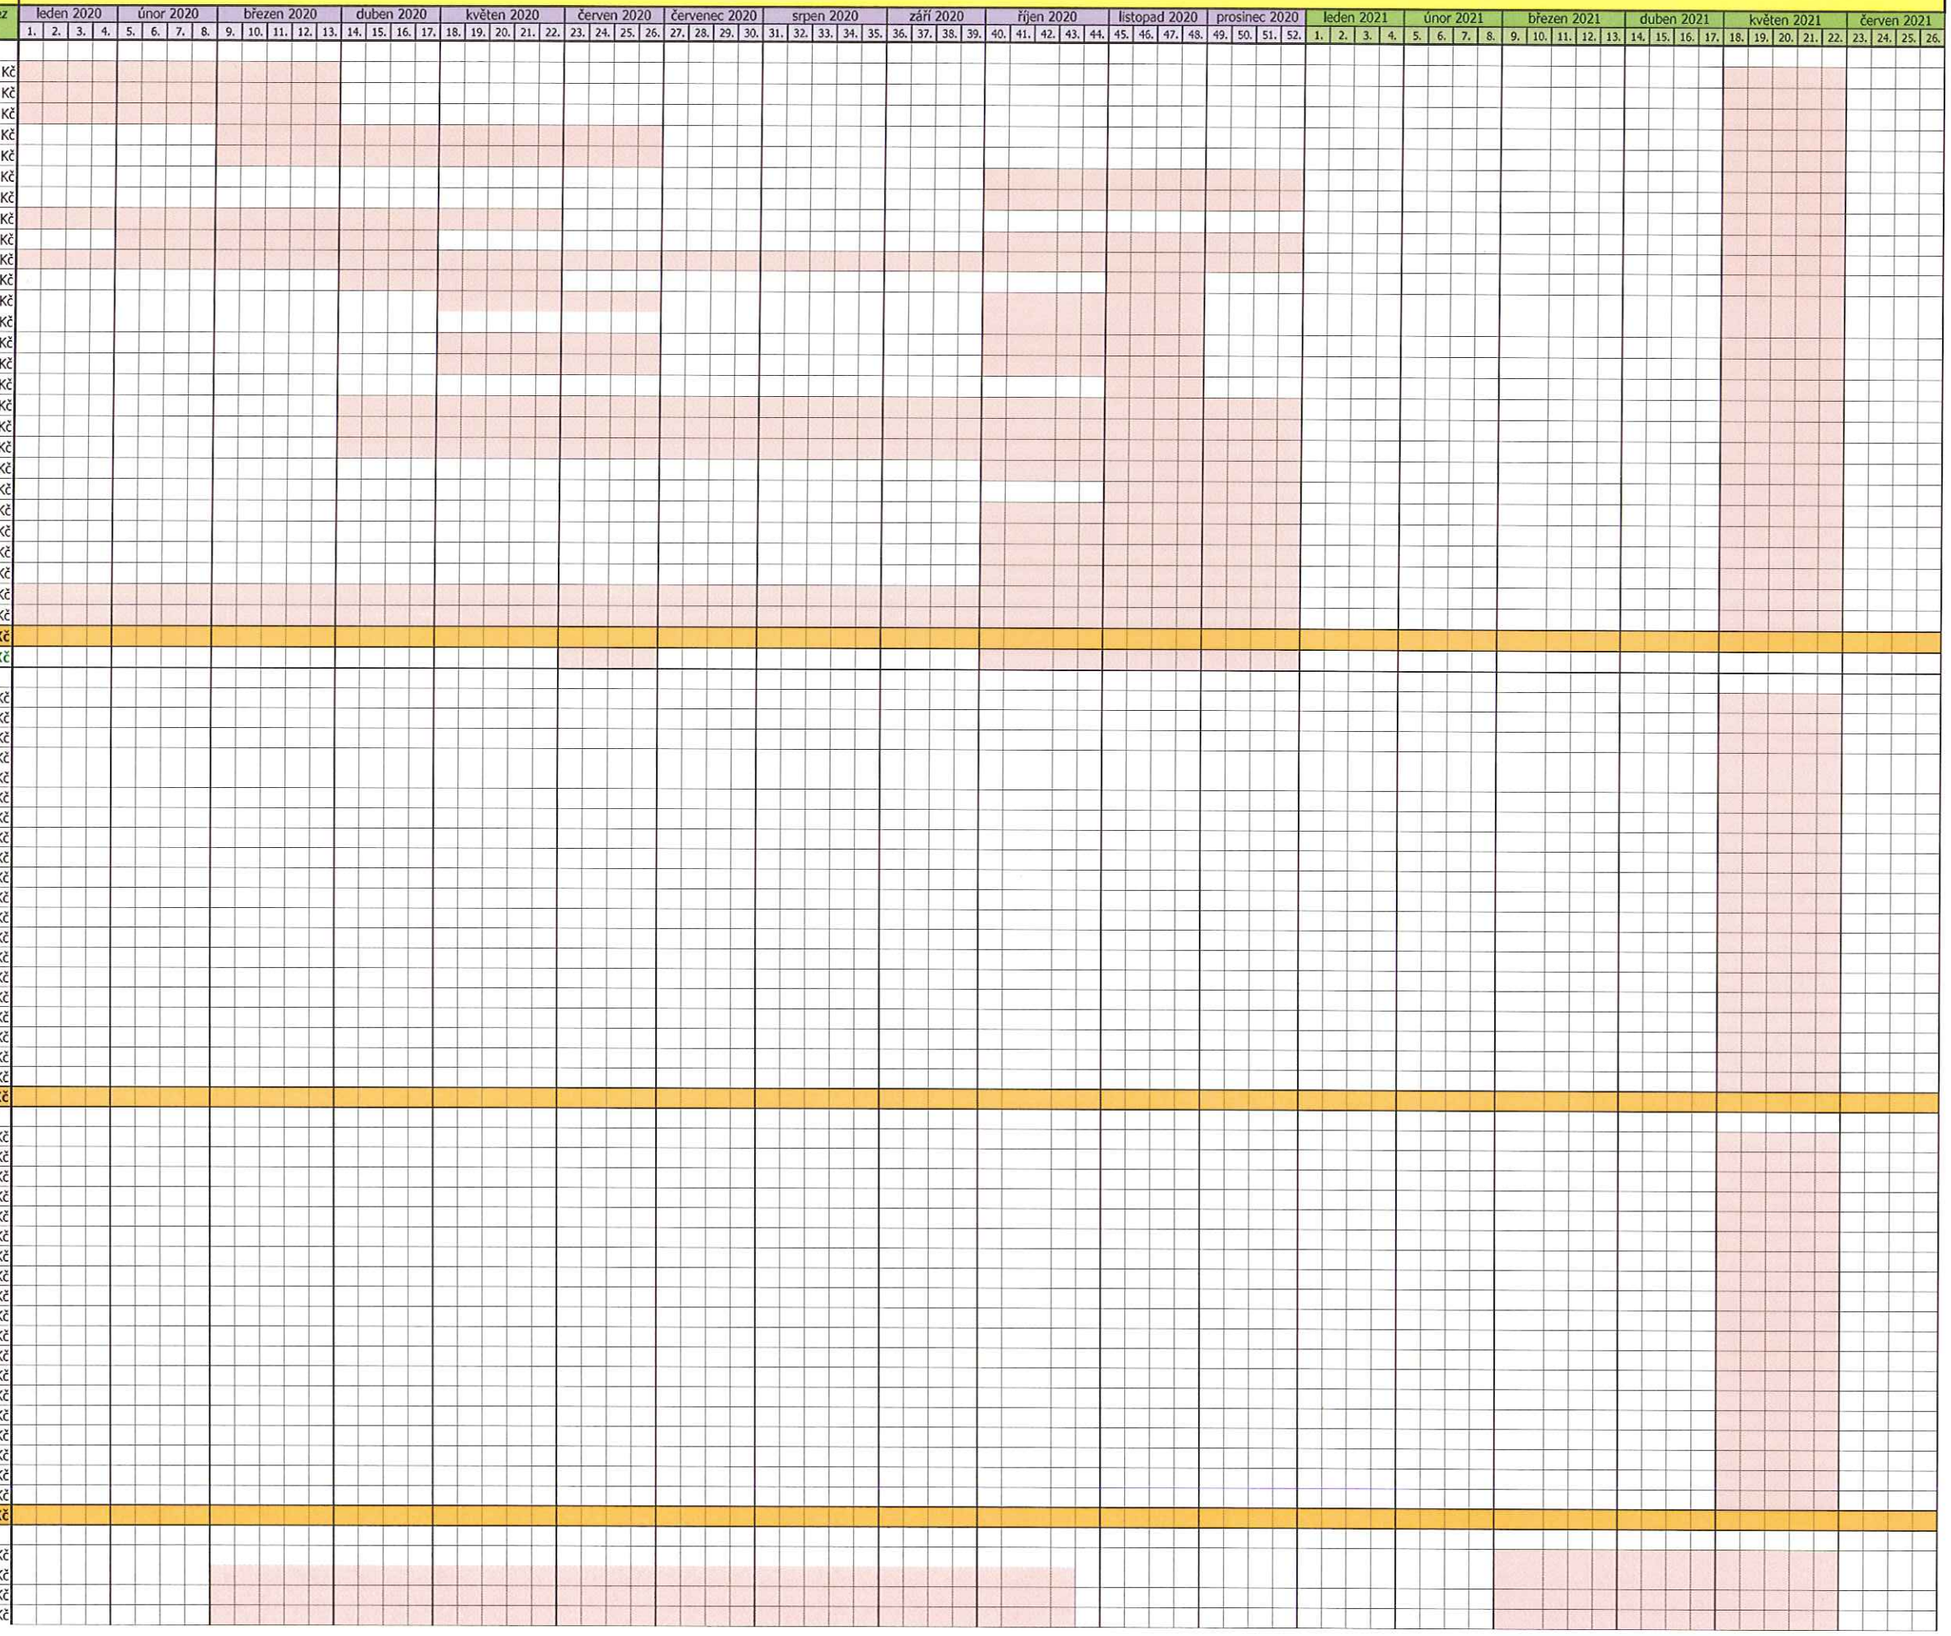

Harmonogram prací - Stavební úpravy - Statek

Harmonogram prací - Stavební úpravy - Statek Milíkov, Krajského muzea Karlovarského kraje. p.o.

Název kapitoly/ měsíc (týden)	kapitola celkem bez DPH (Kč)
Svislé a kompletní konstrukce	521 574,36 Kč
Komunikace	71 200,40 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání	75 410,33 Kč
Přesun sutě	31 726,70 Kč
Přesun hmot	5 797,07 Kč
Konstrukce pokrývačské	3 093,98 Kč
Součet SO 06 - Venkovní plochy	**1 377 444,00 Kč**
SO 07 - Vodovod	**178 998,00 Kč**
SO 09 - Kanalizace	**532 530,00 Kč**
SO 10 - EPS, EZS	**1 524 390,60 Kč**
SO 11 - Elektroinstalace	**212 975,80 Kč**
SO 12 - VRN	**372 900,00 Kč**
Celkem bez DPH	**14 863 878,10 Kč**
DPH 21%	3 121 414,40 Kč
Celkem vč.DPH	**17 985 292,50 Kč**

| leden 2020 | | | | únor 2020 | | | | březen 2020 | | | | | duben 2020 | | | | květen 2020 | | | | | červen 2020 | | | | | červenec 2020 | | | | | srpen 2020 | | | | | září 2020 | | | | | říjen 2020 | | | | | listopad 2020 | | | | | prosinec 2020 | | | | | leden 2021 | | | | | únor 2021 | | | | | březen 2021 | | | | | duben 2021 | | | | | květen 2021 | | | | | červen 2021 | | | | |
|---|---|---
