ID	Režim úkolu	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1			**Metro D - geologický průzkum - PAD 4**	**765 dny**	**01.04. 19**	**23.05. 21**
2		ZS	Zařízení staveniště, příprava území	30 dny	01.04. 19	01.05. 19
3			**Související stavební objekty**	**760 dny**	**01.04. 19**	**18.05. 21**
4		SO 11-01	Příprava území	10 dny	01.04. 19	11.04. 19
5		SO 11-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště	10 dny	06.04. 19	16.04. 19
6		SO 11-03/30	Vodovodní přípojka staveniště PAD4	30 dny	11.04. 19	11.05. 19
7		SO 11-04/30	Kanalizační přípojka staveniště PAD4	30 dny	11.04. 19	11.05. 19
8		SO 11-06/40	El. přípojka|VN staveniště PAD4	60 dny	11.04. 19	10.06. 19
9		SO 11-08	Ochrana pěšího provozu - není předmětem dodávky stavby	750 dny	11.04. 19	18.05. 21
10		SO 11-09	Ochrana inženýrských sítí	750 dny	11.04. 19	18.05. 21
11		SO 11-10	Demolice	10 dny	11.04. 19	21.04. 19
12		SO 11-40	Provizorní dopravní značení	750 dny	11.04. 19	18.05. 21
13		SO 11-75/20	Přeložka a ochrana VO v průběhu GP na PAD4	60 dny	11.04. 19	10.06. 19
14			**C. Stavební část**	**695 dny**	**01.05. 19**	**13.04. 21**
15			Realizace stavební jámy z převrtávaných pilot včetně převázky a dna	140 dny	01.05. 19	18.09. 19
16			Mikropilotový deštník	10 dny	18.09. 19	28.09. 19
17			**Průzkumná štola**	**545 dny**	**28.09. 19**	**13.04. 21**
18			Ražba průzkumné štoly TYP 1	29 dny	28.09. 19	27.10. 19
19			Ražba I. kaloty průzkumné štoly TYP2	37 dny	27.10. 19	03.12. 19
20			Injektáž masivu - TYP 2	61 dny	15.12. 19	23.02. 20

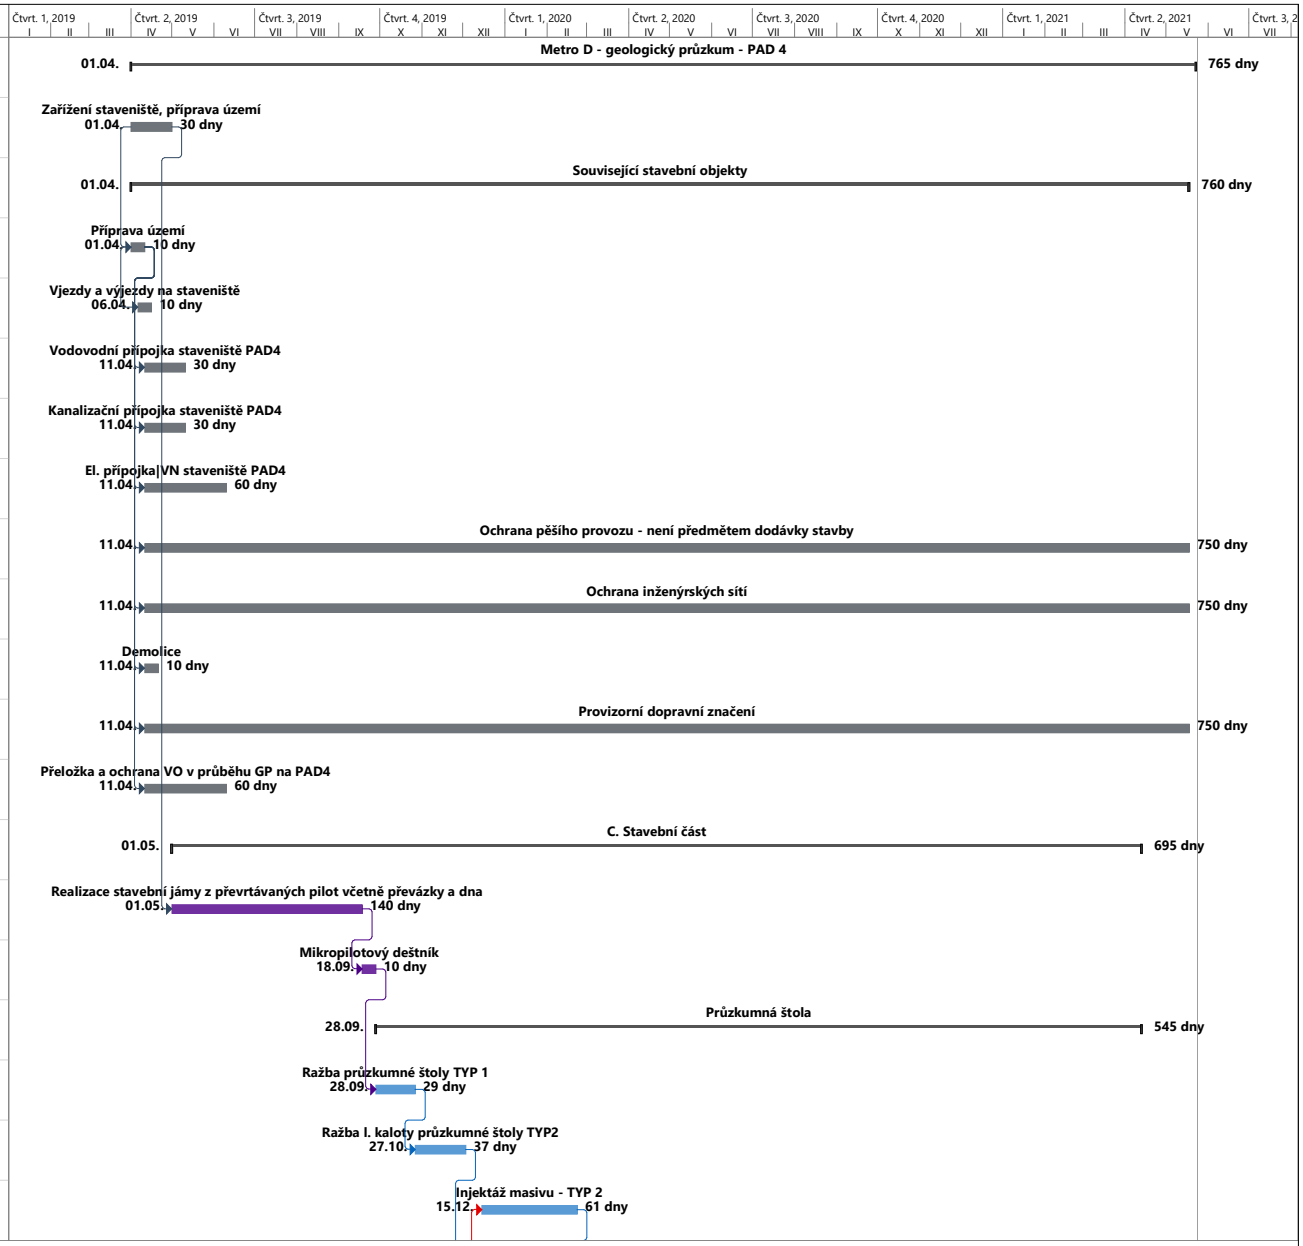

Projekt: Metro D - IGP Pad4
Datum: 30.11.2018

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			

ID	Režim úkolu	Text1	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
21			Ražba rozšíření na celou kalotu TYP 2	25 dny	29.02. 20	25.03. 20
22			Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	01.11. 19	01.11. 19
23			Ražba levé kaloty průzkumné štoly TYP 3 a TYP 4	115 dny	25.03. 20	18.07. 20
24			Injektáž masivu - TYP 4	90 dny	01.08. 20	30.10. 20
25			Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	01.04. 20	01.04. 20
26			Ražba rozšíření na celou kalotu TYP 4	60 dny	07.11. 20	15.01. 21
27			Ruční ražba geotechnické zarážky RI	28 dny	15.01. 21	12.02. 21
28			Dokončovací práce	60 dny	12.02. 21	13.04. 21
29			Geologické vyhodnocení ražeb	0 dny	01.08. 20	01.08. 20
30		ZS	Zařízení staveniště - likvidace	30 dny	23.04. 21	23.05. 21
31			**E. Geologický průzkum**	**503 dny**	**03.12. 19**	**07.05. 21**
32			Presiometrický vějíř PP1	6 dny	03.12. 19	09.12. 19
33			Presiometrické a geofyzikální zkoušky PPINJ1 (před injektáží)	6 dny	09.12. 19	15.12. 19
34			Presiometrické a geofyzikální zkoušky PPINJ1 (po injektáži)	6 dny	23.02. 20	29.02. 20
35			Presiometrický vějíř PP2	6 dny	18.07. 20	24.07. 20
36			Presiometrické a geofyzikální zkoušky PPINJ2 (před injektáží)	8 dny	24.07. 20	01.08. 20
37			Presiometrické a geofyzikální zkoušky PPINJ2 (po injektáži)	8 dny	30.10. 20	07.11. 20
38			Smykové a zatěžovací zkoušky v geotechnické rozrážce	63 dny	12.02. 21	16.04. 21
39			Dlouhé vrty ŠJ 1001 - ŠJ 1003	40 dny	26.02. 21	07.04. 21
40			Zkoušky, měření ve vrtech, laborka	30 dny	07.04. 21	07.05. 21

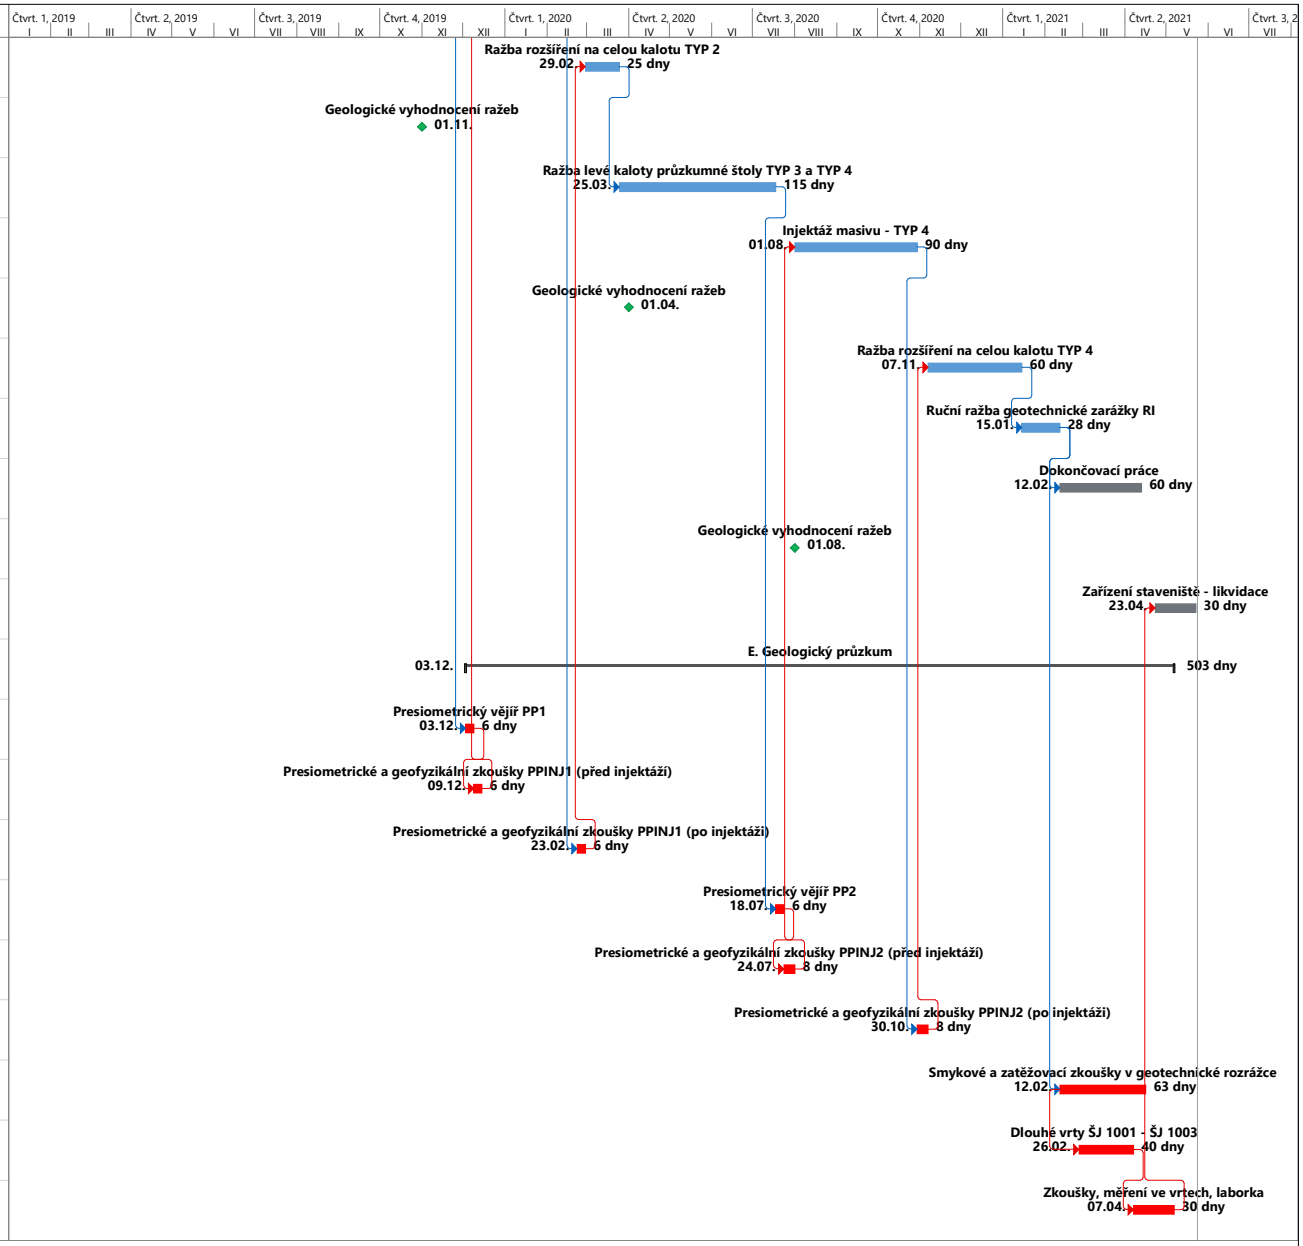

Projekt: Metro D - IGP Pad4
Datum: 30.11.2018

Úkol		Souhrn projektu		Ruční úkol		Pouze zahájení		Konečný termín	
Rozdělení		Neaktivní úkol		Pouze s dobou trvání		Pouze s datem dokončení		Průběh	
Milník		Neaktivní milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější úkoly		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrnný		Neaktivní souhrn		Ruční souhrn		Vnější milník			
