HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

AKCE: III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice

		Číslo položky	Popis položky	Doba trvání
III/0031 a III/00314 Dolní Břežany, rekonstrukce silnice			**rok 2018**	
	I. Etapa	1	Převzetí staveniště zhotovitelem	1den
		2	Silnice III/0031, úsek ZÚ- 0,820	2,5 týdne
			- přípojky inženýrských sítí- obec D. Břežany	1 týden
		3	Předání staveniště objednateli	1den
			Přerušení v zimním období	
			rok 2019	
	II. Etapa	4	Převzetí staveniště zhotovitelem	1den
		5	Silnice III/00314, úsek ZÚ 0,000- 0,700	
			- sanace	4 týdny
			- obrubníky, zámková dlažba- obec Hodkovice	2 týdny
			- recyklace, pokládka asf. vrstev	1 týden
	III. Etapa	6	Silnice III/00314, úsek 0,700- 1,470	
			- sanace, recyklace	4 týdny
			- pokládka asf. vrstev	1 týden
	IV. Etapa	7	Silnice III/00314, úsek 1,470- 1,78	
			- sanace, pokládka SC	2 týdny
			- přeložky inženýrských sítí- obec D. Břežany	2 týdny
			- pokládka asf. vrstev	1 týden
			+ Silnice III/0031, úsek ZÚ 0,850- 1,100	
			- úprava BUS zálivů, pokládka SC	3 týdny
			- pokládka asf. vrstev	1 týden
			- VDZ	
		8	Předání staveniště objednateli	1den

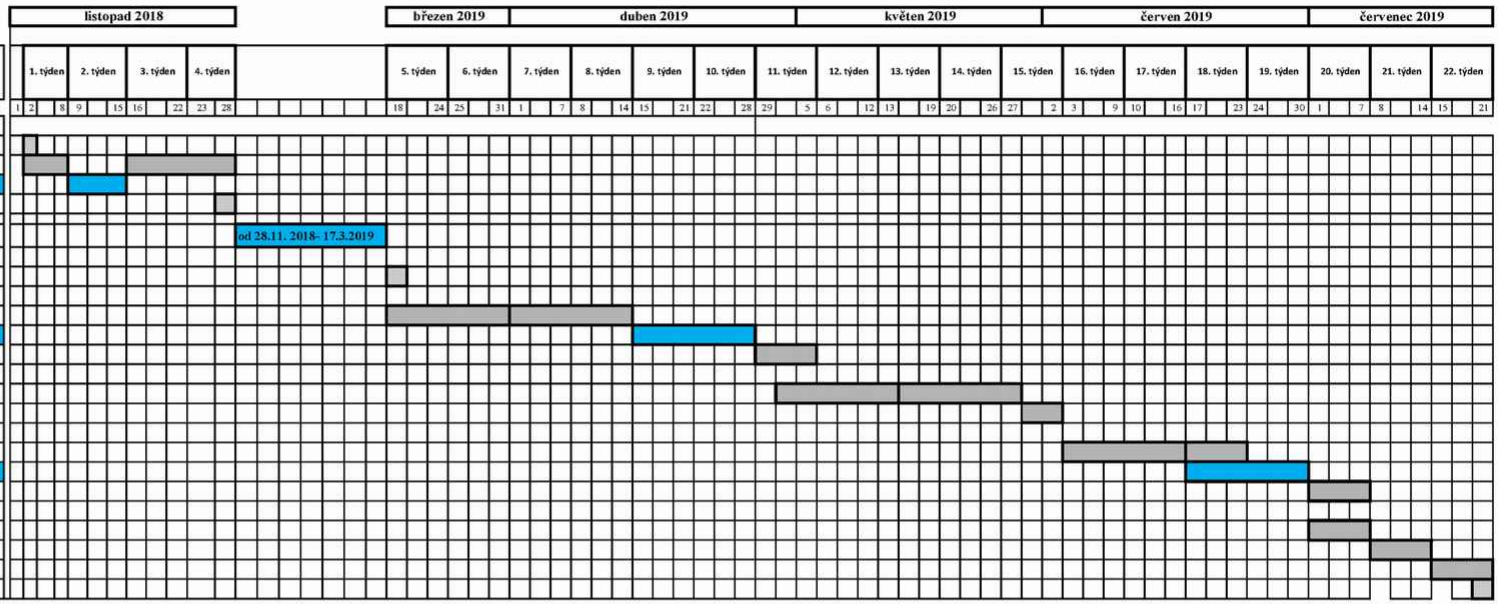

Poznámky: DIO stavby vždy dle prováděného úseku

Termín vyklizení staveniště je do 10dnů od ukončení realizace díla.

V HMG jsou modře vyznačeny práce, které si objednaly obce a je nutné je provádět v souladu s touto stavbou.

ČNES dopravní stavby, a.s.

IČO: 477 81 734

V Kladně dne 10.5. 2019
