HARMONOGRAM - MŠ - Na Ryšavce 241,Písek - pavilon - B,C

Vakustav

Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Dnes je: 16.07.2019

Zahájení **16.07.2019** Připočti týdny 0

Týdenní kalendář

Projekt: **Důležité pracovní úkoly**

ID	Jméno úkolu	Začátek	Konec	Dnů
1	Převzetí stavby - **pavilon - B,C**	16.07.2019	16.07.2019	1
2	Tepelné izolace obvodového pláště - **pavilon - B,C**	16.07.2019	23.08.2019	39
3	Instalace - VZT - **pavilon B,C**	17.07.2019	23.08.2019	38
4	Dodávka a montáž výplní otvorů - okna , dveře - **pavilon - B,C**	15.08.2019	23.08.2019	9
5	Předání díla - **zkušební provoz**	23.08.2019	23.08.2019	1
6	**Předání díla - pavilon - B,C**	31.10.2019	31.10.2019	1

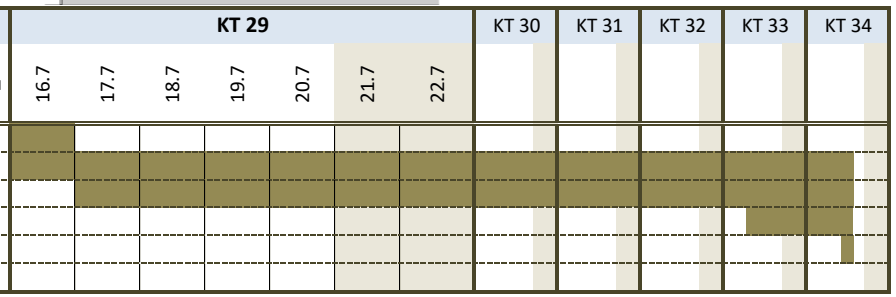

KT 35	KT 36	KT 37	KT 38	KT 39	KT 40	KT 41	KT 42	KT 43	KT 44	KT 45	KT 46	KT 47	KT 48	KT 49	KT 50	KT 51	KT 52	KT 53
