HARMONOGRAM - MŠ - Na Ryšavce 241,Písek - pavilon A,D

Vakustav

Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Dnes je: 16.07.2019

Zahájení **16.07.2019** Připočti týdny 0

Týdenní kalendář

Projekt: **Důležité pracovní úkoly**

ID	Jméno úkolu	Začátek	Konec	Dnů
1	Převzetí stavby - **pavilon A,B,C,D**	16.07.2019	16.07.2019	1
2	Bourací práce - **pavilon - A,D**	24.08.2019	06.09.2019	14
6	Svislé konstrukce - **pavilon - A,D**	07.09.2019	21.09.2019	15
7	Vzduchotechnika - **pavilon A,D**	25.08.2019	15.10.2019	52
8	Instalace - **pavilon - A,D**	06.09.2019	15.10.2019	40
9	Ústřední topení - **pavilon A,D**	07.09.2019	13.10.2019	37
10	Elektomontáže - **pavilon - A,D**	07.09.2019	14.10.2019	38
11	Ostatní konstrukce a práce - **pavilon A,D**	09.09.2019	23.09.2019	15
12	Úpravy povrchů vnitřních - **pavilon - A,D**	23.09.2019	11.10.2019	19
13	Konstukce truhlářské - **pavilon - A,D**	03.10.2019	13.10.2019	11
14	Izolace proti vodě - **pavilon - A,D**	08.09.2019	12.09.2019	5
15	Podlahy - **pavilon - A,D**	12.09.2019	20.09.2019	9
16	Obkaldy keramické - **pavilon - A,D**	24.09.2019	10.10.2019	17
17	Podlahy z dlaždic - **pavilon - A,D**	24.09.2019	10.10.2019	17
18	Podlahy povlakové - **pavilon - A,D**	10.10.2019	13.10.2019	4
20	SDK - sádrokarton - **pavilon - A,D**	18.09.2019	07.10.2019	20
21	Nátěry - **pavilon - A,D**	09.10.2019	13.10.2019	5
22	Malby - **pavilon - A,D**	09.10.2019	13.10.2019	5
23	Zkušební provoz - **pavilon - A,D**	15.10.2019	15.10.2019	1
24	Předání díla - **pavilon - A,D**	31.10.2019	31.10.2019	1

KT 29							KT 30	KT 31	KT 32	KT 33	KT 34
16.7	17.7	18.7	19.7	20.7	21.7	22.7					

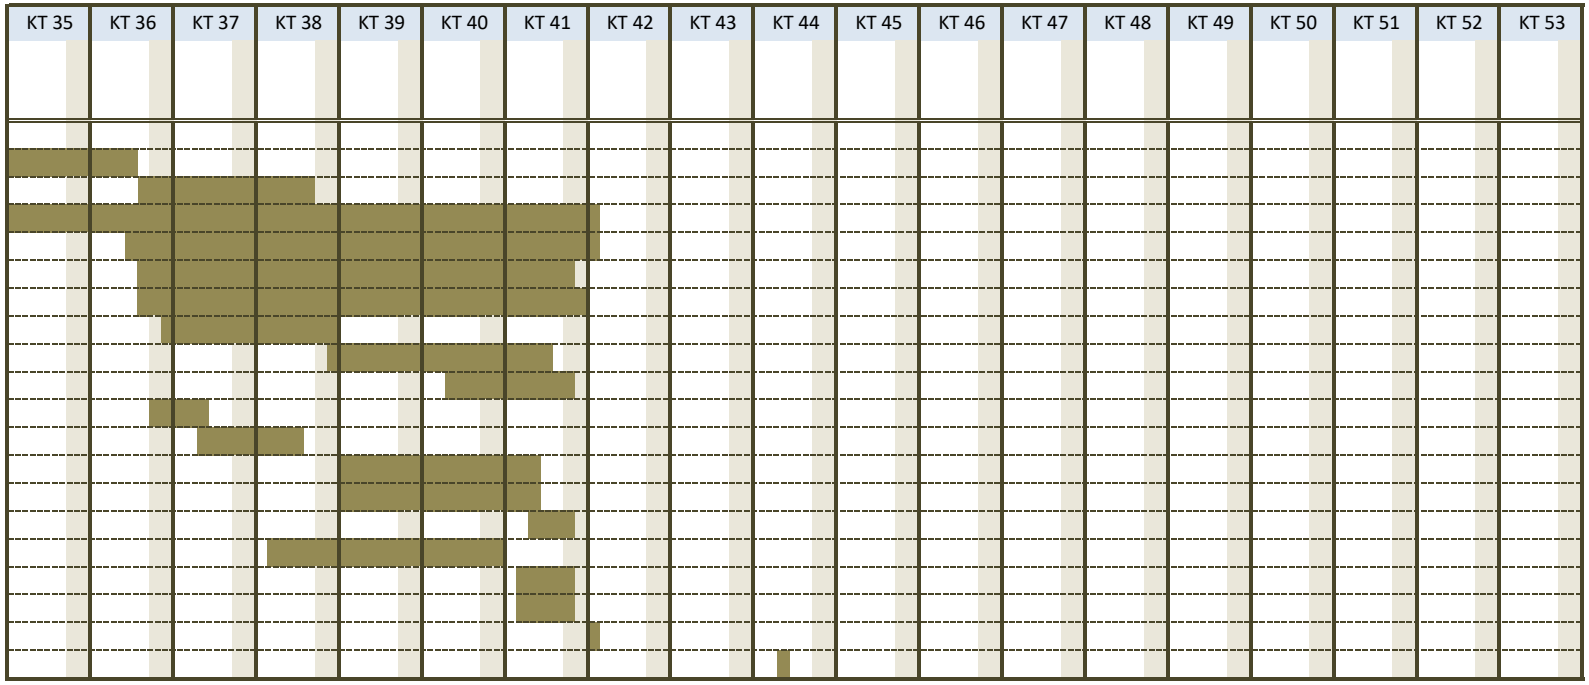
KT 35
KT 36
KT 37
KT 38
KT 39
KT 40
KT 41
KT 42
KT 43
KT 44
KT 45
KT 46
KT 47
KT 48
KT 49
KT 50
KT 51
KT 52
KT 53
