HARMONOGRAM - MŠ - Na Ryšavce 241,Písek - pavilon B,C

Vakustav

Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek

Dnes je: 16.07.2019

Zahájení **16.07.2019** Připočti týdny 0

Týdenní kalendář

Projekt: **Důležité pracovní úkoly**

ID	Jméno úkolu	Začátek	Konec	Dnů
1	Převzetí stavby - **pavilon A,B,C,D**	16.07.2019	16.07.2019	1
2	Bourací práce - **pavilon - B,C**	17.07.2019	24.07.2019	8
3	Základy - SO05	20.07.2019	27.07.2019	8
4	Trubní vedení - SO05	22.07.2019	25.07.2019	4
5	Komunikace - SO05	09.08.2019	20.08.2019	12
6	Svislé konstrukce - **pavilon - B,C**	31.07.2019	15.08.2019	16
7	Vzduchotechnika - **pavilon B,C**	17.07.2019	23.08.2019	38
8	Instalace - **pavilon - B,C**	17.07.2019	20.08.2019	35
9	Ústřední topení - **pavilon B,C**	20.07.2019	21.08.2019	33
10	Elektomontáže - **pavilon - B,C**	17.07.2019	22.08.2019	37
11	Ostatní konstrukce a práce - **pavilon B,C**	10.08.2019	20.08.2019	11
12	Úpravy povrchů vnitřních - **pavilon - B,C**	02.08.2019	19.08.2019	18
13	Konstukce truhlářské - **pavilon - B,C**	14.08.2019	19.08.2019	6
14	Izolace proti vodě - **pavilon - B,C**	28.07.2019	07.08.2019	11
15	Podlahy - **pavilon - B,C**	05.08.2019	14.08.2019	10
16	Obkaldy keramické - **pavilon - B,C**	10.08.2019	20.08.2019	11
17	Podlahy z dlaždic - **pavilon - B,C**	15.08.2019	21.08.2019	7
18	Podlahy povlakové - **pavilon - B,C**	15.08.2019	21.08.2019	7
20	SDK - sádrokarton - **pavilon - B,C**	02.08.2019	20.08.2019	19
21	Nátěry - **pavilon - B,C**	19.08.2019	22.08.2019	4
22	Malby - **pavilon - B,C**	19.08.2019	22.08.2019	4
23	Zkušební provoz - **pavilon - B,C**	23.08.2019	23.08.2019	1
24	Předání díla - **pavilon - B,C**	31.10.2019	31.10.2019	1

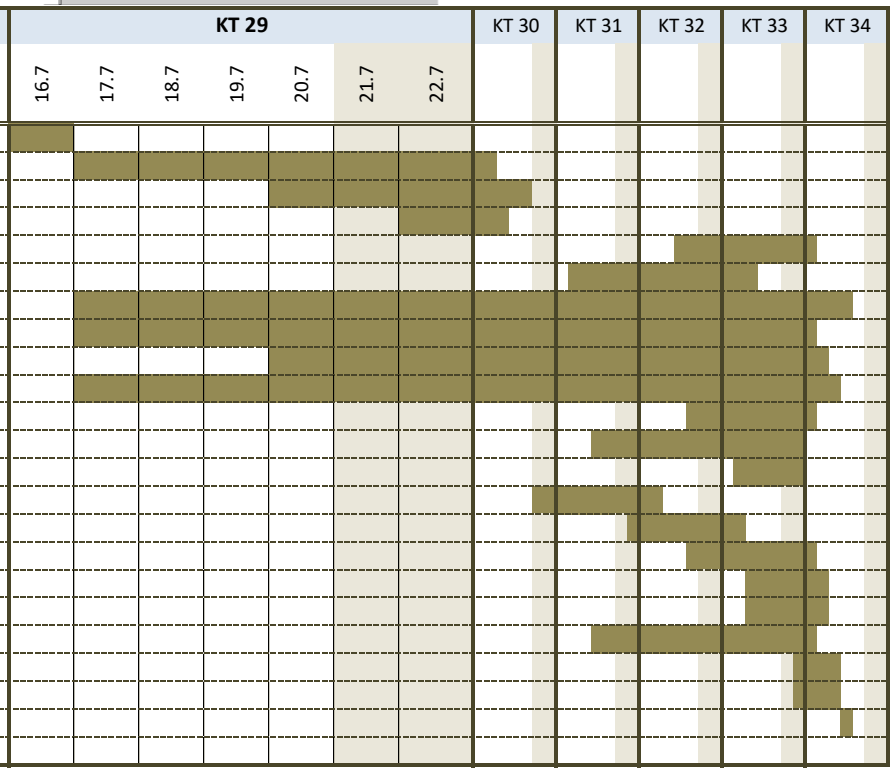

KT 35	KT 36	KT 37	KT 38	KT 39	KT 40	KT 41	KT 42	KT 43	KT 44	KT 45	KT 46	KT 47	KT 48	KT 49	KT 50	KT 51	KT 52	KT 53
