HARMONOGRAM STAVBY: PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI SÍDL. BARRANDOV - HOLYNĚ - SLIVENEC

ID	ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání
1	1		HMG	61 dny
2	2		Zahájení stavby	0 dny
3	3		Dokončení stavby	0 dny
4	4		SO 122 - Provizorní dopravní značení	61 dny
5	5		SO 101 - Úpravy stávající smyčky Barrandov	61 dny
6	6		Zemní práce a demolice	14 dny
7	7		Odvodnění, podkladní vrstvy a obruby	14 dny
8	8		Montáže	23 dny
9	9		Povrchy	10 dny
10	10		SO 102 - Tramvajová trať	61 dny
11	11		Zemní práce a demolice	14 dny
12	12		Odvodnění, podkladní vrstvy a obruby	14 dny
13	13		Montáže	23 dny
14	14		Povrchy	10 dny
15	15		SO 203 - Multikanál DP	28 dny
16	16		SO 301 - Odvodnění smyčky Barrandov (stávající km 0,0-0,1)	18 dny
17	17		SO 401 - Trolejové vedení	61 dny
18	18		Demontáž, zemní práce, základy	14 dny
19	19		Montáž	8 dny
20	20		SO 403 - Elektrické ovládání výměn a vytápění	42 dny
21	21		Zemní a přípravné práce	10 dny
22	22		Montáž	7 dny
23	23		SO 404 - Mazací zařízení	7 dny
24	24		SO 405 - Osvětlení zastávek a napájení OTZ	58 dny
25	25		Zemní práce	14 dny
26	26		Montáže	7 dny
27	27		SO 409 - Elektrická přípojka ZS	14 dny
28	28		SO 421 - Přípojka optického kabelu	14 dny
29	29		SO 706 - Zastřešení IS na zastávce Sídliště Barrandov z centra	10 dny
30	30		PS 902 - Informační systém	14 dny
31	31		VON - Vedlejší a ostatní náklady	61 dny
32	32		Zařízení staveniště	61 dny

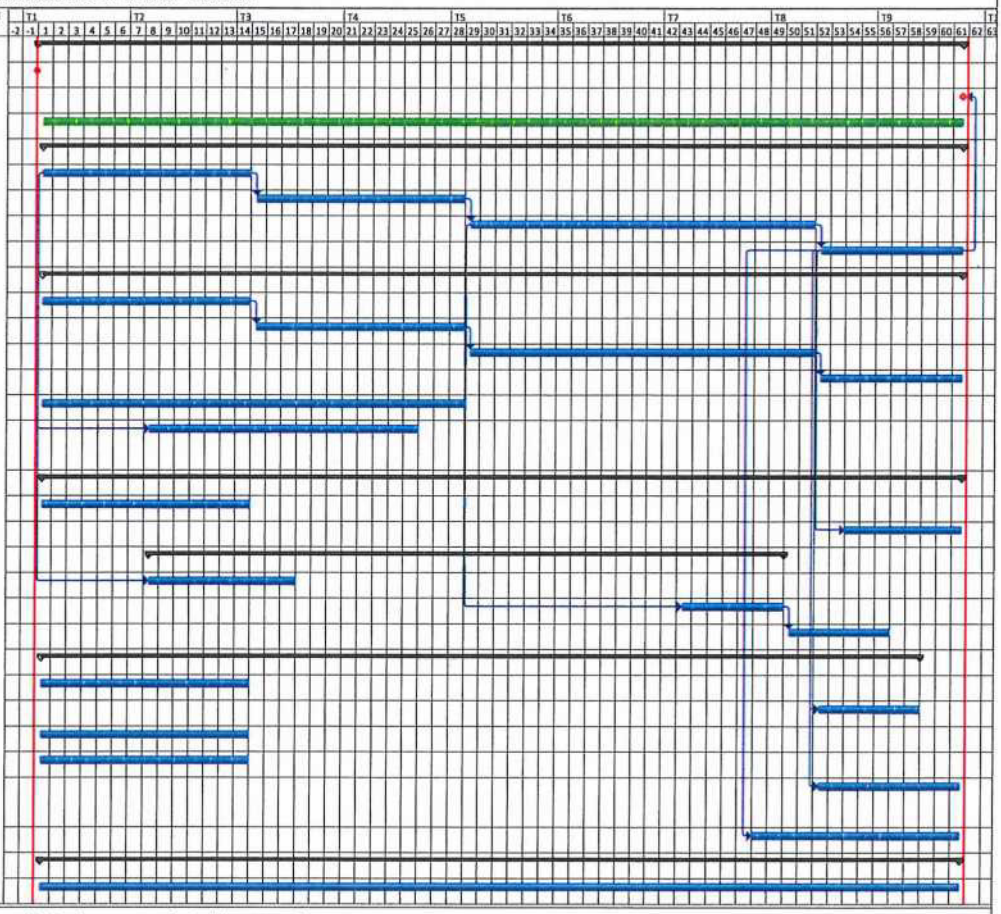

Projekt: msproj11
Datum: 04.06. 19

Úkol — Rozdělení — Mezník — Souhrnný
