Příloha 2. - harmonogram prací

ID	ID	Task Name	Duration	Start	Finish
1	1	Celková doba provádění díla	570 days	17/01/20	08/08/21
2	**2**	**AST - architektonická studie**	**85 days**	**17/01/20**	**10/04/20**
3	3	AST - předání finální verze ASŘ pro DUR	70 days	17/01/20	26/03/20
4	4	AST - kompletace, finální prezentace	15 days	27/03/20	10/04/20
5	**5**	**DBP - dokumentace bouracích prací**	**150 days**	**06/02/20**	**04/07/20**
6	6	DBP - vypracování dokumentace odstranění staveb	90 days	06/02/20	05/05/20
7	7	DBP - projednání povolení odstanění staveb	60 days	06/05/20	04/07/20
8	**8**	**Provedení průzkumů**	**170 days**	**17/01/20**	**04/07/20**
9	**9**	**SEA - dokumentace a řízení - návrh, není předmětem d**	**135 days**	**21/02/20**	**04/07/20**
10	10	SEA - zpracování podkladů pro posouzení - odhad	45 days	21/02/20	05/04/20
11	11	SEA - posouzení vlivu na životní prostředí - odhad	90 days	06/04/20	04/07/20
12	**12**	**DUR - rozhodnutí o umístění stavby**	**260 days**	**27/03/20**	**11/12/20**
13	13	DUR - vypracování dokumentace k odsouhlasení	100 days	27/03/20	04/07/20
14	14	DUR - inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS	60 days	05/07/20	02/09/20
15	15	DUR - vydání rozhodnutí	60 days	03/09/20	01/11/20
16	16	DUR - nabytí právní moci	40 days	02/11/20	11/12/20
17	**17**	**DSP - stavební povolení**	**270 days**	**24/08/20**	**20/05/21**
18	18	DSP - vypracování dokumentace k odsouhlasení	110 days	24/08/20	11/12/20
19	19	DSP - inženýrská činnost, zajištění vyjádření DOSS	60 days	12/12/20	09/02/21
20	20	DSP - vydání rozhodnutí	60 days	10/02/21	10/04/21
21	21	DSP - nabytí právní moci	40 days	11/04/21	20/05/21
22	22	**DVZ - dokumentace pro výběr zhotovitele**	**180 days**	**10/02/21**	**08/08/21**
23	23	DSP - projektová dokumentace pro provedení stavby	180 days	10/02/21	08/08/21
24	**24**	**PD Interieru**	**210 days**	**14/10/20**	**11/05/21**
25	25	INT - studie interieru	120 days	13/10/20	09/02/21
26	26	INT - prováděcí dokumentace interiéru	90 days	10/02/21	10/05/21
27	27	SPD - soupis prací a dodávek	30 days	10/07/21	08/08/21
28	**28**	**AD - autorský dozor - po dobu výstavby**			

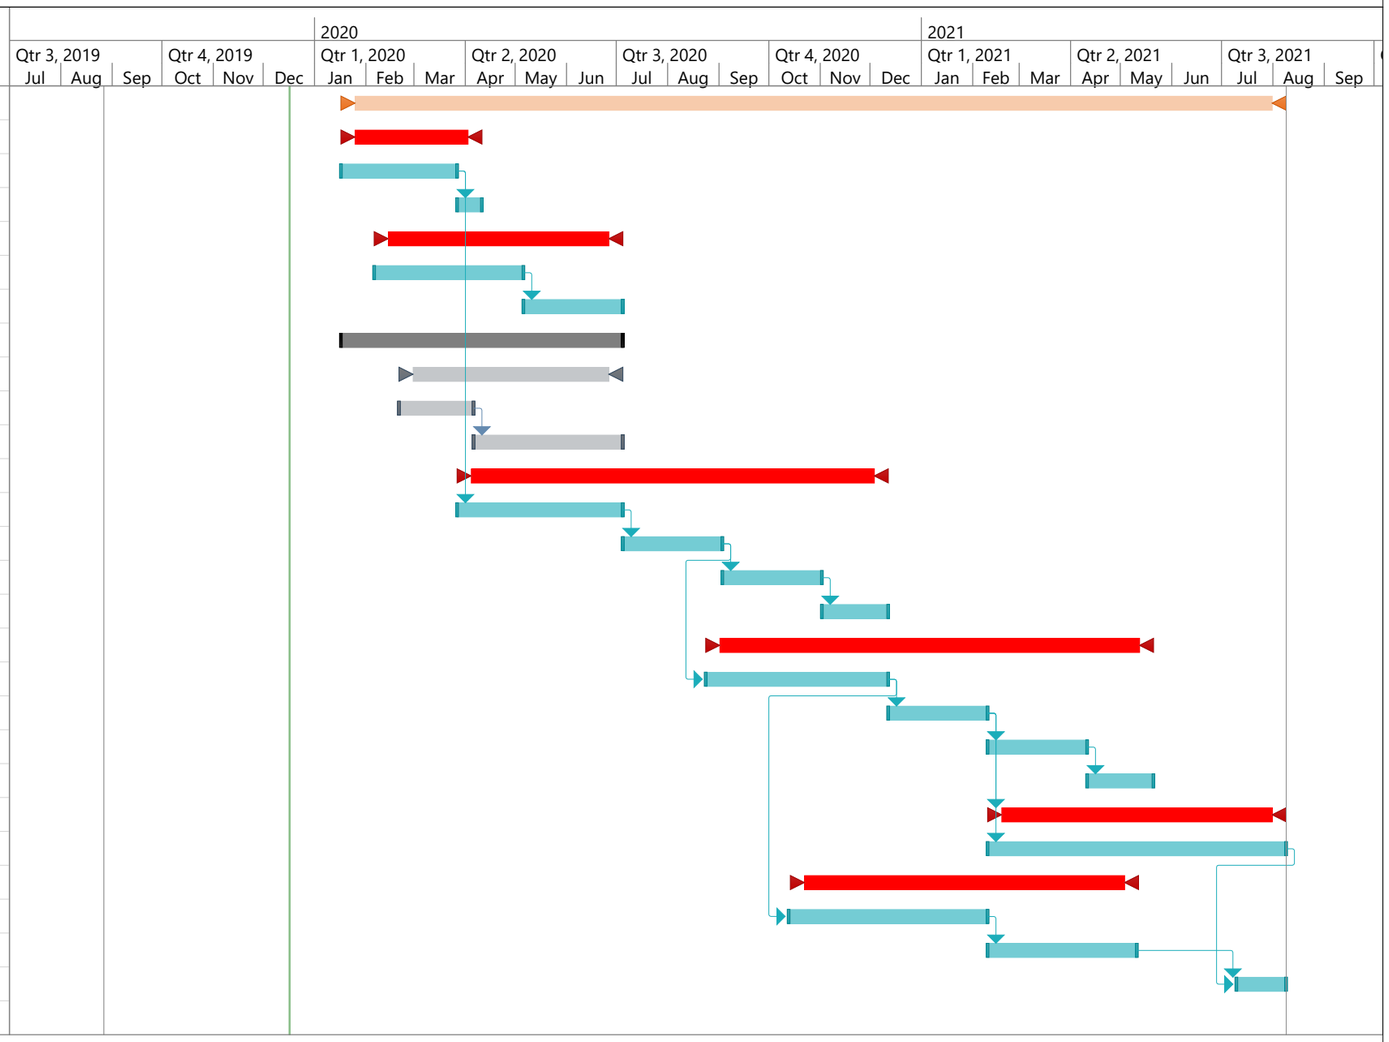

Project: 191212 hmg_jihlava
Date: 17/12/19

Task	Project Summary	Manual Task	Start-only	Deadline
Split	Inactive Task	Duration-only	Finish-only	Progress
Milestone	Inactive Milestone	Manual Summary Rollup	External Tasks	Manual Progress
Summary	Inactive Summary	Manual Summary	External Milestone	
