Polní cesta C13 v k.ú. Rostěnice

Harmonogram
stavebních prací

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	**Doba plnění**	**93 dny**	**15.08. 16**	**15.11. 16**	
2	***Termín zahájení realizace stavebních prací***	***0 dny***	15.08. 16	15.08. 16	
3	**SO 101 Polní cesta - část 1**	**88 dny**	**15.08. 16**	**10.11. 16**	
4	posečení trávy, odstranění křovin a stromů, sejmutí ornice	28 dny	15.08. 16	11.09. 16	
5	zemní práce, sanace podloží, úprava pláně, drenáž	37 dny	20.08. 16	25.09. 16	4SS+5 dny
6	podkladní vozovkové vrstvy nestmelené	35 dny	11.09. 16	15.10. 16	5FS-15 dny
7	vozovkové vrstvy asfaltové, krajnice	28 dny	14.10. 16	10.11. 16	6FS-2 dny
8	svahování, ohumusování, osetí	35 dny	07.10. 16	10.11. 16	7FF
9	oprava mostu, zábradlí	42 dny	30.09. 16	10.11. 16	8FF
10	***Termín dokončení stavebních prací***	***0 dny***	10.11. 16	10.11. 16	9
11	***Termín předání a převzetí díla***	***0 dny***	15.11. 16	15.11. 16	10FS+5 dny
12					
13	*uzlové body:*		15.08. 16	15.08. 16	
14	*zhotovení pláně*	0 dny	15.09. 16	15.09. 16	
15	*zhotovení štěrkových vrstev*	0 dny	05.10. 16	05.10. 16	
16	*zhotovení asfaltobetonových vrstev*	0 dny	10.11. 16	10.11. 16	7

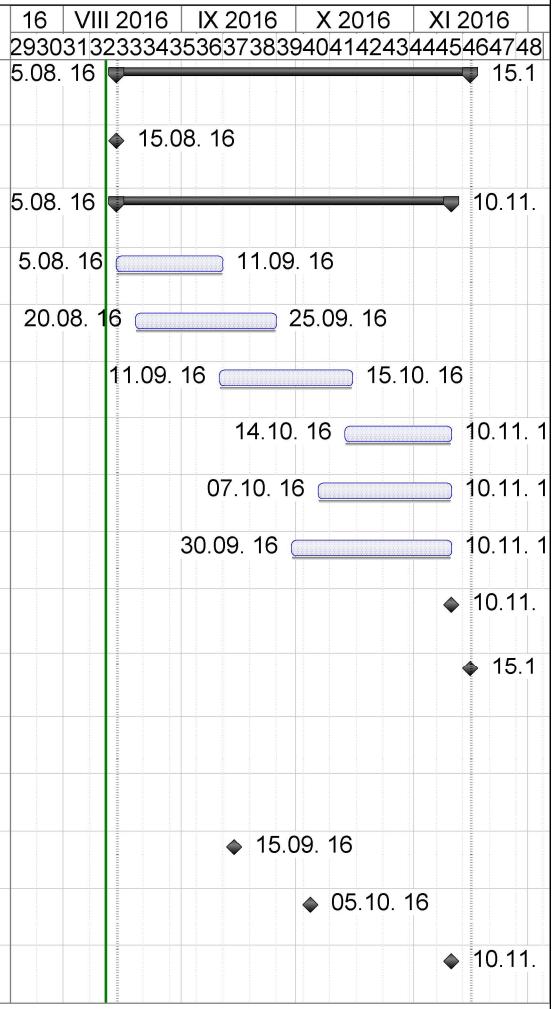

Projekt: Rostěnice_hmg_pt_1.m
Datum: 12.08. 16

Úkol | Přerušení | Milník | Souhrnný
