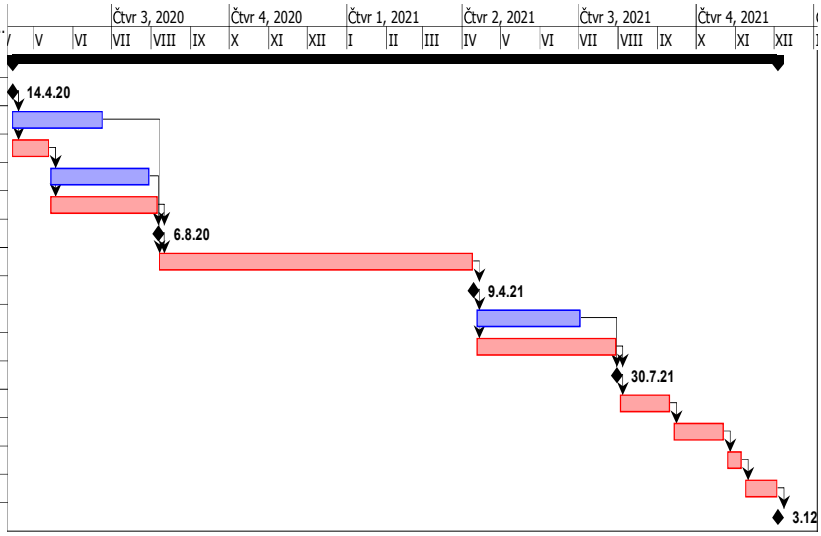	Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Předc...
1	**Výstavba**	**420 dní**	**14.4.20 8:00**	**3.12.21 17:00**	
2	Zahájení akce - předání staveniště	0 dní	14.4.20 8:00	14.4.20 8:00	
3	Stěhování skladů ND	50 dní	14.4.20 8:00	24.6.20 17:00	2
4	Příprava firmy, zřízení zázemí staveniště	20 dní	14.4.20 8:00	13.5.20 17:00	2
5	Ochranná opatření v 5. a 6. PP, přeložky, příprava	55 dní	14.5.20 8:00	30.7.20 17:00	4
6	Odpojení, demontáž strojního zařízení, demolice příček ...	60 dní	14.5.20 8:00	6.8.20 17:00	4
7	Zahájení demolice nosné části	0 dní	6.8.20 17:00	6.8.20 17:00	5;6
8	Postupná náhrada nosné konstrukce	170 dní	7.8.20 8:00	9.4.21 17:00	3;7
9	Nová deska na +0 hotova	0 dní	9.4.21 17:00	9.4.21 17:00	8
10	Hydroizolace a nové skladby piazzetty	60 dní	12.4.21 8:00	2.7.21 17:00	9
11	Dokončovací práce uvnitř suterénů	80 dní	12.4.21 8:00	30.7.21 17:00	9
12	Stavební práce dokončeny	0 dní	30.7.21 17:00	30.7.21 17:00	10;11
13	Odstraňování vad a nedodělků	30 dní	2.8.21 8:00	10.9.21 17:00	12
14	REZERVA	30 dní	13.9.21 8:00	22.10.21 17:00	13
15	Kolaudace	10 dní	25.10.21 8:00	5.11.21 17:00	14
16	Uvádění do provozu	20 dní	8.11.21 8:00	3.12.21 17:00	15
17	Otevření pro veřejnost	0 dní	3.12.21 17:00	3.12.21 17:00	16
