Příloha č.4 : **Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky - „Revitalizace energeticky úsporných opatření ZŠ Vlčice"**

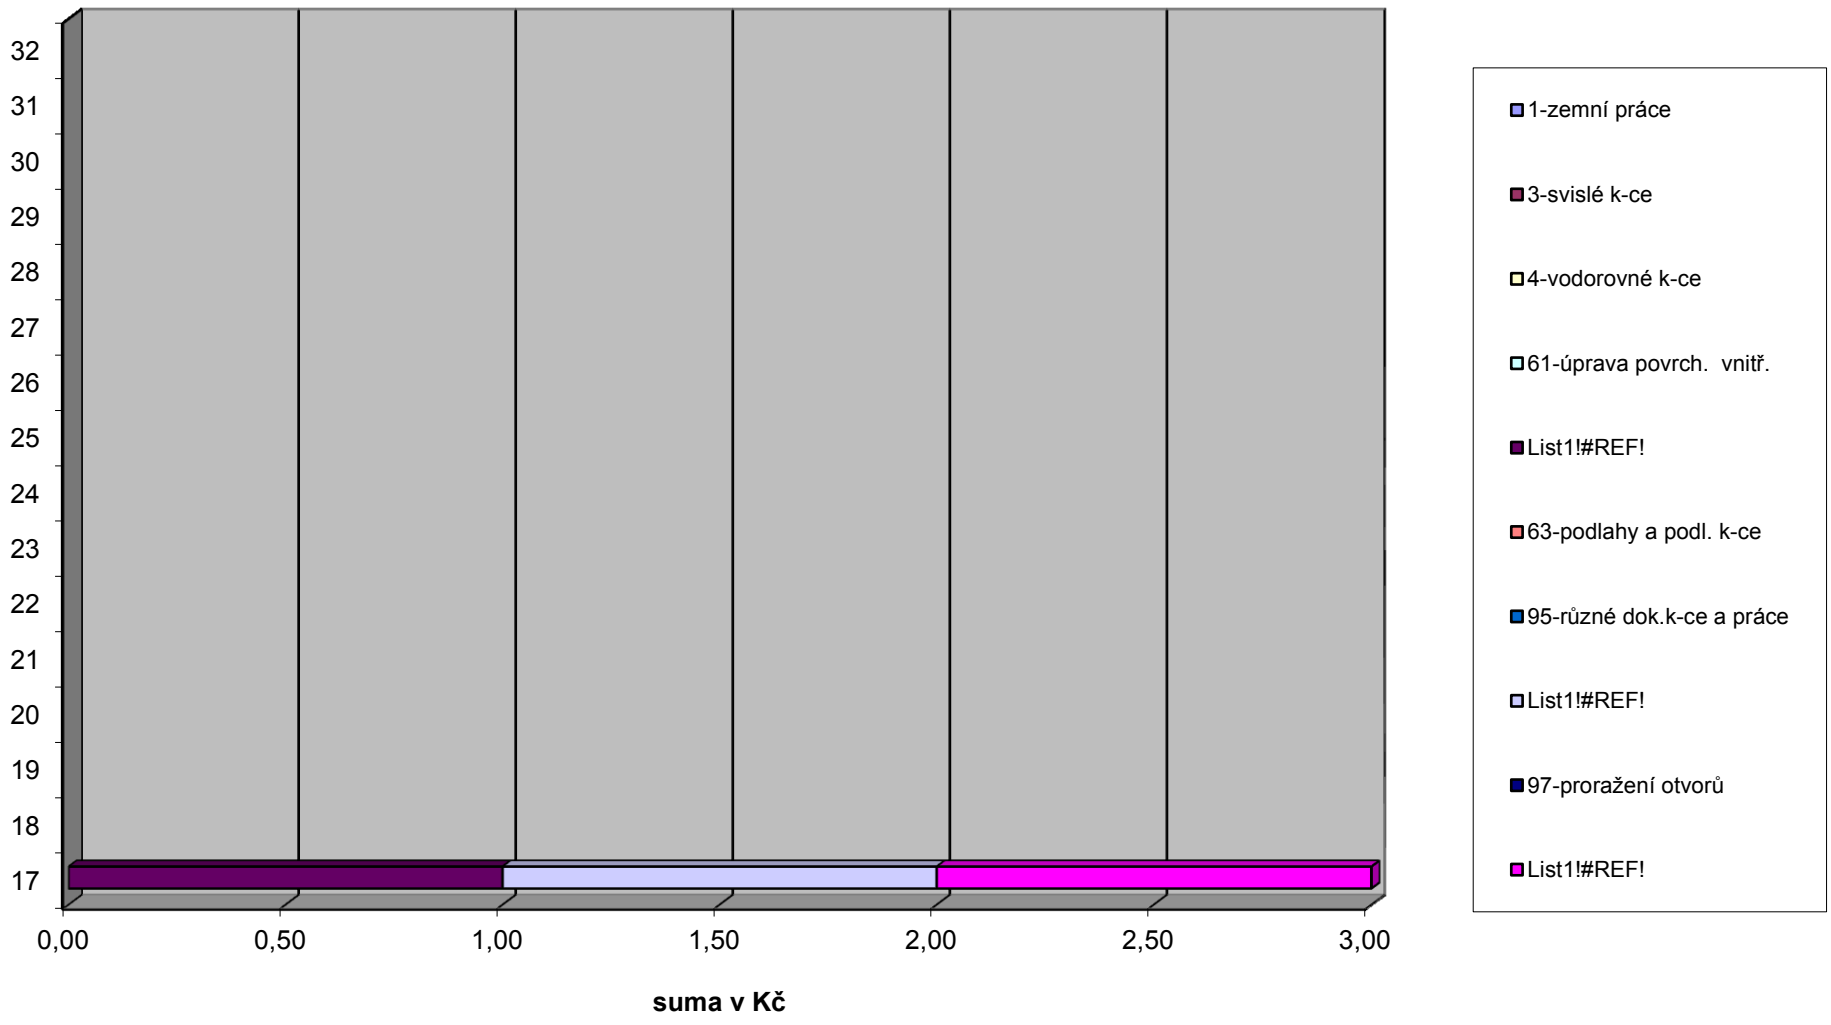

Finanční harmonogram plnění veřejné zakázky -

,,Revitalizace energeticky úsporných opatření ZŠ Vlčice"

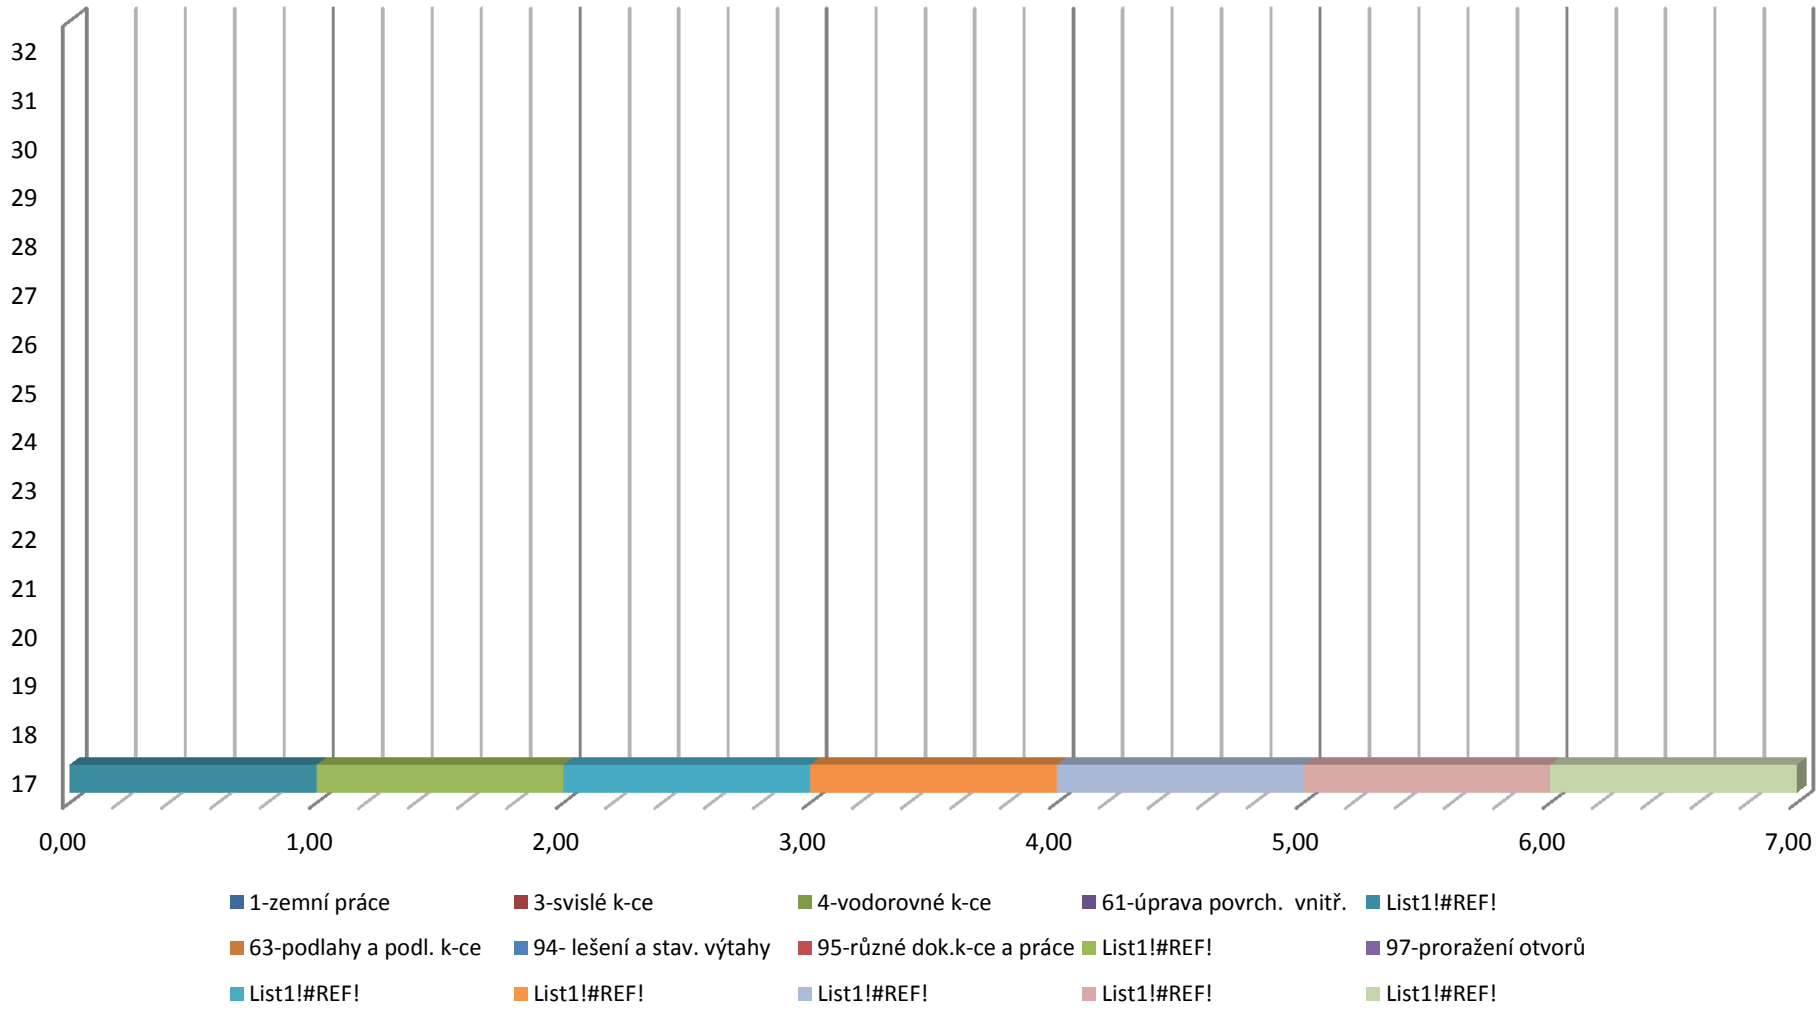

HARMONOGRAM PRACÍ (týdenní) - „Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“, od 1.5.2020 do 31.10.2021

týden 2020	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1-zemní práce					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
3-svislé k-ce																■	■	■	■	■	■	■
4-vodorovné k-ce																						
61-úprava povrch. vnitř.																						
63-podlahy a podl. k-ce																						
94- lešení a stav. výtahy				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
95-různé dok.k-ce a práce																						
96- bourání k-cí								■														
97-proražení otvorů										■	■	■	■	■	■							
98-demolice a sanace	■	■	■	■	■	■																
997-přesuny sutě	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
998-přesuny hmot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
711-izol. proti vodě																						
720- zdravotechnika																						
751-vzduchotechnika																						
762-k-ce tesařské																						
763-kce suché výstavby																						
766-k-ce truhlářské																						
771-podlahy z dlaždic																						
777-podlahy lité																						
781-obklady																						
782-obklady z kamene																						
784-malby a tapety																						
21-M-elektromontáže																						
VRN3-zařízení staveniště	■	■	■																			
VRN4-inženýrská činnost	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN7-provozní vlivy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

HARMONOGRAM PRACÍ (týdenní) - „Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“, od 1.5.2020 do 31.10.2021

týden 2020-2021	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8
1-zemní práce																						
3-svislé k-ce																						
4-vodorovné k-ce	■	■																				
61-úprava povrch. vnitř.																			■	■	■	■
63-podlahy a podl. k-ce																						
94- lešení a stav. výtahy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
95-různé dok.k-ce a práce																						
96- bourání k-cí																						
97-proražení otvorů																						
98-demolice a sanace																						
997-přesuny sutě																						
998-přesuny hmot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
711-izol. proti vodě																						
720- zdravotechnika											■	■	■	■								
751-vzduchotechnika																						
762-k-ce tesařské																						
763-kce suché výstavby																						
766-k-ce truhlářské																						
771-podlahy z dlaždic																						
777-podlahy lité																						
781-obklady																						
782-obklady z kamene																						
784-malby a tapety																						
21-M-elektromontáže							■	■	■	■												
VRN3-zařízení staveniště																						
VRN4-inženýrská činnost	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN7-provozní vlivy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

HARMONOGRAM PRACÍ (týdenní) - „Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“, od 1.5.2020 do 31.10.2021

týden 2020-2021	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1-zemní práce																						
3-svislé k-ce																						
4-vodorovné k-ce																						
61-úprava povrch. vnitř.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
63-podlahy a podl. k-ce										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
94- lešení a stav. výtahy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
95-různé dok.k-ce a práce																						
96- bourání k-cí																						
97-proražení otvorů	■	■	■	■																		
98-demolice a sanace																						
997-přesuny sutě	■	■	■																			
998-přesuny hmot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
711-izol. proti vodě																				■	■	
720- zdravotechnika																			■			
751-vzduchotechnika													■									
762-k-ce tesařské																					■	■
763-kce suché výstavby																						■
766-k-ce truhlářské																	■	■	■			
771-podlahy z dlaždic																						
777-podlahy lité																						
781-obklady																						
782-obklady z kamene																					■	
784-malby a tapety																						
21-M-elektromontáže		■	■	■	■																	
VRN3-zařízení staveniště																						
VRN4-inženýrská činnost	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN7-provozní vlivy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

HARMONOGRAM PRACÍ (týdenní) - „Komunitní centrum ve Šternberském klášteře“, od 1.5.2020 do 31.10.2021

týden 2020-2021	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
1-zemní práce													
3-svislé k-ce													
4-vodorovné k-ce													
61-úprava povrch. vnitř.	■	■	■	■									
63-podlahy a podl. k-ce													
94- lešení a stav. výtahy	■	■	■	■	■	■	■	■					
95-různé dok.k-ce a práce									■	■			
96- bourání k-cí													
97-proražení otvorů													
98-demolice a sanace													
997-přesuny sutě													
998-přesuny hmot	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
711-izol. proti vodě													
720- zdravotechnika								■	■			■	■
751-vzduchotechnika									■				
762-k-ce tesařské	■	■											
763-kce suché výstavby	■	■	■										
766-k-ce truhlářské									■	■	■	■	
771-podlahy z dlaždic				■									
777-podlahy lité			■										
781-obklady		■											
782-obklady z kamene													
784-malby a tapety							■	■	■	■			
21-M-elektromontáže											■	■	
VRN3-zařízení staveniště												■	■
VRN4-inženýrská činnost	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
VRN7-provozní vlivy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
