ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
1	**1**	**Rekonstrukce současných prostor objektu G - MBÚ AV ČR**	**453 dny**	**20.01. 20**	**30.06. 21**
2	**1.1**	**Předání staveniště pro přípravné práce**	**35 dny**	**20.01. 20**	**28.02. 20**
3	1.1.1	připravné práce	5 dny	20.01. 20	24.01. 20
4	1.1.2	zpoždění na straně investora - chybějící stavební povol.	30 dny	25.01. 20	28.02. 20
5	1.2	**Předání staveniště - smluvní**	0 dny	28.02. 20	28.02. 20
6	1.3	1 - Zemní práce	45 dny	29.02. 20	21.04. 20
7	1.4	2 - Zakládání	45 dny	24.03. 20	14.05. 20
8	1.5	3 - Svislé a kompletní konstrukce	60 dny	15.05. 20	23.07. 20
9	1.6	4 - Vodorovné konstrukce	90 dny	24.07. 20	05.11. 20
10	1.7	5 - Komunikace pozemní	45 dny	15.01. 21	08.03. 21
11	1.8	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	160 dny	06.11. 20	11.05. 21
12	1.9	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	320 dny	29.02. 20	08.03. 21
13	1.10	Provedení demoličních prací interiéru	0 dny	17.11. 20	17.11. 20
14	1.11	Dokončení stavební připravenosti prostor	0 dny	23.11. 20	23.11. 20
15	1.12	997 - Přesun sutě	220 dny	29.02. 20	11.11. 20
16	1.13	998 - Přesun hmot	320 dny	29.02. 20	08.03. 21
17	1.14	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	80 dny	16.04. 20	04.02. 21
18	1.15	712 - Povlakové krytiny	45 dny	11.12. 20	01.02. 21
19	1.16	713 - Izolace tepelné	60 dny	11.12. 20	08.04. 21
20	1.17	720 - Výtahy	55 dny	21.04. 21	23.06. 21
21	1.18	761 - Konstrukce prosvětlovací	15 dny	11.12. 20	28.12. 20
22	1.19	763 - Konstrukce suché výstavby	60 dny	29.12. 20	08.03. 21
23	1.20	764 - Konstrukce klempířské	60 dny	08.10. 20	17.12. 20
24	1.21	766 - Konstrukce truhlářské	120 dny	21.01. 21	09.06. 21
25	1.22	767 - Konstrukce zámečnické	120 dny	21.01. 21	09.06. 21
26	1.23	771 - Podlahy z dlaždic	40 dny	09.03. 21	23.04. 21
27	1.24	776 - Podlahy povlakové	35 dny	20.03. 21	29.04. 21
28	1.25	777 - Podlahy lité	20 dny	24.04. 21	17.05. 21
29	1.26	781 - Dokončovací práce - obklady	40 dny	14.05. 21	29.06. 21
30	1.27	783 - Dokončovací práce - nátěry	25 dny	18.05. 21	15.06. 21
31	1.28	784 - Dokončovací práce - malby a tapety	30 dny	18.05. 21	21.06. 21
32	1.29	OST-1 - Ochranné prvky	10 dny	16.06. 21	26.06. 21
33	1.30	OST-2 - Vnitřní vybavení	10 dny	16.06. 21	26.06. 21
34	1.31	OST-3 - Základy VZT	14 dny	09.09. 20	24.09. 20

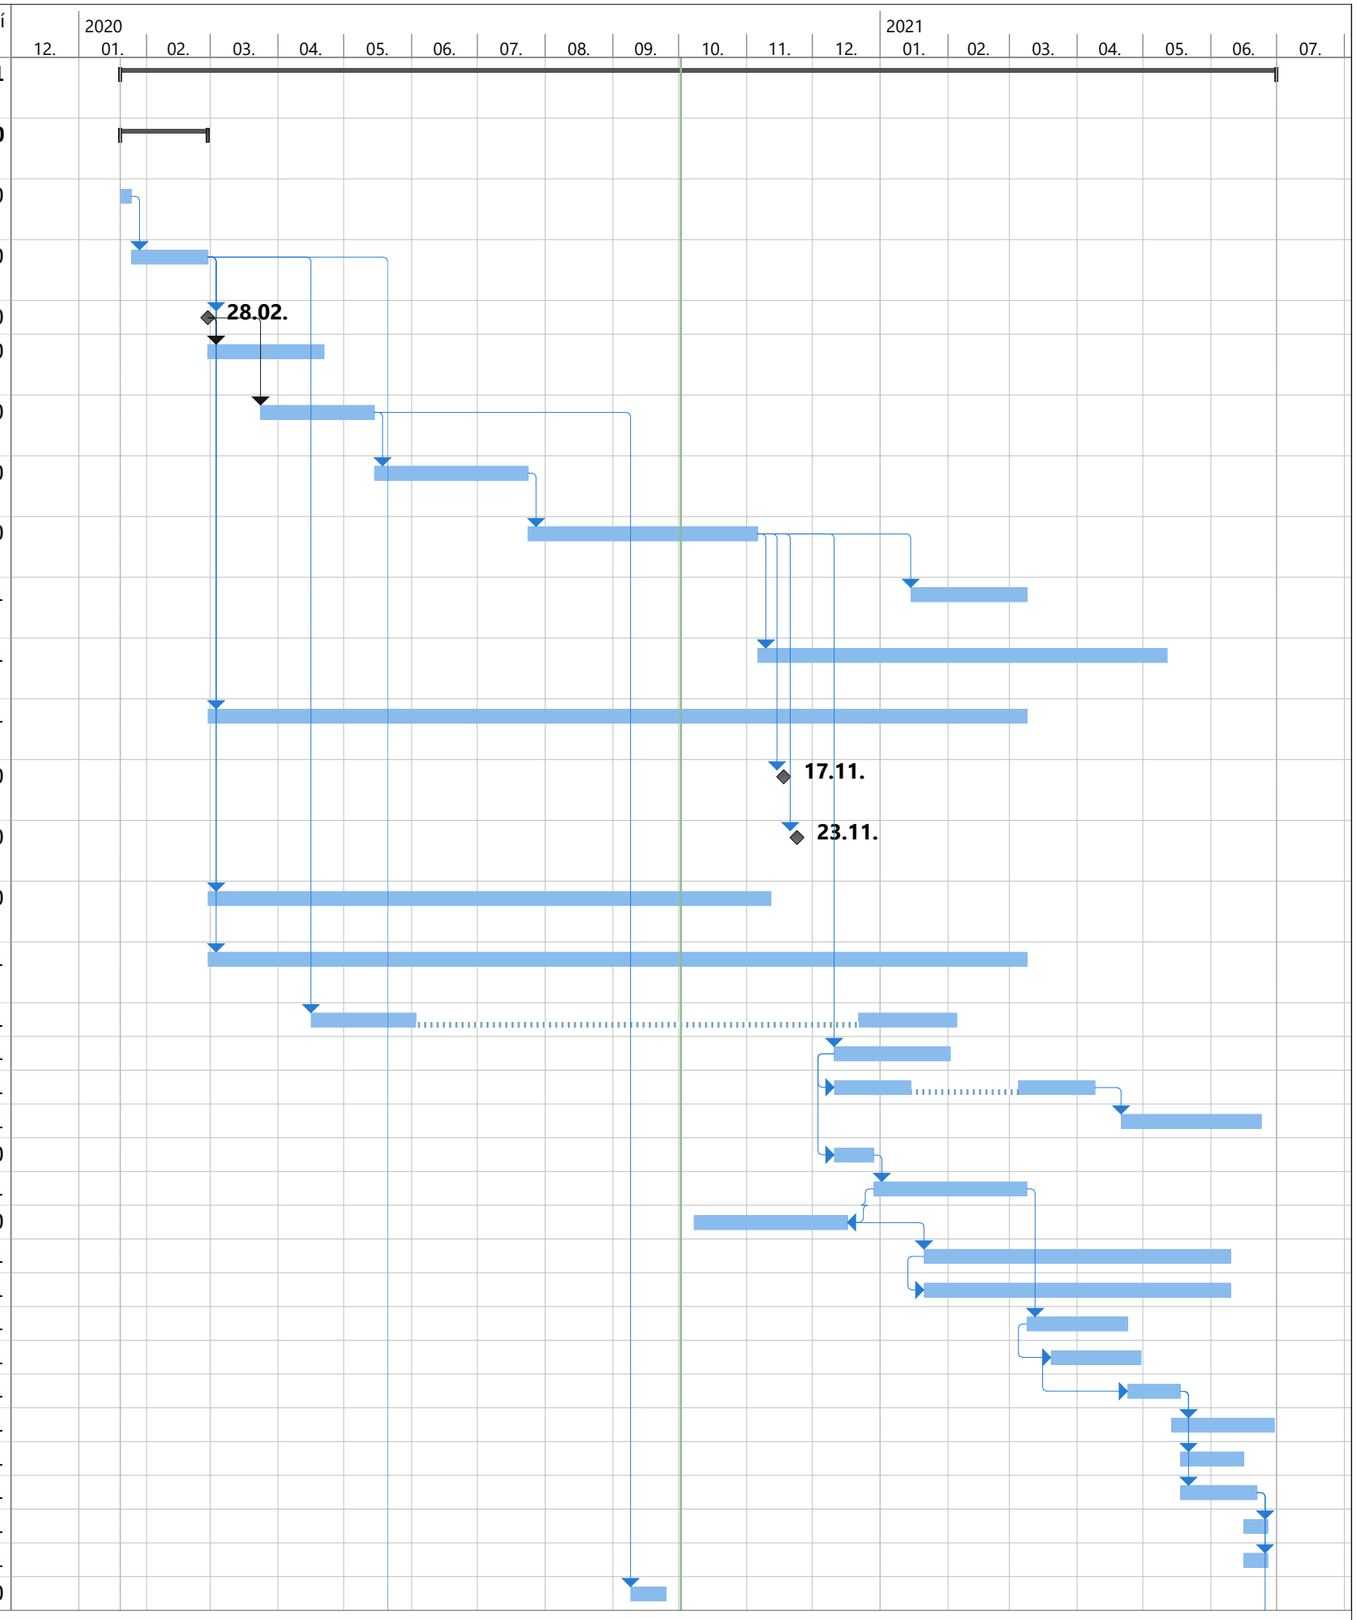
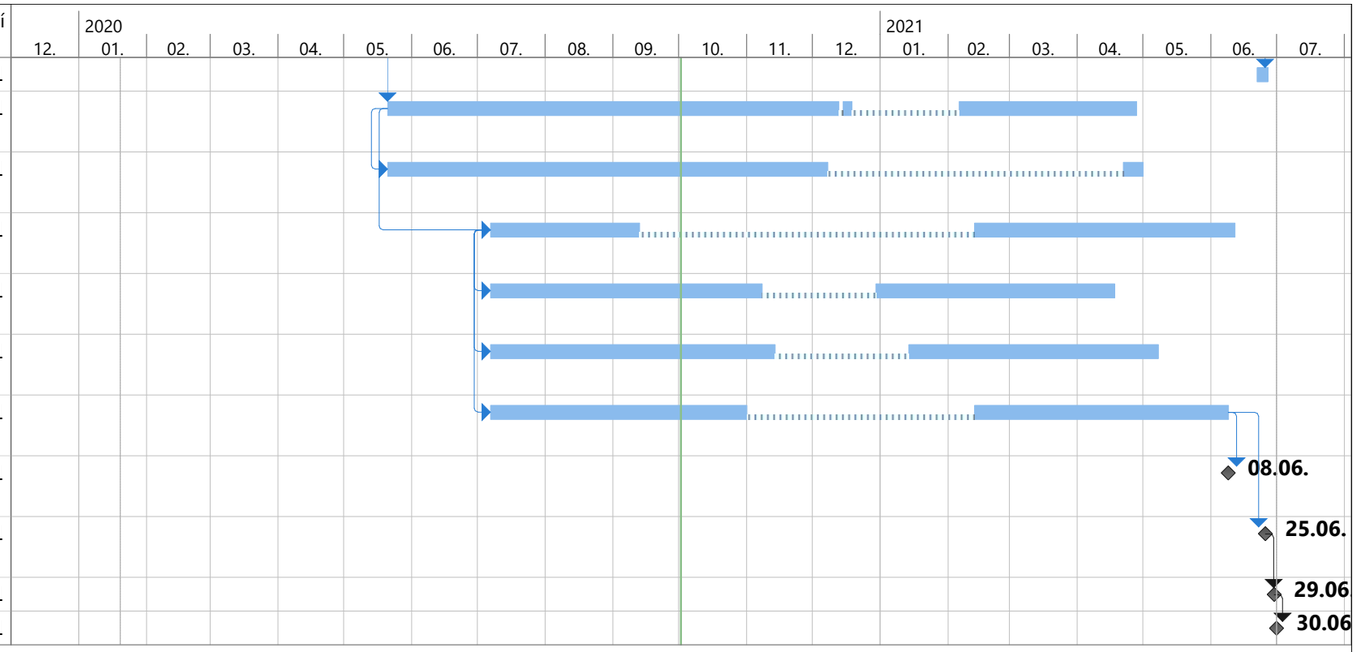
ID	Kód WBS	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení
35	1.32	OST-4 - Hasící přístroje a prvky PBŘ	5 dny	22.06. 21	26.06. 21
36	1.33	ESI - Silnoproud	250 dny	21.05. 20	27.04. 21
37	1.34	ESL - Slaboproud	180 dny	21.05. 20	30.04. 21
38	1.35	MaR - Měření a regulace	160 dny	07.07. 20	11.06. 21
39	1.36	UT,CH - Ústřední topení, chlazení	200 dny	07.07. 20	17.04. 21
40	1.37	ZTI - Zdravotechnika	210 dny	07.07. 20	07.05. 21
41	1.38	VZT-Vzduchotechnika	200 dny	07.07. 20	08.06. 21
42	1.39	Dokončení rozvodů elektro, ZTI, UT	0 dny	08.06. 21	08.06. 21
43	1.40	Dokončení VZT	0 dny	25.06. 21	25.06. 21
44	1.41	**Kolaudace**	0 dny	29.06. 21	29.06. 21
45	1.42	**Předání díla**	0 dny	30.06. 21	30.06. 21
