Časový plán výstavby - Harmonogram postupu prací

18 -016 Rozšíření odbavovacích přepážek v Terminálu 2- platný k (23.7.2020) - dodatek ke smlouvě č. 2
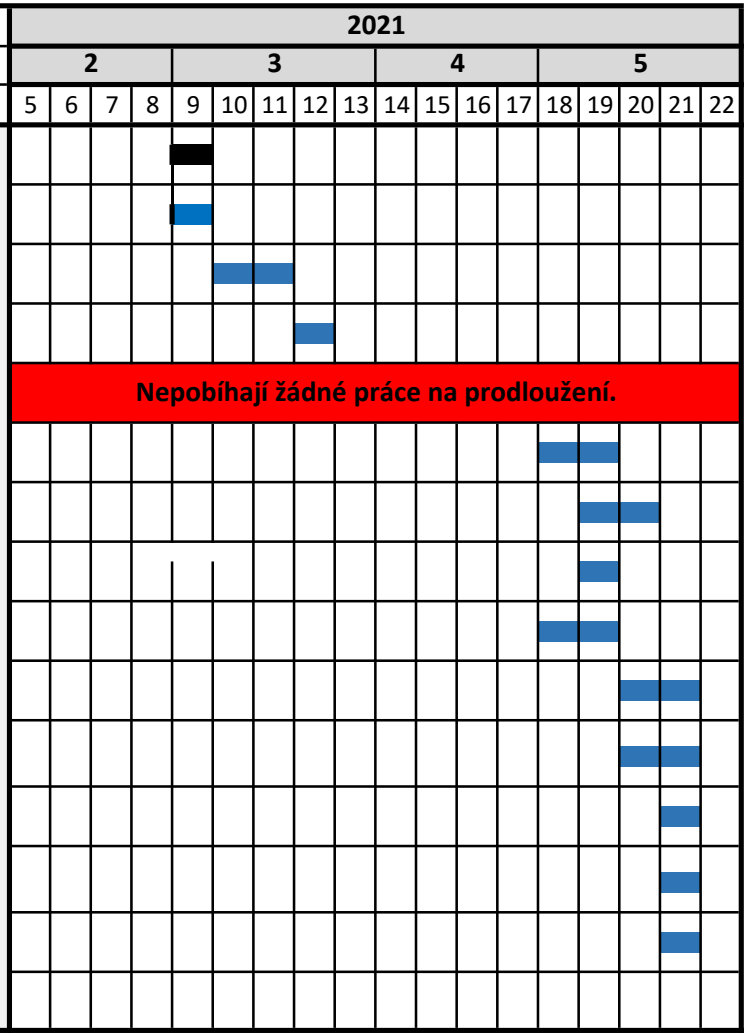
P.č.	Etapa	Položka	Začátek	Konec	Délka trvání
0.	Check in island No.3	Dočasný - částečný zábor u CIO3 (platí pro 18-016)	1.3.2021	1.3.2021	1 den
1.		Odpojení silnoproudých a slaboproudých rozvodů (OK)	2.3.2021	7.3.2021	6 dnů
2.		Demontáž a montáž ocelové konstrukce (Canopy)	8.3.2021	21.3.2021	14 dnů
3.		Zapojení sl. a sil. rozvodů v návaznosti na OK	22.3.2021	28.3.2021	7 dnů
4.		Výměna 3 v 1 sběrných dopravníků + požární uzávěr (VI)	29.3.2021	10.5.2021	8 týdnů
5.		Montáž sil. a sl. rozvodů supervizorských stanovišť	3.5.2021	16.5.2021	14 dnů
6.		Osazení svítidel a držáků FIDS	10.5.2021	22.5.2021	14 dnů
7.		Instalace check-in vážících a odesílacích dopravníků	10.5.2021	14.5.2021	5 dnů
8.		Montáž nábytku supervizorů a check-in přepážek	3.5.2021	16.5.2021	14 dnů
9.		Montáž zdvojené podlahy	20.5.2021	25.5.2021	6 dnů
10.		Technické prohlídky	19.5.2021	25.4.2021	6 dnů
11.		Kalibrace a certifikace vah - prvotní ověření	25.5.2021	26.5.2021	2 dny
12.		Demontáže záborů úklid staveniště	26.5.2021	26.5.2021	1 den
13.		Dílčí předání díla Objednateli	27.5.2021	27.5.2021	1 den
14.		Předání celého díla Objednateli	30.6.2021	30.6.2021	1 den
