ŘÁDKOVÝ HARMONOGRAM

Stavba:	

Termín stavby	
Od:	10.5.2021
Do:	25.7.2021

Práce o víkendu	
soboty	ano
neděle	ne

Svátky
ne
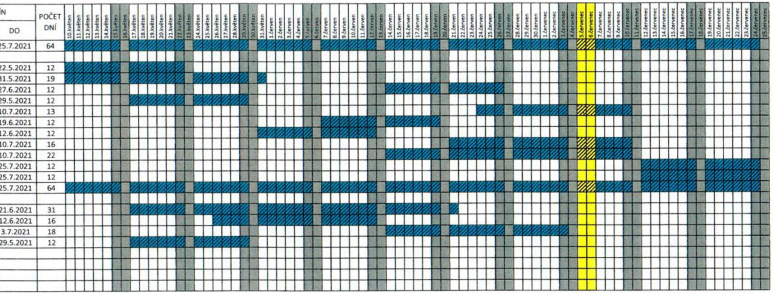
Č	NÁZEV ČINNOSTI	TERMÍN OD	TERMÍN DO	POČET DNÍ
1	**SO 010 VRN**	10.5.2021	25.7.2021	64
2	**SO 101**			
3	Odstranění krytů zpevněných ploch	10.5.2021	22.5.2021	12
4	Odkopávky pro zemní pláň + úpravy pláně KM 0,00 - 0,170	10.5.2021	31.5.2021	19
5	Odkopávky pro zemní pláň + úpravy pláně KM 0,170-0,257	14.6.2021	27.6.2021	12
6	Hloubení rýh pro odvodnění a obruby KM 0,00 - 0,120	17.5.2021	29.5.2021	12
7	Hloubení rýh pro odvodnění a obruby KM 0,120 - 0,200	24.6.2021	10.7.2021	13
8	Hloubení rýh pro odvodnění a obruby 0,200 - 0,257	7.6.2021	19.6.2021	12
9	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtí KM 0,00 - 0,170	31.5.2021	12.6.2021	12
10	Vozovkové vrstvy ze štěrkodrtí KM 0,170 - 0,257	21.6.2021	10.7.2021	16
11	Dlážděné kryty, obruby	14.6.2021	10.7.2021	22
12	Živičné kryty	12.7.2021	25.7.2021	12
13	Dokončovací práce, ornice, dopravní značení	12.7.2021	25.7.2021	12
14	**SO 181 DIO**	10.5.2021	25.7.2021	64
15	**SO 301 Kanalizace**			
16	Návrtávky kanalizace/ připojek ul.vpusti a odv.žlabů	17.5.2021	21.6.2021	31
17	Hlavní stoka	26.5.2021	12.6.2021	16
18	Odvodňovací žlaby, úpravy šachet	14.6.2021	3.7.2021	18
19	**SO 402 Přeložka vedení ČEZ**	17.5.2021	29.5.2021	12
20				
21	SO 401 Přeložka vedení CETIN			
22	SO 441 Nové veřejné osvětlení			
23	SO 801 Sadové úpravy
