Brno, Kalvodova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Časový harmonogram

firesta

ID	Název úkolu	Doba trvání
1	**Lhůta plnění - 32 týdnů**	**224 dny**
2	***Termín zahájení prací (předání staveniště)***	***0 dny***
3	přípravné práce	4 dny
4	**Etapa I**	**65 dny**
5	SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 110 m, DN 400 - 12 m)	50 dny
6	SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	50 dny
7	**Etapa II**	**80 dny**
8	SO 01 - KANALIZACE - STOKY (DN 500/750 - 179 m, DN 400 - 21 m)	55 dny
9	SO 02 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	65 dny
10	**Etapa III**	**65 dny**
11	SO 03 - VODOVODNÍ ŘADY	50 dny
12	SO 04 - VODOVODNÍ PŘÍPOJKY	55 dny
13	**Etapa IV**	**45 dny**
14	**SO 05 - KOMUNIKACE**	**45 dny**
15	SO 05.1 - KOMUNIKACE- komunikace	45 dny
16	SO 05.2 - KOMUNIKACE - chodníky	45 dny
17	SO 05.3 - KOMUNIKACE - odvodnění	35 dny
18	dokončovací práce, dokladová část	5 dny
19	***Termín dokončení díla, předání a převzetí díla***	***0 dny***

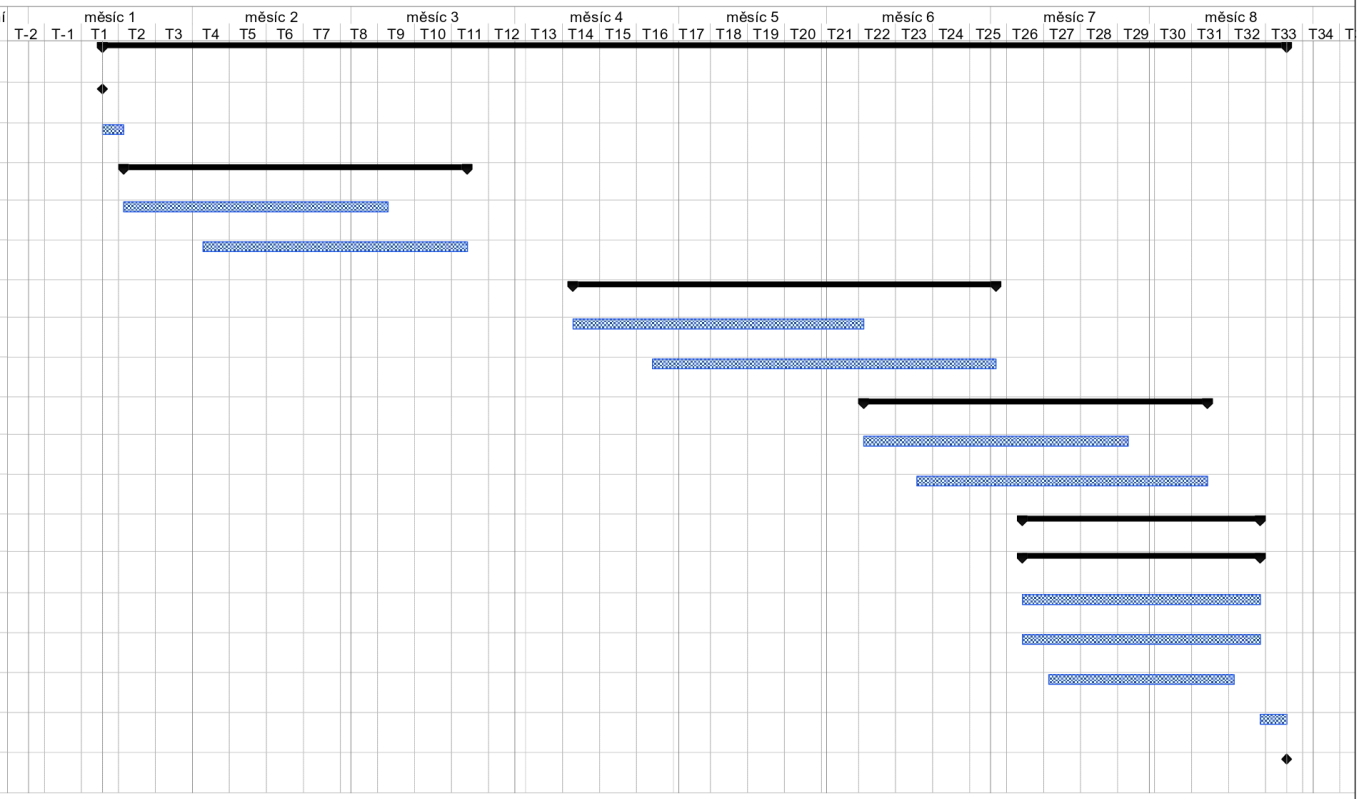

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum: 07.06. 21

Úkol Přerušení Milník Souhrnný
