ID		Režim úkolu	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů
1							
2			Přípravné práce	20.11. 19	20.12. 19		
3			Předání 1 části PD	19.12. 19	19.12. 19		
4			Předání 2 části PD	28.02. 20	28.02. 20		
5			Předání 3 části PD	30.04. 20	30.04. 20		
6			Předání staveniště I.Venkovní plochy	06.01. 20	06.01. 20		
7			Předání staveniště II. Stávající budova SO 01	03.08. 20	03.08. 20		
8			SO 01 a Rekonstrukce pláště stávajících budov	03.08. 20	28.01. 22		
9			SO 02 Přístavba polyfunkčního objektu	01.05. 20	14.10. 21		
10			SO 03 Přeložení vodovodu	15.02. 20	31.08. 20		
11			SO 04 Přeložení VTL plynovodu	15.02. 20	15.05. 20		
12			SO 06 Přípojka splaškové kanalizace	08.02. 21	23.04. 21		
13			SO 07 Přípojka dešťové kanalizace	03.03. 21	18.05. 21		
14			SO 08 Odvodňování zpevněných ploch	20.01. 20	30.06. 20		
15			SO 09 Přeložka slaboproudého kabelu CETIN	15.02. 20	15.06. 20		
16			SO 10 Přeložka slaboproudého kabelu UPC	20.01. 20	15.05. 20		
17			SO 11 Přeložka silnoproudého kabelu VO	15.02. 20	15.06. 20		
18			SO 12 Zpevněné plochy	20.01. 20	01.09. 21		
19			SO 13 Schodiště a opěrné zdi	01.09. 20	31.08. 21		
20			SO 14 Veřejné osvětlení	20.01. 20	01.09. 21		
21			SO 15 Sadové úpravy	15.03. 21	30.09. 21		
22			SO 16 Dopravní napojení (součástí SO12)	20.01. 20	01.09. 21		
23			SO 17 Trubní retence	03.03. 21	18.05. 21		
24			SO 18 Retenční a vsakovací objekt	20.01. 20	15.05. 20		
25			SO 20 Přípojka dešťové kanalizace	20.01. 20	15.05. 20		
26			Kolaudace SO 01	14.03. 22	16.03. 22	8FS+30 dny	
27			Kolaudace SO 02	14.03. 22	16.03. 22	8FS+30 dny	
28			Kolaudace vodoprávní řízení	15.11. 21	18.11. 21		

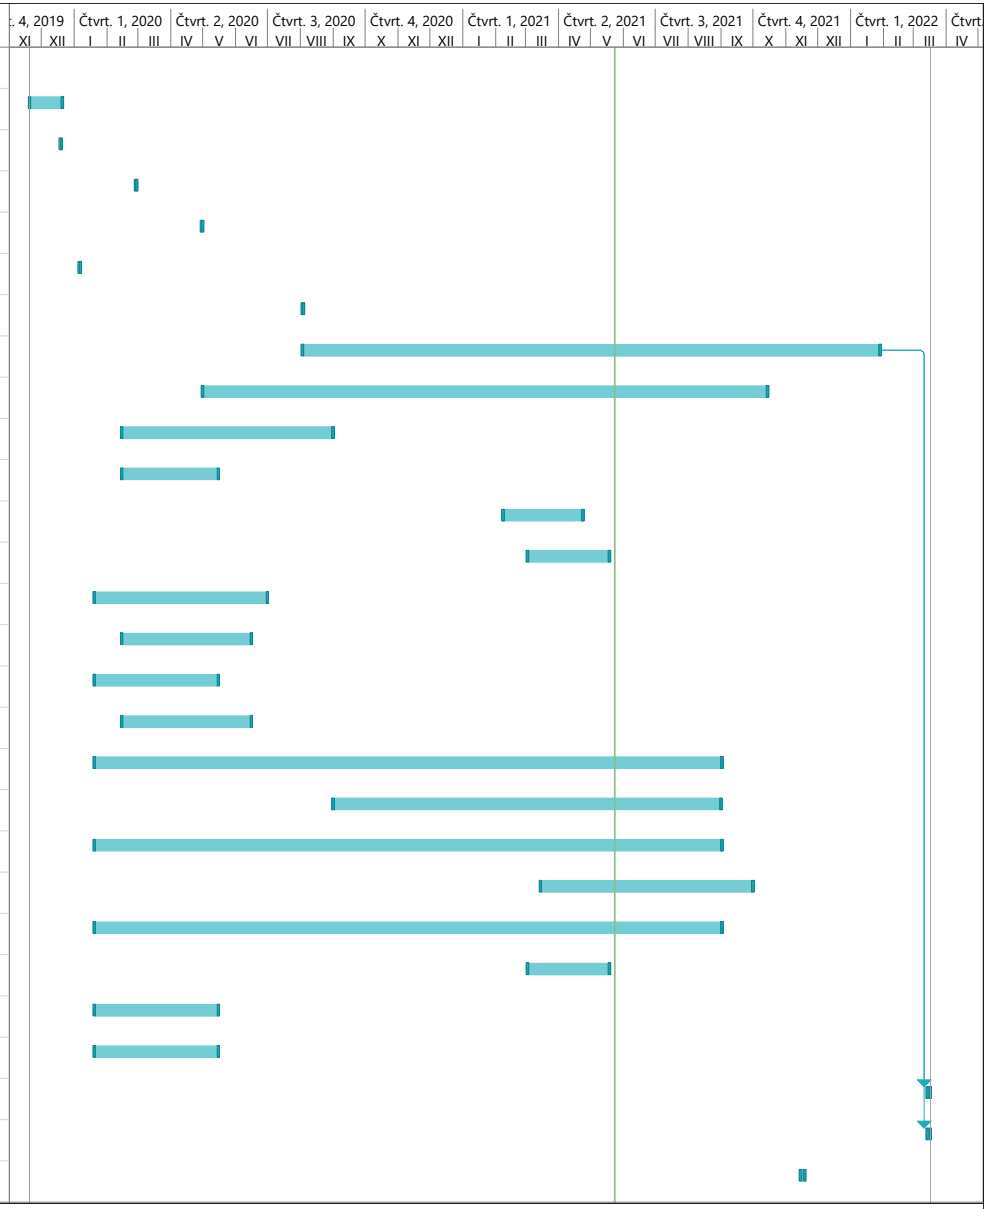

Projekt: HMG úprava SoD 24-5
Datum: 24.05. 21

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			
