Harmonogram stavby "Bytový dům Náchodská, Horní Počernice"

Kód položky	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena
533117	Bytový dům Náchodská, Horní Počernice	27.12.2021	10.01.2023	380,00	19 109 945,08
SO 01	Bytový dům	27.12.2021	10.01.2023	380,00	15 343 686,27
SO 01 D.1.1.1	Architektonicko stavební řešení	27.12.2021	10.01.2023	380,00	10 479 854,53
HSV	Práce a dodávky HSV	27.12.2021	10.01.2023	380,00	5 525 745,59
1	Zemní práce	27.12.2021	13.03.2022	77,00	597 308,54
2	Zakládání	29.12.2021	13.03.2022	75,00	911 668,90
3	Svislé a kompletní konstrukce	01.03.2022	13.08.2022	166,00	1 062 516,87
4	Vodorovné konstrukce	27.02.2022	13.08.2022	168,00	828 407,44
5	Komunikace pozemní	29.07.2022	13.12.2022	138,00	9 762,75
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30.05.2022	13.12.2022	198,00	1 523 096,60
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	27.12.2021	11.07.2022	197,00	421 440,75
997	Přesun sutě	27.12.2021	10.01.2023	380,00	3 393,35
998	Přesun hmot	27.12.2021	10.01.2023	380,00	168 150,39
PSV	Práce a dodávky PSV	27.12.2021	13.12.2022	352,00	4 954 108,94
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27.12.2021	13.03.2022	77,00	95 728,70
712	Povlakové krytiny	29.05.2022	13.10.2022	138,00	65 239,46
713	Izolace tepelné	30.03.2022	13.10.2022	198,00	351 969,07
714	Akustická a protiotřesová opatření	30.05.2022	13.11.2022	168,00	6 257,08
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	29.09.2022	13.12.2022	76,00	14 632,98
762	Konstrukce tesařské	29.04.2022	13.08.2022	107,00	436 597,37
763	Konstrukce suché výstavby	30.03.2022	13.10.2022	198,00	424 326,71
764	Konstrukce klempířské	30.05.2022	13.10.2022	137,00	125 533,38
765	Krytina skládaná	30.05.2022	13.10.2022	137,00	323 533,38
766	Konstrukce truhlářské	30.03.2022	13.08.2022	137,00	1 248 323,92
767	Konstrukce zámečnické	29.06.2022	13.12.2022	168,00	595 505,69
771	Podlahy z dlaždic	29.09.2022	13.12.2022	76,00	606 355,11
776	Podlahy povlakové	29.09.2022	13.12.2022	76,00	140 668,34
781	Dokončovací práce - obklady	29.09.2022	13.12.2022	76,00	247 161,91
783	Dokončovací práce - nátěry	30.10.2022	13.12.2022	45,00	37 060,21
784	Dokončovací práce - malby a tapety	30.10.2022	13.12.2022	45,00	104 082,56
786	Dokončovací práce - čalounické úpravy	29.10.2022	13.12.2022	46,00	131 133,07
SO 01 D..1.1.4.1	Zdravotně technické instalace	27.12.2021	13.12.2022	352,00	1 098 404,32
HSV	Práce a dodávky HSV	27.12.2021	10.04.2022	105,00	108 212,32
1	Zemní práce	27.12.2021	13.03.2022	77,00	97 917,06
4	Vodorovné konstrukce	30.12.2021	13.03.2022	74,00	8 216,00
8	Trubní vedení	30.01.2022	13.03.2022	43,00	2 077,38
998	Přesun hmot	27.12.2021	10.04.2022	105,00	1,88
PSV	Práce a dodávky PSV	30.01.2022	13.12.2022	318,00	990 192,00
713	Izolace tepelné	29.03.2022	13.09.2022	169,00	18 596,83
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	30.01.2022	13.07.2022	165,00	198 999,66
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	29.04.2022	13.09.2022	138,00	338 016,66
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	30.08.2022	13.12.2022	106,00	22 028,52
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	30.08.2022	13.12.2022	106,00	264 281,29
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	29.06.2022	13.10.2022	107,00	112 669,04
727	Zdravotechnika - požární ochrana	29.09.2022	13.12.2022	76,00	35 600,00
SO 01 D.1.1.4.2	Zařízení pro vytápění staveb	29.03.2022	13.12.2022	260,00	1 036 445,41
HSV	Práce a dodávky HSV	30.08.2022	13.12.2022	106,00	663,75
997	Přesun sutě	30.08.2022	13.12.2022	106,00	663,75
OST	Ostatní	29.08.2022	13.12.2022	107,00	12 720,00
PSV	Práce a dodávky PSV	29.03.2022	13.12.2022	260,00	1 023 061,66
713	Izolace tepelné- Viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02-05.	29.04.2022	13.11.2022	199,00	20 018,74
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace. Viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02, 04	29.03.2022	13.09.2022	169,00	2 475,75
731	Ústřední vytápění - kotelny- Viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02,04,05	29.09.2022	13.12.2022	76,00	171 805,40
732	Ústřední vytápění - strojovny. Viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02, 04, 05.	30.08.2022	13.12.2022	106,00	31 569,46
733	Ústřední vytápění - potrubí -viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02-05.	30.05.2022	13.09.2022	107,00	682 381,07
734	Ústřední vytápění - armatury -viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02-05.	30.05.2022	13.09.2022	107,00	51 513,72
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa -viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02-05.	30.07.2022	13.10.2022	76,00	47 656,26
767	Konstrukce zámečnické -viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02-05.	29.08.2022	13.10.2022	46,00	14 117,16
783	Dokončovací práce - nátěry -viz. výkr.č. D.1.1.4.2.02-05.	29.10.2022	13.12.2022	46,00	1 524,10
SO 01 D.1.1.4.3	Vzduchotechnika	29.07.2022	13.12.2022	138,00	1 192 415,00
PSV	Práce a dodávky PSV	29.07.2022	13.12.2022	138,00	1 192 415,00
751	Vzduchotechnika	29.07.2022	13.12.2022	138,00	1 192 415,00
SO 01 D.1.1.4.4	Plynová zařízení	29.05.2022	13.10.2022	138,00	39 730,01
PSV	Práce a dodávky PSV	29.05.2022	13.10.2022	138,00	39 730,01
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod viz. výkr.č. D.1.1.4.4.02-04.	29.05.2022	13.09.2022	108,00	32 651,27
767	Konstrukce zámečnické viz. výkr.č. D.1.1.4.4.02-04.	30.05.2022	13.09.2022	107,00	5 527,74
783	Dokončovací práce - nátěry viz. výkr.č. D.1.1.4.4.02-04.	30.07.2022	13.10.2022	76,00	1 551,00
SO 01 D.1.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod	30.03.2022	13.11.2022	229,00	1 270 292,00
PSV	Práce a dodávky PSV	30.03.2022	13.11.2022	229,00	1 270 292,00
741	Elektroinstalace - silnoproud	30.03.2022	13.11.2022	229,00	1 270 292,00
SO 01 D.1.1.4.6	Slaboproudá zařízení	29.06.2022	13.12.2022	168,00	226 545,00
PSV	Práce a dodávky PSV	29.06.2022	13.12.2022	168,00	226 545,00
742	Elektroinstalace - slaboproud	29.06.2022	13.12.2022	168,00	226 545,00
IO 01	Venkovní kanalizace	27.12.2021	10.01.2023	380,00	1 128 949,75
HSV	Práce a dodávky HSV	27.12.2021	10.01.2023	380,00	1 128 949,75
1	Zemní práce	27.12.2021	10.01.2023	380,00	800 710,14
3	Svislé a kompletní konstrukce	29.05.2022	13.12.2022	199,00	3 227,67
4	Vodorovné konstrukce	30.05.2022	13.12.2022	198,00	15 526,24
8	Trubní vedení	29.06.2022	13.12.2022	168,00	290 238,84
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	27.12.2021	11.05.2022	136,00	3 240,00

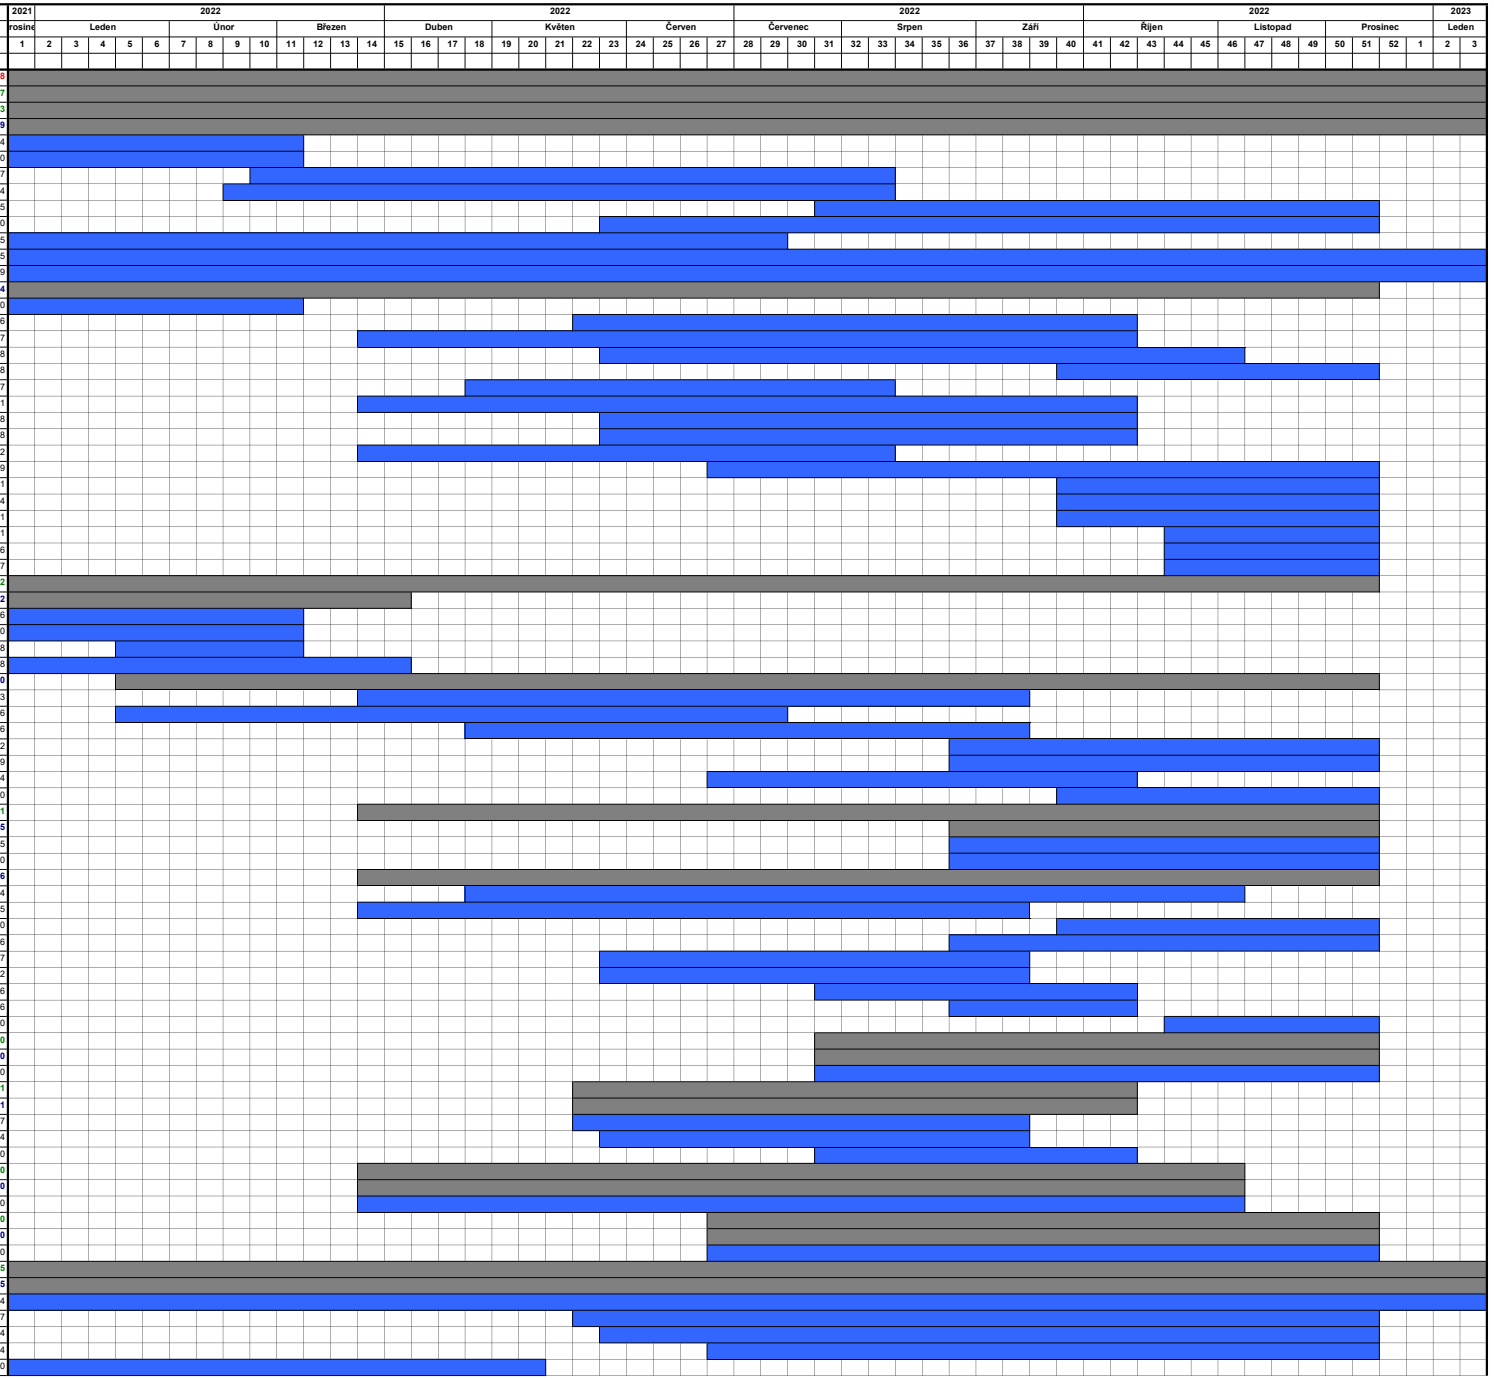
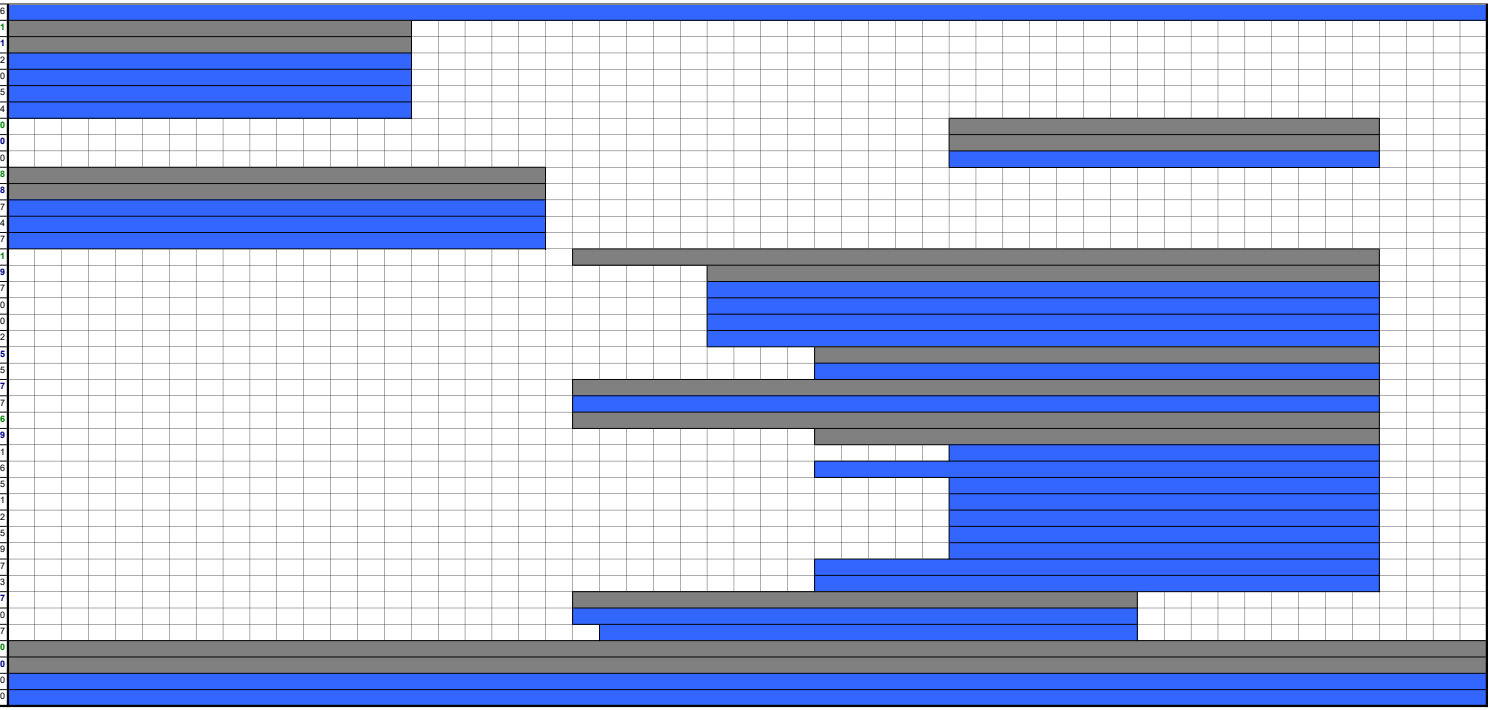
998	Přesun hmot	27.12.2021	10.01.2023	380,00	16 006,86
IO 02	**Vodovodní přípojka**	**27.12.2021**	**10.04.2022**	**133,00**	**370 754,61**
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**27.12.2021**	**10.04.2022**	**133,00**	**370 754,61**
1	Zemní práce	27.12.2021	10.04.2022	105,00	349 578,42
4	Vodorovné konstrukce	27.12.2021	10.04.2022	105,00	500,50
8	Trubní vedení	27.12.2021	10.04.2022	105,00	20 158,55
998	Přesun hmot	27.12.2021	10.04.2022	105,00	517,14
IO 03	**Venkovní osvětlení**	**29.08.2022**	**13.12.2022**	**107,00**	**143 148,00**
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**29.08.2022**	**13.12.2022**	**107,00**	**143 148,00**
741	Elektromontáže	29.08.2022	13.12.2022	107,00	143 148,00
IO 04	**Odstranění vodního díla - studna**	**27.12.2021**	**11.05.2022**	**164,00**	**18 585,88**
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**27.12.2021**	**11.05.2022**	**164,00**	**18 585,88**
1	Zemní práce	27.12.2021	11.05.2022	136,00	16 234,57
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	27.12.2021	11.05.2022	136,00	1 531,04
997	Přesun sutě	27.12.2021	11.05.2022	136,00	820,27
IO 05	**Plynovodní přípojka**	**29.05.2022**	**13.12.2022**	**199,00**	**377 337,91**
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**29.06.2022**	**13.12.2022**	**168,00**	**337 453,39**
1	Zemní práce	29.06.2022	13.12.2022	168,00	334 840,17
4	Vodorovné konstrukce	29.06.2022	13.12.2022	168,00	390,00
8	Trubní vedení	29.06.2022	13.12.2022	168,00	1 294,00
998	Přesun hmot	29.06.2022	13.12.2022	168,00	929,22
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**29.07.2022**	**13.12.2022**	**138,00**	**621,65**
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	29.07.2022	13.12.2022	138,00	621,65
M	**Práce a dodávky M**	**29.05.2022**	**13.12.2022**	**199,00**	**39 262,87**
23-M	Montáže potrubí	29.05.2022	13.12.2022	199,00	39 262,87
IO 06	**Komunikace a zpevněné plochy, terenní a sadové úpravy**	**29.05.2022**	**13.12.2022**	**199,00**	**1 040 482,66**
HSV	**Práce a dodávky HSV**	**29.07.2022**	**13.12.2022**	**138,00**	**1 036 046,09**
1	Zemní práce	29.08.2022	13.12.2022	107,00	482 956,51
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	29.07.2022	13.12.2022	138,00	59 953,86
2	Zakládání	29.08.2022	13.12.2022	107,00	27 217,45
3	Svislé a kompletní konstrukce	30.08.2022	13.12.2022	106,00	94 601,41
5	Komunikace pozemní	30.08.2022	13.12.2022	106,00	221 544,82
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30.08.2022	13.12.2022	106,00	23 666,55
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	29.08.2022	13.12.2022	107,00	60 617,99
997	Přesun sutě	30.07.2022	13.12.2022	137,00	48 235,67
998	Přesun hmot	29.07.2022	13.12.2022	138,00	17 251,83
PSV	**Práce a dodávky PSV**	**29.05.2022**	**13.10.2022**	**138,00**	**4 436,57**
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	29.05.2022	13.10.2022	138,00	314,50
764	Konstrukce klempířské	30.05.2022	13.10.2022	137,00	4 122,07
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	**27.12.2021**	**10.01.2023**	**380,00**	**687 000,00**
VON	**Vedlejší a ostatní náklady**	**27.12.2021**	**10.01.2023**	**380,00**	**687 000,00**
O02	Ostatní náklady	27.12.2021	10.01.2023	380,00	241 000,00
0	Vedlejší rozpočtové náklady	27.12.2021	10.01.2023	380,00	446 000,00
